

# ระบบติดตามความก้าวหน้างานโครงการหมู่บ้านจัดสรร

---

การประชุมสายงานบริการด้านตะวันตกและบริการด้านตะวันออก  
ครั้งที่ 8/2567

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.



ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา

<https://davis.mwa.co.th>

- โดย คณะทำงานด้านบำรุงรักษาของสำนักงานประปาสาขา





# รายงานติดตามงานติดตั้งระบบโครงการหมู่บ้านจัดสรร

ข้อมูล ณ วันที่

8/13/2024

## โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

## เฟสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

ปี  
All

สายงาน  
All

ภาค  
All

สาขา  
All

### โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

หมายถึง

1 โครงการที่ **ไม่ UPLOAD**  
**MASTER PLAN FILE**

ในระบบ CIS

2 โครงการที่ **ไม่ UPLOAD**  
**PROGRESS FILE**

ในระบบ CIS

ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ

สะสมถึงเดือนนี้

0.00%

สะสมถึงเดือนก่อน

0.00%

สะสมถึงเดือนก่อน

0.20%

สะสมถึงเดือนนี้

5.03%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

สสท.

สสส.

สสพ.

สสป.

สสญ.

สสม.

สสล.

สสช.

สสข.

สสมบ.

สสสภ.

สสบ.

สสด.

สสภ.

สสว.

สสน.

สสบท.

สสมส.

สสบ.

สสว.

สสป.

สสภ.

สสบท.

สสส.

สสพ.

สสด.

สสข.

สสน.

สสช.

สสท.

สสญ.

สสม.

สสล.

สสข.

สสมบ.

สสภ.

สสมส.

6

6

4

4

4

3

3

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

เฟสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หมายถึง  
1 เฟสที่ **ไม่ UPLOAD** แบบแปลงาน

วางท่อรายเฟส

ในระบบ CIS

2 เฟสที่ **ไม่ป้อนแผนงาน**

ในระบบ CIS

ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ

DateTH

10/1/2559

3/31/2567

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประจำปี <https://davis.mwa.co.th>



# รายเฟส

เจ้าของโครงการ (ราย)

675

จำนวนเฟสทั้งสิ้น

6,250

ระหว่างดำเนินการ

756

ข้อมูลไม่ครบ

38

ไม่ครบถ้วน (%)

5.03%

ปี  
All

สายงาน  
All

ภาค  
All

สาขา  
All

จำนวนเฟสแยกสายงาน

รวม(กอ)

3,602


รวม(กค)

2,648


ชื่อเฟส

เลขที่คำร้อง	เฟส	แผนงาน	แบบวางท่อ
679999180842	สริน พรานนก - กาญจนา-เฟส 2.0	✗	✗
679999180707	บ้านดอนเมือง-เฟส 8.0	✗	✗
679999180022	โครงการ ชีเน็กซ์ ชีเลคชั่น-เฟส 1.0	✗	✗
679999179968	คุณาลัย นาวาร้า-เฟส 8.0	✗	✗
679999179645	siwalee บำนาถ กม.13 เฟส 1.2-	✗	✗
679999179260	แกรนด์โอ บำนาถ กม.5 เฟส 10-	✗	✗
679999177657	Grand Pleno สุขสวัสดิ์ 64-เฟส 2.0	✗	✗
679999176425	โครงการบ้านนิรติ ศรีวารี บำนาถ เฟส 3.0-	✓	✓
679999176283	โกลเด้น นิโอ สุขสวัสดิ์-พระราม3-เฟส 8.0	✗	✗
679999174694	บ้านกลางเมือง THE EDITION พระราม9-พัฒนาการ 2-เฟส 1.0	✓	✗

จำนวนเฟสที่ข้อมูลไม่ครบ

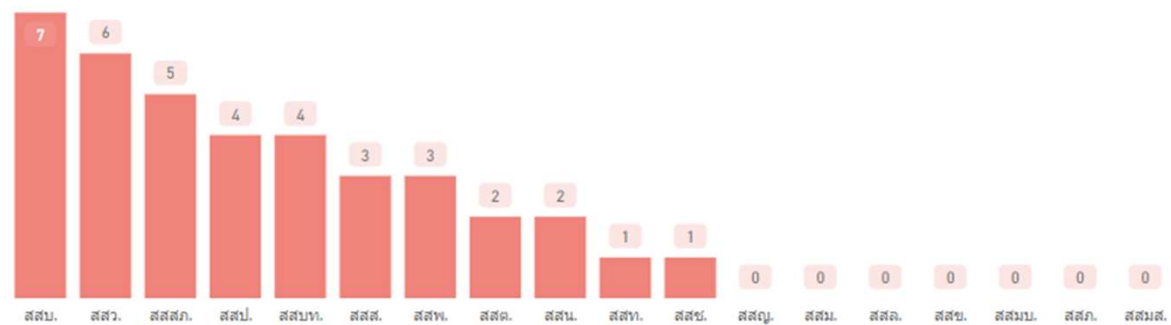

ไม่ป้อนแผนงาน (รายเฟส)



ไม่มีไฟล์แบบวางท่อในระบบ CIS (รายเฟส)



ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา <https://davis.mwa.co.th>



ข้อมูล ณ วันที่

8/13/2024

สาขา

All


ปี

All

เลือก ปี-เดือน

All

จำนวนเฟสแยกปีงบประมาณ



## จำนวนเฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการ แยกตามขั้นตอน

ดำเนินการ ขึ้นเรื่องวางท่อมากกว่า 1 วันทำการ  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

0 / 0

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนยื่นเรื่องวางท่อ (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead line (วัน): 1

ระยะเวลา ขึ้นเรื่องวางท่อ มากที่สุด  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

0

วันทำการ

ดำเนินการ สำรวจ ออกแบบ แจ้งราคามากกว่า 10 วันทำ...  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

9 / 34

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอน สำรวจ ออกแบบ แจ้งราคา (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

สสสภ. 679999112789

Dead Line (วัน): 10

53

สสส. 679999136233

37

สสสภ. 679999143935

32

ระยะเวลา สำรวจ ออกแบบ แจ้งราคา มากที่สุด  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

53

วันทำการ

ดำเนินการ ข้าราชการมากกว่า 20 วันทำการ  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

85 / 116

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนข้าราชการ (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead Line (วัน): 20

สสว. 649999098508

775

สสว. 649999583258

625

สสส. 659999387178

462

ระยะเวลา ข้าราชการ มากที่สุด  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

775

วัน

ดำเนินการ จัดจ้างมากกว่า 40 วันทำการ  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

44 / 119

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนจัดจ้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead Line (วัน): 40

สสสภ. 679999019728

107

สสสภ. 679999027249

92

สสสภ. 679999028206

92

ระยะเวลา จัดจ้าง มากที่สุด  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

107

วันทำการ

ดำเนินการ ก่อสร้างมากกว่า 120 วันทำการ  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

2 / 74

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนก่อสร้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead Line (วัน): 120

สสว. 669999432459

128

สสสภ. 669999233083

123

สสส. 669999417103

111

ระยะเวลา ก่อสร้าง มากที่สุด  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)


128

วัน



< Back to report

ระยะเวลาของขั้นตอน สํารวจ ออกแบบ แ้จรงราคา (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

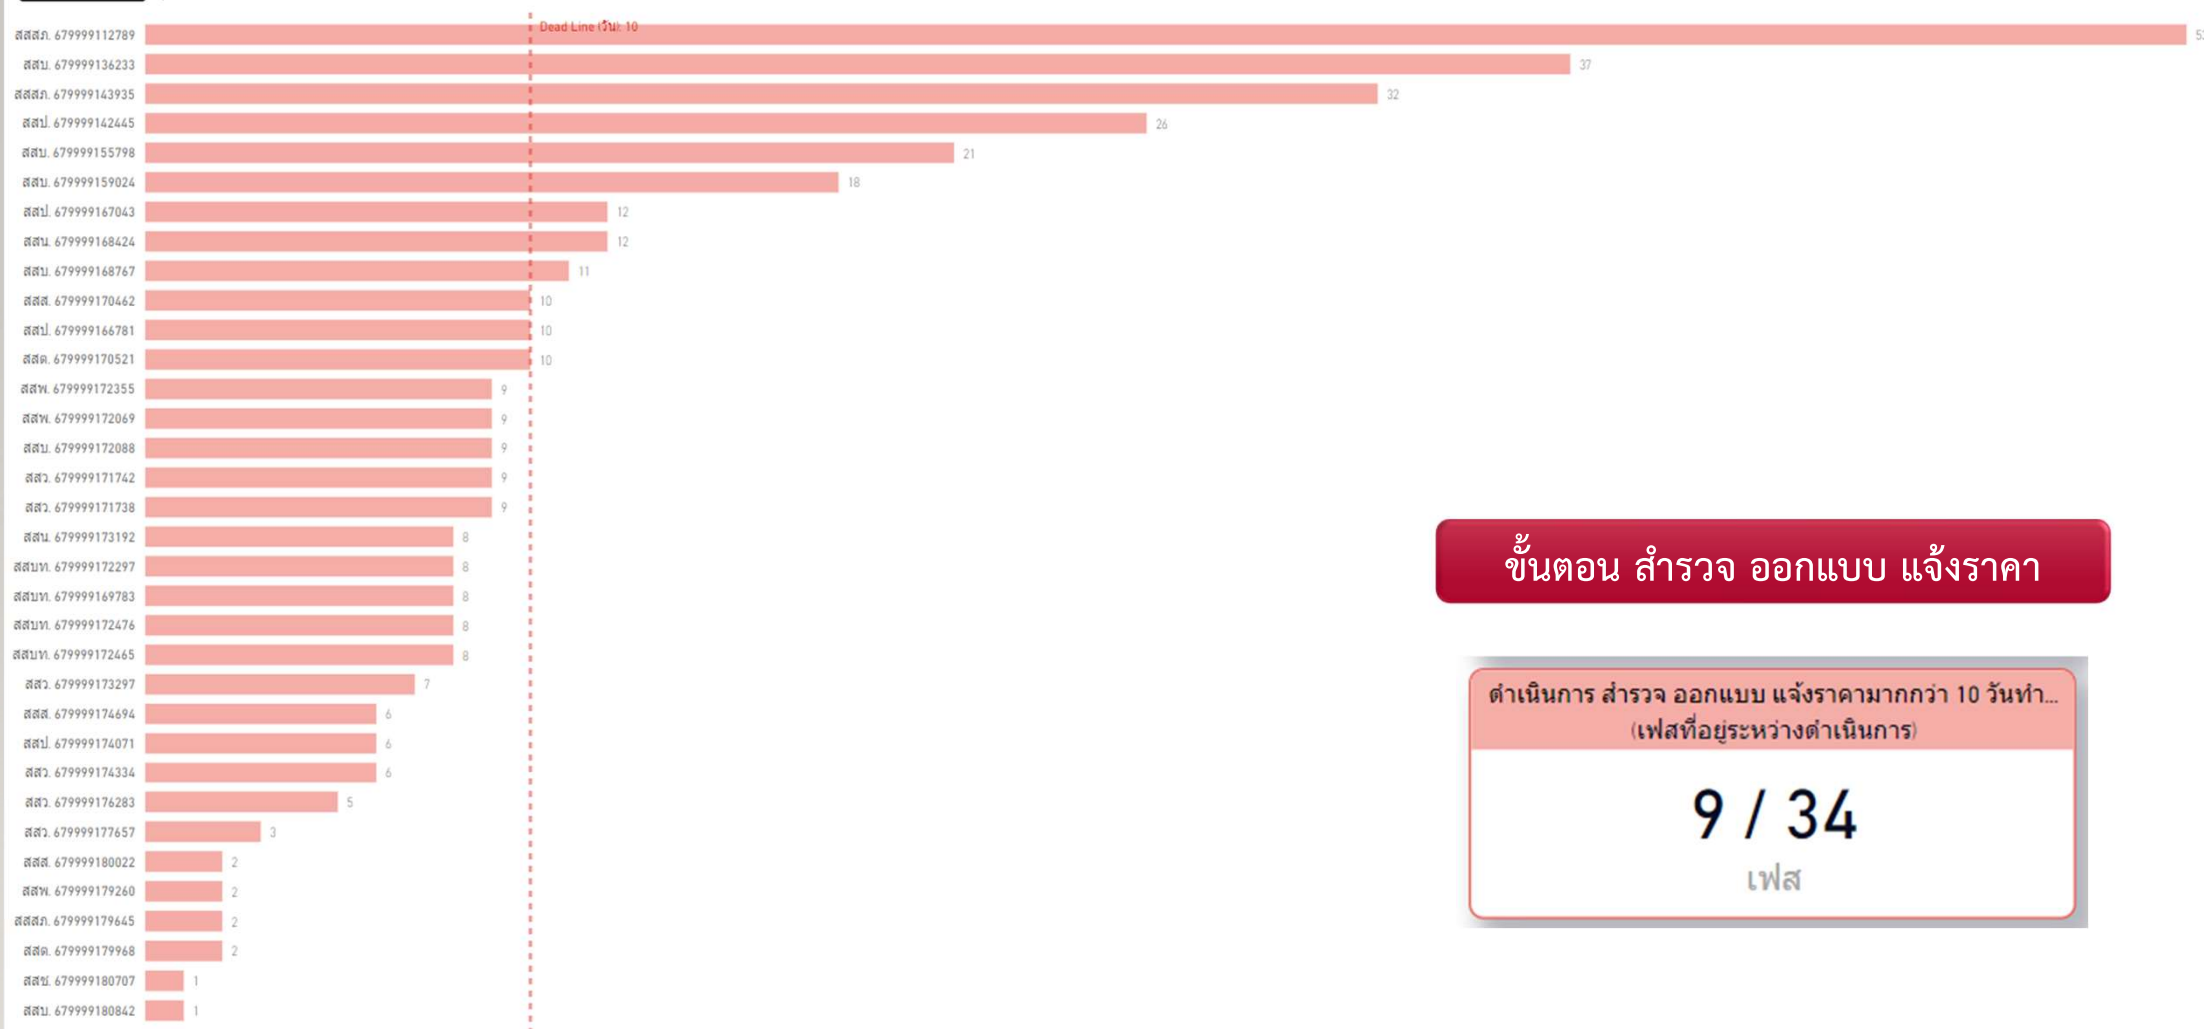

ขั้นตอน สํารวจ ออกแบบ แ้จรงราคา

ดำเนินการ สํารวจ ออกแบบ แ้จรงราคามากกว่า 10 วันทำ...  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

9 / 34


เฟส

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา <https://davis.mwa.co.th>



< Back to report

ระยะเวลาของขั้นตอนชำระเงิน (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

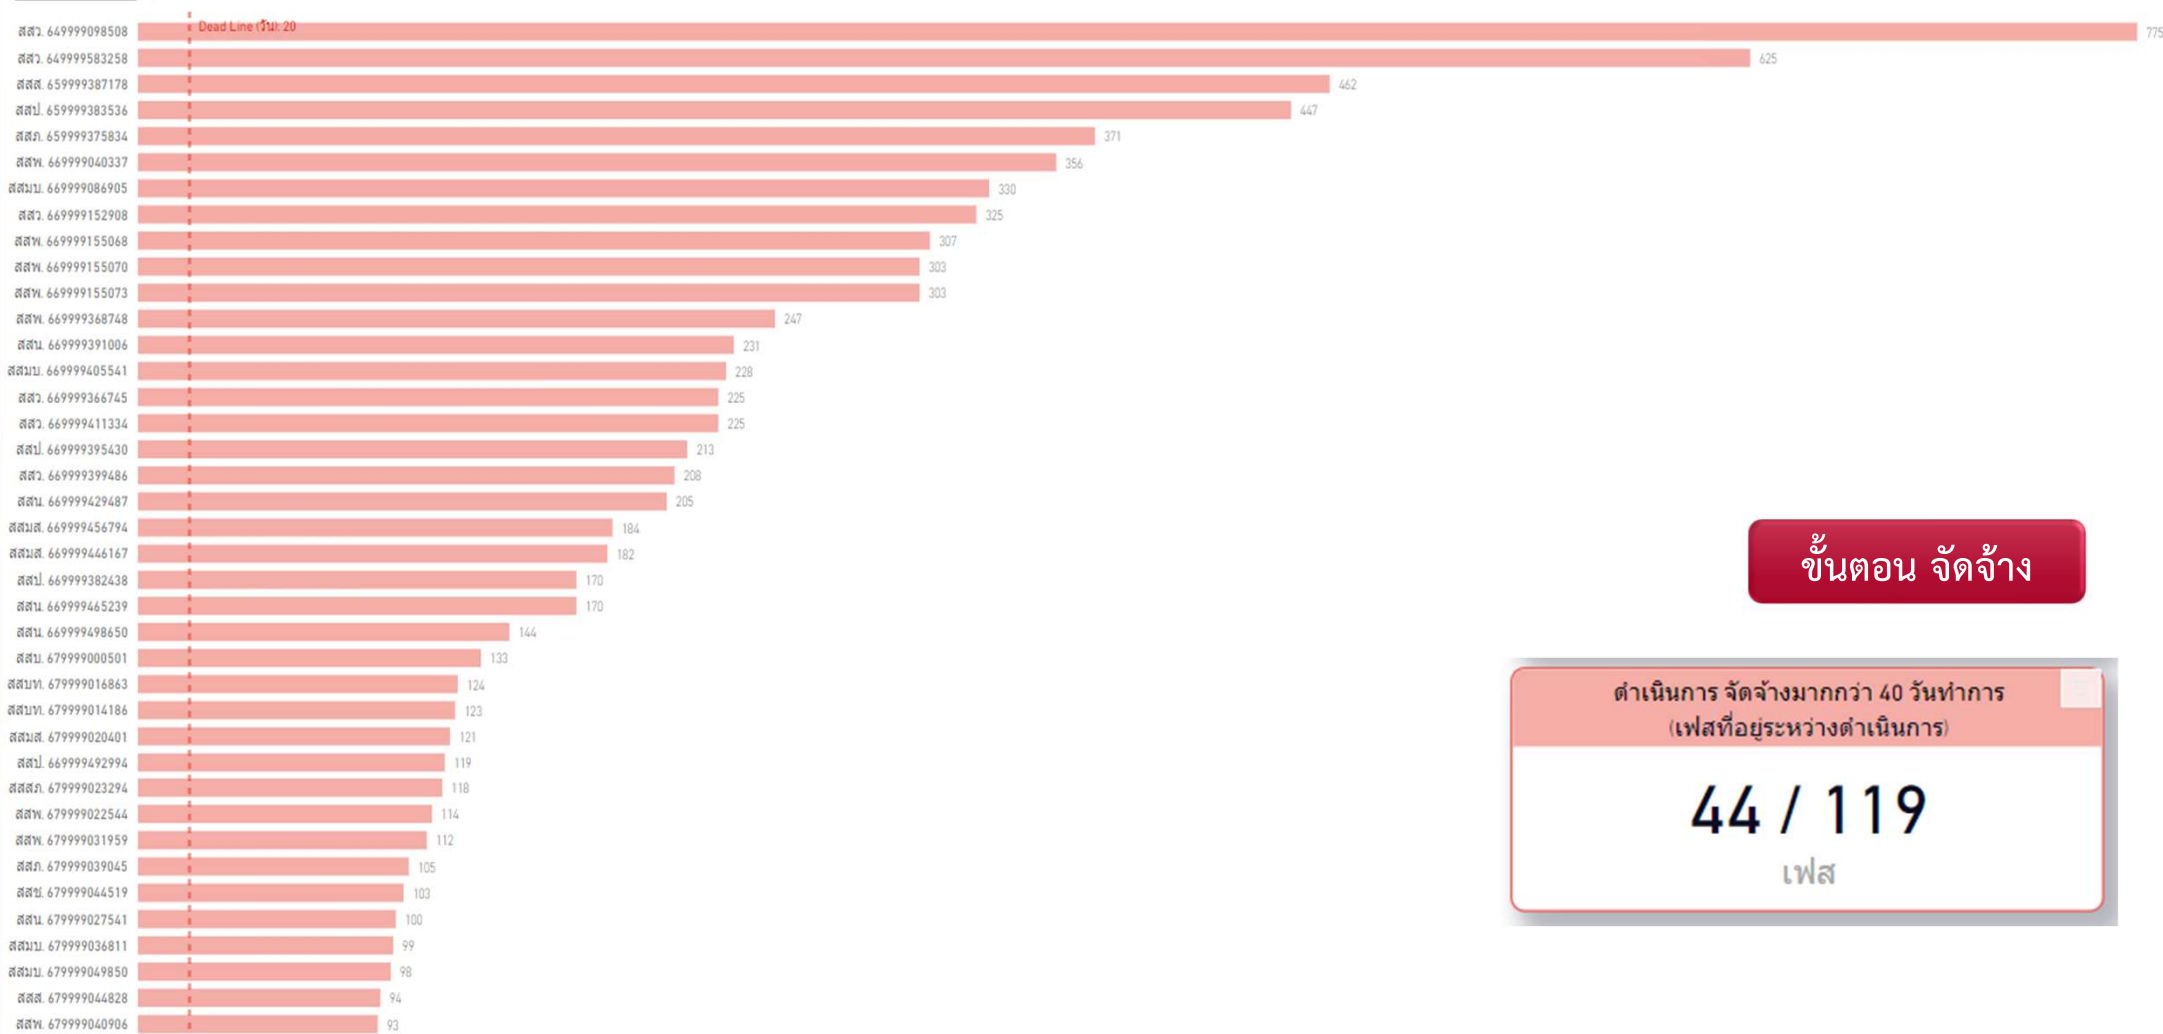

ขั้นตอน จัดจ้าง

ดำเนินการ จัดจ้างมากกว่า 40 วันทำการ  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

44 / 119


เฟส

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประจำ <https://davis.mwa.co.th>



< Back to report

ระยะเวลาของขั้นตอนก่อสร้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

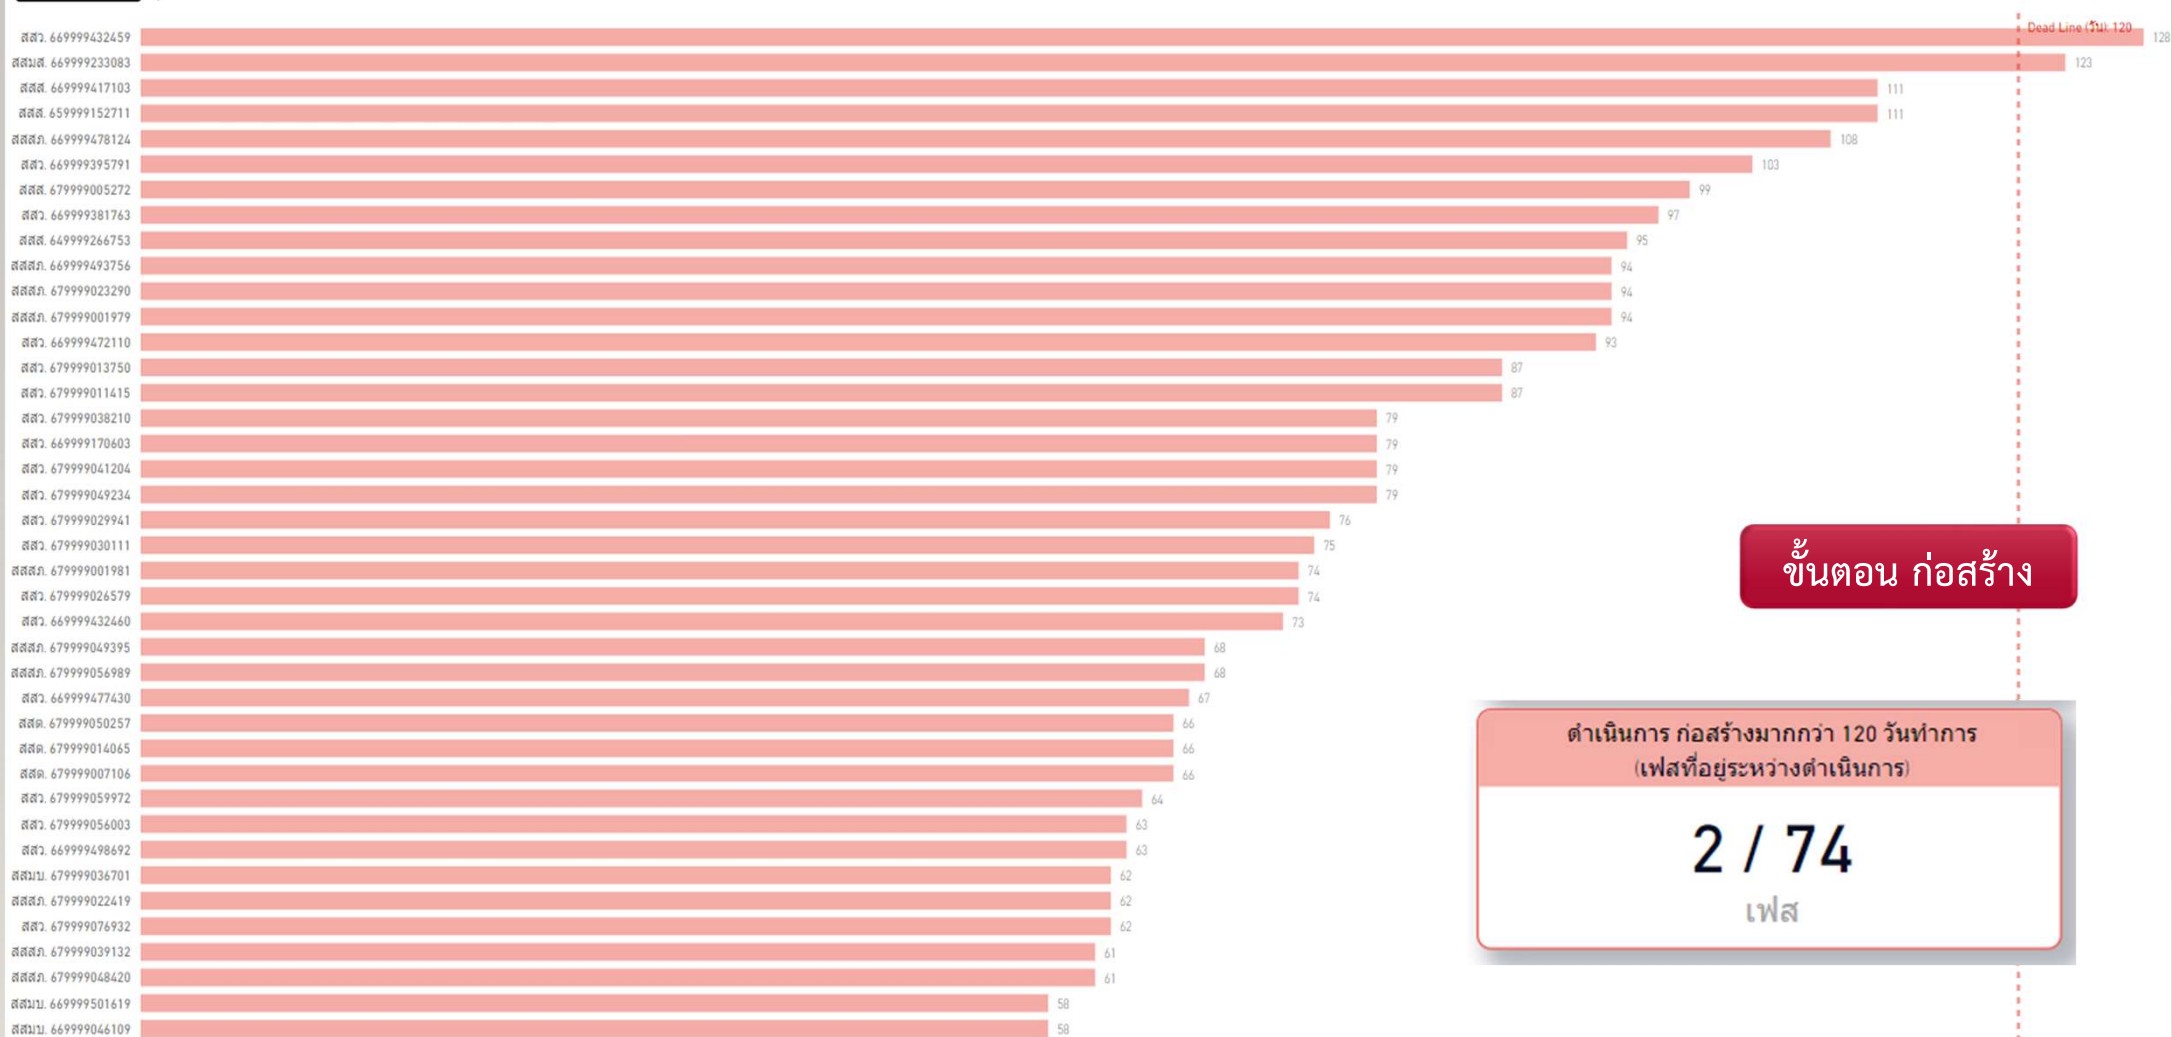


ขั้นตอน ก่อสร้าง

ดำเนินการ ก่อสร้างมากกว่า 120 วันทำการ  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

2 / 74  
เฟส



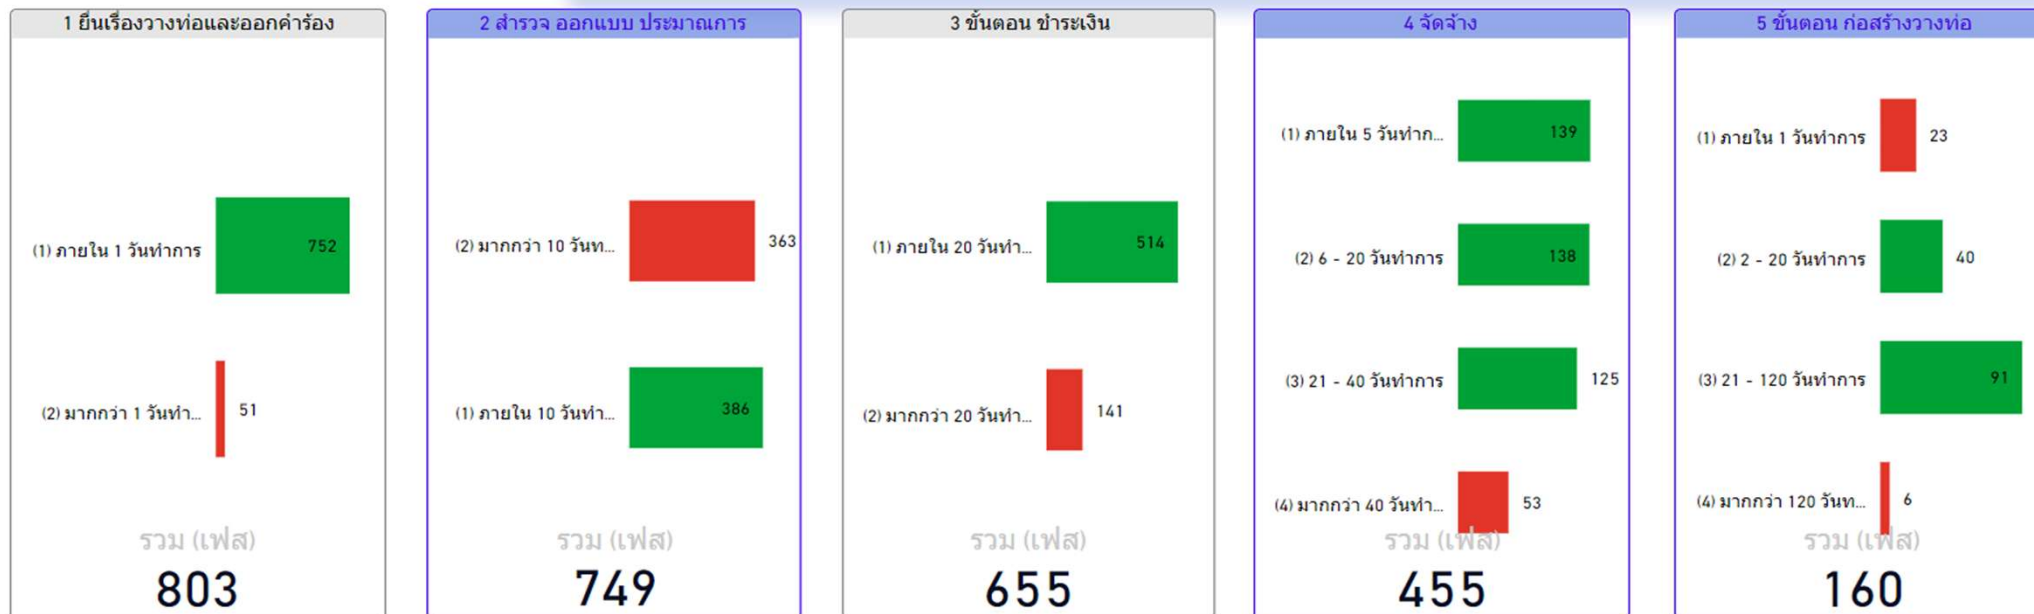

สาขา	ID_Phase	ชื่อเฟส	ขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	วันเริ่มขั้นตอน	วันสิ้นสุดขั้นตอน	% ความก้าวหน้าเฟส
สสท.	669999501489	Veritz Sathupradit 34 -เฟส 20 ติดต่อกุลวรรณเพร ตรงครวี่ 099-451-2646, 02-212-6001, kungbangmod28@gmail.com	ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง	0	25/12/2566	25/12/2566	10
สสท.	669999501489	Veritz Sathupradit 34 -เฟส 20 ติดต่อกุลวรรณเพร ตรงครวี่ 099-451-2646, 02-212-6001, kungbangmod28@gmail.com	ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	21	25/12/2566	25/01/2567	10
สสท.	669999501489	Veritz Sathupradit 34 -เฟส 20 ติดต่อกุลวรรณเพร ตรงครวี่ 099-451-2646, 02-212-6001, kungbangmod28@gmail.com	ชำระเงินค่าวางท่อ	9	25/01/2567	07/02/2567	10
สสท.	669999484126	เบลวิเดียร์-โครงการเบลวิเดียร์ เฟส 1.1 ติดต่อกุลภัทริญามาต สหไพบุญย์กิจ 061-416-7444 E-mail : orawan@uppa.co.th	ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง	4	03/12/2566	12/12/2566	100
สสท.	669999484126	เบลวิเดียร์-โครงการเบลวิเดียร์ เฟส 1.1 ติดต่อกุลภัทริญามาต สหไพบุญย์กิจ 061-416-7444 E-mail : orawan@uppa.co.th	ชำระเงินค่าวางท่อ	0	15/01/2567	15/01/2567	100
สสท.	669999484126	เบลวิเดียร์-โครงการเบลวิเดียร์ เฟส 1.1 ติดต่อกุลภัทริญามาต สหไพบุญย์กิจ 061-416-7444 E-mail : orawan@uppa.co.th	ดำเนินการจัดจ้าง	35	15/01/2567	05/03/2567	100





การผลิตและสูบน้ำ

วิศวกรรม

การบริการ


ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

การเงิน

บุคลากร

แผนและพัฒนา

## ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา



อุณหภูมิ  
35 °C



ปริมาณน้ำฝน  
30 มม.



ความชื้น  
60 %



ลม  
5 กม./ชม.

ไทม์ไลน์ :

การผลิตและสูบน้ำ

1.0  
0.8  
0.6  
0.4  
0.2  
0

รายการที่ชื่นชอบ

ชื่อ

แอดมิน

ไฟล์

แอดมินที่ออกมาใหม่







- การผลิตและสูบน้ำ
- วิศวกรรม
- การบริการ
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
- การเงิน
- บุคลากร
- แผนและพัฒนา

## ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา

00083364 User

แดชบอร์ดสำหรับการบริการ




★ ชื่อแดชบอร์ด	แดชบอร์ด	สารบัญข้อมูล	ดาวน์โหลด
★ รายงานติดตามงานติดตั้งประปาโครงการหมู่บ้านจัดสรร			
★ รายงาน VOC สอบถาม แจ้งเหตุ ร้องเรียน เสนอแนะ			
★ รายงานพยากรณ์ปริมาณน้ำ (Sell unit)			
★ รายงานติดตามบริหารจัดการข้อร้องเรียน			
★ รายงานสรุปการใช้งานกล้อง CIA			
★ รายงาน Service Level Agreement : SLA มาตรฐานการให้บริการ			
★ รายงานแรงดันน้ำ			
★ รายงานซ่อมท่อแตก ท่อรั่ว			
★ รายงานน้ำขายขายขอบ			
★ รายงานภาพรวมความพึงพอใจ			

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา <https://davis.mwa.co.th>



## งานเพิ่ม / ลด ของคำร้องที่ยื่นเข้ามาใน E-Service

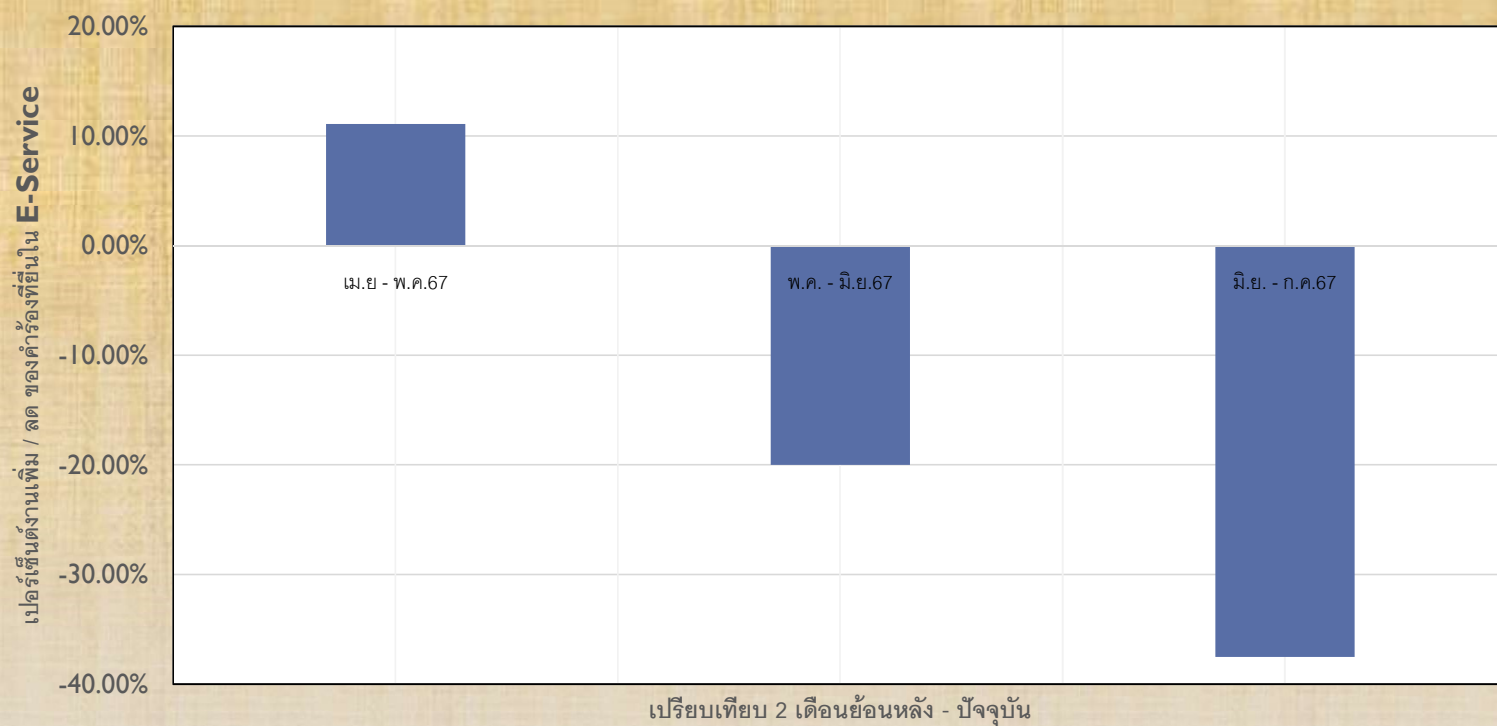

■ งานเพิ่ม / ลด ของคำร้องที่ยื่นเข้ามาใน E-Service

เปรียบเทียบระหว่างเดือน	งานเพิ่ม / ลด
เม.ย. — พ.ค. 2567	11.11%
พ.ค. — มิ.ย. 2567	-20.00%
มิ.ย. — ก.ค. 2567	-37.50%



---

# จบการนำเสนอ

