



การส่งมอบงานปรับปรุงท่อลดน้ำสูญเสีย
และ การบริหารจัดการใช้ท่อ PVC

ความยาวท่อส่งมอบงาน (กม.)

800
700
600
500
400
300
200
100
0

ข้อมูลจากคณะทำงานย่อยส่วนก่อสร้าง

- ผลงานสะสมถึง 21 มิ.ย. 62 \approx 354 กม. (ต่ำกว่าแผน)
- คาดการณ์ส่งมอบปลายปี \approx 709 กม. (ต่ำกว่าแผน)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

●- - แผนสะสม


◆- - ผลงานสะสม

20 43 65 88 112 161 220 303 415 517 636 741

20 52 78 95 124 207 231 303 354 470 597 709

741 กม.+38.55 กม. -70.62 กม. = **708.93** กม. (คาดการณ์สิ้นปีเกรด B+)

คาดการณ์เป้าหมาย
ปลายปี 62 ลดลง

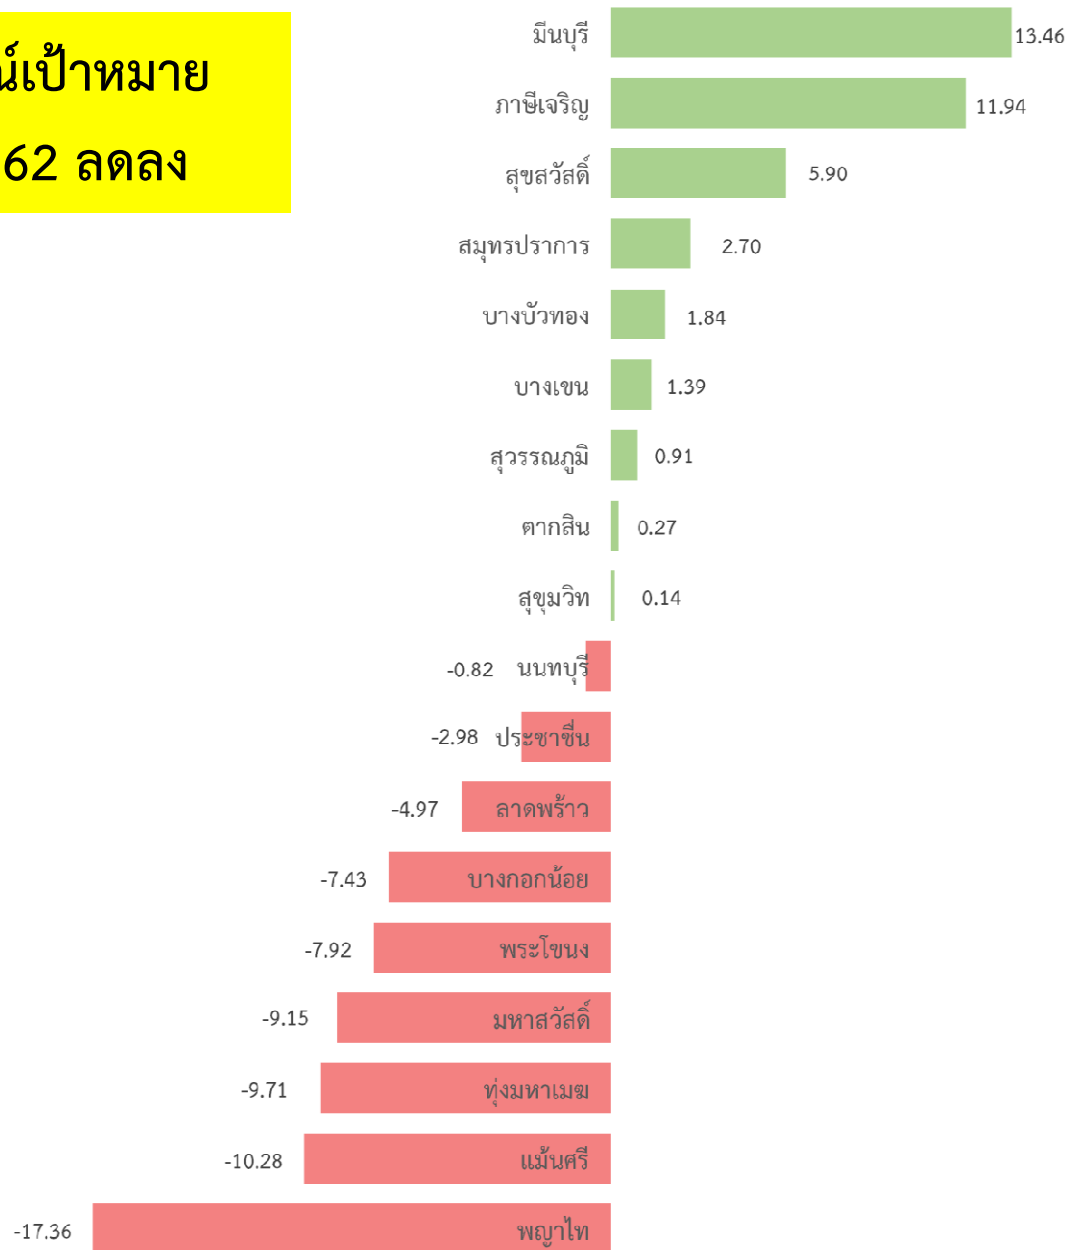


กลุ่มสาขาปรับปรุงเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น = **38.55** กม.

กลุ่มสาขาปรับปรุงเป้าหมาย
ลดลง = **70.62** กม.

ข้อมูลส่งมอบงาน ฯ ณ 21 มิ.ย. 62 จากคณะทำงานย่อย สกส. (ปัจจุบัน เกรด D+)

สาขา	รายเดือน				รายเดือนสะสม					
	ผลงาน ประจำงวดเดือน มิ.ย.-62	แผนงานประจำเดือน	ผลต่าง งวดเดือน + / (-)	เปรียบเทียบกับ แผนงานงวดเดือน	ผลงานสะสม ต.ค.61 - ข้อมูลสุด	แผนงานสะสม ต.ค.61 - เดือนล่าสุด (เป้าหมายปลายปี 741 กม.)	ผลต่าง สะสม + / (-)	เปรียบเทียบกับ แผนงานสะสม	ลำดับ ผลงาน สะสม	ลำดับ เปรียบเทียบกับ แผนสะสม
		มิ.ย.-62								
สสส.	5.246	4.300	0.946	ดีกว่าแผน	21.589	15.100	6.489	ดีกว่าแผน	10	3
สสพ.	5.000	9.000	-4.000	ต่ำกว่าแผน	30.076	30.000	0.076	ดีกว่าแผน	2	7
สสป.	4.000	8.000	-4.000	ต่ำกว่าแผน	25.861	34.606	-8.745	ต่ำกว่าแผน	7	13
ชวก.(ก1)	14.246	21.300	-7.054	ต่ำกว่าแผน	77.526	79.706	-2.180	ต่ำกว่าแผน		
สสญ.	0.000	6.000	-6.000	ต่ำกว่าแผน	16.645	40.000	-23.355	ต่ำกว่าแผน	12	18
สสท.	0.630	3.500	-2.870	ต่ำกว่าแผน	7.094	23.720	-16.626	ต่ำกว่าแผน	16	17
สสม.	0.260	1.700	-1.440	ต่ำกว่าแผน	10.382	19.436	-9.054	ต่ำกว่าแผน	14	14
สสล.	0.000	1.500	-1.500	ต่ำกว่าแผน	4.138	5.800	-1.662	ต่ำกว่าแผน	17	10
ชวก.(ก2)	0.890	12.700	-11.810	ต่ำกว่าแผน	38.259	88.956	-50.697	ต่ำกว่าแผน		
สสช.	0.000	6.000	-6.000	ต่ำกว่าแผน	3.991	18.000	-14.009	ต่ำกว่าแผน	18	15
สสข.	1.500	3.000	-1.500	ต่ำกว่าแผน	28.891	22.960	5.931	ดีกว่าแผน	4	4
สสมบ.	5.000	6.400	-1.400	ต่ำกว่าแผน	29.458	16.000	13.458	ดีกว่าแผน	3	1
สสสภ.	3.700	6.700	-3.000	ต่ำกว่าแผน	24.506	23.593	0.913	ดีกว่าแผน	8	6
ชวก.(ก3)	10.200	22.100	-11.900	ต่ำกว่าแผน	86.846	80.553	6.293	ดีกว่าแผน		
รวก.(กอ)	25.336	56.100	-30.764	ต่ำกว่าแผน	202.631	249.215	-46.584	ต่ำกว่าแผน		
สสบ.	1.492	9.088	-7.596	ต่ำกว่าแผน	28.659	43.112	-14.453	ต่ำกว่าแผน	5	16
สสด.	4.687	16.114	-11.427	ต่ำกว่าแผน	17.083	18.345	-1.262	ต่ำกว่าแผน	11	8
สสภ.	1.888	3.800	-1.912	ต่ำกว่าแผน	31.127	27.950	3.177	ดีกว่าแผน	1	5
สสว.	4.616	8.277	-3.661	ต่ำกว่าแผน	27.766	29.857	-2.092	ต่ำกว่าแผน	6	11
ชวก.(ก4)	12.683	37.279	-24.596	ต่ำกว่าแผน	104.635	119.264	-14.630	ต่ำกว่าแผน		
สสน.	3.300	4.600	-1.300	ต่ำกว่าแผน	9.631	11.085	-1.454	ต่ำกว่าแผน	15	9
สสบท.	0.000	10.103	-10.103	ต่ำกว่าแผน	23.238	13.925	9.313	ดีกว่าแผน	9	2
สสมส.	9.300	4.484	4.816	ดีกว่าแผน	13.576	21.665	-8.089	ต่ำกว่าแผน	13	12
ชวก.(ก5)	12.600	19.187	-6.587	ต่ำกว่าแผน	46.445	46.675	-0.230	ต่ำกว่าแผน		
รวก.(กต)	25.283	56.466	-31.183	ต่ำกว่าแผน	151.080	165.939	-14.860	ต่ำกว่าแผน		
กปน.	50.619	112.566	-61.947	ต่ำกว่าแผน	353.711	415.154	-61.443	ต่ำกว่าแผน		

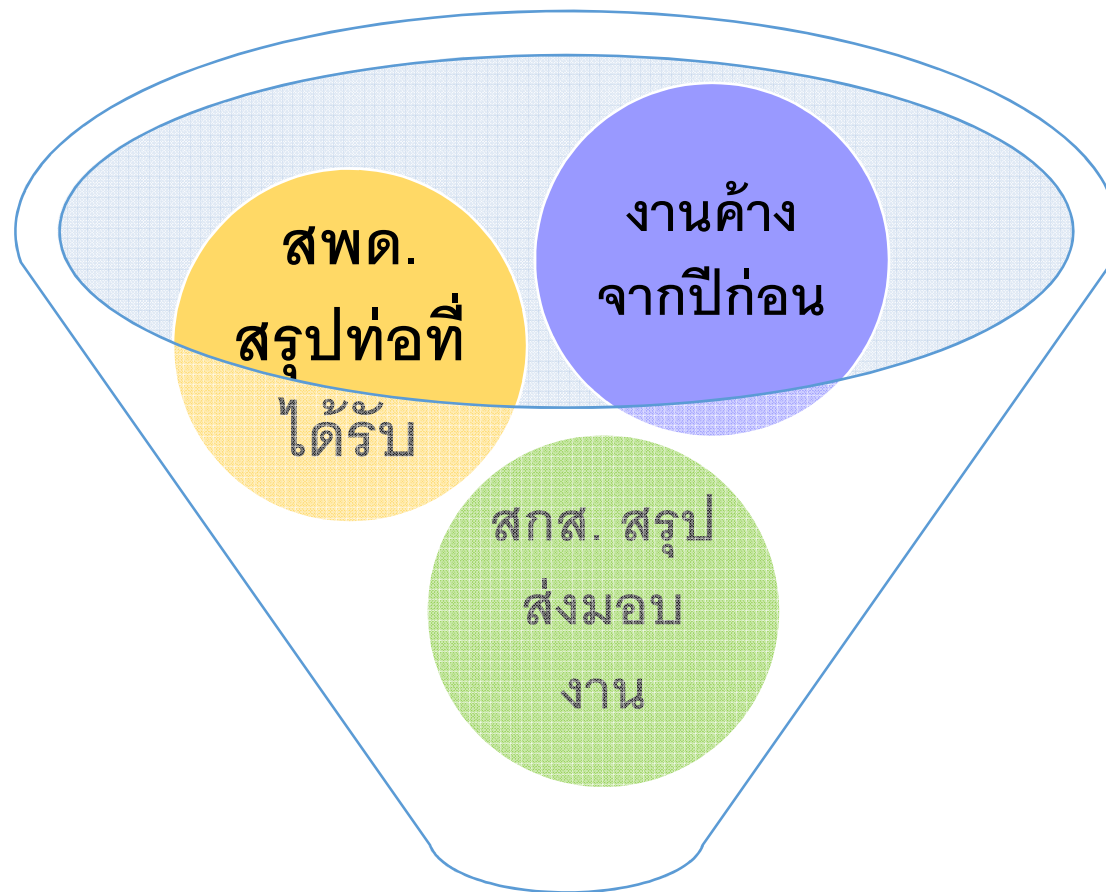

**ท่อ PVC คงเหลือระหว่าง
บริหารสัญญา**

	A	B	C=A+B	D	E=C-D	C rank	D rank	E rank
สาขา	งานค้างปีก่อน จะส่งงานปี 62 (กม.)	ท่อ PVC ส่งให้ ผรจ. 1 ต.ค.61-31 พ.ค.62 (กม.)	รวมท่อ PVC ส่งให้ ผรจ. ไปแล้ว (กม.)	ผลส่งมอบงานสะสม 1 ต.ค.61- 21 มิ.ย.62 (กม.)	ท่อ PVC คงเหลือ ระหว่างบริหารสัญญา (กม.)	Ranking		
						ท่อที่ได้รับ	ส่งมอบงาน	ท่อคงค้าง
สสภ.	10.530	46.242	56.772	31.127	25.645	1	1	1
สสส.	7.400	34.504	41.904	21.589	20.315	4	10	2
สสพ.	8.000	39.357	47.357	30.076	17.281	2	2	3
สสต.	7.653	26.175	33.828	17.083	16.745	9	11	4
สสมบ.	4.850	40.212	45.062	29.458	15.604	3	3	5
สสน.	2.327	22.374	24.701	9.631	15.070	12	15	6
สสช.	0.000	17.640	17.640	3.991	13.649	16	18	7
สสข.	3.510	38.363	41.873	28.891	12.982	5	4	8
สสบท.	3.822	31.572	35.394	23.238	12.156	7	9	9
สสบ.	12.865	27.854	40.719	28.659	12.060	6	5	10
สสมส.	0.678	23.562	24.240	13.576	10.664	13	13	11
สสป.	13.780	21.190	34.970	25.861	9.109	8	7	12
สสม.	12.945	5.803	18.748	10.382	8.366	15	14	13
สสสภ	3.893	27.534	31.427	24.506	6.921	10	8	14
สสญ.	8.000	14.544	22.544	16.645	5.899	14	12	15
สสท.	8.520	3.192	11.712	7.094	4.618	17	16	16
สสล.	2.912	5.160	8.072	4.138	3.934	18	17	17
สสว.	4.554	24.072	28.626	27.766	0.860	11	6	18
รวม	116.239	449.350	565.589	353.711	211.878	= 565 กม.		

ขั้นตอนและระยะเวลา

การส่งจ่ายท่อและส่งมอบท่อให้ผู้รับจ้าง

กลุ่มสพด. สาขา

รวมระยะเวลา 11 วันทำการ

กจพ.ฝจพ. ข้อความร่วมมือ

ตรวจสอบเอกสาร POS ให้ถูกต้องก่อนส่ง

