




การประปานครหลวง

METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

ผลการดำเนินงานด้านลดน้ำสูญเสีย
ประจำเดือน มีนาคม 2565

คาดการณ์ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสม มีนาคม 2565 (กปน.)

(%)

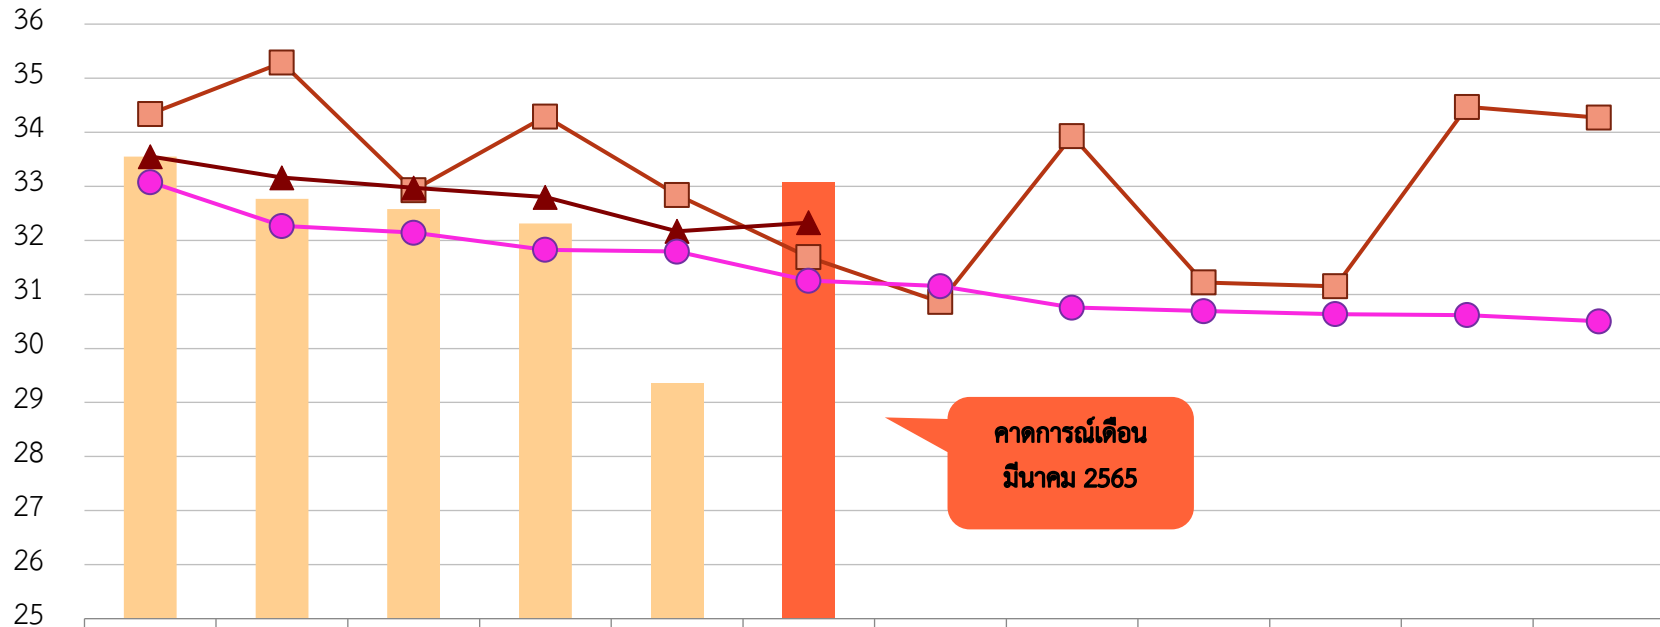

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายเดือน ปี 2565	33.55	32.77	32.58	32.31	29.36	33.08						
รายเดือน ปี 2564	34.34	35.29	32.93	34.29	32.84	31.69	30.86	33.93	31.22	31.15	34.47	34.27
สะสม ปี 2565	33.55	33.16	32.97	32.8	32.17	32.33						
เป้าสะสม ปี 2565	33.08	32.27	32.14	31.82	31.79	31.25	31.15	30.76	30.69	30.63	30.62	30.50

ตัวชี้วัด	E	D	C	B	A
อัตราน้ำสูญเสีย(ร้อยละ)	34.09	33.59	33.09	31.79	30.50

คาคการณ้ผลงานอ้ทราน้าสูญเสียเดือนมีนาคม 2565

สาขา	ปริมาณน้ำเข้า (ลบ.ม./วัน)		ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม./วัน)		เป้าหมายน้ำ จำหน่าย มี.ค. (ลบ.ม./วัน)	% น้ำจำหน่าย เทียบเป้าหมาย มี.ค. (%)	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)		เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)	
	ก.พ.	มี.ค. (1)	ก.พ.	มี.ค. (1)			ก.พ.	มี.ค. (1)	ก.พ.	มี.ค. (1)
สสท.	217,686.00	223,355.80	141,079.99	141,774.42	153,741.94	- 7.78	76,606.01	81,581.38	35.19	36.53
สสส.	358,036.00	369,706.45	257,056.88	259,623.35	274,064.52	- 5.27	100,979.12	110,083.10	28.20	29.78
สสพ.	384,322.00	393,153.20	292,512.29	291,040.74	295,967.74	- 1.66	91,809.71	102,112.46	23.89	25.97
สสป.	529,685.00	548,057.60	417,018.05	385,250.13	405,032.26	- 4.88	112,666.95	162,807.47	21.27	29.71
สสญ.	339,936.00	344,663.00	229,436.81	236,777.41	243,387.10	- 2.72	110,499.19	107,885.59	32.51	31.30
สสม.	307,710.00	311,689.20	196,388.94	193,697.97	197,580.65	- 1.97	111,321.06	117,991.23	36.18	37.86
สสล.	301,098.00	308,883.30	218,759.71	216,831.74	236,580.65	- 8.35	82,338.29	92,051.56	27.35	29.80
สสช.	229,968.00	232,043.45	171,499.06	173,030.65	183,354.84	- 5.63	58,468.94	59,012.80	25.42	25.43
สสข.	190,343.00	196,000.00	159,426.62	147,885.71	160,096.77	- 7.63	30,916.38	48,114.29	16.24	24.55
สสมบ.	247,718.00	254,670.90	214,883.01	209,774.19	217,451.61	- 3.53	32,834.99	44,896.71	13.25	17.63
สสสภ.	310,452.00	319,997.00	273,596.77	268,875.65	273,677.42	- 1.75	36,855.23	51,121.35	11.87	15.98
สสบ.	356,154.00	362,722.25	209,790.32	180,082.00	202,645.16	- 11.13	146,363.68	182,640.25	41.10	50.35
สสต.	381,171.00	382,685.90	231,190.94	222,516.13	229,387.10	- 3.00	149,980.06	160,169.77	39.35	41.85
สสภ.	343,580.00	348,859.55	220,630.37	207,961.61	211,129.03	- 1.50	122,949.63	140,897.94	35.78	40.39
สสว.	375,782.00	383,977.20	206,480.80	205,404.26	210,322.58	- 2.34	169,301.20	178,572.94	45.05	46.51
สสน.	249,237.00	258,384.40	184,406.23	178,774.19	200,645.16	- 10.90	64,830.77	79,610.21	26.01	30.81
สสบท.	226,482.00	232,868.45	160,445.73	149,676.13	143,709.68	4.15	66,036.27	83,192.32	29.16	35.73
สสมส.	262,644.00	274,252.40	179,858.06	176,081.55	190,774.19	- 7.70	82,785.94	98,170.85	31.52	35.80
กปน.	5,612,004.00	5,745,970.05	3,964,460.58	3,845,057.83	4,029,548.39	- 4.58	1,647,543.42	1,900,912.22	29.36	33.08

คาคการณ์ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสมเดือนมีนาคม 2565 (เทียบเป้าหมายรายเดือน)

สาขา	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)			เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)			ผลงานสะสม (%)	เป้าหมายเดือน มี.ค. 65	
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค. (1)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค. (1)		เป้าหมายสะสม (%)	เปรียบเทียบ
สสท.	78,898.80	76,606.01	81,581.38	36.07	35.19	36.53	37.20	30.02	✗
สสส.	103,416.83	100,979.12	110,083.10	28.38	28.20	29.78	29.72	27.78	✗
สสพ.	103,302.06	91,809.71	102,112.46	26.75	23.89	25.97	27.03	28.58	✓
สสป.	159,321.01	112,666.95	162,807.47	29.85	21.27	29.71	27.71	34.67	✓
ขวก.(ก1)	444,938.71	382,061.80	456,584.41	29.60	25.65	29.76	29.41	29.59	✓
สสญ.	109,150.77	110,499.19	107,885.59	32.81	32.51	31.30	34.02	35.77	✓
สสม.	115,117.62	111,321.06	117,991.23	37.06	36.18	37.86	37.16	37.29	✓
สสล.	85,686.25	82,338.29	92,051.56	28.48	27.35	29.80	28.11	23.17	✗
ขวก.(ก2)	309,954.65	304,158.54	317,928.38	32.83	32.06	32.94	33.17	32.38	✗
สสช.	58,483.28	58,468.94	59,012.80	25.53	25.42	25.43	26.02	30.36	✓
สสข.	46,413.11	30,916.38	48,114.29	23.42	16.24	24.55	23.63	23.6	✗
สสมบ.	39,662.14	32,834.99	44,896.71	15.84	13.25	17.63	16.59	12.36	✗
สสสภ.	59,693.19	36,855.23	51,121.35	18.58	11.87	15.98	16.24	16.76	✓
ขวก.(ก3)	204,251.72	159,075.54	203,145.16	20.45	16.26	20.26	20.06	20.45	✓

คาคการณ์ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสมเดือนมีนาคม 2565 (เทียบเป้าหมายรายเดือน)

สาขา	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)			เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)			ผลงานสะสม (%)	เป้าหมายเดือน มี.ค. 65	
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค. (1)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค. (1)		เป้าหมายสะสม (%)	เปรียบเทียบ
สสบ.	156,599.04	146,363.68	182,640.25	43.13	41.10	50.35	44.91	44.83	✗
สสด.	172,506.89	149,980.06	160,169.77	44.17	39.35	41.85	42.94	35.5	✗
สสภ.	134,576.17	122,949.63	140,897.94	38.77	35.78	40.39	39.66	38.29	✗
สสว.	178,692.76	169,301.20	178,572.94	47.45	45.05	46.51	45.53	42.86	✗
ขวก.(ก4)	642,374.86	588,594.57	662,280.90	43.48	40.41	44.80	43.31	40.42	✗
สสน.	68,497.59	64,830.77	79,610.21	27.18	26.01	30.81	29.17	29.81	✓
สสบท.	78,975.28	66,036.27	83,192.32	33.89	29.16	35.73	32.16	27.31	✗
สสมส.	83,013.64	82,785.94	98,170.85	31.62	31.52	35.80	34.80	34.74	✗
ขวก.(ก5)	230,486.50	213,652.98	260,973.38	30.83	28.94	34.09	32.09	30.98	✗
กปน.	1,832,006.43	1,647,543.42	1,900,912.22	32.31	29.36	33.08	32.33	31.25	✗

รายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรมลดน้ำสูญเสียเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สาขา	งานสำรวจท่อรั่ว						งานซ่อมท่อ (จุด)									
	Step Test (ครั้ง)		ระยะทางสำรวจท่อรั่ว (กม.)		จำนวนจุดรั่วที่พบ		Reported Burst				Unreported Burst				รวม	
							ท่อจ่าย		ท่อบริการ ⁽¹⁾		ท่อจ่าย		ท่อบริการ ⁽¹⁾			
	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾		
สสท.	3	4	427	377	190	150	11	4	211	278	15	10	149	114	386	406
สสส.	3	-	288	346	272	296	23	32	602	405	6	9	288	231	919	677
สสพ.	2	6	735	519	788	380	24	46	707	487	14	8	688	301	1,433	842
สสป.	12	12	327	271	405	879	58	63	813	600	25	14	280	638	1,176	1,315
ภาค 1	20	22	1,777	1,513	1,655	1,705	116	145	2,333	1,770	60	41	1,405	1,284	3,914	3,240
สสญ.	12	12	424	421	564	398	28	16	404	270	14	14	511	337	957	637
สสม.	17	12	478	468	305	668	20	24	396	272	5	3	280	650	701	949
สสล.	11	11	430	555	476	792	34	40	641	428	8	11	435	730	1,118	1,209
ภาค 2	40	35	1,333	1,444	1,345	1,858	82	80	1,441	970	27	28	1,226	1,717	2,776	2,795
สสข.	6	6	595	1,064	160	382	31	18	522	387	5	10	422	321	980	736
สสข.	8	4	420	298	203	183	21	19	455	850	12	10	173	143	661	1,022
สสมบ.	6	2	142	378	115	240	56	45	423	334	6	14	90	224	575	617
สสสภ.	4	6	525	595	435	500	60	36	326	308	12	11	350	425	748	780
ภาค 3	24	18	1,680	2,335	913	1,305	168	118	1,726	1,879	35	45	1,035	1,113	2,964	3,155
รวม.(กอ)	84	75	4,790	5,292	3,913	4,868	366	343	5,500	4,619	122	114	3,666	4,114	9,654	9,190
สสบ.	6	9	562	756	692	984	50	25	781	937	25	12	520	924	1,376	1,898
สสด.	-	5	811	718	982	1,078	47	53	1,017	1,125	8	9	865	881	1,937	2,068
สสภ.	9	21	441	1,500	683	1,112	26	30	840	1,024	7	20	656	995	1,529	2,069
สสว.	8	4	537	1,067	593	1,495	25	37	591	583	9	12	508	1,391	1,133	2,023
ภาค 4	23	39	2,350	4,040	2,950	4,669	148	145	3,229	3,669	49	53	2,549	4,191	5,975	8,058
สสน.	1	-	273	267	324	362	10	11	404	420	14	15	203	308	631	754
สสบพ.	3	4	273	296	343	492	40	33	713	766	6	20	320	421	1,079	1,240
สสมส.	4	-	631	644	622	885	27	31	661	744	20	18	492	703	1,200	1,496
ภาค 5	8	4	1,178	1,206	1,289	1,739	77	75	1,778	1,930	40	53	1,015	1,432	2,910	3,490
รวม.(กต)	31	43	3,528	5,247	4,239	6,408	225	220	5,007	5,599	89	106	3,564	5,623	8,885	11,548
กปน.	115	118	8,318	10,539	8,152	11,276	591	563	10,507	10,218	211	220	7,230	9,737	18,539	20,738

หมายเหตุ :

ข้อมูลผลงานจากระบบ WLMA ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 – 28 มีนาคม 2565 บันทึกโดยสำนักงานประปาสาขา

(1) จำนวนงานซ่อมท่อบริการ = ผลรวมของงานซ่อมท่อบริการ + อุปกรณ์ท่อจ่าย + อุปกรณ์ท่อบริการ + อุปกรณ์ท่ออื่นๆ

(2) คือ จำนวนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบในช่วงเดือนเดียวกัน ระหว่างปีงบประมาณ 2565 และ ปีงบประมาณ 2564

ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย เดือน มีนาคม 2565

ระดับข้อมูล	จำนวนงาน Step Test	จำนวนงาน สร.	ระยะทางที่เดิน	จำนวนจุดรั่วที่พบ	จำนวนงานซ่อมที่เปิด-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อจ่าย-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อบริการ-สปน.	งานซ่อมท่อจ่าย-สปน.	งานซ่อมท่อบริการ-สปน.	ไม่พบจุดรั่ว-สปน.	อื่นๆ-สปน.	ยกเลิกงาน-สปน.
กปน.	50	1,729	8,734	8,932	8,992	165	7,036	145	5,839	89	438	61
รวก.(กอ)	29	724	3,820	3,072	3,171	81	2,562	74	2,213	27	213	29
รวก.(กต)	21	1,005	4,914	5,860	5,821	84	4,474	71	3,626	62	225	32

ระดับข้อมูล	จำนวนงานซ่อมที่เปิด - รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนามท่อจ่าย - รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนามท่อบริการ - รับแจ้ง
กปน.	10,186	437	8,477
รวก.(กอ)	4,681	258	3,900
รวก.(กต)	5,505	179	4,577

SCAN หากต้องการดู
รายละเอียดงาน



หมายเหตุ: กรณีทุกตัว DM คาดว่าใช้งานได้หมด จะใช้น้ำเข้า DMA จริงจากอุปกรณ์เครื่องวัดภาคสนาม
กรณีคาดว่ามิบาง DM ใช้งานไม่ได้ จะใช้น้ำเข้า DMA จากข้อมูลคาดการณ์จากสาขาเดือนก่อนหน้า

***ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน กลส.ฝจส. ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565

แผน-ผลงานจัดทำแบบและจ้าง (สาขาและ Agenda base) ปีงบประมาณ 2565

สาขา	แผน (1200 กม.)	เบิกจ้างแล้ว				ลงนามแล้ว			
		ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน	ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน
สสส.	63	0.000	72.253	72.253	114.69%	0.000	48.236	48.236	76.57%
สสพ.	69	0.000	71.679	71.679	103.88%	0.000	47.897	47.897	69.42%
สสป.	90	0.000	90.386	90.386	100.43%	0.000	32.554	32.554	36.17%
สสท.	26	0.000	25.878	25.878	99.53%	0.000	11.081	11.081	42.62%
ขวก.(ก1)	248	0.000	260.196	260.196	104.92%	0.000	139.768	139.768	56.36%
สสญ.	48	0.000	51.045	51.045	106.34%	0.000	6.042	6.042	12.59%
สสม.	16	0.000	16.582	16.582	103.64%	0.000	5.515	5.515	34.47%
สสค.	45	0.000	46.993	46.993	104.43%	0.000	17.038	17.038	37.86%
ขวก.(ก2)	109	0.000	114.620	114.620	105.16%	0.000	28.595	28.595	26.23%
สสช.	55	0.000	55.494	55.494	100.90%	0.000	38.309	38.309	69.65%
สสช.	53	0.000	53.101	53.101	100.19%	0.000	39.513	39.513	74.55%
สสมบ.	40	0.000	42.833	42.833	107.08%	0.000	42.833	42.833	107.08%
สสสภ.	55	0.000	60.375	60.375	109.77%	0.000	45.223	45.223	82.22%
ขวก.(ก3)	203	0.000	211.803	211.803	104.34%	0.000	165.878	165.878	81.71%
รวก.(กอ)	560	0.000	586.619	586.619	104.75%	0.000	334.241	334.241	59.69%
สสบ.	101	0.000	102.925	102.925	101.91%	0.000	47.721	47.721	47.25%
สสค.	75	0.000	76.766	76.766	102.35%	0.000	76.766	76.766	102.35%
สสภ.	85	0.000	86.755	86.755	102.06%	0.000	66.576	66.576	78.32%
สสว.	82	0.000	82.379	82.379	100.46%	0.000	51.032	51.032	62.23%
ขวก.(ก4)	343	0.000	348.825	348.825	101.70%	0.000	242.095	242.095	70.58%
สสน.	58	0.000	69.863	69.863	120.45%	0.000	22.738	22.738	39.20%
สสบท.	41	0.000	41.535	41.535	101.30%	0.000	28.853	28.853	70.37%
สสมส.	58	0.000	60.110	60.110	103.64%	0.000	23.806	23.806	41.04%
ขวก.(ก5)	157	0.000	171.508	171.508	109.24%	0.000	75.397	75.397	48.02%
รวก.(กต)	500	0.000	520.333	520.333	104.07%	0.000	317.492	317.492	63.50%
Agenda base	140	0.000	41.394	41.394	29.57%	0.000	6.758	6.758	4.83%
กปน.	1,200	0.000	1148.346	1148.346	95.70%	0.000	658.491	658.491	54.87%

หมายเหตุ : ข้อมูลเบิกจ้าง-ลงนาม จาก Google sheet ณ 24 มี.ค.65 (9.30 น.)

ผลงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2565

สาขา	เป้าหมาย ผลส่งมอบงาน	คาดการณ์ ผลส่งมอบงาน	ผลการลงนาม ปีงบฯ 65	ผลงานปรับปรุงท่อ						
				คาดการณ์ ถึงสิ้น มี.ค.65	รายเดือน มี.ค.65			สะสม ต.ค.64-มี.ค.65		
					แผนงาน	ผลงาน	ผลต่าง +/-	แผนงาน	ผลงาน	ผลต่าง +/-
สสส.	63	63.000	48.236	0.000	5.000	2.466	(2.534)	23.000	23.483	0.483
สสพ.	69	69.000	47.897	5.969	6.000	5.969	(0.031)	30.000	35.795	5.795
สสป.	90	90.000	32.554	5.429	4.500	2.392	(2.108)	31.500	34.517	3.017
สสท.	26	26.000	11.081	0.680	0.500	0.410	(0.090)	5.984	4.880	(1.104)
รวม.(ก1)	248	248.000	139.768	12.078	16.000	11.237	(4.763)	90.484	98.675	8.191
สสญ.	48	48.000	6.042	6.000	6.000	6.010	0.010	20.700	21.620	0.920
สสม.	16	16.000	5.515	1.204	1.200	1.204	0.004	4.700	8.655	3.955
สสล.	45	45.000	17.038	0.000	1.300	0.000	(1.300)	13.200	16.779	3.579
รวม.(ก2)	109	109.000	28.595	7.204	8.500	7.214	(1.286)	38.600	47.054	8.454
สสช.	55	55.000	38.309	6.077	6.000	6.077	0.077	22.000	23.412	1.412
สสข.	53	53.000	39.513	0.000	6.000	0.000	(6.000)	20.000	17.338	(2.662)
สสมบ.	40	40.000	42.833	5.229	3.968	5.229	1.261	27.256	32.297	5.041
สสสภ.	55	55.000	45.223	7.146	2.000	7.146	5.146	9.200	27.162	17.962
รวม.(ก3)	203	203.000	165.878	18.452	17.968	18.452	0.484	78.456	100.209	21.753
รวม.(ก๔)	560	560.000	334.241	37.734	42.468	36.903	(5.565)	207.540	245.938	38.398
สสบ.	91	91.000	47.721	7.495	5.334	7.495	2.161	14.172	18.209	4.037
สสด.	70	70.000	76.766	0.000	4.000	2.465	(1.535)	28.000	28.022	0.022
สสภ.	80	80.000	66.576	2.500	6.000	0.000	(6.000)	16.000	14.616	(1.384)
สสว.	81	81.000	51.032	4.000	4.000	3.008	(0.992)	13.000	11.511	(1.489)
รวม.(ก4)	322	322.000	242.095	13.995	19.334	12.968	(6.366)	71.172	72.358	1.186
สสน.	63	63.000	22.738	5.000	5.000	5.033	0.033	11.500	22.835	11.335
สสบท.	52	52.000	28.853	7.080	5.000	7.080	2.080	22.000	40.546	18.546
สสมส.	63	63.000	23.806	4.500	4.500	3.427	(1.073)	12.000	13.228	1.228
รวม.(ก5)	178	178.000	75.397	16.580	14.500	15.540	1.040	45.500	76.609	31.109
รวม.(ก๕)	500	500.000	317.492	30.575	33.834	28.508	(5.326)	116.672	148.967	32.295
Agenda base	140	140.000	6.758	9.000	9.000	11.172	2.172	38.000	50.995	12.995
กปน.	1200	1200.000	658.491	77.309	85.302	76.583	(8.720)	362.212	445.900	83.688

หมายเหตุ : 1. คาดการณ์ผลการส่งมอบงานจาก สกส. สำนักงานประชาสัมพันธ์และ ABS ทบทวนตามหนังสือ ส่วนที่ ๓๓ (ก๔) ๐405.2/ ๖78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ วันที่ 4 มี.ค.65

2. ผลการลงนามปีงบฯ 65 จาก Google sheet ณ วันที่ ๒๔ มี.ค.65 (9.30 น.) และผลงานปรับปรุงท่อรายเดือน จาก Google sheet ณ วันที่ ๒๔ มี.ค.65 (10.00 น.)

สถานะสัญญาจ้างบริหารจัดการข้อมูล

[illegible]

ติดตั้ง DMA ใหม่

เป้าหมาย			ติดตั้ง DMA ใหม่ (จุดวัดอัตราการไหลและแรงดันน้ำ) สนับสนุนกิจกรรมการจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาสาขา																										
รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2563			2564												2565											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
งานซื้องานติดตั้งเครื่องวัด DMA ใหม่ ปีงบฯ 2564	27 จุด	20 ล้านบาท				A			B	C	D		E	F															
										A	B	C	D	E	F														

ลงนามสัญญาวันที่ 19 มี.ค.64 / กจช.ฝจพ. มีการแก้ไขขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา

รายละเอียดวันแจ้งเริ่มงาน-สิ้นสุด วันที่ 21 มิ.ย.64 /ประชุม precon วันที่ 19 ต.ค.64

กำหนดให้เริ่มงานแล้ววันที่ 8 พ.ย. 2564 ระยะเวลาดำเนินงาน 480 วัน

จัดบรรจุติดตั้ง DM ใหม่ ได้จำนวน 7 จุด จากทั้งสิ้น 27 จุด (สสป.4 ,สสส. 2 และ สสสภ. 1)

กำลังดำเนินการขอมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อเชื่อมโยงระบบ WLMA ต่อไป

หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฝจส.) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564



A

อนุมัติเอกสารประกวดราคา
(TOR + ราคากลาง)

B

ยื่นเอกสารประกวดราคา

C

ตรวจเอกสาร

D

ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)

E

ลงนามสัญญา

F

ดำเนินงานตามสัญญา



แผนการดำเนินงาน



เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน



ล่าช้ากว่าแผน

ติดตั้ง DMA ใหม่

เป้าหมาย

ติดตั้ง DMA ใหม่ (จุดวัดอัตราการไหลและแรงดันน้ำ) สนับสนุนกิจกรรมการจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาสาขา

รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2564										2565										2566														
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
งานปรับปรุงประสิทธิภาพฯ (ติดตั้งใหม่) ปีงบฯ 2565	10 จุด	10 ล้านบาท			A	B	C	D	E	F																											
ขั้นตอนเตรียมบันทึกเบิกจ่าย /ตรวจสอบผู้ประกอบการ SMEs ตาม ว.845 แล้วเสร็จ /แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และราคากลางแล้วเสร็จวันที่ 15 ต.ค. 64 /ประชุม TOR วันที่ 28 ต.ค.64 ปัจจุบัน TOR และราคากลางแล้วเสร็จ ปัจจุบันในขั้นตอนการยื่นข้อเสนอฯ /ตรวจคุณสมบัติผู้ประมูล																																					
งานปรับปรุงประสิทธิภาพฯ (ติดตั้งใหม่) ปีงบฯ 2565 (ของบเพิ่มเติม)	80 จุด	ประมาณการงบฯ 80 ล้านบาท			A	B	C	D	E	F																											
ระหว่างขั้นตอนจัดทำบันทึกเสนอของบประมาณเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2565 (ประมาณการงบ 80 ล้านบาท) ปัจจุบันบันทึกถึง ฝ่ายงบประมาณ (25 ต.ค.64) (รองบประมาณ)ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขอเบิกจ่ายฯ (ส่งเรื่องถึง ฝจพ.ดำเนินการต่อไปแล้ว)																																					

หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฝจส.) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

หมายเหตุ

- A อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคากลาง)/ตรวจ SMEs
- B ยื่นเอกสารประกวดราคา
- C ตรวจเอกสาร

- D ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)
- E ลงนามสัญญา
- F ดำเนินงานตามสัญญา

- แผนการดำเนินงาน
- เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน
- ล่าช้ากว่าแผน

งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 2,3 และ 4,5 (ส่วนต่อขยาย)

เป้าหมาย

บริหารข้อมูลฯ ภาค 2,3,4,5 (ส่วนต่อขยาย)

รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2564						2565										2566													
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 2,3 (ส่วนต่อขยาย)	20 จุด	0.8 ล้านบาท																														
งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 4,5 (ส่วนต่อขยาย)	20 จุด	0.8 ล้านบาท																														

หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฝจส.) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

หมายเหตุ

A

อนุมัติเอกสารประกวดราคา
(TOR + ราคากลาง)/ตรวจ SMEs

B

ยื่นเอกสารประกวดราคา

C

ตรวจเอกสาร

D

ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)

E

ลงนามสัญญา

F

ดำเนินงานตามสัญญา

แผนการดำเนินงาน

เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน

ล่าช้ากว่าแผน

แผนงานจ้างสัญญาจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย (PBC) (ปรับปรุงแผน ตุลาคม 2563)

ลำดับ ที่	กิจกรรม	2564				2565																			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
1	จำนวน 4 สัญญา ประกอบด้วย สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ภาษีเจริญ บางกอกน้อย และตากสิน	<div>- ภาษีเจริญแจ้งเริ่มงาน 1 ต.ค. 64 และ สมุทรปราการแจ้งเริ่มงาน 11 ต.ค. 64</div> <div>และจัดทำ Base Line แล้วเสร็จทั้ง 2 สัญญา</div> <div>- แจ้งเริ่มงานแล้ว 2 สัญญา (สาขางอกน้อย เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 64 และสาขาทากสิน เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 65) และจัดทำ Base Line แล้วเสร็จ 1 สัญญา (สาขางอกน้อย)</div>																							
	ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดทำสัญญาฯ และลงนาม																								
	ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)																								
2	จำนวน 8 สัญญา ประกอบด้วย สำนักงานประปาสาขาพระโขนง พญาไท ทุ่งมหาเมฆ แม้นศรี ประชาชื่น สุวรรณภูมิ สุขสวัสดิ์ และ มหาสวัสดิ์																								
	ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดทำสัญญาฯ และลงนาม	* ครั้งที่ 2																							
	ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)																								
3	จำนวน 1 สัญญา ประกอบด้วย สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท																								
	ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดทำสัญญาฯ และลงนาม	* ครั้งที่ 2																							
	ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)																								

หมายเหตุ : * ได้ยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

แผนการดำเนินงานเดิมก่อนปรับปรุง
 แผนการดำเนินงาน
 เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน
 ล่าช้ากว่าแผน

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

เป้าหมาย		จ้างสำรวจหาท่อรั่วด้วยดาวเทียม และเทคโนโลยี Sensors												
รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปี 2564			ปี 2565								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สำรวจหาท่อรั่วด้วยดาวเทียม	8,000 กม.	10.5 ล้านบาท												
			A		B	C/D	E	F						
			A		B	C/D	E	F	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาฯ (ลงนามสัญญา วันที่ 25 ม.ค. 65 และแจ้งเริ่มงานวันที่ 31 ม.ค. 65) ถ่ายภาพดาวเทียมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และจะตรวจรับงานครั้งที่ 1 .ในวันที่ 25 มีนาคม 2565					
งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยี Sensors	พื้นที่เป้าหมาย	20 ล้านบาท												
			B	C/D	E	F								
			A						มีการทดสอบความเหมาะสม ของเทคโนโลยีแล้วเสร็จ 4 บริษัท และได้จัดทำรายงานผลการทดสอบแล้วเสร็จและนำเสนอ รวก.(กต) เห็นชอบ					

หมายเหตุ

A

อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคากลาง)

B

ยื่นเอกสารประกวดราคา

C

ตรวจเอกสาร

D

ดำเนินการขออนุมัติจ้าง

E

ลงนามสัญญา

F

ดำเนินงานตามสัญญา

แผนการดำเนินงาน

เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน

ล่าช้ากว่าแผน

ขอบคุณครับ
