

## แผน-ผลงานจัดทำแบบและจ้าง (สาขาและ Agenda base) ปีงบประมาณ 2565

สาขา	แผน (1200 กม.)	เบิกจ้างแล้ว				ลงนามแล้ว			
		ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน	ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน
สสส.	63	0.000	86.946	86.946	138.01%	0.000	72.253	72.253	114.69%
สสพ.	69	0.000	72.489	72.489	105.06%	0.000	72.489	72.489	105.06%
สสป.	90	0.000	92.731	92.731	103.03%	0.000	92.731	92.731	103.03%
สสท.	26	0.000	27.035	27.035	103.98%	0.000	27.035	27.035	103.98%
ชวก.(ก1)	248	0.000	279.201	279.201	112.58%	0.000	264.508	264.508	106.66%
สสญ.	48	0.000	51.045	51.045	106.34%	0.000	51.045	51.045	106.34%
สสม.	16	0.000	16.268	16.268	101.68%	0.000	12.590	12.590	78.69%
สสล.	45	0.000	50.567	50.567	112.37%	0.000	50.567	50.567	112.37%
ชวก.(ก2)	109	0.000	117.880	117.880	108.15%	0.000	114.202	114.202	104.77%
สสช.	55	0.000	55.494	55.494	100.90%	0.000	55.494	55.494	100.90%
สสข.	53	0.000	53.101	53.101	100.19%	0.000	53.101	53.101	100.19%
สสมบ.	40	0.000	53.956	53.956	134.89%	0.000	53.956	53.956	134.89%
สสสภ.	55	0.000	60.375	60.375	109.77%	0.000	60.375	60.375	109.77%
ชวก.(ก3)	203	0.000	222.926	222.926	109.82%	0.000	222.926	222.926	109.82%
รวก.(กอ)	560	0.000	620.007	620.007	110.72%	0.000	601.636	601.636	107.44%
สสบ.	101	0.000	105.298	105.298	104.26%	0.000	105.298	105.298	104.26%
สสด.	75	0.000	77.230	77.230	102.97%	0.000	77.230	77.230	102.97%
สสภ.	85	0.000	95.431	95.431	112.27%	0.000	87.979	87.979	103.50%
สสว.	82	0.000	85.343	85.343	104.08%	0.000	82.001	82.001	100.00%
ชวก.(ก4)	343	0.000	363.302	363.302	105.92%	0.000	352.508	352.508	102.77%
สสน.	58	0.000	78.081	78.081	134.62%	0.000	63.192	63.192	108.95%
สสบพ.	41	0.000	73.335	73.335	178.87%	0.000	54.528	54.528	133.00%
สสมส.	58	0.000	83.154	83.154	143.37%	0.000	76.051	76.051	131.12%
ชวก.(ก5)	157	0.000	234.570	234.570	149.41%	0.000	193.771	193.771	123.42%
รวก.(กต)	500	0.000	597.872	597.872	119.57%	0.000	546.279	546.279	109.26%
Agenda base	140	0.000	130.268	130.268	93.05%	0.000	123.276	123.276	88.05%
กปน.	1,200	0.000	1348.147	1348.147	112.35%	0.000	1271.191	1271.191	105.93%

หมายเหตุ : ข้อมูลเบิกจ้าง-ลงนาม จาก Google sheet ณ 27 ก.ย. 65

## ผลงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2565

สาขา	เป้าหมาย ผลส่งมอบงาน	คาดการณ์ ผลส่งมอบงาน	ผลการลงนาม ปีงบฯ 65	ผลงานปรับปรุงท่อ					
				รายเดือน ก.ย.65			สะสม ต.ค.64-ก.ย.65		
				แผนงาน	ผลงาน	ผลต่าง +/-	แผนงาน	ผลงาน	ผลต่าง +/-
สสส.	63	63.000	72.253	10.000	9.270	(0.730)	63.000	59.445	(3.555)
สสพ.	69	69.000	72.489	5.000	5.580	0.580	69.000	72.588	3.588
สสป.	90	90.000	92.731	10.500	8.204	(2.296)	90.000	86.871	(3.129)
สสท.	26	18.551	27.035	6.000	0.000	(6.000)	26.000	19.223	(6.777)
ขวก.(ก1)	248	240.551	264.508	31.500	23.054	(8.446)	248.000	238.127	(9.873)
สสญ.	48	48.000	51.045	8.500	2.614	(5.886)	48.000	48.161	0.161
สสม.	16	16.000	12.590	3.200	1.126	(2.074)	16.000	16.098	0.098
สสล.	45	45.000	50.567	7.500	7.922	0.422	45.000	43.705	(1.295)
ขวก.(ก2)	109	109.000	114.202	19.200	11.662	(7.538)	109.000	107.964	(1.036)
สสช.	55	55.000	55.494	7.000	7.170	0.170	55.000	56.911	1.911
สสข.	53	51.002	53.101	7.000	12.673	5.673	53.000	53.049	0.049
สสมบ.	40	40.000	53.956	0.682	0.000	(0.682)	40.000	49.335	9.335
สสสภ.	55	55.000	60.375	12.500	1.584	(10.916)	55.000	55.717	0.716
ขวก.(ก3)	203	201.002	222.926	27.182	21.427	(5.755)	203.000	215.011	12.011
รวก.(กอ)	560	550.553	601.636	77.882	56.143	(21.739)	560.000	561.102	1.102
สสบ.	91	91.000	105.298	27.813	27.182	(0.631)	91.000	91.005	0.005
สสค.	70	70.000	77.230	8.000	16.774	8.774	70.000	81.220	11.220
สสภ.	80	80.000	87.979	15.000	14.887	(0.113)	80.000	79.664	(0.336)
สสว.	81	49.343	82.001	15.800	15.087	(0.713)	81.000	66.472	(14.528)
ขวก.(ก4)	322	290.343	352.508	66.613	73.930	7.317	322.000	318.361	(3.639)
สสน.	63	63.000	63.192	11.500	7.311	(4.189)	63.000	69.628	6.628
สสบท.	52	52.000	54.528	5.000	6.063	1.063	52.000	76.967	24.967
สสมส.	63	63.000	76.051	11.000	12.270	1.270	63.000	60.654	(2.346)
ขวก.(ก5)	178	178.000	193.771	27.500	25.644	(1.856)	178.000	207.249	29.249
รวก.(กต)	500	468.343	546.279	94.113	99.574	5.461	500.000	525.610	25.610
Agenda base	140	140.000	123.276	19.000	11.792	(7.208)	140.000	123.657	(16.344)
กปน.	1200	1158.896	1271.191	190.995	167.509	(23.486)	1200.000	1210.368	10.368

หมายเหตุ : 1. คาดการณ์ผลการส่งมอบงานจาก สกส. สำนักงานประชาสัมพันธ์และ ABS ทบทวนตามบันทึกที่ กปทผจส32/2565 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

2. ผลการลงนามปีงบฯ 65 จาก Google sheet ณ วันที่ ณ 27 ก.ย.65 และผลงานปรับปรุงท่อรายเดือน จาก Google sheet ณ วันที่ ณ 27 ก.ย. 65

# แนวทางการดำเนินงานปรับปรุงท่อฯ ปีงบประมาณ 2566


## การส่งมอบงานปรับปรุงท่อฯ

- การกำหนดแผนการส่งมอบงาน ปีงบประมาณ 2566 จะกำหนดผลการส่งมอบงานที่ 90% ณ สิ้นสุดเดือน ก.ค. 2566 (ผลงานสะสม 10 เดือน)
- ให้สำนักงานประปาสาขา และ Agenda Base จัดทำแผนส่งมอบงานรายเดือน ให้สอดคล้องกับการส่งมอบงาน 90% ณ สิ้นสุดเดือน ก.ค. 2566 และ 100% ณ สิ้นสุดเดือน ก.ย. 2566

## การเบิกจ่าย

- ปีงบประมาณ 2565 ผู้บริหารกำหนดให้สำนักงานประปาสาขาเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ (100%) ณ สิ้นสุดเดือน ม.ค. 2565 ยกเว้นหน่วยงาน Agenda Base
- ปีงบประมาณ 2566 ขอให้สำนักงานประปาสาขาดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ (100%) ณ สิ้นสุดเดือน ม.ค. 2566 ยกเว้นหน่วยงาน Agenda Base เช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2565

## แนวทางการติดตามผลการส่งมอบงานปีงบประมาณ 2566

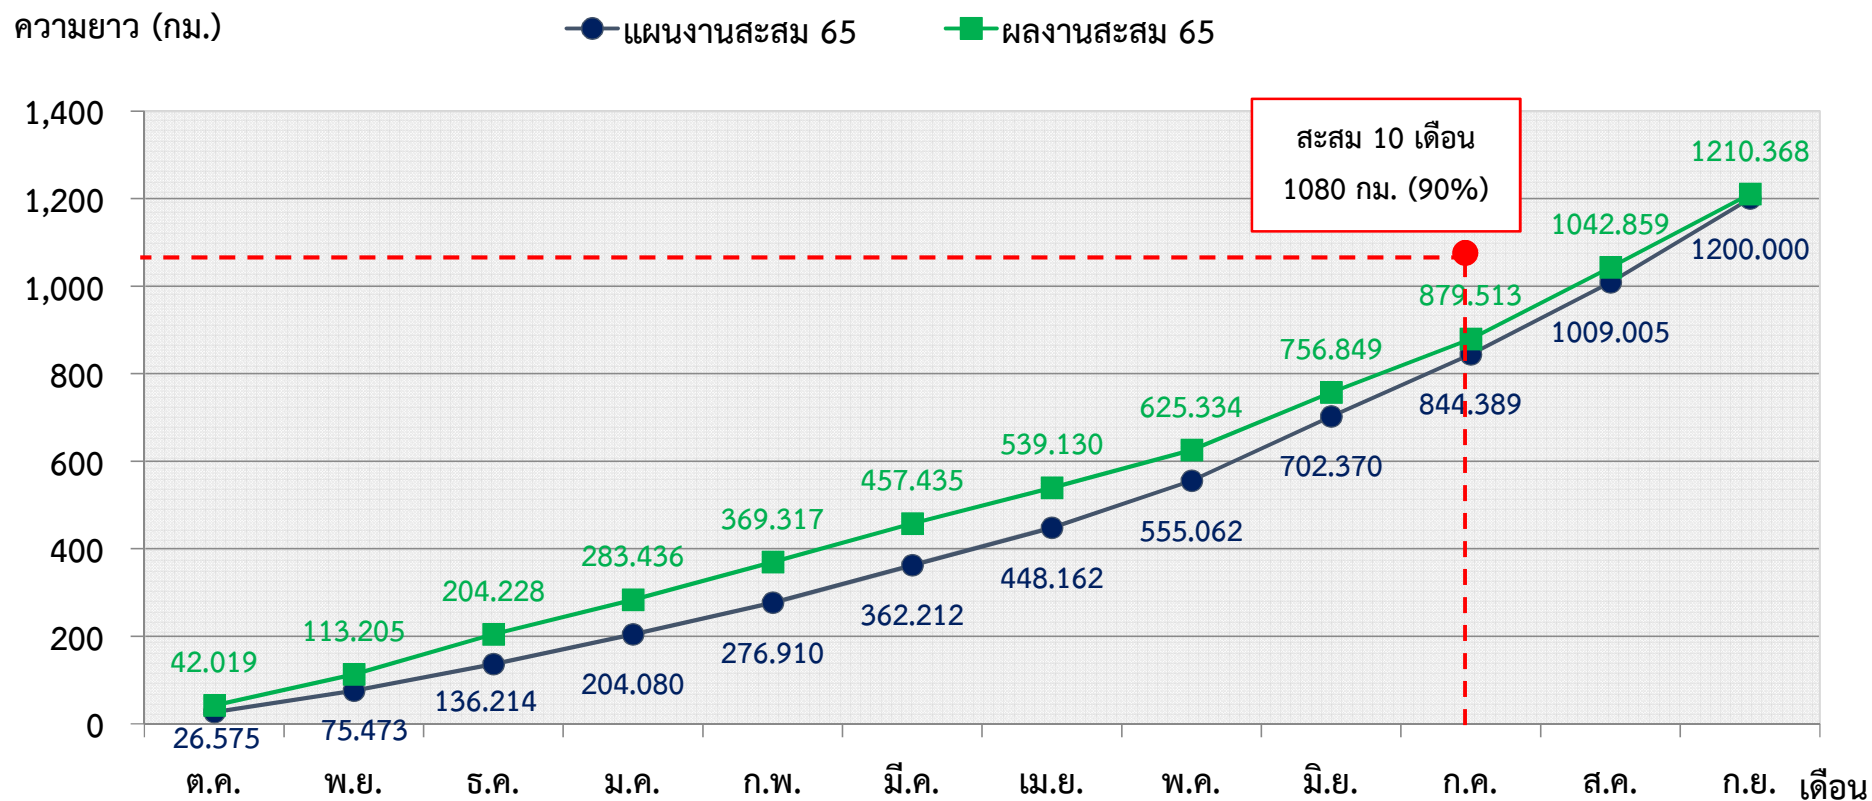

รายการ	ปีงบประมาณ 2565											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานสะสม 65	26.575	75.473	136.214	204.080	276.910	362.212	448.162	555.062	702.370	844.389	1009.005	1200.000
ผลงานสะสม 65	42.019	113.205	204.228	283.436	369.317	457.435	539.130	625.334	756.849	879.513	1042.859	1210.368

## แผน-ผลงานจัดทำแบบและจ้าง (สาขาและ Agenda base) ปีงบประมาณ 2566

สาขา	แผน (1200 กม.)	เบิกจ้างแล้ว					ลงนามแล้ว			
		ฝจพ.		สาขา	รวม	% เทียบแผน	ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน
สสส.	78	78	0	40.433	40.433	51.84%	0	0	0	0.00%
สสพ.	65	65	0	26.333	26.333	40.51%	0	0	0	0.00%
สสป.	97	97	0	51.142	51.142	52.72%	0	0	0	0.00%
สสท.	30	30	0	3.204	3.204	10.68%	0	0	0	0.00%
ชวก.(ก1)	270	270	0	121.112	121.112	44.86%	0	0	0	0.00%
สสญ.	53	53	0	17.727	17.727	33.45%	0	0	0	0.00%
สสม.	20	20	0	8.304	8.304	41.52%	0	0	0	0.00%
สสล.	51	51	0	25.071	25.071	49.16%	0	0	0	0.00%
ชวก.(ก2)	124	124	0	51.102	51.102	41.21%	0	0	0	0.00%
สสช.	55	55	0	7.232	7.232	13.15%	0	0	0	0.00%
สสข.	35	35	0	21.587	21.587	61.68%	0	0	0	0.00%
สสมบ.	40	40	0	26.019	26.019	65.05%	0	0	0	0.00%
สสสภ.	13	13	0	9.698	9.698	74.60%	0	0	0	0.00%
ชวก.(ก3)	143	143	0	64.536	64.536	45.13%	0	0	0	0.00%
รวก.(กอ)	537	537	0	236.750	236.750	44.09%	0	0	0	0.00%
สสบ.	95	95	0	59.263	59.263	62.38%	0	0	0	0.00%
สสด.	74	74	0	52.551	52.551	71.01%	0	0	0	0.00%
สสภ.	90	90	0	37.983	37.983	42.20%	0	0	0	0.00%
สสว.	70	70	0	29.988	29.988	42.84%	0	0	0	0.00%
ชวก.(ก4)	329	329	0	179.785	179.785	54.65%	0	0	0	0.00%
สสน.	75	75	0	32.809	32.809	43.75%	0	0	0	0.00%
สสบท.	48	48	0	19.848	19.848	41.35%	0	0	0	0.00%
สสมส.	61	61	0	24.726	24.726	40.53%	0	0	0	0.00%
ชวก.(ก5)	184	184	0	77.383	77.383	42.06%	0	0	0	0.00%
รวก.(กต)	513	513	0	257.168	257.168	50.13%	0	0	0	0.00%
Agenda base	150	150	0	18.184	18.184	12.12%	0	0	0	0.00%
กปน.	1,200	1,200	0	512.102	512.102	42.68%	0	0	0	0.00%

หมายเหตุ : ข้อมูลเบิกจ้าง-ลงนาม จาก Google sheet ณ 27 ก.ย. 65 (11.00 น.)

## ผลงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2565

สาขา	เป้าหมายผลส่งมอบงาน	ผลงานปรับปรุงท่อสะสม ต.ค.64-ก.ย.65 (ณ 27 ก.ย. 65)	
		ผลงานสะสม	ผลต่าง +/-
สสส.	63.000	59.445	(3.555)
สสพ.	69.000	72.588	3.588
สสป.	90.000	86.871	(3.129)
สสท.	26.000	19.223	(6.777)
รวม.(ก1)	248.000	238.127	(9.873)
สสญ.	48.000	48.161	0.161
สสม.	16.000	16.098	0.098
สสล.	45.000	43.705	(1.295)
รวม.(ก2)	109.000	107.964	(1.036)
สสช.	55.000	56.911	1.911
สสข.	53.000	53.049	0.049
สสมบ.	40.000	49.335	9.335
สสสภ.	55.000	55.717	0.716
รวม.(ก3)	203.000	215.011	12.011
รวม.(กอ)	560.000	561.102	1.102
สสบ.	91.000	91.005	0.005
สสต.	70.000	81.220	11.220
สสภ.	80.000	79.664	(0.336)
สสว.	81.000	66.472	(14.528)
รวม.(ก4)	322.000	318.361	(3.639)
สสน.	63.000	69.628	6.628
สสบท.	52.000	76.967	24.967
สสมส.	63.000	60.654	(2.346)
รวม.(ก5)	178.000	207.249	29.249
รวม.(กต)	500.000	525.610	25.610
Agenda base	140.000	123.657	(16.344)
กปน.	1,200.000	1,210.368	10.368

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการส่งมอบงานปรับปรุงท่อจาก Google sheet ณ 27 ก.ย.65
