



การประปานครหลวง


METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

ผลการดำเนินงานด้านลดน้ำสูญเสีย
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสม มกราคม 2566 (กปน.)

(%)

36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

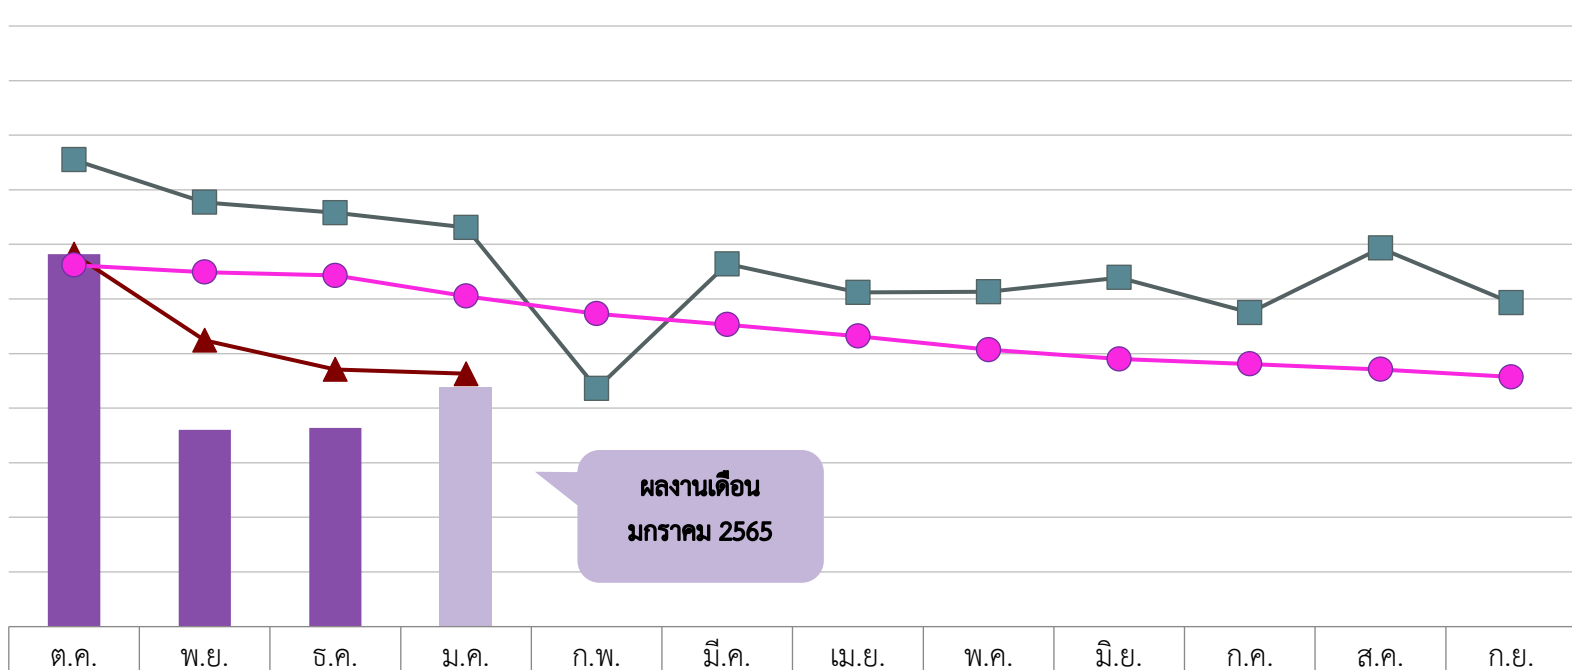

รายเดือน ปี 2566	31.82	28.60	28.64	29.38								
รายเดือน ปี 2565	33.55	32.77	32.58	32.31	29.36	31.64	31.12	31.13	31.39	30.75	31.93	30.93
สะสม ปี 2566	31.82	30.24	29.71	29.63								
เป้าหมาย ปี 2566	31.62	31.49	31.43	31.05	30.73	30.53	30.32	30.07	29.90	29.81	29.71	29.57

ผลงานอัตราน้ำสูญเสียเดือนมกราคม 2566

สาขา	ปริมาณน้ำเข้า (ลบ.ม./วัน)		ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม./วัน)		เป้าหมายน้ำจำหน่าย รายเดือน (ลบ.ม./วัน)	% น้ำจำหน่ายเทียบ เป้าหมาย รายเดือน (%)	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)		เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)	
	ธ.ค.	ม.ค.	ธ.ค.	ม.ค.			ธ.ค.	ม.ค.	ธ.ค.	ม.ค.
สสท.	227,341.00	229,225.00	152,087.28	153,622.96	141,129.03	8.85	75,253.72	75,602.04	33.10	32.98
สสส.	389,837.00	392,780.00	279,102.58	274,762.21	264,161.29	4.01	110,734.42	118,017.79	28.41	30.05
สสพ.	370,327.00	374,682.00	284,238.29	283,735.25	278,548.39	1.86	86,088.71	90,946.75	23.25	24.27
สสป.	513,241.00	518,968.00	390,953.55	374,310.36	374,387.10	0.02	122,287.45	144,657.64	23.83	27.87
สสญ.	319,498.00	327,220.00	241,990.00	238,384.68	229,838.71	3.72	77,508.00	88,835.32	24.26	27.15
สสม.	296,736.00	298,184.00	207,174.07	207,932.52	183,870.97	13.09	89,561.93	90,251.48	30.18	30.27
สสล.	286,755.00	284,147.00	217,992.97	215,200.77	224,612.90	4.19	68,762.03	68,946.23	23.98	24.26
สสช.	224,550.00	224,565.00	172,997.51	170,616.11	168,290.32	1.38	51,552.49	53,948.89	22.96	24.02
สสข.	189,576.00	191,226.00	151,436.31	156,055.09	152,161.29	2.56	38,139.69	35,170.91	20.12	18.39
สสมบ.	249,505.00	252,087.00	213,748.28	214,812.60	204,903.23	4.84	35,756.72	37,274.40	14.33	14.79
สสสภ.	305,100.00	309,957.00	270,841.48	257,299.15	250,129.03	2.87	34,258.52	52,657.85	11.23	16.99
สสบ.	347,356.00	338,723.00	201,566.85	202,936.51	188,548.39	7.63	145,789.15	135,786.49	41.97	40.09
สสต.	352,806.00	344,347.00	217,961.90	214,613.69	213,580.65	0.48	134,844.10	129,733.31	38.22	37.68
สสภ.	330,822.00	327,921.00	208,275.90	207,143.03	195,935.48	5.72	122,546.10	120,777.97	37.04	36.83
สสว.	366,249.00	363,952.00	213,933.21	213,689.72	196,612.90	8.69	152,315.79	150,262.28	41.59	41.29
สสน.	253,837.00	248,741.00	183,607.85	179,554.63	186,451.61	3.70	70,229.15	69,186.37	27.67	27.81
สสบท.	231,986.00	231,051.00	159,701.21	160,924.30	139,741.94	15.16	72,284.79	70,126.70	31.16	30.35
สสมส.	259,270.00	263,479.00	167,917.57	173,277.19	177,548.39	2.41	91,352.43	90,201.81	35.23	34.23
กปน.	5,514,792.00	5,521,255.00	3,935,526.81	3,898,870.76	3,770,451.61	3.41	1,579,265.19	1,622,384.24	28.64	29.38

ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสมเดือนมกราคม 2566 (เทียบเป้าหมายรายเดือน)

สาขา	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)			เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)			แนวโน้มน้ำ สูญเสีย 3 เดือน ย้อนหลัง	ผลงานสะสม (%)	เป้าหมาย	
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.			เป้า ดำเนินการ ม.ค. 66 (%)	เป้า ดำเนินการ ปีงบฯ 66 (%)
สสพ.	71,124.39	77,762.18	75,602.04	32.31	33.10	32.98		33.28	35.64	33.50
สสส.	109,027.10	114,425.57	118,017.79	28.52	28.41	30.05		29.71	28.58	27.51
สสพ.	78,905.30	88,958.34	90,946.75	21.90	23.25	24.27	เพิ่มขึ้น	23.75	25.78	24.74
สสป.	142,196.27	126,363.69	144,657.64	27.36	23.83	27.87		26.87	26.60	25.28
ชวก.(ก1)	401,253.05	407,509.77	429,224.23	27.07	26.28	28.32		27.79	28.22	26.89
สสญ.	76,660.33	80,091.60	88,835.32	24.10	24.26	27.15	เพิ่มขึ้น	25.28	30.77	29.29
สสม.	85,180.31	92,547.33	90,251.48	29.29	30.18	30.27	เพิ่มขึ้น	30.22	34.86	32.64
สสล.	66,786.34	71,054.10	68,946.23	23.75	23.98	24.26	เพิ่มขึ้น	25.41	26.91	25.52
ชวก.(ก2)	228,626.97	243,693.03	248,033.03	25.68	26.12	27.27	เพิ่มขึ้น	26.93	30.90	29.18
สสช.	55,955.27	53,270.90	53,948.89	24.80	22.96	24.02		24.97	25.44	24.39
สสช.	30,973.02	39,411.01	35,170.91	16.87	20.12	18.39		19.51	21.18	19.81
สสมบ.	35,449.94	36,948.62	37,274.40	14.32	14.33	14.79	เพิ่มขึ้น	15.54	17.43	16.28
สสสภ.	44,293.74	35,400.47	52,657.85	14.45	11.23	16.99		15.41	16.05	14.96
ชวก.(ก3)	166,671.98	165,031.00	179,052.05	17.30	16.49	18.31		18.46	19.58	18.41

ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสมเดือนมกราคม 2566 (เทียบเป้าหมายรายเดือน)

สาขา	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)			เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)			แนวโน้มน้ำ สูญเสีย 3 เดือน ย้อนหลัง	ผลงานสะสม (%)	เป้าหมาย	
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.			เป้า ดำเนินการ ม.ค. 66 (%)	เป้า ดำเนินการ ปีงบประมาณ 66 (%)
สสบ.	139,479.61	150,648.79	135,786.49	40.51	41.97	40.09		42.34	43.82	41.57
สสด.	136,676.66	139,338.90	129,733.31	38.74	38.22	37.68	ลดลง	39.71	41.85	40.45
สสภ.	115,957.52	126,630.97	120,777.97	35.86	37.04	36.83		36.94	38.20	36.69
สสว.	149,240.55	157,392.99	150,262.28	41.61	41.59	41.29	ลดลง	41.70	43.56	41.81
ชวภ.(ก4)	541,354.33	574,011.65	536,560.05	39.25	39.76	39.02		40.23	41.91	40.18
สสน.	69,018.79	72,570.12	69,186.37	27.65	27.67	27.81	เพิ่มขึ้น	28.31	28.16	26.82
สสบท.	63,642.79	74,694.29	70,126.70	28.57	31.16	30.35		30.48	30.42	29.28
สสมส.	84,833.33	94,397.51	90,201.81	33.81	35.23	34.23		35.06	34.85	33.74
ชวภ.(ก5)	217,494.91	241,661.92	229,514.88	30.07	31.39	30.88		31.35	31.24	30.05
กปน.	1,555,401.24	1,631,907.36	1,622,384.24	28.60	28.64	29.38	เพิ่มขึ้น	29.63	31.05	29.57

รายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรมลดน้ำสูญเสียเดือน มกราคม 2566

สาขา	งานสำรวจท่อรั่ว						งานซ่อมท่อ (จุด)									
	Step Test (ครั้ง)		ระยะทางสำรวจท่อรั่ว (กม.)		จำนวนจุดรั่วที่พบ		Reported Burst				Unreported Burst				รวม	
							ท่อจ่าย		ท่อบริการ ⁽¹⁾		ท่อจ่าย		ท่อบริการ ⁽¹⁾			
	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾
สสท.	5	7	483	326	153	308	7	11	277	246	13	2	104	119	401	378
สสส.	2	15	314	733	279	411	26	65	513	709	10	14	227	272	776	1,060
สสพ.	3	12	530	678	305	465	30	43	478	838	21	30	309	399	838	1,310
สสป.	11	2	963	156	1,420	404	63	69	671	707	34	18	977	254	1,745	1,048
ภาค 1	21	36	2,290	1,893	2,157	1,588	126	188	1,939	2,500	78	64	1,617	1,044	3,760	3,796
สสญ.	8	8	467	808	430	368	17	22	408	347	12	28	365	259	802	656
สสม.	12	7	352	526	313	365	12	19	332	313	5	4	273	327	622	663
สสล.	10	14	546	600	756	640	32	45	471	522	8	15	725	579	1,236	1,161
ภาค 2	30	29	1,365	1,935	1,499	1,373	61	86	1,211	1,182	25	47	1,363	1,165	2,660	2,480
สสข.	6	6	1,006	101	422	200	17	35	444	522	4	5	410	164	875	726
สสข.	-	5	341	261	206	134	15	36	848	637	11	11	195	111	1,069	795
สสมบ.	6	10	350	393	228	355	57	80	423	519	19	33	193	305	692	937
สสสภ.	8	5	613	683	523	614	51	54	318	395	15	18	428	528	812	995
ภาค 3	20	26	2,310	1,438	1,379	1,303	140	205	2,033	2,073	49	67	1,226	1,108	3,448	3,453
รวก.(กอ)	71	91	5,965	5,265	5,035	4,264	327	479	5,183	5,755	152	178	4,206	3,317	9,868	9,729
สสบ.	5	15	711	799	1,120	1,538	13	43	823	1,171	5	25	422	1,313	1,263	2,552
สสต.	-	9	826	1,045	890	940	65	37	1,236	610	7	6	727	503	2,035	1,156
สสภ.	15	19	1,998	2,197	1,372	2,445	39	39	1,104	903	17	39	1,179	2,124	2,339	3,105
สสว.	5	4	845	1,058	1,099	1,592	35	44	745	633	18	30	1,104	1,496	1,902	2,203
ภาค 4	25	47	4,380	5,099	4,481	6,515	152	163	3,908	3,317	47	100	3,432	5,436	7,539	9,016
สสน.	-	1	424	124	337	125	18	23	489	414	14	16	307	105	828	558
สสบท.	5	-	353	234	479	186	48	53	930	1,626	14	12	396	153	1,388	1,844
สสมส.	-	-	603	1,774	806	1,329	35	37	977	820	21	28	626	1,055	1,659	1,940
ภาค 5	5	1	1,379	2,132	1,622	1,640	101	113	2,396	2,860	49	56	1,329	1,313	3,875	4,342
รวก.(กต)	30	48	5,759	7,231	6,103	8,155	253	276	6,304	6,177	96	156	4,761	6,749	11,414	13,358
กปน.	101	139	11,724	12,496	11,138	12,419	580	755	11,487	11,932	248	334	8,967	10,066	21,282	23,087

หมายเหตุ :

ข้อมูลผลงานจากระบบ WLMA ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2566 บันทึกโดยสำนักงานประปาสาขา


(1) จำนวนงานซ่อมท่อบริการ =ผลรวมของงานซ่อมท่อบริการ + อุปกรณ์ท่อจ่าย + อุปกรณ์ท่อบริการ + อุปกรณ์ท่ออื่นๆ

(2) คือ จำนวนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบในช่วงเดือนเดียวกัน ระหว่างปีงบประมาณ 2566 และ ปีงบประมาณ 2565

การดำเนินงานปรับปรุง DM ตามเป้าหมาย RTU ใช้งาน 85%

รูปแบบการดำเนินงาน		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
เปลี่ยนมาตร สวส.กาท. (ชล.32/2564)	แผนงาน	13	9	14	6	2	2	2	2	2	2	2	2
	ผลงาน	13	9	14	2								
เปลี่ยนมาตร สพง.กาท. (ชล.31/2564)	แผนงาน	8	8	9	9	9	9	6	8	8	8	8	
	ผลงาน	8	14	12	10								
เปลี่ยนมาตร สพง.กาท. (ชล.52/2565)	แผนงาน				8	9	9	6	8	8	8	8	8
	ผลงาน				5								
ชล.24/2566	แผนงาน	สัญญาติดอุทธรณ์											
	ผลงาน												
เปลี่ยนมาตรสัญญา 10 ล้าน	แผนงาน											4	8
	ผลงาน												
รับประกัน	แผนงาน			30									
CM/PM เร่งด่วน	แผนงาน			10	10	0	3						
	ผลงาน			0	8								
CM/PM ตามแผน	แผนงาน							20	30	20	10	20	10
	ผลงาน												
อัตราการเสีย (0.5%)		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
รวมแผนงาน		12	8	54	24	11	14	25	39	29	19	33	19
ผลงานจริง		12	14	17	16								
รวมแผนงานสะสม		12	20	74	98	109	123	148	187	216	235	268	287
ผลงานสะสม		12	26	43	59								

การดำเนินงานปรับปรุง DM ตามเป้าหมาย RTU ใช้งาน 85%

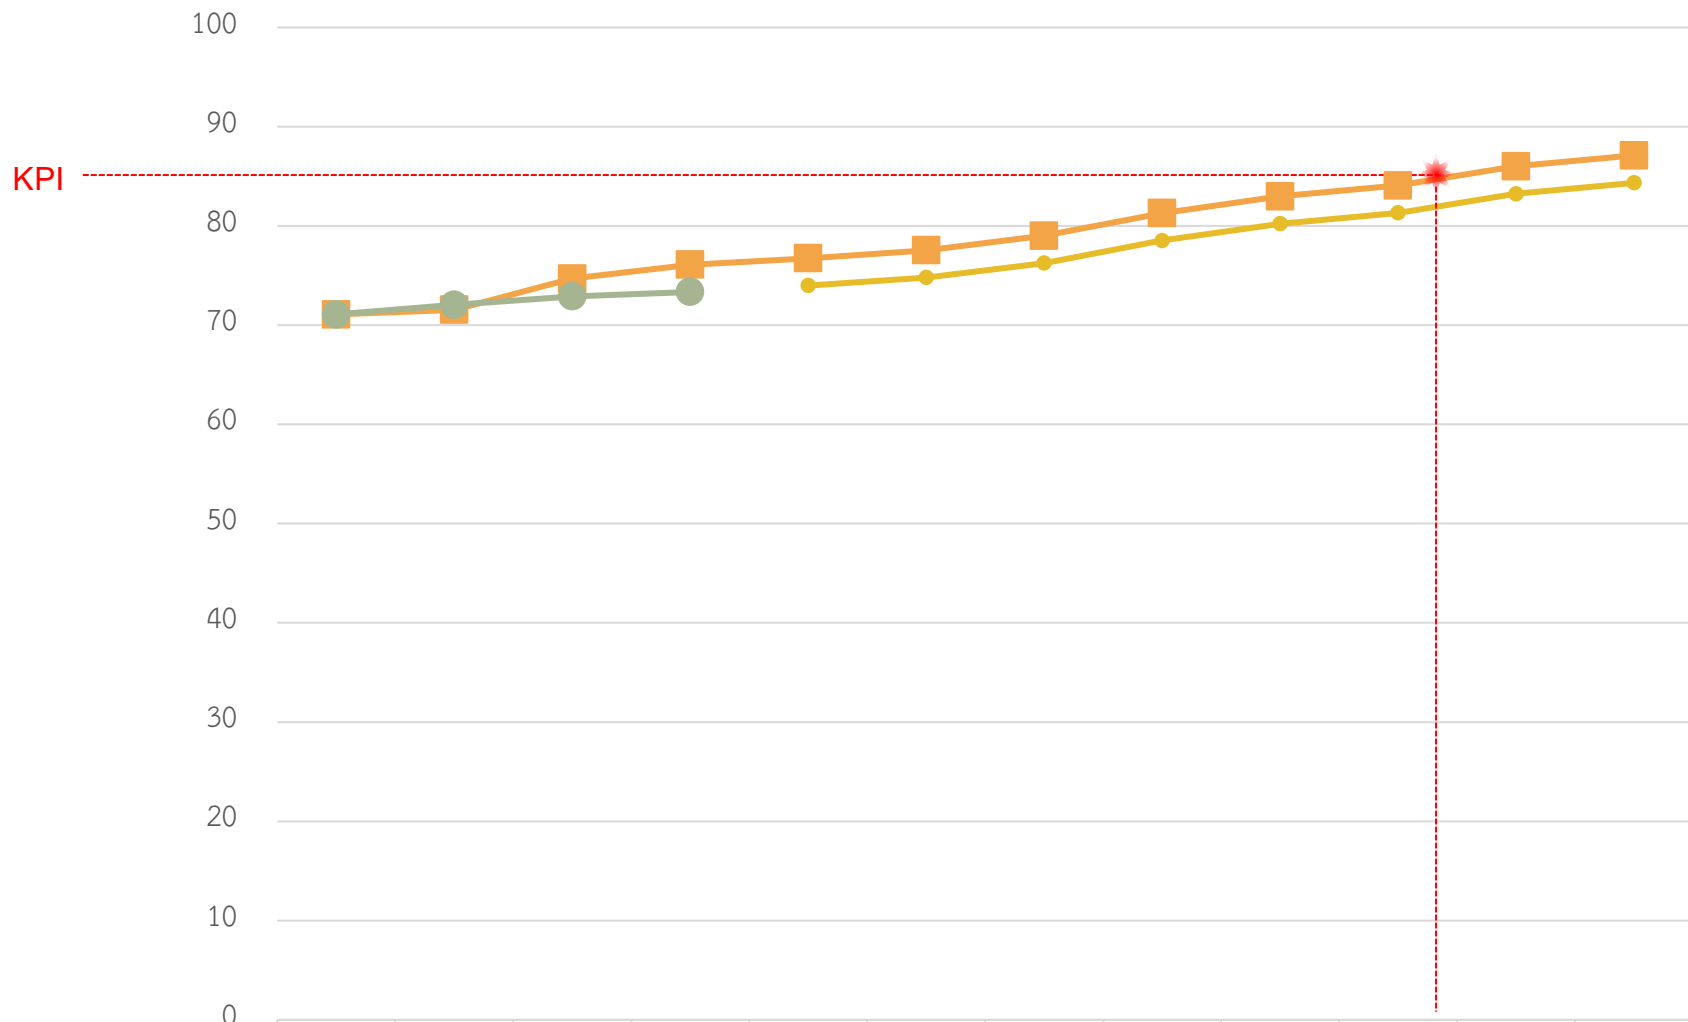

■ %ผู้ใช้ได้คาดการณ์ต้นปี

● ผลงาน %

● %ผู้ใช้ได้คาดการณ์ตามเดือนที่ออกรายงานล่าสุด

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

71.08

71.55

74.69

76.09

76.73

77.55

79.01

81.28

82.97

84.08

86.01

87.11

71.08

72.05

72.91

73.36

74.00

74.81

76.27

78.53

80.22

81.33

83.25


84.35

ตารางข้อมูล RTU และเครื่องวัดอัตราการไหล

Code	Region	Branch	Meter_Code	F	P	F_Code	P_Code	PBC	ติด เหตุ	ยี่ห้อ	ยี่ห้อจาก บริษัท	ชื่อสัญญา	สัญญา กวด.	สัญญา	ปีติดตั้ง	อายุ	ที่อยู่(สัญญา)	ที่อยู่(WLMA)	ยืนยันจากสาขา
1	West	1	DM-01-01-01-01	NA	NA	0	0	0	0	SIEMENS	0	ชล.32- 2/2563	#N/A	TRUE	2563	2	ถ.เจริญสนิทวงศ์ อยู่ ข้างทางรถไฟ ช	ถ.เจริญสนิทวงศ์ อยู่ข้างทางรถไฟ (ใกล้ปาก ทางเข้าที่จอดรถเขตบางกอกน้อย)ช	
1	West	1	DM-01-01-02-01	NA	NA	0	0	1	0	SIEMENS	0	#N/A	#N/A	FALSE	#N/A	#N/A	#N/A	ถ.เจริญสนิทวงศ์ อยู่ข้างทางรถไฟ (ใกล้ปาก ทางเข้าช.วัดสุทธาวาส)	
1	West	1	DM-01-01-02-02	NA	NA	0	0	1	0	ISOIL	0	ชล.31/2564	#N/A	TRUE	2564	1	ถ.อิสราภาพ ตรงข้าม ตลาดบางกอกน้อยช	ถ.อิสราภาพ ตรงข้ามตลาดบางกอกน้อย ประมาณ 100 ม.ก่อนถึงแยกพรวนบก	
1	West	1	DM-01-01-03-01	NA	NA	0	0	1	0	FLOWMAG	0	ชล.23/2563	#N/A	TRUE	2563	2	ถ.อิสราภาพ ตรงปาก ทาง สามแยกบ้าน เนิน	ถ.อิสราภาพ ตรงปากทาง สามแยกบ้านเนิน (หน้าร้านค้า ทบ. 492)	
1	West	1	DM-01-01-03-02	NA	NA	0	0	1	0	SIEMENS	0	ชล.32- 2/2563	#N/A	TRUE	2563	2	ถ.พรวนบก ปาก ทางเข้าวัดวิเศษการ	ถ.พรวนบก ปากทางเข้าวัดวิเศษการ	
2	West	1	DM-01-01-03-03	M0	NA	1	0	1	0	N/A	0	#N/A	#N/A	FALSE	#N/A	#N/A	#N/A	รพ.ศิริราช ประตูดุ	
1	West	1	DM-01-01-04-01	NA	NA	0	0	1	0	ISOIL	0	#N/A	#N/A	FALSE	#N/A	#N/A	#N/A	ถ.อิสราภาพ ปากซอยวัดจตุลเหล็ก	
1	West	1	DM-01-01-05-01	NA	NA	0	0	1	0	ISOIL	0	ชล.31/2564	#N/A	TRUE	2564	1	ถ.เจริญสนิทวงศ์ สะพานคลองมอญ	ถ.เจริญสนิทวงศ์ สะพานคลองมอญ	
999	West	1	DM-01-01-06-01	M0	NA	1	0	1	0	ISOIL	0	ชล.31/2564	#N/A	TRUE	2564	1	ถ.อิสราภาพ หน้า สโมสรทหารเรือ	ถ.อิสราภาพ หน้าสโมสรทหารเรือ	
1	West	1	DM-01-01-06-02	NA	NA	0	0	1	0	ISOIL	0	ชล.31/2564	#N/A	TRUE	2564	1	ถ.พรวนบก ปากซอย บ้านช่างหล่อ	ถ.พรวนบก ปากซอยบ้านช่างหล่อ	
1	West	1	DM-01-02-01-01	NA	NA	0	0	0	0	ABB	0	ชล.52/2565	#N/A	TRUE	2565	0	ถ.บางขุนนนท์ หน้า ธนาคารกรุงไทย สาขา	ถ.บางขุนนนท์ หน้าธนาคารกรุงไทย สาขา บางขุนนนท์	
999	West	1	DM-01-02-01-02	M0	NA	1	0	0	0	ISOIL	0	ชล.31/2564	#N/A	TRUE	2564	1	ถ.บางขุนนนท์ ตรง ข้ามธนาคารกรุงไทย	ถ.บางขุนนนท์ ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์	
1	West	1	DM-01-02-02-01	NA	NA	0	0	0	0	SIEMENS	0	ชล.32- 2/2563	#N/A	TRUE	2563	2	ถ.เจริญสนิทวงศ์ ข้าง ป้ายรถเมล์ (ใกล้ คลอง	ถ.เจริญสนิทวงศ์ ข้างป้ายรถเมล์ (ใกล้คลอง บางขุนนนท์) > ร้อยองงานรถไฟฟ้า	

SCAN หากต้องการดู

รายละเอียดงาน



ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ระดับข้อมูล	จำนวนงาน Step Test	จำนวนงาน สร.	ระยะทางที่เดิน	จำนวนจุดรั่วที่พบ	จำนวนงานซ่อมที่เปิดสปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อจ่าย สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อบริการ สปน.	งานซ่อมท่อจ่าย สปน.	งานซ่อมท่อบริการ สปน.	ไม่พบจุดรั่ว สปน.	อื่นๆ สปน.	ยกเลิกงาน สปน.
กปน.	15	640	3,697	3,474	3,396	42	1,424	18	642	9	59	11
รวก.(กอ)	6	315	1,376	1,277	1,271	24	599	16	393	6	55	10
รวก.(กต)	9	325	2,321	2,197	2,125	18	825	2	249	3	4	1

ระดับข้อมูล	จำนวนงานซ่อมที่เปิดรับแจ้ง	ปิดงานภาคสนามท่อจ่าย – รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนามท่อบริการรับแจ้ง
กปน.	2,988	92	2,385
รวก.(กอ)	1,444	55	1,097
รวก.(กต)	1,544	37	1,288

SCAN หากต้องการดู
รายละเอียดงาน



หมายเหตุ: กรณีทุกตัว DM คาดว่าใช้งานได้หมด จะใช้น้ำเข้า DMA จริงจากอุปกรณ์เครื่องวัดภาคสนาม
กรณีคาดว่ามิบบาง DM ใช้งานไม่ได้ จะใช้น้ำเข้า DMA จากข้อมูลคาดการณ์จากสาขาเดือนก่อนหน้า

***ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน กลส.ฟจส. ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ผลงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2566

สาขา	เป้าหมาย ผลส่งมอบงาน	คาดการณ์ ผลส่งมอบงาน	ผลการลงนาม ปีงบฯ 66	ผลงานปรับปรุงท่อ					
				รายเดือน ม.ค.66			สะสม ต.ค.65-ม.ค.66		
				แผนงาน	ผลงาน	ผลต่าง +/-	แผนงาน	ผลงาน	ผลต่าง +/-
สสส.	75.000	75.000	20.736	5.000	5.831	0.831	12.000	12.707	0.707
สสพ.	62.000	62.000	28.367	4.000	5.240	1.240	19.000	21.204	2.204
สสป.	97.000	97.000	34.612	7.500	9.500	2.000	25.000	27.088	2.088
สสท.	30.000	30.000	7.94	3.000	3.072	0.072	11.000	11.312	0.312
รวม.(n1)	264.000	264.000	91.655	19.500	23.643	4.143	67.000	72.311	5.311
สสญ.	50.000	50.000	3.660	3.900	4.174	0.274	13.100	16.657	3.557
สสม.	20.000	20.000	0	1.000	0.000	(1.000)	1.000	2.782	1.782
สสล.	51.000	51.000	24.321	2.750	5.088	2.338	7.850	16.990	9.140
รวม.(n2)	121.000	121.000	27.981	7.650	9.262	1.612	21.950	36.429	14.479
สสช.	52.000	52.000	7.232	2.000	2.180	0.180	11.000	12.210	1.210
สสข.	35.000	35.000	35.213	5.000	6.561	1.561	11.300	12.987	1.687
สสมบ.	40.000	40.000	16.811	5.000	6.070	1.070	5.000	16.468	11.468
สสสภ.	25.000	25.000	9.698	1.000	3.133	2.133	3.500	9.770	6.270
รวม.(n3)	152.000	152.000	68.954	13.000	17.944	4.944	30.800	51.435	20.635
รวม.(กอ)	537.000	537.000	188.59	40.150	50.849	10.699	119.750	160.175	40.425
สสบ.	95.000	95.000	97.575	4.900	1.421	(3.479)	14.000	10.686	(3.314)
สสด.	74.000	74.000	51.898	3.000	7.959	4.959	8.000	15.227	7.227
สสภ.	90.000	90.000	32.677	3.000	3.762	0.762	5.500	6.683	1.183
สสว.	70.000	70.000	32.597	3.000	3.074	0.074	10.000	10.195	0.195
รวม.(n4)	329.000	329.000	214.747	13.900	16.216	2.316	37.500	42.791	5.291
สสน.	75.000	75.000	28.206	4.000	5.257	1.257	11.000	13.305	2.305
สสบท.	48.000	48.000	0	6.000	6.828	0.828	14.000	20.661	6.661
สสมส.	61.000	61.000	28.048	7.400	3.462	(3.938)	30.300	28.188	(2.112)
รวม.(n5)	184.000	184.000	56.254	17.400	15.547	(1.853)	55.300	62.154	6.854
รวม.(กค)	513.000	513.000	271.001	31.300	31.763	0.463	92.800	104.945	12.145
Agenda base	150.000	150.000	18.184	11.000	15.803	4.803	24.000	43.039	19.039
กปน.	1200.000	1200.000	477.775	82.450	98.415	15.965	236.550	308.159	71.609

หมายเหตุ : 1. คาดการณ์ผลการส่งมอบงานปีงบประมาณ 2566 จาก สกส. สำนักงานประชาสัมพันธ์และ ABS

2. ผลการลงนามปีงบฯ 66 จาก Google sheet ณ วันที่ ณ 8 ก.พ. 66 และผลงานปรับปรุงท่อรายเดือน จาก Google sheet ณ วันที่ ณ 2 ก.พ.66

3. ผลงานปรับปรุงท่อที่มีผลลดน้ำสูญเสียรวมอยู่สะสม 0.918 กิโลเมตร

การติดตามงานปรับปรุงท่อฯ ปีงบประมาณ 2566

เป้าเดิม

ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	ก.พ.66		เม.ย.66	สิ้นปี
		Threshold	Trigger		
KRI (ผลเบิกจ่าย)	ฝบส.	1100	1150	1200	1200
KPI (ผลส่งมอบ)	ฝนย.		320		1200


เป้าใหม่

ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	ก.พ.66		เม.ย.66	สิ้นปี
		Threshold	Trigger		
KRI (ผลเบิกจ่าย)	ฝบส.	1210	1240	1270	1270
KPI (ผลส่งมอบ)	ฝนย.		???		1270

เบิกจ้างงานปรับปรุงท่อฯ ปีงบประมาณ 2566

ผลการเบิกจ่ายสะสม ปีงบประมาณ 2566 เทียบแผนเบิกจ่ายสะสมที่ 1,200 กม.

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ. 66 ผลการเบิกจ่ายสะสม = 1,200.441 กม.

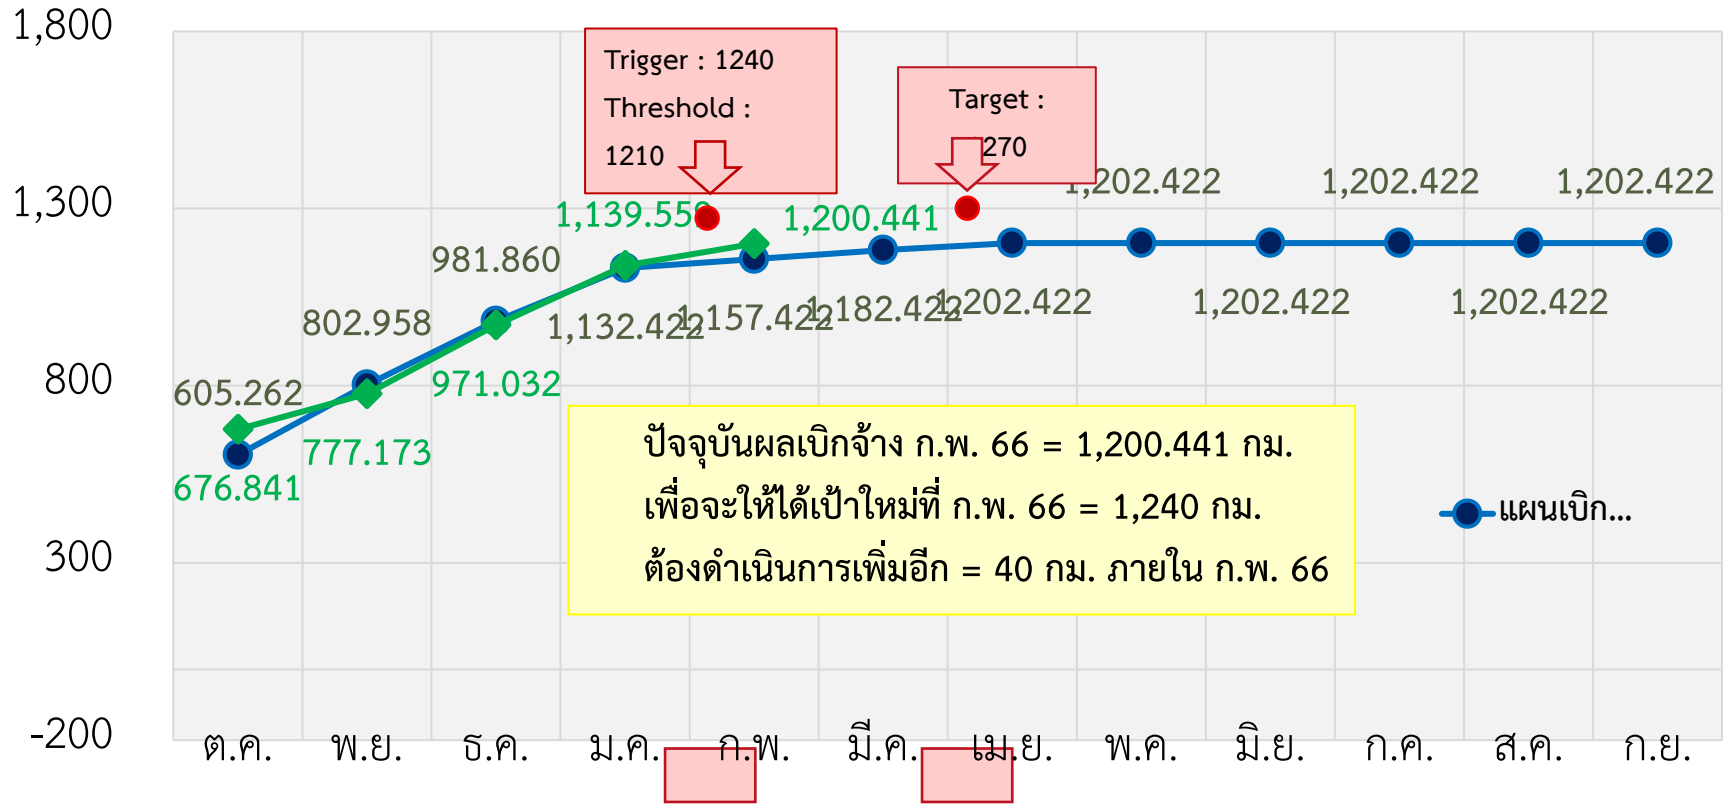

สาขายืนยันความยาวของสัญญา ป.65 ที่เบิกจ่ายหลัง 30 เม.ย. 65 และสัญญานั้นต้องยังไม่มีผลส่งมอบงานในปีงบฯ 65
 (ในกรณีที่ผู้บริหารเห็นชอบให้นำมารวมกับความยาวเบิกจ่ายปีงบฯ 66 (สัญญา ป.66) สำหรับการ
 ประเมินผล KRI ผลงานเบิกจ่ายของปีงบฯ 66)

สัญญาที่ตรงกับเงื่อนไขข้างต้น ความยาวรวม 31.768 กม.

สาขา	สัญญา	ความยาวจาก google sheet (กม.)
สสน.	ป.04-29(65)	0.618
สสน.	ป.04-28(65)	2.853
สสน.	ป.04-27(65)	0.360
สสน.	ป.04-26(65)	0.222
สสน.	ป.04-25(65)	3.871
สสน.	ป.04-23(65)	0.21
สสน.	ป.04-22(65)	0.332
สสม.	ป.06-11(65)	3.407
สสม.	ป.06-08(65)	0.035


สาขา	สัญญา	ความยาวจาก google sheet (กม.)
สสภ.	ป.11-28(65)	2.603
สสภ.	ป.11-27(65)	0.325
สสว.	ป 14-19(65) ครั้งที่ 2	4.500
สสบท.	ป.54-25(65)	6.999
สสมส.	ป.56-27(65)	3.959
สสมส.	ป.56-23(65)	0.252
สสมส.	ป.56-21(65)	0.51
สสมส.	ป.56-20(65)	0.548
สสมส.	ป.56-19(65)	0.164
รวม		31.768

ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 10 กม. เพื่อจะบรรลุเป้าเบิกจ่ายที่ 1,240 กม. (วัดผล KRI ก.พ. 66)
 ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 40 กม. เพื่อจะบรรลุเป้าเบิกจ่ายที่ 1,270 กม. (วัดผล KRI เม.ย. 66)

ส่งมอบงานปรับปรุงท่อฯ ปีงบประมาณ 2566

แผนส่งมอบงานปรับปรุงท่อฯ สะสม ปีงบประมาณ 2566 เดิม (1,200 กม.)

ขอให้สาขาคาดการณ์แผนส่งมอบงานปรับปรุงท่อฯ รายเดือนตามเป้าใหม่ (1,270 กม.)

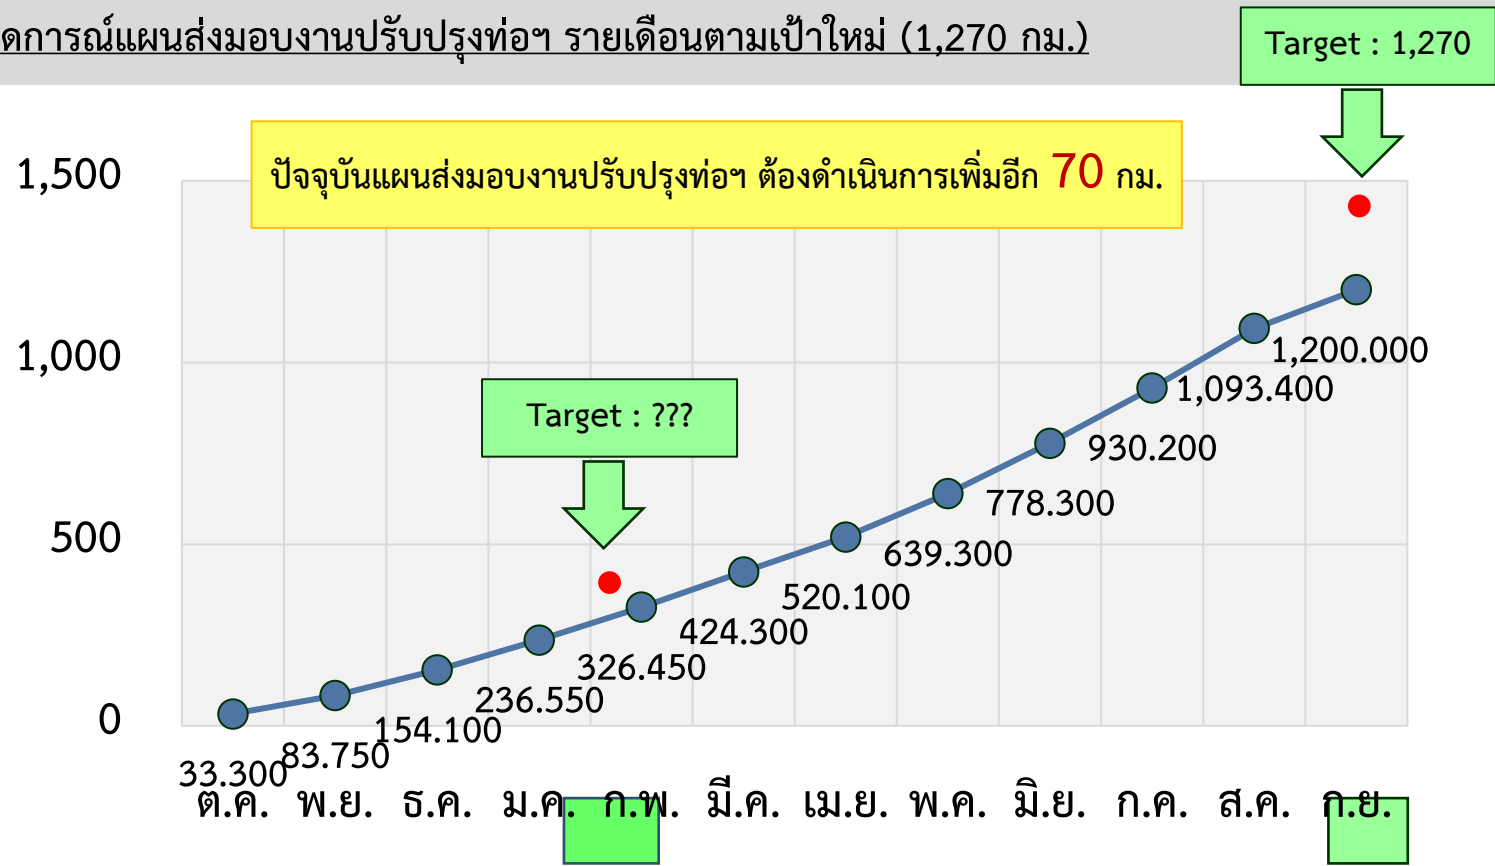

คาดการณ์ผลส่งมอบงาน งานปรับปรุงท่อฯ ปีงบประมาณ 2566

หน่วย : กิโลเมตร

สาขา/ Agenda base	คาดการณ์จะส่งมอบงานในปีงบฯ 66 สัญญา ป. (1)	คาดการณ์จะส่งมอบงานในปีงบฯ 66 PBC (2)	รวมคาดการณ์จะส่งมอบฯปีงบฯ 66 (1)+(2)	คาดการณ์จะส่งมอบงานในปีงบฯ 66 ปรับปรุงกำลังน้ำ
สสส.	75.000	0.000	75.000	2.000
สสพ.	62.000	0.000	62.000	2.000
สสป.	97.000	5.000	102.000	
สสท.	30.000	0.000	30.000	
ขวก.(ก1)	264.000	5.000	269.000	4.000
สสญ.	49.690	2.640	52.330	
สสม.	20.000	1.000	21.000	2.000
สสล.	51.000	0.000	51.000	
ขวก.(ก2)	120.690	3.640	124.330	2.000
สสช.	52.000	2.000	54.000	3.000
สสข.	35.000	0.000	35.000	1.542
สสมบ.	40.000	0.000	40.000	
สสสภ.	25.000	0.000	25.000	
ขวก.(ก3)	152.000	2.000	154.000	4.542
รวก.(กอ)	536.690	10.640	547.330	10.542
สสป.	95.000	1.256	96.256	
สสต.	74.000	0.000	74.000	
สสภ.	85.000	5.000	90.000	1.000
สสว.	70.000	0.000	70.000	0.000
ขวก.(ก4)	324.000	6.256	330.256	1.000
สสน.	75.000	0.000	75.000	
สสบท.	70.000	0.000	70.000	
สสมส.	66.021	0.000	66.021	
ขวก.(ก5)	211.021	0.000	211.021	0.000
รวก.(กต)	535.021	6.256	541.277	1.000
Agenda base	150.000	0.000	150.000	0.000
กปน.	1,221.711	16.896	1,238.607	11.542

- อัปเดตผลการคาดการณ์งานปรับปรุงกำลังน้ำ ณ วันที่ 9 ก.พ.66

คาดการณ์งานค้างและผลส่งมอบงาน งานปรับปรุงท่อฯ ปีงบประมาณ 2566

สาขา Appendix Table	คาดการณ์ผลส่งมอบงานปีงบประมาณ 66 สัญญา ป. (1)	คาดการณ์ผลส่งมอบงานปีงบประมาณ 66 PBC (2)	รวมคาดการณ์ผลส่งมอบงานปีงบประมาณ 66 (1)+(2)	คาดการณ์ผลส่งมอบงานปีงบประมาณ 66 ปรับปรุงกำลังน้ำ
สสส.	75.000	0.000	75.000	2.000
สสพ.	62.000	0.000	62.000	2.000

สาขาคาดการณ์ปีงบฯ 66 ผลงานส่งมอบงานปรับปรุงท่อฯ อยู่ที่ 1,221.711 กม. และ PBC อยู่ที่ 16.896 กม. ปรับปรุงกำลังน้ำ อยู่ที่ 11.542 กม. รวมเป็น 1,250.149 กม.

ดำเนินการเพิ่มอีกประมาณ 20 กม.

ปรับปรุงกำลังน้ำ สาขายังส่งมาไม่ครบ ถ้าได้ข้อมูลครบคาดการณ์การดำเนินการเพิ่มเติม
อาจน้อยลง

รวม(งบค.)	1,221.711	16.896	1,238.607	11.542
สสส.	75.000	0.000	75.000	
สสพ.	70.000	0.000	70.000	
สสมส.	66.021	0.000	66.021	
รวม(งบค.)	211.021	0.000	211.021	0.000
รวม(กต)	535.021	6.256	541.277	1.000
Appendix Table	1,650.000	0.000	1,650.000	0.000
กปน.	1,221.711	16.896	1,238.607	11.542

เรื่องอื่นๆ

การกรอกข้อมูล MNF ปีงบประมาณ 2565 และ 2566

ผลการติดตามการกรอกข้อมูล MNF และ DMA ปีงบประมาณ 2566



ปัจจุบันสาขายังไม่ดำเนินการกรอก MNF ในเส้นทางที่ส่งมอบงาน (ข้อมูล ณ 7 ก.พ. 66)

[illegible]

ชื่อ “งาน ป-66 สกส
กรอก”

ผลการติดตามการกรอกข้อมูล MNF ปีงบประมาณ 2565

ปัจจุบันการกรอก MNF คิดเป็น 18.8% ของเส้นทางส่งมอบแล้ว (ข้อมูล ณ 7 ก.พ. 66)

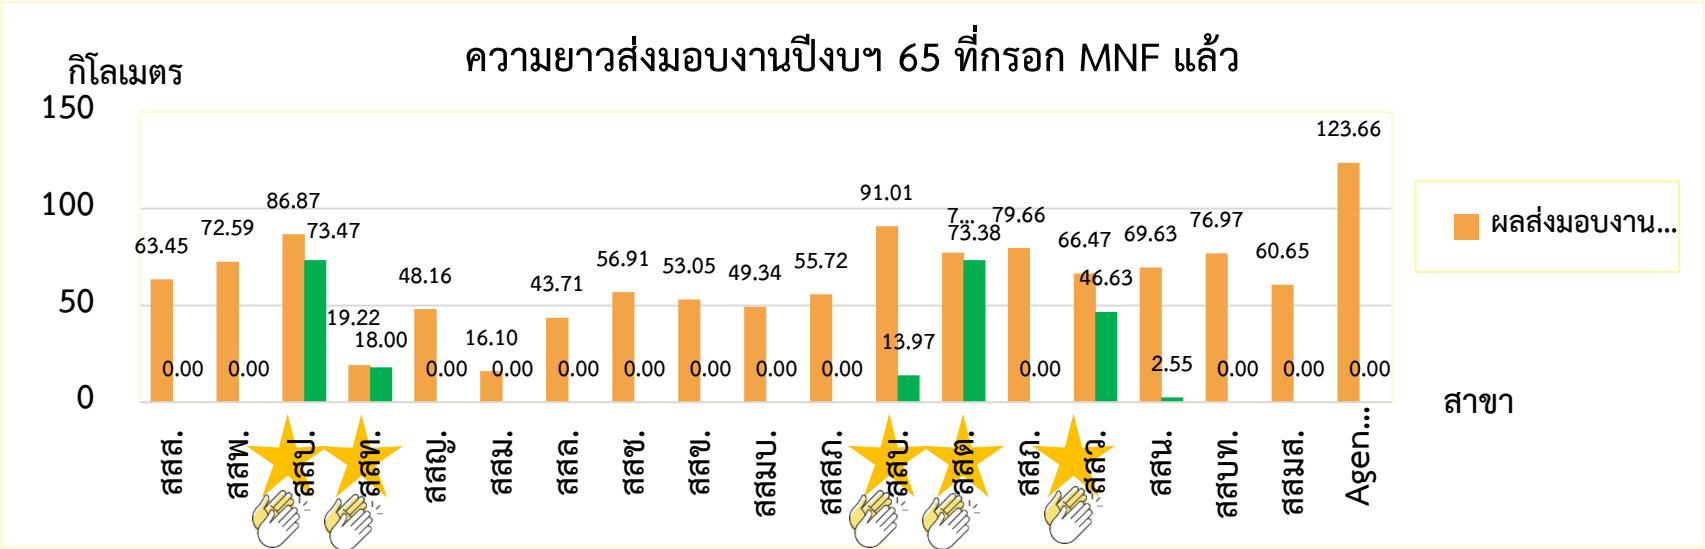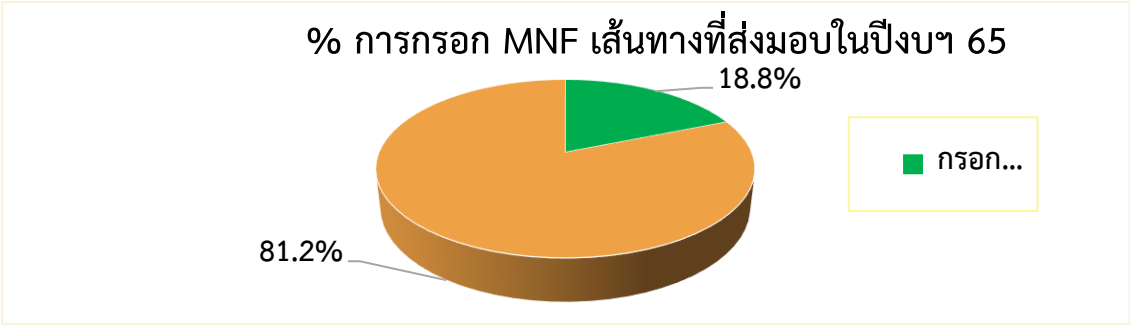

เรื่องอื่นๆ

การเสนอขอยกเว้น (Waive) เส้นทางที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ขอให้สาขาจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการขอ waive เส้นทางที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- Timeline กิจกรรมตามแผนงาน รายสัญญา/รายเส้นทาง ที่จะเสนอขอยกเว้น (waive) ว่าได้รับผลกระทบอย่างไร สาเหตุที่ได้รับผลกระทบ ช่วงเวลาใดของสัญญา จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ 2566
- แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค เพื่อแสดงให้เห็นว่า กปน. ได้พยายามบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างสุดความสามารถแล้ว
- เอกสาร/หลักฐานประกอบ เช่น หนังสือของ กปน. หนังสือจากหน่วยงานภายนอก นโยบายภาครัฐ หนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ หนังสืออนุญาตให้เข้าพื้นที่ของ กทม. ประกาศ ครม. เป็นต้น



ผลการดำเนินงานจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย (PBC) ปีงบประมาณ 2566

สัญญาจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย (PBC) จำนวนทั้งสิ้น 13 สัญญา

สาขา	สัญญาเลขที่	วันเริ่มงาน	สถานะปัจจุบัน	Base Line	อัตราน้ำสูญเสีย ณ ม.ค. 66	ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยที่ลดได้ ของปีงบประมาณ 2566
มหาสวัสดิ์	จบส.2/2565	6-พ.ค.-65	ดำเนินการตามสัญญา	50.34	45.02	590,212.07
สุขสวัสดิ์	จบส.3/2565	9-พ.ค.-65	ดำเนินการตามสัญญา	55.56	47.49	375,876.57
ภาษีเจริญ	จบส.1/2562	1-ต.ค.-64	ดำเนินการตามสัญญา	48.49	49.03	360,731.01
พระโขนง	จบส.1/2565	7-มิ.ย.-65	ดำเนินการตามสัญญา	43.62	38.68	315,679.33
ตากลีน	จบส.1/2563	1-ม.ค.-65	ดำเนินการตามสัญญา	60.71	56.77	249,509.21
สุขุมวิท	จบส.4/2565	1-ส.ค.-65	ดำเนินการตามสัญญา	39.48	31.97	202,038.26
สมุทรปราการ	จบส.2/2562	11-ต.ค.-64	ดำเนินการตามสัญญา	43.33	36.08	133,259.82
ประชาชื่น	จบส.8/2565	6-พ.ค.-65	ดำเนินการตามสัญญา	42.51	39.21	131,770.25
แมนศรี	จบส.7/2565	6-พ.ค.-65	ดำเนินการตามสัญญา	51.64	38.93	119,570.05
สุวรรณภูมิ	จบส.9/2565	25-ก.ค.-65	ดำเนินการตามสัญญา	30.86	26.50	116,900.95
ทุ่งมหาเมฆ	จบส.5/2565	6-พ.ค.-65	ดำเนินการตามสัญญา	46.49	42.04	115,534.64
บางกอกน้อย	จบส.8/2563	1-ธ.ค.-64	ดำเนินการตามสัญญา	54.21	49.38	90,682.63
พญาไท	จบส.6/2565	6-พ.ค.-65	ดำเนินการตามสัญญา	37.32	36.59	12,228.61

หมายเหตุ : ข้อมูลสถานะอ้างอิงจากหน่วยงานฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฝจส.) ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566


ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.2/2565 พื้นที่สาขามหาสวัสดิ์

อัตราการสูญเสีย (%)

วันที่แจ้งเริ่มงาน 6-พ.ค.-65

ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยปี 66 ที่ลดได้ : 590,212.07 ลบ.ม./เดือน

BASE LINE

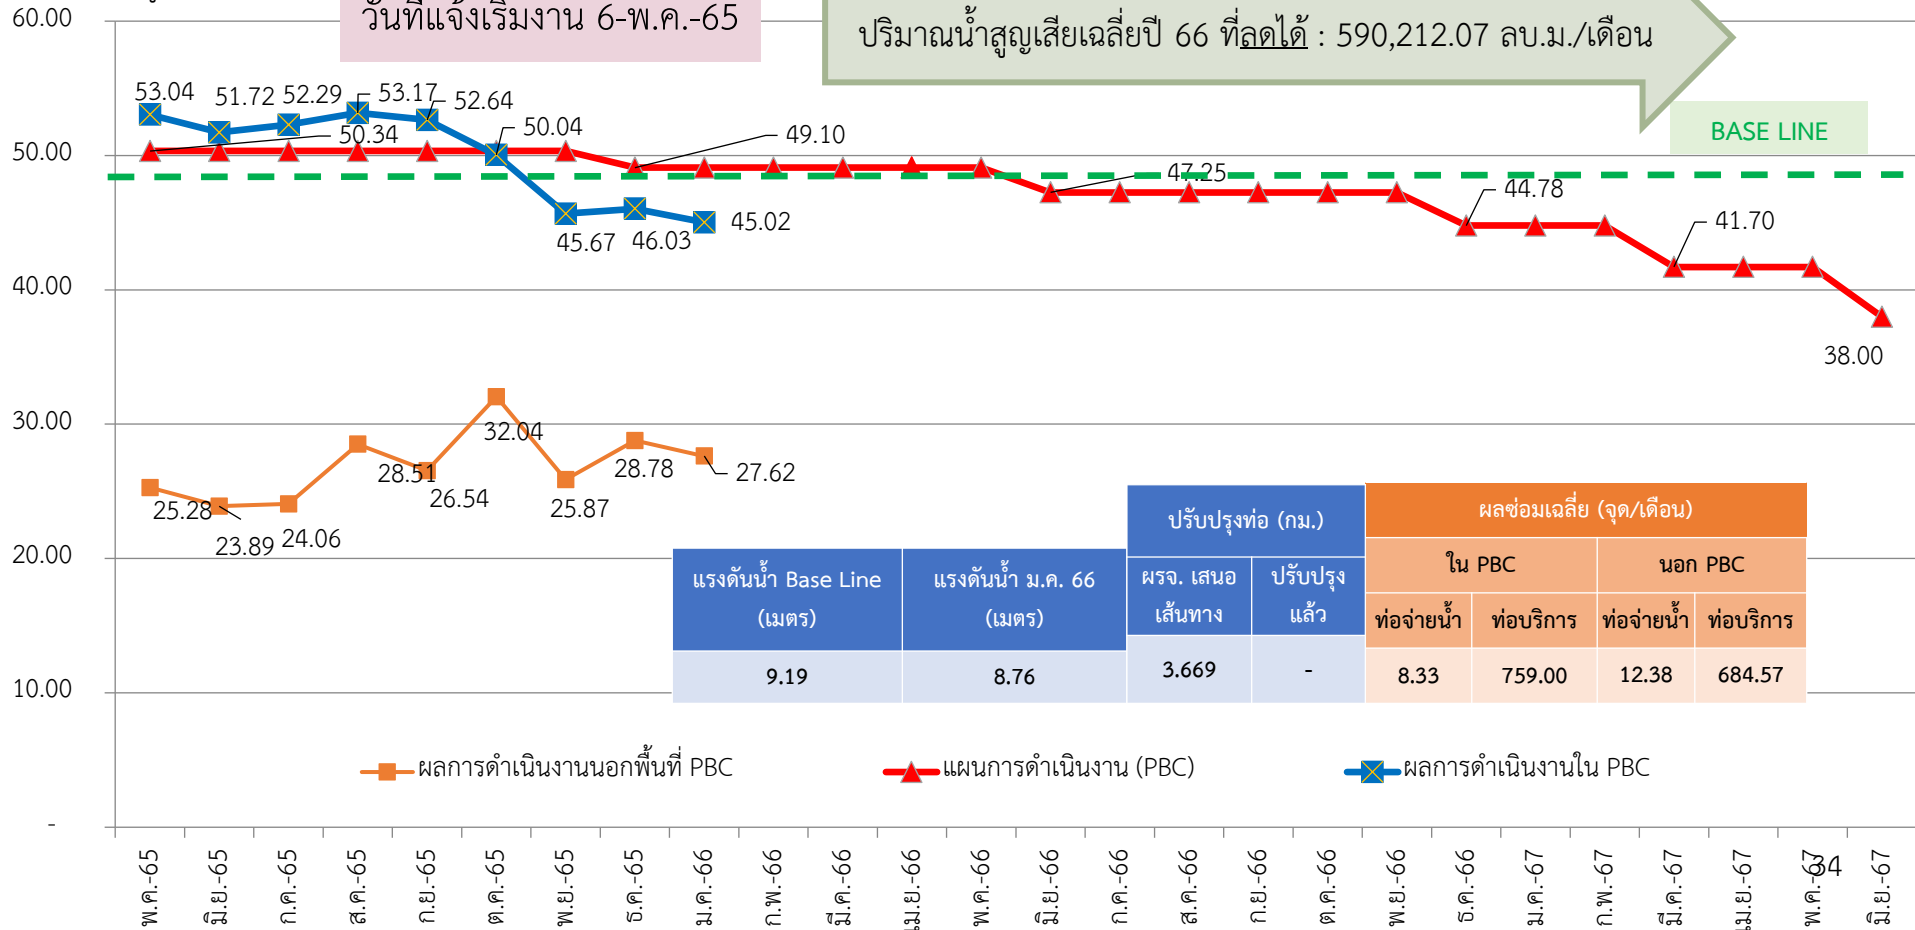

■ ผลการดำเนินงานนอกพื้นที่ PBC

▲ แผนการดำเนินงาน (PBC)

■ ผลการดำเนินงานใน PBC

ปรับปรุงท่อ (กม.)		ผลซ่อมเฉลี่ย (จุด/เดือน)			
พรจ. เสนอ เส้นทาง	ปรับปรุง แล้ว	ใน PBC		นอก PBC	
		ท่อจ่ายน้ำ	ท่อบริการ	ท่อจ่ายน้ำ	ท่อบริการ
3.669	-	8.33	759.00	12.38	684.57

แรงดันน้ำ Base Line
(เมตร)

9.19

แรงดันน้ำ ม.ค. 66
(เมตร)

8.76


ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.3/2565 พื้นที่สาขาสุขสวัสดิ์

อัตราน้ำสูญเสีย (%)

วันที่แจ้งเริ่มงาน 9-พ.ค.-65

ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยปี 66 ที่ลดได้ : 375,876.57 ลบ.ม./เดือน

BASE LINE

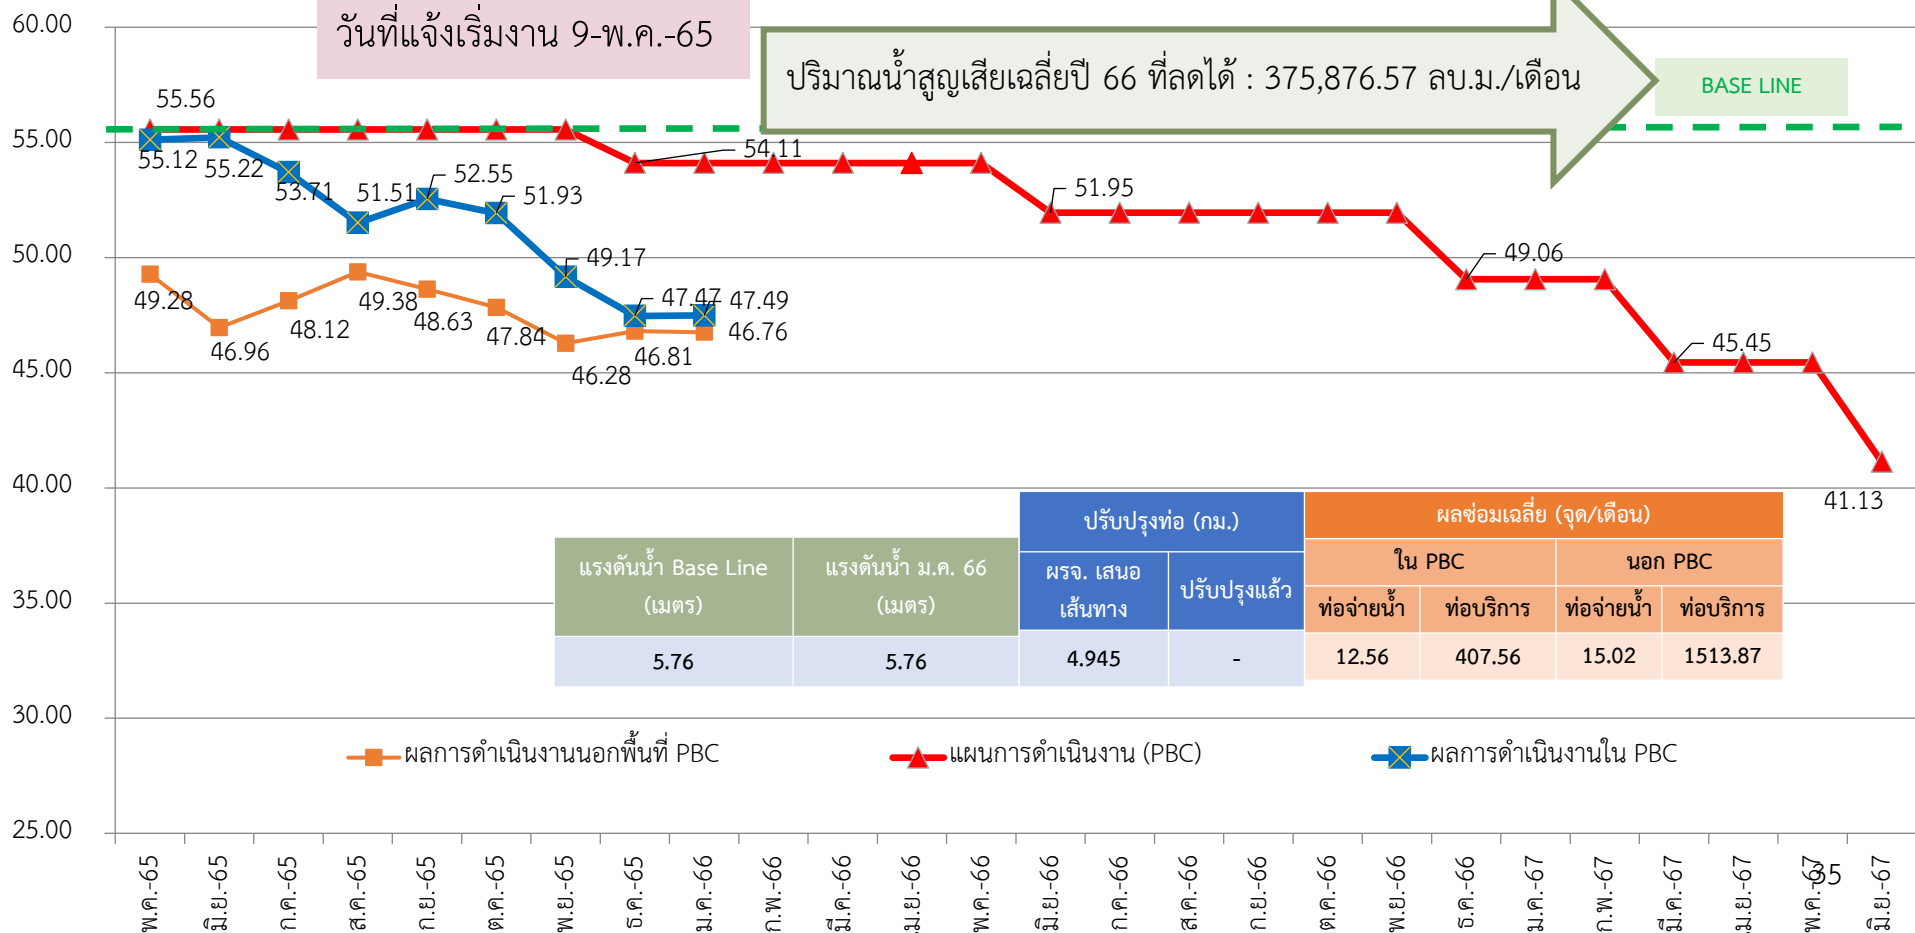

แรงดันน้ำ Base Line (เมตร)
5.76

แรงดันน้ำ ม.ค. 66 (เมตร)
5.76

ปรับปรุงท่อ (กม.)	
ผวจ. เสนอเส้นทาง	ปรับปรุงแล้ว
4.945	-

ผลซ่อมเฉลี่ย (จุด/เดือน)			
ใน PBC		นอก PBC	
ท่อจ่ายน้ำ	ท่อบริการ	ท่อจ่ายน้ำ	ท่อบริการ
12.56	407.56	15.02	1513.87


ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.1/2562 พื้นที่สาขาภาษีเจริญ

อัตราการสูญเสีย (%)

วันที่แจ้งเริ่มงาน 1-ต.ค.-64


ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยปี 66 ที่ลดได้ : 360,731.01 ลบ.ม./เดือน

BASE LINE

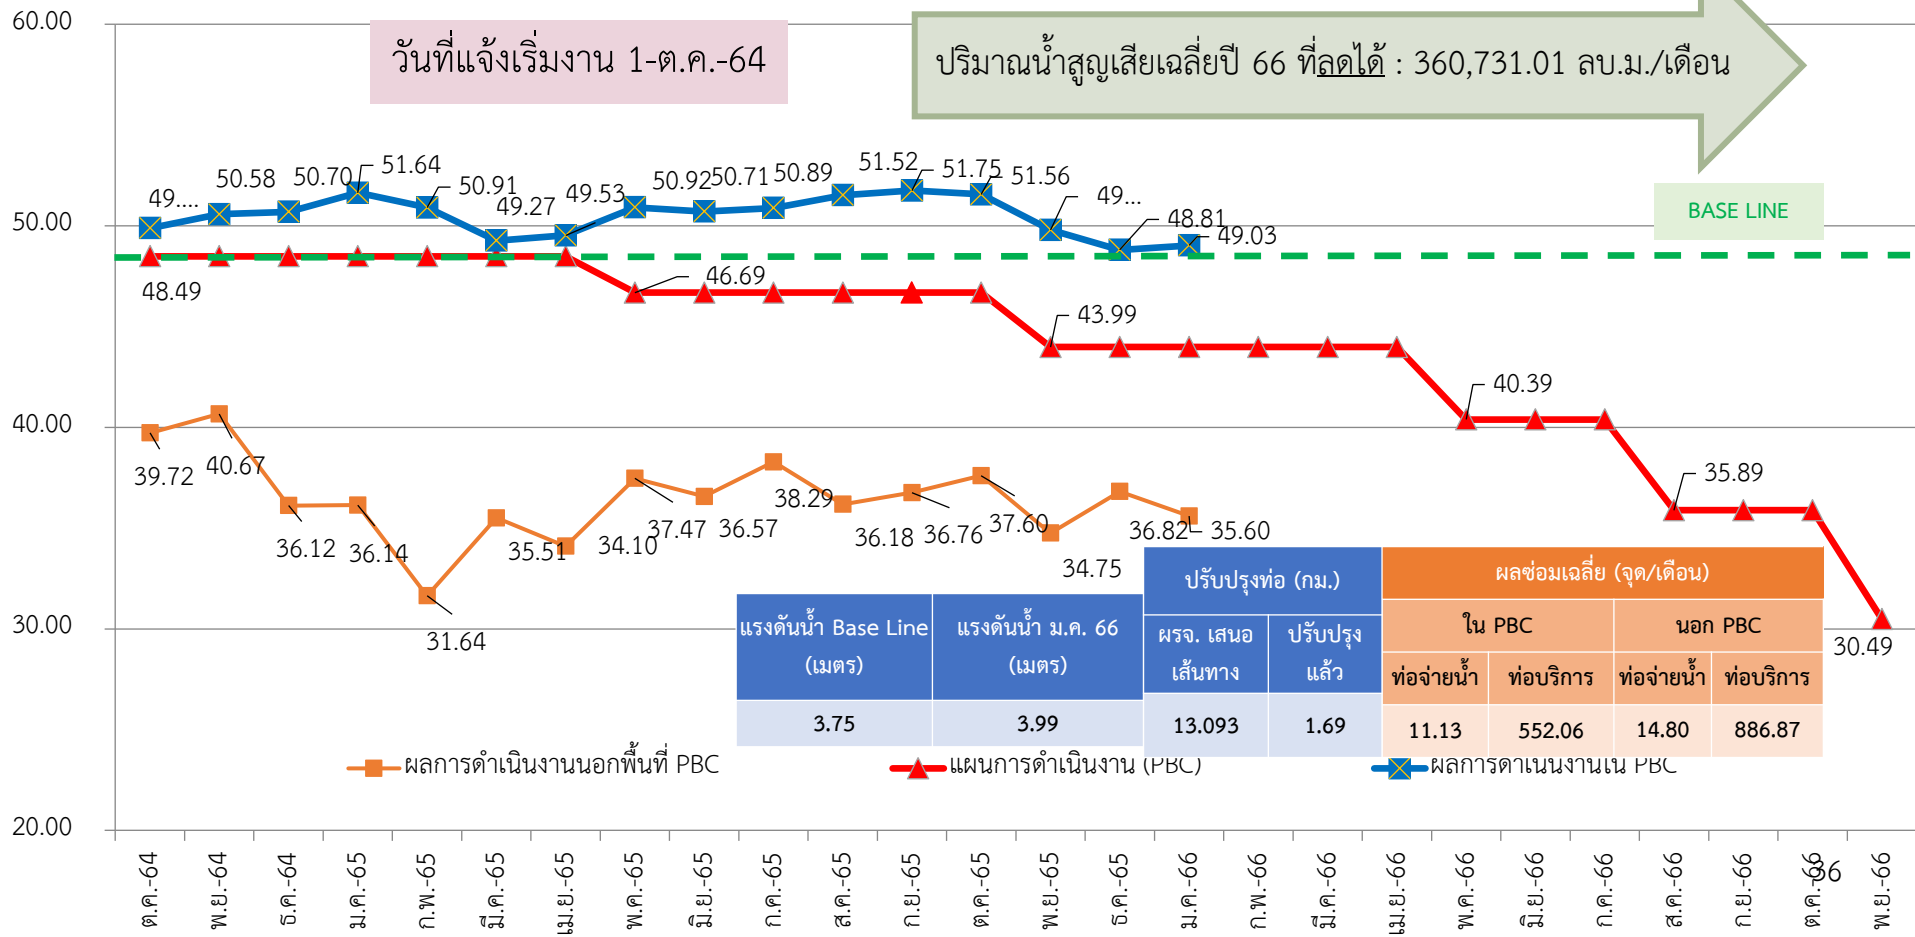

ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.1/2565 พื้นที่สาขาพระโขนง

อัตราน้ำสูญเสีย (%)

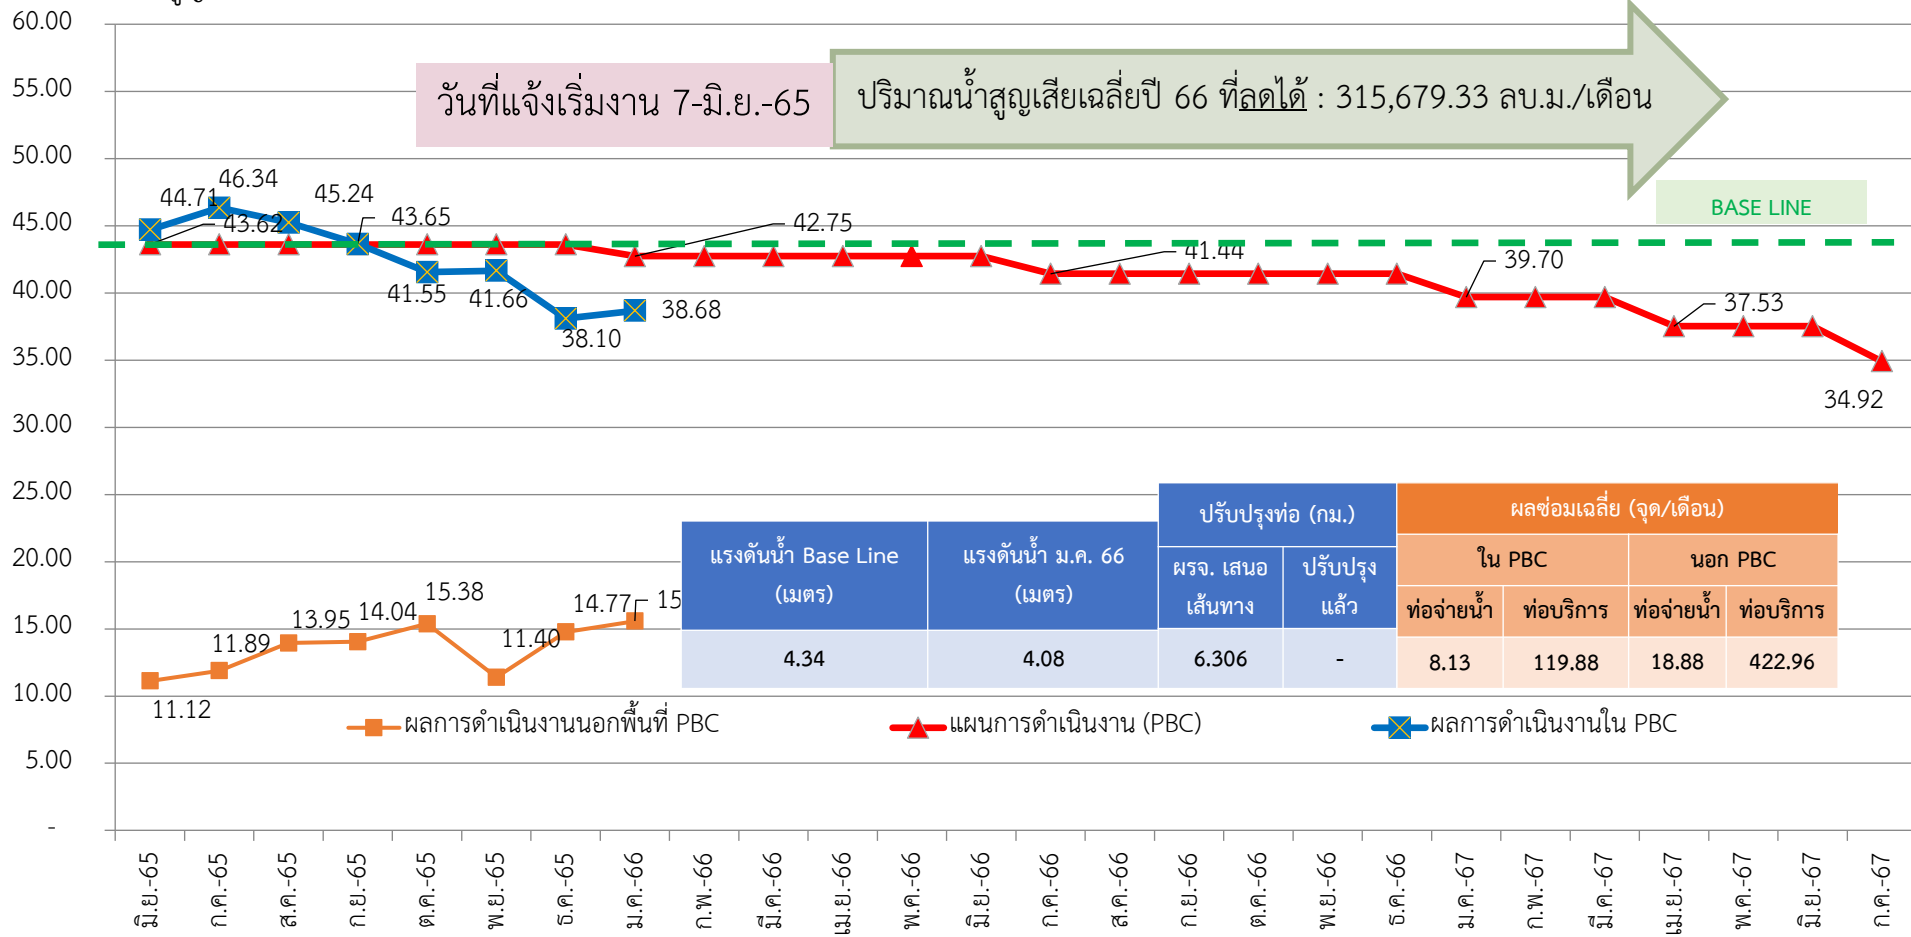


ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.1/2563 พื้นที่สาขาทากสิน

อัตราน้ำสูญเสีย (%)

วันที่แจ้งเริ่มงาน 1-ม.ค.-65

ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยปี 66 ที่ลดได้ : 249,509.21 ลบ.ม./เดือน


BASE LINE

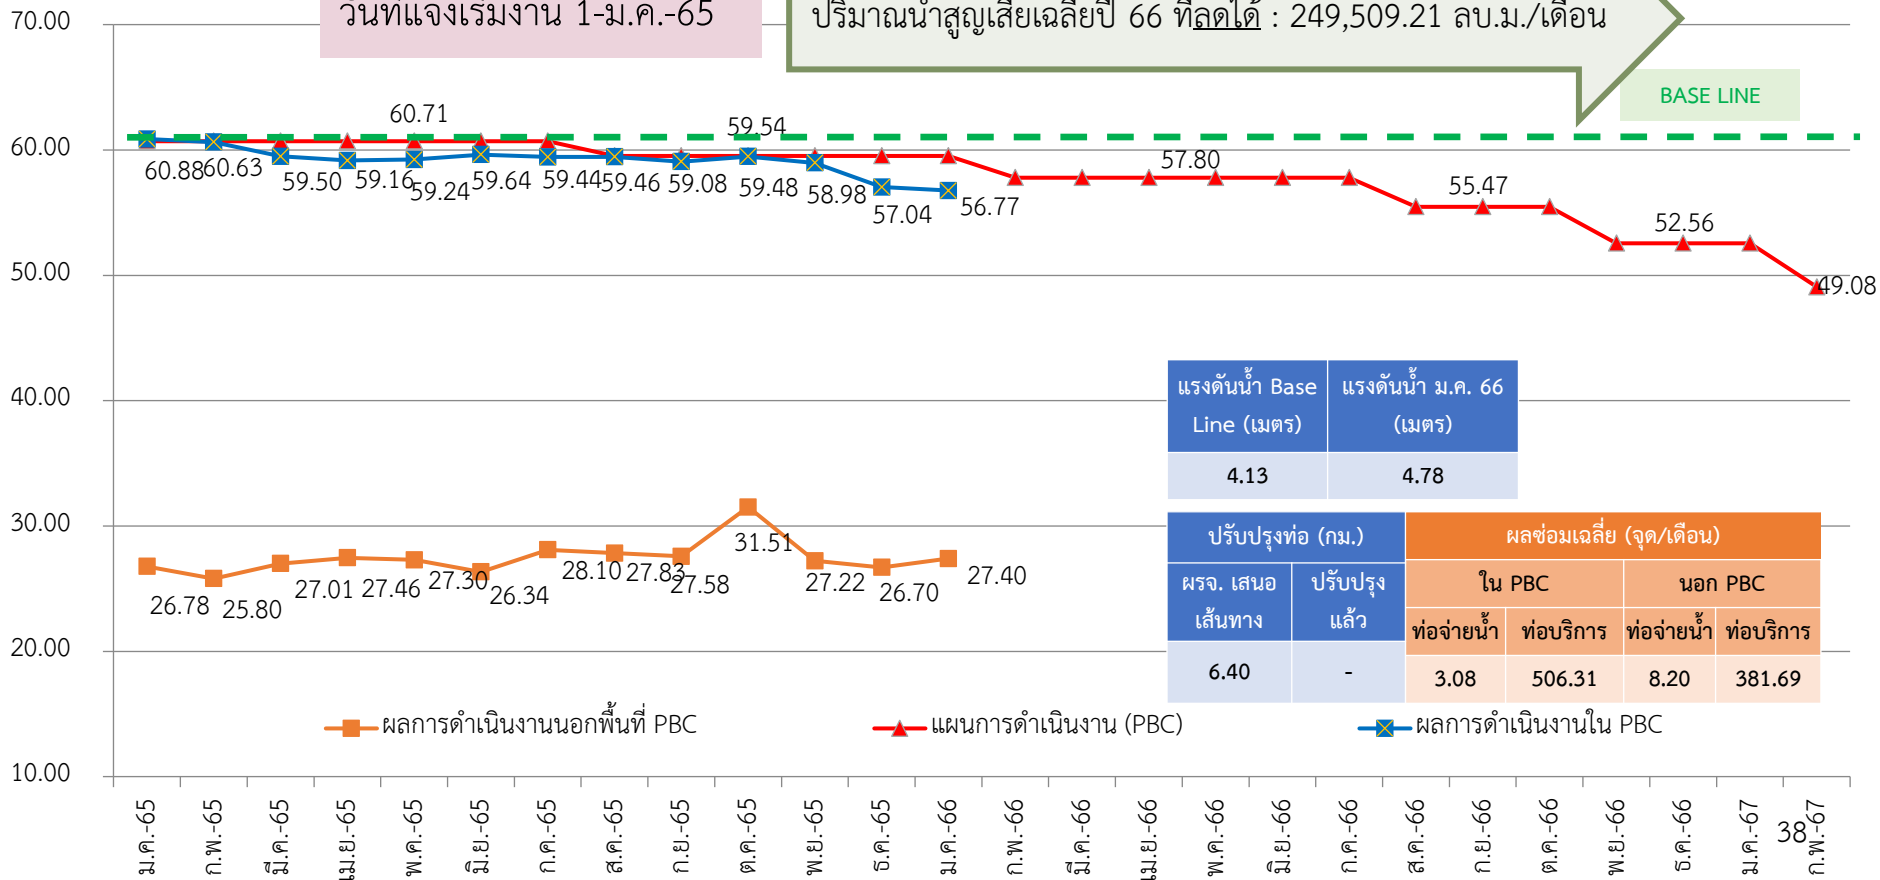

แรงดันน้ำ Base Line (เมตร)	แรงดันน้ำ ม.ค. 66 (เมตร)
4.13	4.78

ปรับปรุงท่อ (กม.)		ผลซ่อมเฉลี่ย (จุด/เดือน)			
พรจ. เสนอเส้นทาง	ปรับปรุงแล้ว	ใน PBC		นอก PBC	
		ท่อจ่ายน้ำ	ท่อบริการ	ท่อจ่ายน้ำ	ท่อบริการ
6.40	-	3.08	506.31	8.20	381.69

ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.4/2565 พื้นที่สาขาสุขุมวิท

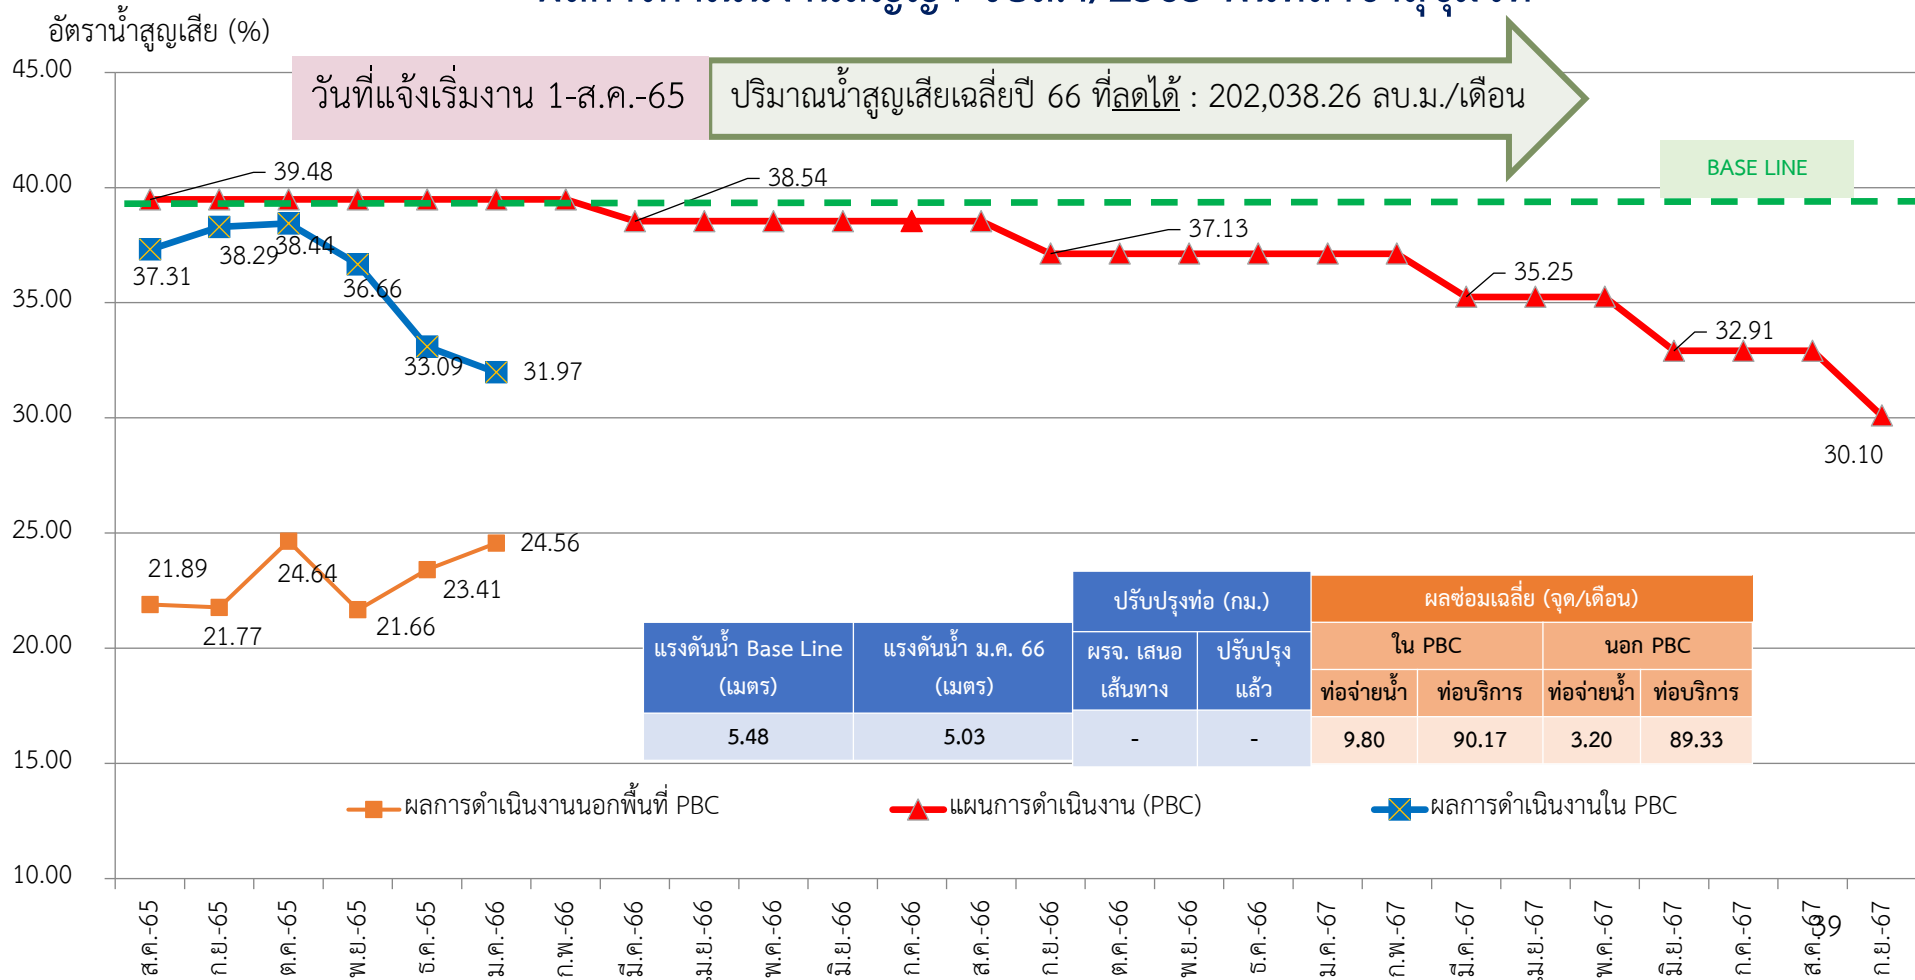


ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.2/2562 พื้นที่สาขาสมุทรปราการ

อัตราน้ำสูญเสีย (%)

วันที่แจ้งเริ่มงาน 11-ต.ค.-64

ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยปี 66 ที่ลดได้ : 133,259.82 ลบ.ม./เดือน

BASE LINE

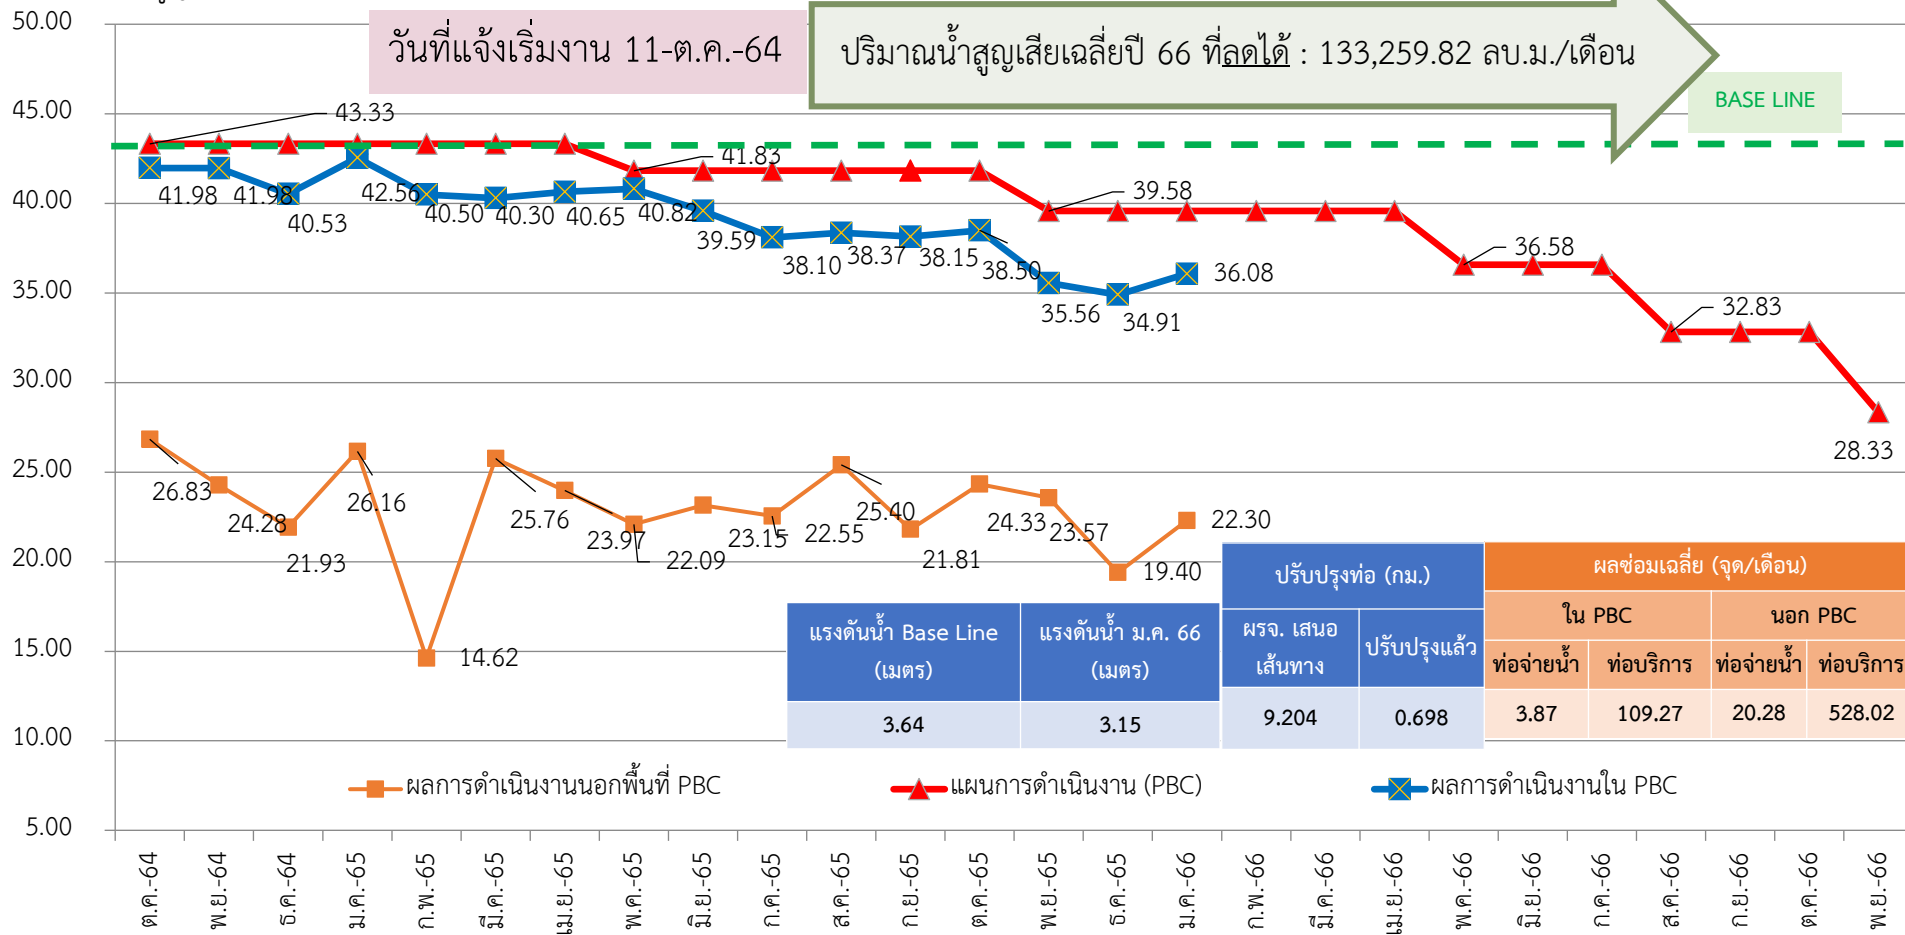


ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.8/2565 พื้นที่สาขาประชาชน

อัตราน้ำสูญเสีย (%)


วันที่แจ้งเริ่มงาน 6-พ.ค.-65

ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยปี 66 ที่ลดได้ : 131,770.25 ลบ.ม./เดือน

BASE LINE

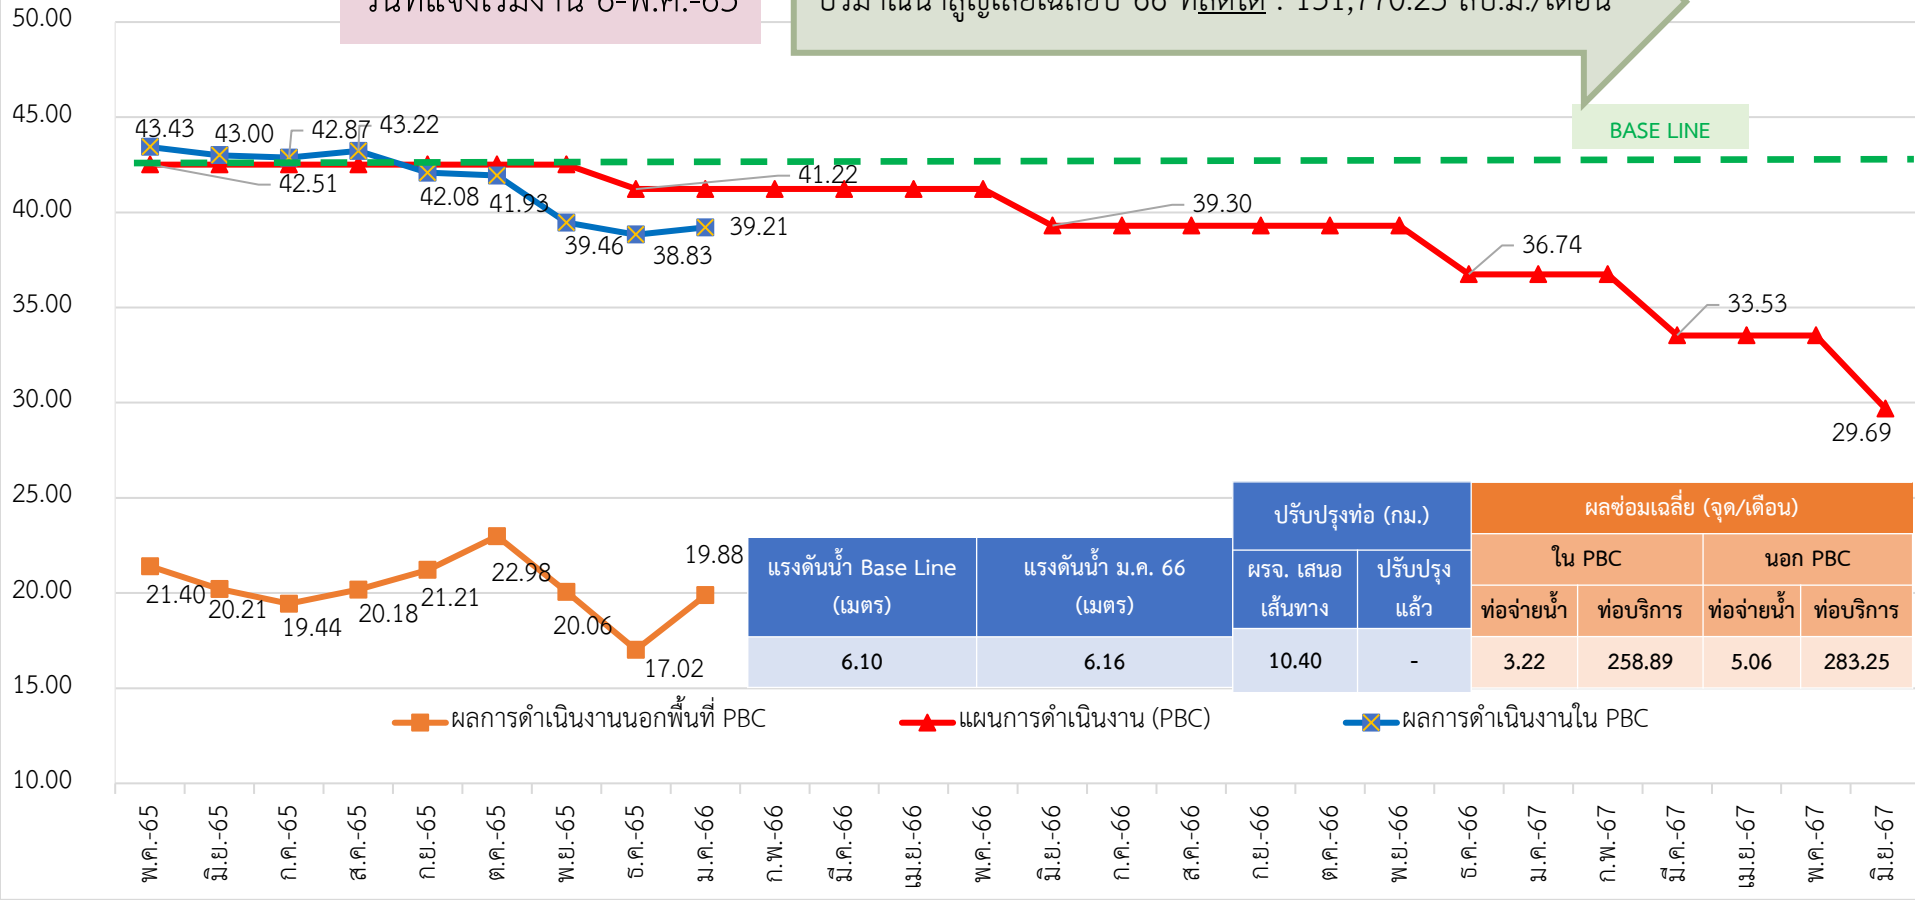

ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.9/2565 พื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ

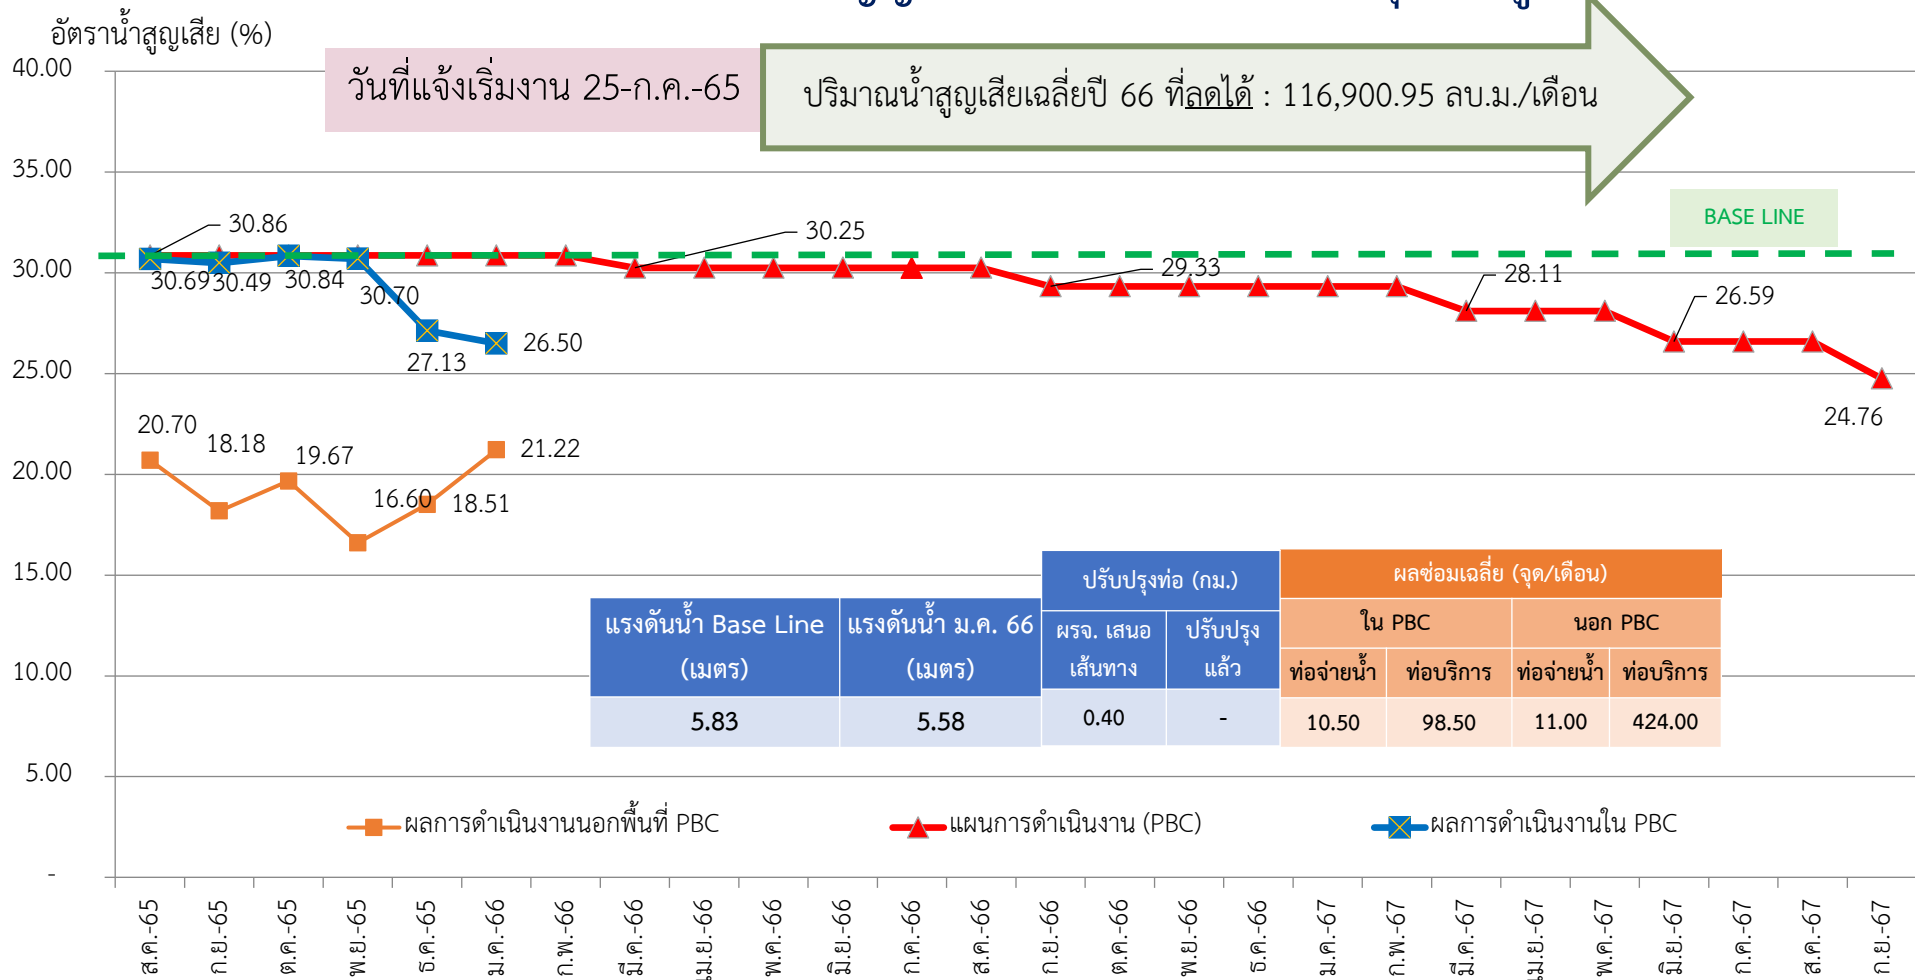


ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.5/2565 พื้นที่สาขาทุ่งมหาเมฆ

อัตราน้ำสูญเสีย (%)

วันที่แจ้งเริ่มงาน 6-พ.ค.-65

ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยปี 66 ที่ลดได้ : 115,534.64 ลบ.ม./เดือน

BASE LINE

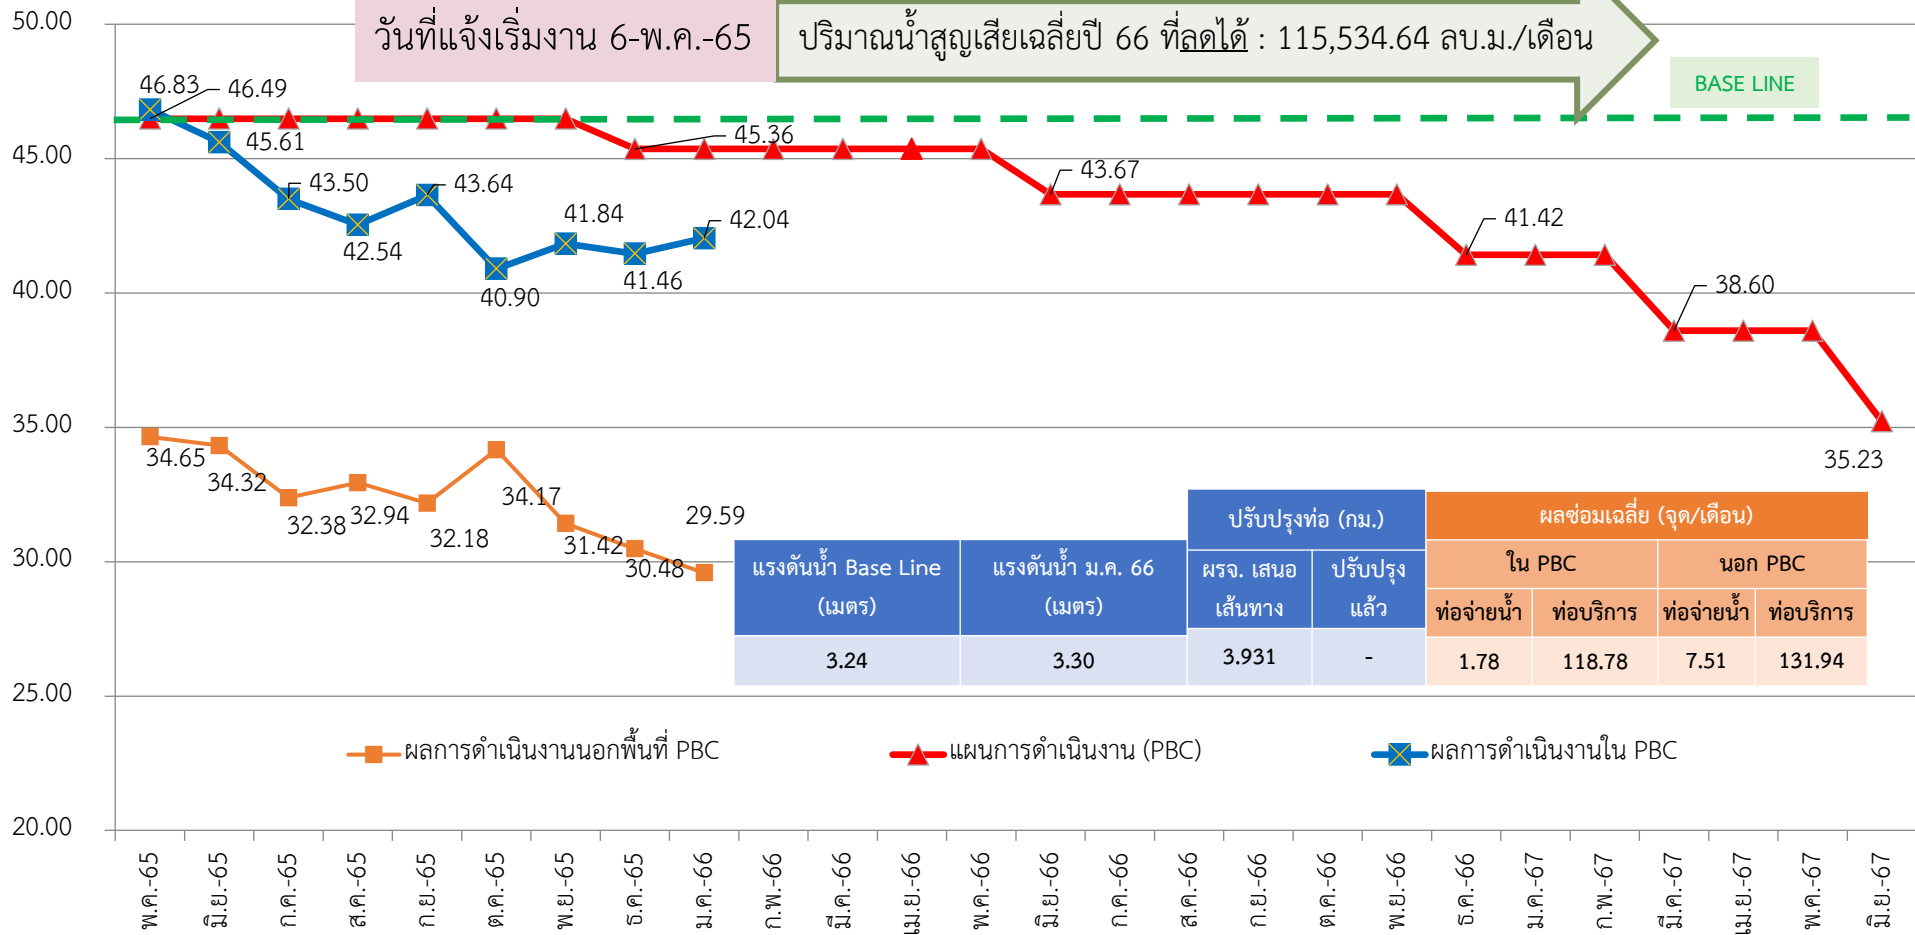

■ ผลการดำเนินงานนอกพื้นที่ PBC

▲ แผนการดำเนินงาน (PBC)

✕ ผลการดำเนินงานใน PBC


ปรับปรุงท่อ (กม.)		ผลซ่อมเฉลี่ย (จุด/เดือน)			
ผจ. เสนอ เส้นทาง	ปรับปรุง แล้ว	ใน PBC		นอก PBC	
		ท่อจ่ายน้ำ	ท่อบริการ	ท่อจ่ายน้ำ	ท่อบริการ
3.931	-	1.78	118.78	7.51	131.94

แรงดันน้ำ Base Line (เมตร)
3.24

แรงดันน้ำ ม.ค. 66 (เมตร)
3.30


ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.8/2563 พื้นที่สาขางอกน้อย

อัตราน้ำสูญเสีย (%)

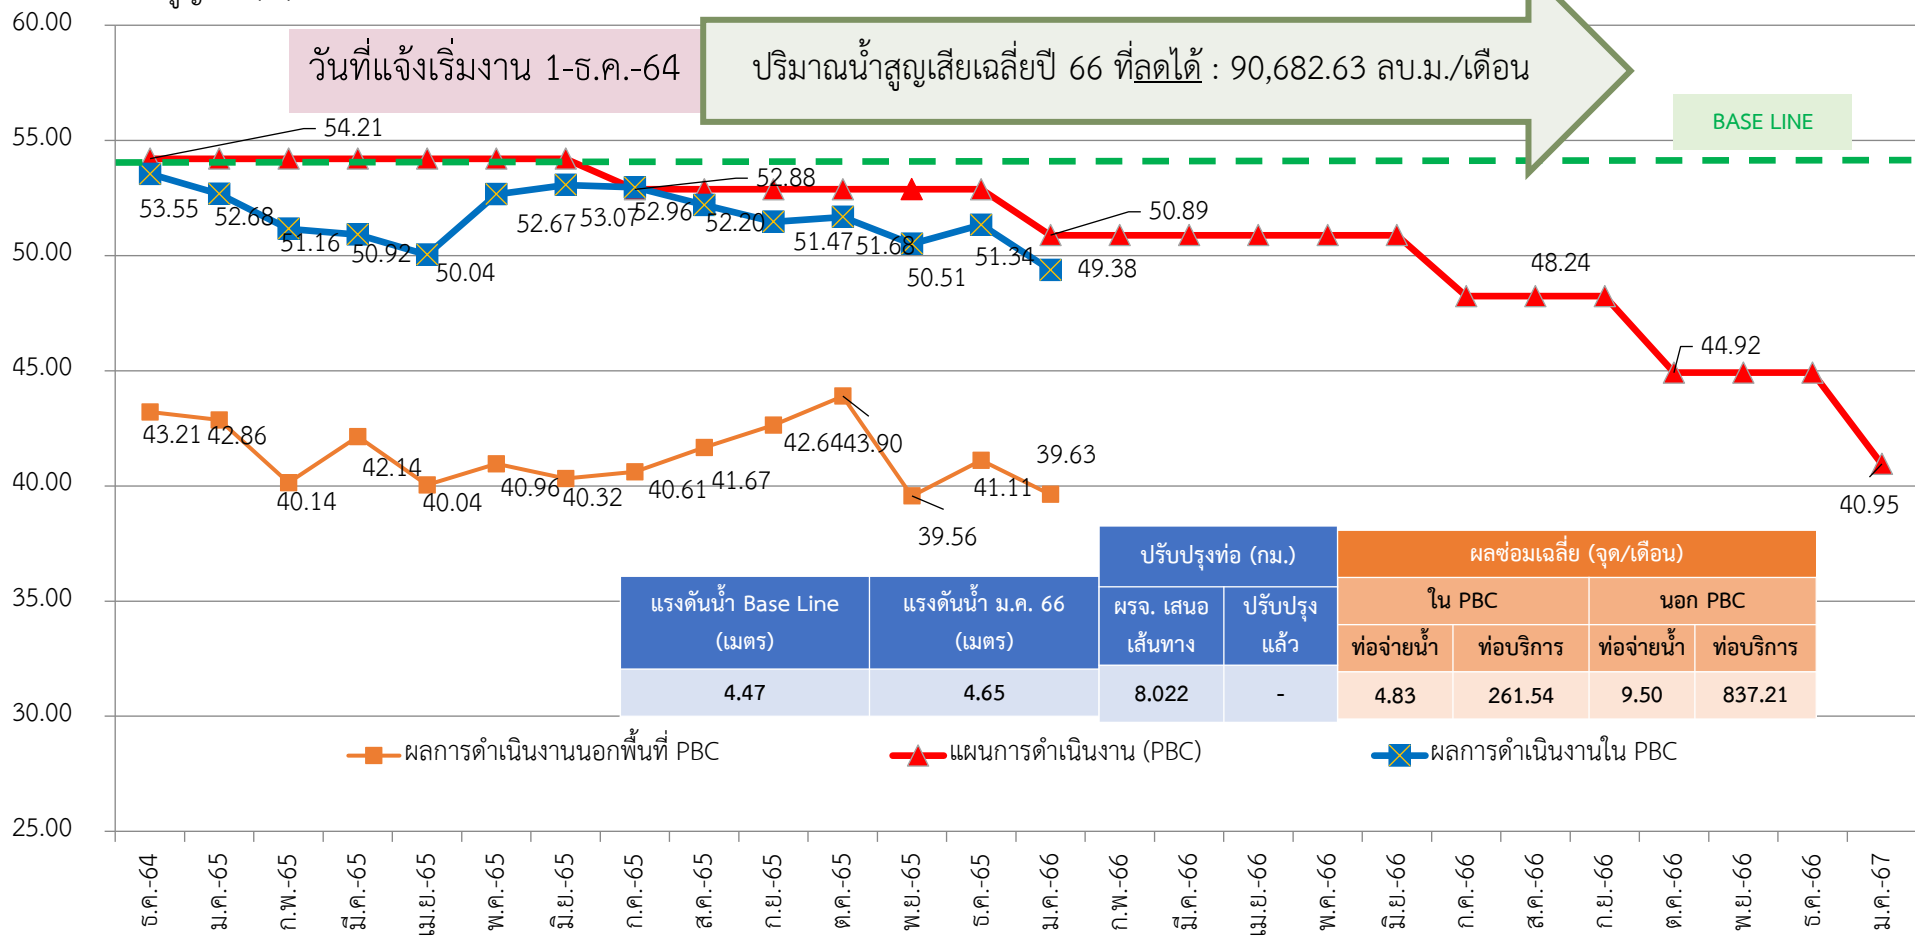


ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.7/2565 พื้นที่สาขาแม่นครศรี

อัตราน้ำสูญเสีย (%)

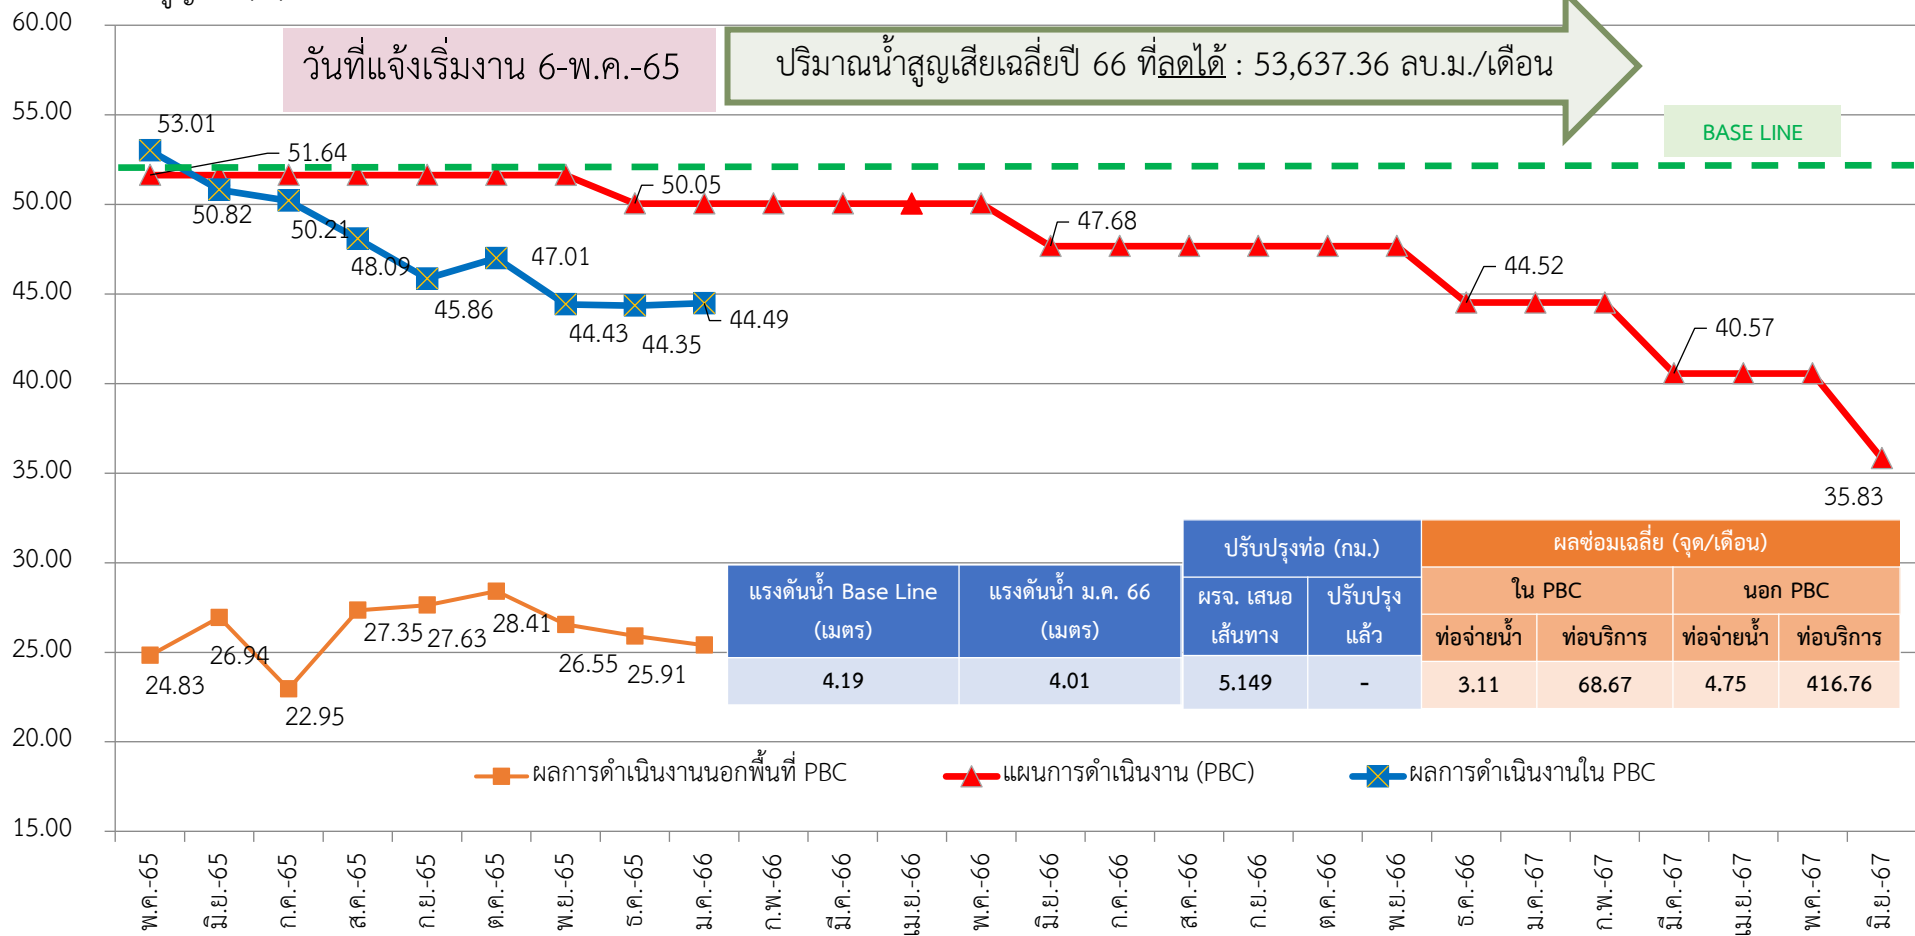

ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.6/2565 พื้นที่สาขาพญาไท

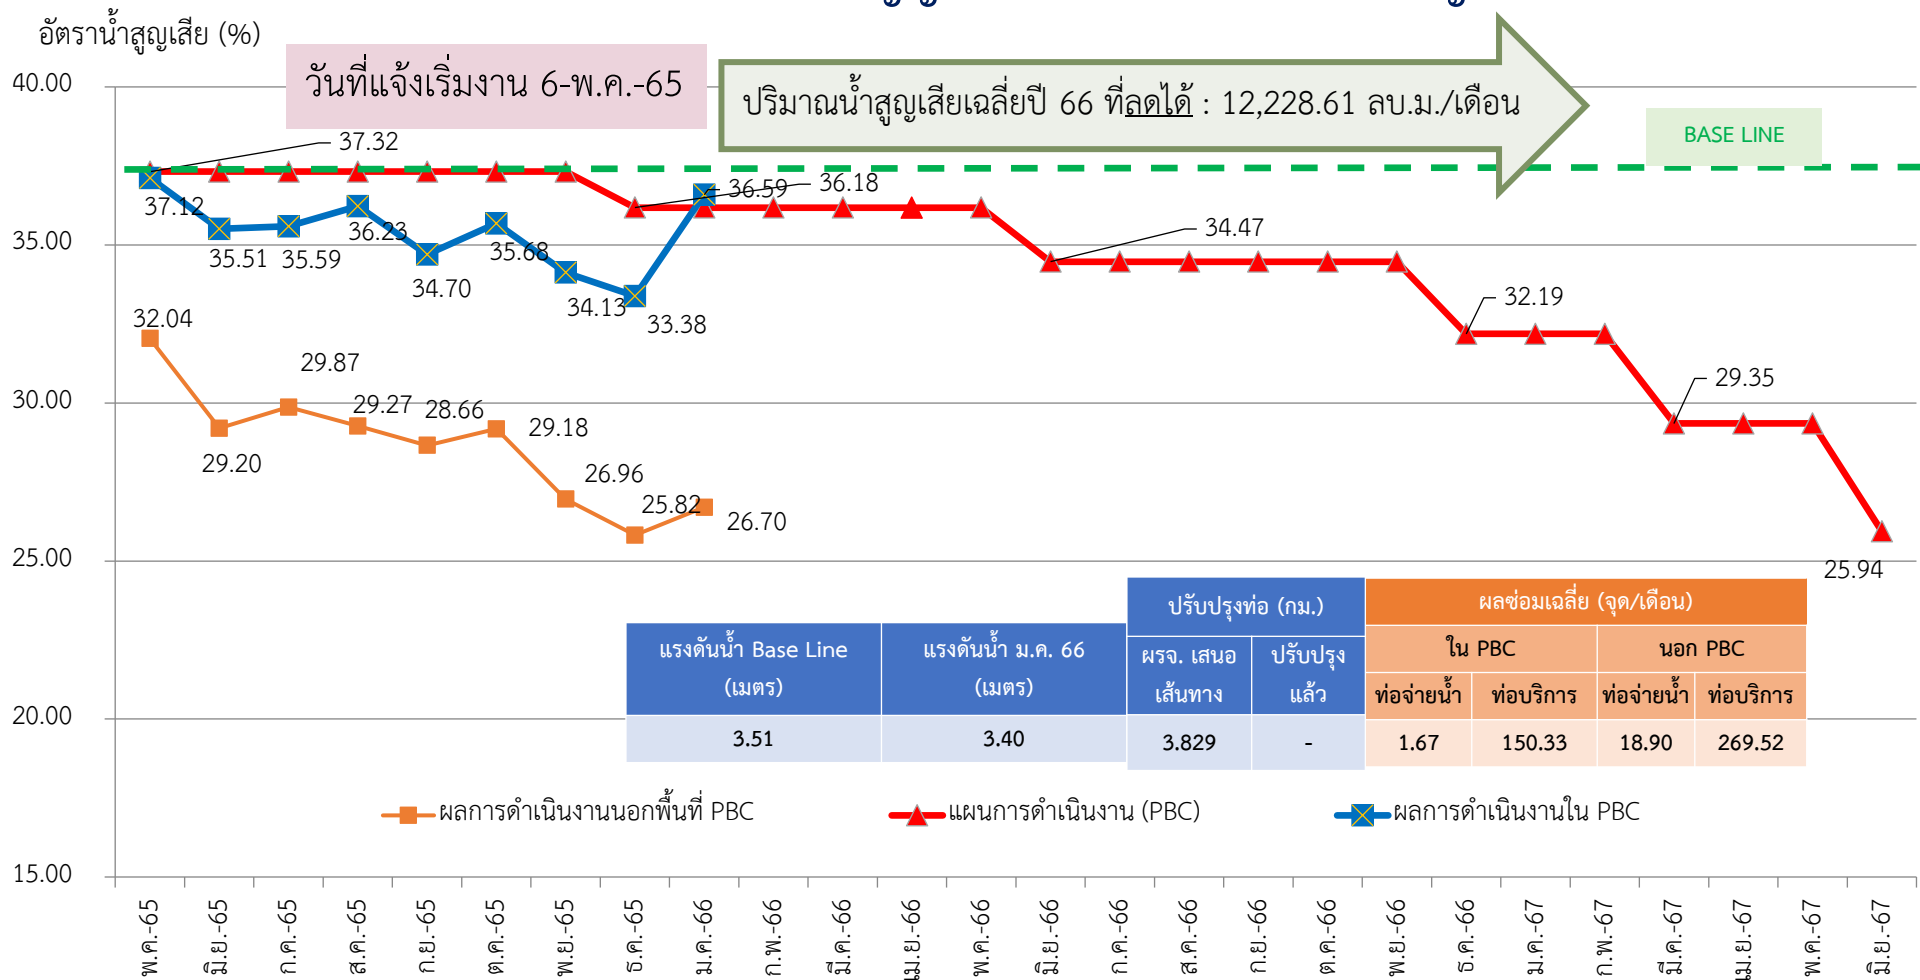

สรุปรายละเอียดจุดงานปรับปรุงมาตรา (DM) พื้นที่บริการภาค 1 และ 2 สัญญาเลขที่ ชล.32/2564

ที่	สาขา	จำนวนจุดตามTOR		ติดตั้งแล้ว	จำนวนจุดงานในพื้นที่ PBC				แนวทางแผนงาน /คาดการณ์แล้วเสร็จ
		300 มม.	200 มม.	รวม	อยู่ใน PBC	ติดตั้งมาตร แล้วเสร็จ	*รอตติมาตร	ตู้ Online	
1	สสส.		35	9	12	9	3	7	*ติดตั้งในพื้นที่ PBC 3 จุด /ภายใน 28 ก.พ. 66
2	สสพ.		19	17	12	11	1	10	*ติดตั้งในพื้นที่ PBC 1 จุด/ ภายใน 28 ก.พ. 66
3	สสป.		14		ไม่มี PBC				
4	สสท.	4	24	14	13	12	1	10	*ติดตั้งในพื้นที่ PBC 1 จุด/ ภายใน 28 ก.พ. 66
5	สสญ.		9		ไม่มี PBC				
6	สสม.	21	18	12	21	10	11	9	*ติดตั้งในพื้นที่ PBC 11 จุด /ภายใน 31 มี.ค. 66
7	สสล.		36	7	ไม่มี PBC				
รวม		25	155	59	58	42	16	36	ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. 66
		180							

รายละเอียดจุดติดตั้งที่ดำเนินการแล้ว งานปรับปรุงมาตรฯ (DM) พื้นที่บริการภาค 1 และ 2 สัญญาเลขที่ ชล.32/2564

ลำดับที่	ลำดับที่ (ตาม TOR)	สาขา	หมายเลข DM	สถานที่	ขนาดศก.มาตร ฯ (มม.)	พื้นที่ PBC	ตรวจรับมอบงาน
1	4	สสส.	DM 07 01 05 04	ปาก ช.สุขุมวิท41 (300 มม.) ตู้ RTU (07M40 เดิม)	200	✓	รอเชื่อมโยงระบบ
2	5	สสส.	DM 07 01 06 01	ซอย ปาก ช.สุขุมวิท 53 (300 มม.) ตู้ RTU (07M41 เดิม)	200	✓	รอตรวจสอบข้อมูล
3	13	สสส.	DM 07 04 16 01	อ่อนนุช 17 ติดคลองประเวศฝั่งขวา	200	✓	รอส่งมอบงานงวดที่ 4
4	14	สสส.	DM 07 04 16 04	อ่อนนุช 17 คลองโอง่างฝั่งซ้าย	200	✓	รอส่งมอบงานงวดที่ 4
5	22	สสส.	DM 07 05 03 01	อาคาร แผนรักษาสายส่งใต้ดิน ถนน รัชดาภิเษก 07M109	200	✓	รอส่งมอบงานงวดที่ 4
6	23	สสส.	DM 07 05 03 02	ถนนรัชดาภิเษก ใกล้ปากซอยสุขุมวิท 16 หน้าอาคารเอ็กซ์เชนจ์ทาวเวอร์	200	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 3
7	24	สสส.	DM 07 05 04 01	อาคาร แผนรักษาสายส่งใต้ดิน ถนน รัชดาภิเษก 07M110	200	✓	รอเชื่อมโยงระบบ
8	27	สสส.	DM 07 05 13 01	ใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ถ.รัชดาฯ07M130	200	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 3
9	32	สสส.	DM 07 05 13 02	หน้าอาคาร เดอะปาร์ค ตรงข้าม ธ.กสิกรไทย คลองเตย	200	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 3
10	36	สสพ.	DM 13 02 04 04	ริมทางรถไฟสายเก่า ข้างคลองบางจาก	200	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 3
11	37	สสพ.	DM 13 01 03 01	ถ.อ่อนนุช ข้างซอยอ่อนนุช 24 (หน้าร้านขายศาลพระภูมิ)	200		รอตรวจสอบข้อมูล
12	38	สสพ.	DM 13 01 07 02	ถ.อ่อนนุช ข้างซอยอ่อนนุช 29 (หน้ากิตติอัมพรคลินิก)	200		รอตรวจสอบข้อมูล
13	39	สสพ.	DM 13 03 01 01	ถ.อ่อนนุช ข้างซอยอ่อนนุช 66 (หน้าร้านตัดผม)	200		รอเชื่อมโยงระบบ
14	40	สสพ.	DM 13 03 01 03	ถ.ศรีนครินทร์ ข้างปั้มเอสโซ่ (ตรงข้าม ซอยโสสุตร)	200		ส่งมอบงานงวดที่ 3
15	41	สสพ.	DM 13 03 04 02	ตรงข้าม ช.อ่อนนุช 65	200		รอส่งมอบงานงวดที่ 4
16	43	สสพ.	DM 13 03 06 03	ช.อ่อนนุช 65	200		รอเชื่อมโยงระบบ
17	44	สสพ.	DM 13 02 03 02	ถ.สุขุมวิท ข้าง ช.สุขุมวิท 52	200	✓	รอเชื่อมโยงระบบ
18	45	สสพ.	DM 13 07 02 01	ถ.สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 105 ข้างซอยลาซาล 55 ตรงข้ามร้านข้าวนี้่ง	200	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 3
19	47	สสพ.	DM 13 02 01 02	ถ.สุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท 50 (เกษมสุวรรณ)(หน้าโลตัสสุขุมวิท)	200	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 3
20	48	สสพ.	DM 13 07 05 02	ถ.สุขุมวิท ช.สุขุมวิท 107 ปาก ช.แบร์ริง (หน้า 7 Eleven)	200	✓	รอตรวจสอบข้อมูล

รายละเอียดจุดติดตั้งที่ดำเนินการแล้ว งานปรับปรุงมาตรฯ (DM) พื้นที่บริการภาค 1 และ 2 สัญญาเลขที่ ชล.32/2564

ลำดับที่	ลำดับที่ (ตาม TOR)	สาขา	หมายเลข DM	สถานที่	ขนาดศก.มาตร ๑ (มม.)	พื้นที่ PBC	ตรวจรับมอบงาน
21	49	สสพ.	DM 13 04 04 02	ถ.บางนา ทรายต ก่อนถึงเซ็นทรัลบางนา (กม2+900)	200	✓	รอส่งมอบงานงวดที่ 4
22	50	สสพ.	DM 13 07 07 05	ถ.สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 113 ใน ปชช.สมุทรปราการ (ตรงข้ามซอยเทวา)	200	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 3
23	51	สสพ.	DM 13 07 06 03	ถ.ศรีนครินทร์ ซ.ศรีदान 3 ตรงข้ามตึก DTAC	200	✓	รอตรวจสอบข้อมูล
24	52	สสพ.	DM 13 07 05 03	ถ.สุขุมวิท ใต้สะพานสำโรง	200	✓	รอตรวจสอบข้อมูล
25	53	สสพ.	DM 13 07 01 02	ถ.สุขุมวิท 105 ใกล้ซอยลาซาล 23 หน้าบริษัทคริสตินนี่	200	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 3
26	54	สสพ.	DM 13 07 06 02	ถ.ศรีนครินทร์ ตรงข้าม ม.ลดาวลัย (หน้าปั๊มปิโตรนาส)	200	✓	รอตรวจสอบข้อมูล
27	78	สสพ.	DM 05 03 02 03	ใกล้ซอยเจริญกรุง 79 ถนนเจริญกรุง (ตรงข้ามมูลนิธิสตรีไทยมุสลิม)	300		ส่งมอบงานงวดที่ 3
28	80	สสพ.	DM 05 01 09 02	หน้าบ้านเลขที่ 946/40 ถ.พระราม 4 (ใกล้โรงแรมดุสิต)	300		ส่งมอบงานงวดที่ 1
29	81	สสพ.	DM 05 02 02 01	เยื้องวัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง(ใกล้สามแยก)	200	✓	รอตรวจสอบข้อมูล
30	82	สสพ.	DM 05 02 03 01	ปากซอยสาทร 11 (ข้างร้านอาหารภัทรา)	300	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 1
31	83	สสพ.	DM 05 02 03 03	ปากซอยบำเพ็ญกุศล (ตรงข้าม 7 Eleven) ถ.จันทร์	200	✓	รอเชื่อมโยงระบบ
32	84	สสพ.	DM 05 02 04 02	ปากซอยสาทร 11	300	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 1
33	85	สสพ.	DM 05 02 05 01	หน้าบ้านชินขีรฐา ข้างซอยสาทร 3	200	✓	รอส่งมอบงานงวดที่ 4
34	86	สสพ.	DM 05 02 07 01	ปากซอยจันทร์ 16 ถ.จันทร์	200	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 3
35	90	สสพ.	DM 05 04 01 01	ปากซอยจันทร์ 45 ถ.จันทร์	200	✓	รอส่งมอบงานงวดที่ 4
36	91	สสพ.	DM 05 04 03 02	ปากซอยจันทร์ 27 ถ.จันทร์	200	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 3
37	92	สสพ.	DM 05 04 04 01	ปากซอยสาธุประดิษฐ์ 16 ถ.สาธุประดิษฐ์	200	✓	รอเชื่อมโยงระบบ
38	95	สสพ.	DM 05 04 08 01	หน้าบริษัท เค.จี.เอส.สตีล จำกัด ถ.พระราม 3 ใกล้ซอยพระราม 3 ซอย 23	200	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 3

รายละเอียดจุดติดตั้งที่ดำเนินการแล้ว งานปรับปรุงมาตรฯ (DM) พื้นที่บริการภาค 1 และ 2 สัญญาเลขที่ ชล.32/2564

ลำดับที่	ลำดับที่ (ตาม TOR)	สาขา	หมายเลข DM	สถานที่	ขนาดศก.มาตรา (มม.)	พื้นที่ PBC	ตรวจรับมอบงาน
39	97	สสท.	DM 05 04 09 01	ถ.พระราม 3 ใกล้ ซอยพระราม 3 ซอย 22	200	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 3
40	98	สสท.	DM 05 04 10 04	ถ.พระราม 3 หน้าบริษัท น้ำแข็งสตูล จำกัด	200	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 3
41	108	สสม.	DM 06 04 01 02	ใต้สะพานเจริญผล ฝั่งใต้ ใกล้ตุ่มทรศัพท	300	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 3
42	111	สสม.	DM 06 04 05 04	ปากซอยจุฬา 4 ถ.บรรทัดทอง	200	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 3
43	112	สสม.	DM 06 02 07 01	ริม ถ.เยาวราช (ฝั่งซ้าย) ใกล้แยกเฉลิมบุรี หน้า ทบ.544	200	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 3
44	113	สสม.	DM 06 02 06 01	ริมถนนเยาวราช (ฝั่งซ้าย) ใกล้แยกราชวงศ์	200	✓	
45	114	สสม.	DM 06 02 06 02	ริม ถ.ทรงวาด หน้า ทบ.1093	200	✓	รอตรวจสอบข้อมูล
46	117	สสม.	DM 06 03 04 02	บริเวณริมถนนดำรงศรีเกษ เชิงสะพานข้ามคลองมหานาค หน้าร้านขายไม้	300	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 1
47	118	สสม.	DM 06 04 03 01	หน้าโถงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ	200		ส่งมอบงานงวดที่ 3
48	122	สสม.	DM 06 04 01 03	ใต้สะพานหัวช้าง ฝั่งบริษัท สยามนิสสัน จำกัด	300	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 2
49	124	สสม.	DM 06 04 04 02	บริเวณตรอกราษฎร์อุทิศ ถ.พระราม 4	300	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 2
50	125	สสม.	DM 06 04 04 04	ตรงข้ามซอยจุฬาลงกรณ์ 4 ถ.บรรทัดทอง	300	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 2
51	130	สสม.	DM 06 04 06 03	ริมถนนราชดำริ หน้าสวนลุมพินี	300		รอเชื่อมโยงระบบ
52	141	สสม.	DM 06 04 05 03	แยกสะพานอ่อน ถ.บรรทัดทอง	200	✓	ส่งมอบงานงวดที่ 3
53	161	สสส.	DM 12 03 06 01	หน้า ร.ร.วัดบึงทองหลาง (ลาดพร้าว 101)	200		รอส่งมอบงานงวดที่ 4

รายละเอียดจุดติดตั้งที่ดำเนินการแล้ว งานปรับปรุงมาตรฯ (DM) พื้นที่บริการภาค 1 และ 2 สัญญาเลขที่ ชล.32/2564

ลำดับที่	ลำดับที่ (ตาม TOR)	สาขา	หมายเลข DM	สถานที่	ขนาดศก.มาตรา (มม.)	พื้นที่ PBC	ตรวจรับมอบงาน
54	162	สสส.	DM 12 03 08 01	ช.โพธิ์แก้ว ไกล่ ม.พิบูลย์	200		รอส่งมอบงานงวดที่ 4
55	163	สสส.	DM 12 03 08 02	ถ.ลาดพร้าว ซอย 101 ตรงข้าม ร.รมัยมวัดบึงทองหลาง	200		รอส่งมอบงานงวดที่ 4
56	168	สสส.	DM 12 07 09 01	ถ.คูบอน ซ.คูบอน 27 (ตรงข้าม ซ.สายธารณี)	200		รอส่งมอบงานงวดที่ 4
57	170	สสส.	DM 12 04 06 01	ถ.ลาดพร้าว ปาก ซ.ลาดพร้าว 112	200		รอส่งมอบงานงวดที่ 4
58	171	สสส.	DM 12 04 07 01	ถ.ลาดพร้าว ซอย 124	200		รอส่งมอบงานงวดที่ 4
59	175	สสส.	DM 12 05 02 01	ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม ตรงข้าม ถ.สุคนธ์สวัสดิ์ ม.มาสเตอร์พีช	200		รอส่งมอบงานงวดที่ 4

สรุปรายละเอียดจุดงานปรับปรุงมาตรา (DM) พื้นที่บริการภาค 3, 4 และ 5 สัญญาเลขที่ ซล.31/2564

ที่	สาขา	จุดในสัญญา			ติดตั้งแล้ว			งาน PBC				แนวทางแผนงาน /คาดการณ์แล้วเสร็จ
		300 มม.	200 มม.	รวม	300 มม.	200 มม.	รวม	อยู่ใน PBC	ติดตั้งมาตร	รอตติมาตร	ค่า F Online ได้ ใน WLMA	
1	สสข.	1		1				มาตรา DM ส่วนใหญ่ มีรับประกันฯ ซล.32 2/2563 (UHM)				
2	สสข.	2	2	4	1	1	2	ไม่มี PBC				
3	สสมบ.	2	5	7	2	5	7	ไม่มี PBC				
4	สสสภ.	7	17	24	5	11	16	9	9		9	
5	สสบ.	13	14	27	10	13	23	9	8	1	8	มีอุปสรรคน้ำใต้ดิน ยังไม่สามารถติดตั้งมาตราได้
6	สสต.	10	22	32	10	15	25	9	8	1	8	1 จุด (สสต. จะขอปิดท่อประธาน)
7	สสภ.	8	7	15	7	5	12	4	4		3	(ติดตั้งมาตรPBCแล้วเสร็จ)
8	สสว.	8	8	16	6	2	8	4	4		4	(ติดตั้งมาตรPBCแล้วเสร็จ)
9	สสน.	5	11	16	2	4	6	ไม่มี PBC				
10	สสบท.	6	10	16	3	7	10	ไม่มี PBC				
11	สสมส.	4	8	12	4	8	12	8	8		8	(ติดตั้งมาตรPBCแล้วเสร็จ)
รวม		66	104	170	50	71	121	43	41	2	40	ข้อมูลพหุสบัติที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
		170			121							

ขอบคุณครับ
