



## วาระที่ 3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566



# Agenda

01

ผลเบิกจ่ายงบประมาณเดือน ก.พ.66  
และสะสม ต.ค.65 - ก.พ.66

02

การเบิกจ่ายแบบ Front Load  
วงเงินไม่เกิน 1 แสน & วงเงินที่เกิน 1 แสน ไม่เกิน 5 แสน


03

การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566 และ  
รายการที่ขออนุมัติจากเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน

04


ปัญหาการส่งมอบท่อ และ รายงานท่อที่ยังไม่แจ้งข้อมูลส่ง  
มอบท่อในระบบ Pipe Order System (POS)





1. ผลเบิกจ่ายงบประมาณเดือน ก.พ.66  
และสะสม ต.ค.65 - ก.พ.66

## แผน — ผลเบิกจ่าย ก.พ.66 และสะสม ต.ค.65 - ก.พ.66

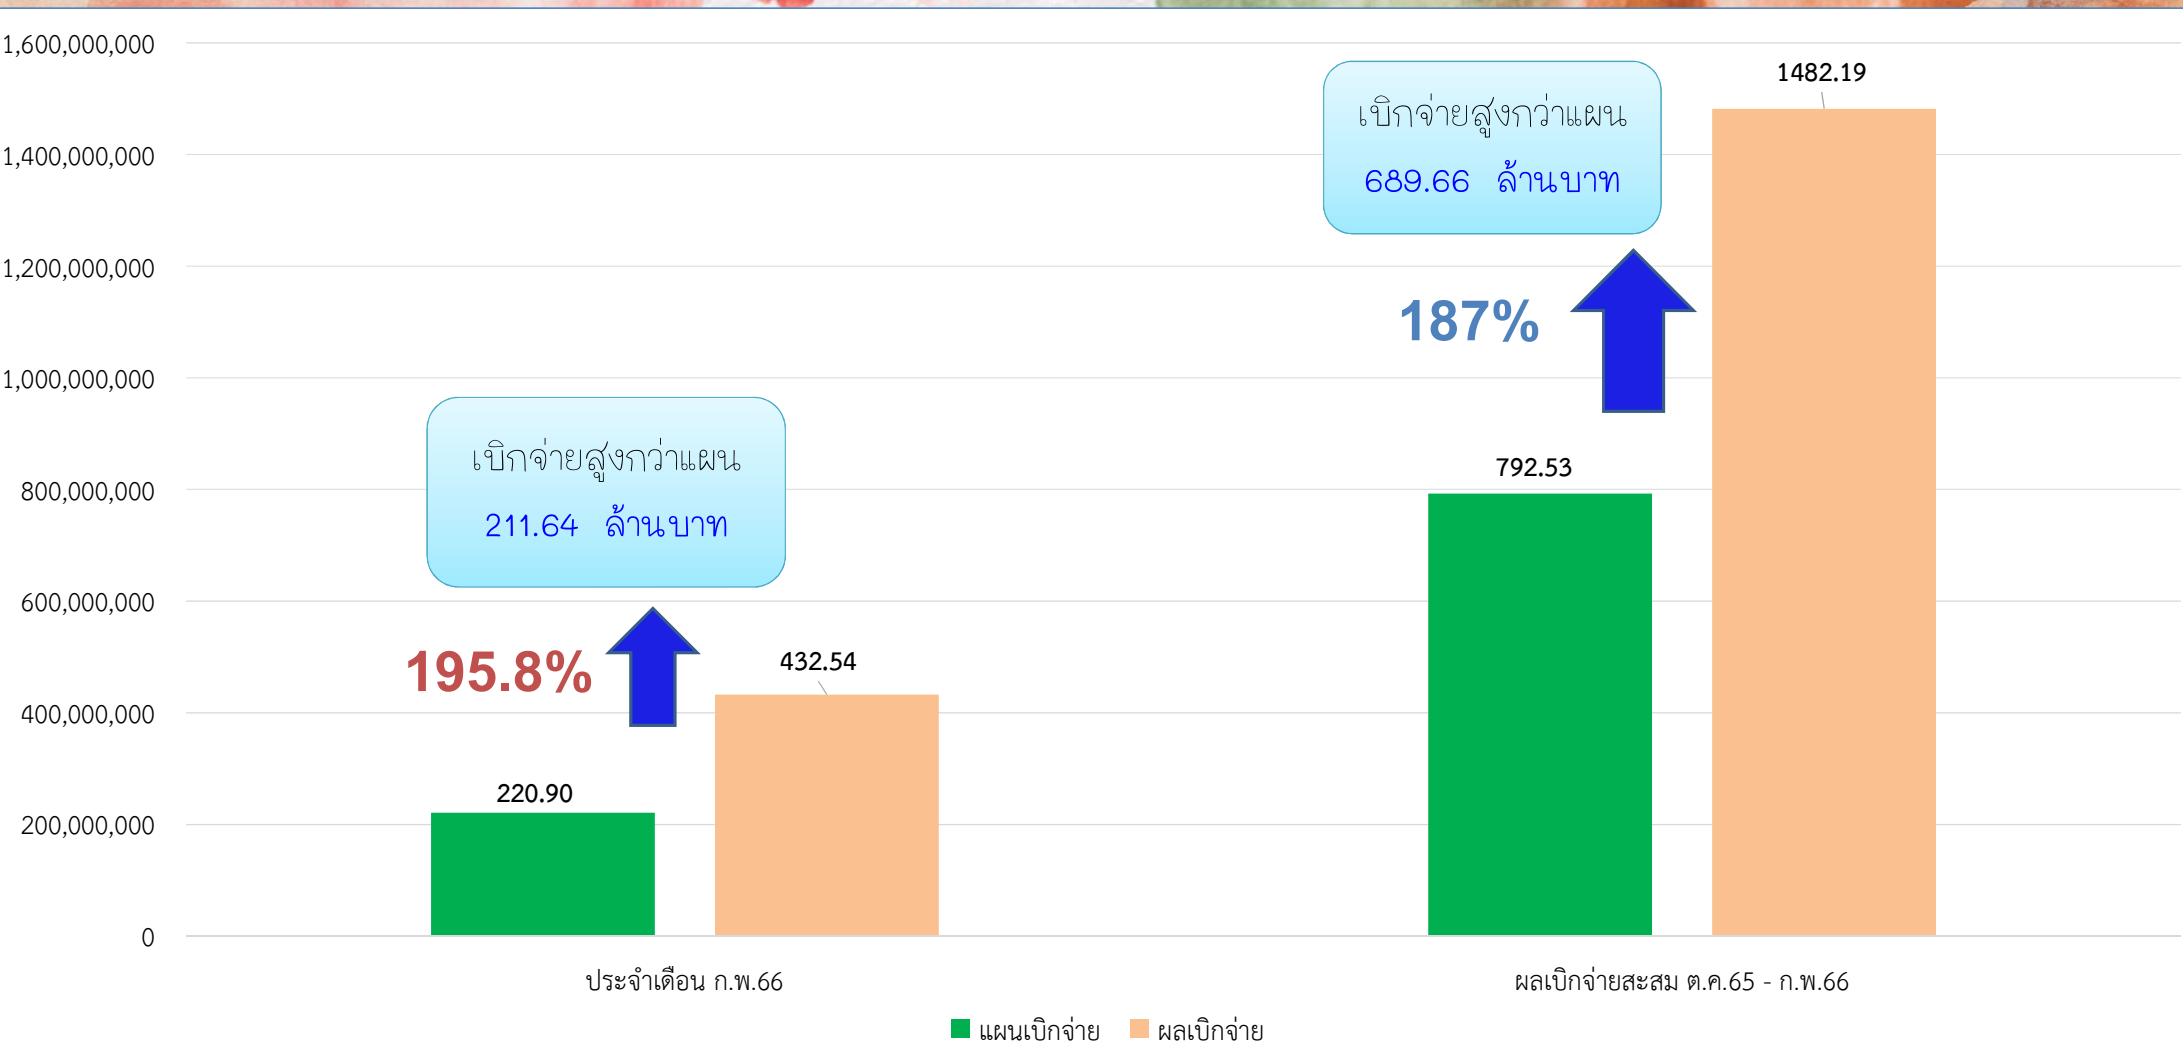



แผน — ผลเบิกจ่าย ก.พ.66 และสะสม ต.ค.65 - ก.พ.66

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ก.พ.66				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.65 - ก.พ.66			
	แผน ก.พ.66	ผล ก.พ.66	ผลต่าง	%	แผน ก.พ.66	ผล ก.พ.66	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	11.99	37.29	25.30	311.0%	54.61	165.30	110.69	302.7%
ลดน้ำสูญเสีย	144.38	312.24	167.86	216.3%	466.74	1,122.30	655.56	240.5%
มาตรวัดน้ำ	23.41	28.97	5.56	123.8%	95.40	160.13	64.73	167.9%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	1.35	4.47	3.12	330.9%	10.24	21.60	11.36	210.9%
ขยายเขตชุมชนเมือง	0.30	11.26	10.96	3,752.6%	9.80	31.82	22.02	324.7%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	0.45	13.72	13.27	3,049.0%	13.32	70.63	57.31	530.3%
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	7.21	-	-	-	24.41	-	-
งานรับจ้างงาน	20.76	61.66	40.90	297.0%	71.20	263.27	192.07	369.8%
งานติดตั้งประปาใหม่	14.49	22.20	7.71	153.2%	62.29	101.42	39.13	162.8%
งานทดแทนระบบเฝ้าระวัง DMA	-	-	-	-	1.20	13.78	12.58	1,148.1%
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	3.77	13.72	9.95	363.7%	7.74	70.63	62.90	913.2%
รวมทั้งสิ้น	220.90	432.54	211.64	195.8%	792.53	1,482.19	689.66	187.0%



2. การเบิกจ่ายแบบ Front Load  
วงเงินไม่เกิน 1 แสน &  
วงเงินที่เกิน 1 แสน ไม่เกิน 5 แสน



## 2. การเบิกจ่ายตามนโยบาย Front Loaded

### รายการที่คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย

สายงาน	วงเงินต่ำกว่า 100,001 บาท		วงเงินระหว่าง 100,001-500,000 บาท	
	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
บริหาร	-	-	1	429,000.00
วิศวกรรม	4	198,100.00	2	932,200.00
ผลิตน้ำ	-	-	16	5,395,000.00
แผนและพัฒนา	-	-	1	250,000.00
บริการ (ทอ)	4	91,520.00	12	4,986,066.11
เทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	1	500,000.00
บริการ (กต)	5	213,000.00	4	1,116,591.36
รวม	13	502,620.00	37	13,608,857.47

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

สายงานบริการด้านตะวันออก

## 2.1 รวก.(กอ)

รายการที่มีวงเงินดำเนินการต่ำกว่า 100,001 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย  
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	แผนจ่าย		ประเภท
					เดิม	ใหม่	
1	สสป.	C-66.1.05.01.0098	เก้าอี้ประชุม	24,720.00	ต.ค. 65	ก.พ. 66	ประจำปี
2	สสป.	C-66.1.05.01.0104	เก้าอี้ห้องประชุม (ประธาน)	4,900.00	ต.ค. 65	ก.พ. 66	ประจำปี
3	สสม.	C-66.1.05.04.0004	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด3,500ANSILumens	29,000.00	มี.ค. 66	-	ประจำปี
4	สสม.	C-66.1.05.04.0016	จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาด180นิ้ว	32,900.00	มี.ค. 66	-	ประจำปี
รวม				91,520.00			

รายการที่มีวงเงินดำเนินการระหว่าง 100,001 - 500,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย  
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	แผนจ่าย		ประเภท
					เดิม	ใหม่	
5	สสส.	C-65.1.06.02.0038	งานติดตั้งจุดให้บริการรับชำระเงิน (ตู้จุดจ่ายจร) และงานที่เกี่ยวข้อง	464,830.00	เม.ย. 66	เม.ย. 66	ผูกพันการจ่ายเงิน
6	สสญ.	C-65.1.06.02.0067	งานสร้างห้องน้ำคนพิการ	464,942.11	เม.ย. 66	-	ผูกพันดำเนินการ
7	สสท.	C-65.1.06.02.0084	งานปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ	450,000.00	เม.ย. 66	-	ผูกพันดำเนินการ
8	สสท.	C-65.1.06.02.0085	งานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชน เนื่องจากภัยแล้ง	248,000.00	เม.ย. 66	-	ผูกพันดำเนินการ
9	สสท.	C-65.1.06.02.0086	งานปรับปรุงหลังคาเมทัลชีส (สถานที่จอดรถจักรยานยนต์ ทางเดินเชื่อมโรงอาหาร)	396,732.00	เม.ย. 66	เม.ย. 66	ผูกพันดำเนินการ
10	สสม.	C-65.1.06.02.0087	งานปรับปรุงกระเบื้องปูพื้นแกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม.	440,750.00	เม.ย. 66	เม.ย. 66	ผูกพันดำเนินการ



## 2.1 รวก.(กอ)

### สายงานบริการด้านตะวันออก

รายการที่มีวงเงินดำเนินการระหว่าง 100,001 - 500,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย  
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	แผนจ่าย		ประเภท
					เดิม	ใหม่	
11	สสท.	C-65.1.06.02.0089	ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการชั้น 1 เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ เคาน์เตอร์รับคำร้อง/ ติดตั้งประปาใหม่	466,000.00	ม.ค. 66	-	ผูกพันดำเนินการ
12	สสข.	C-66.1.02.01.0001	งานติดตั้งตู้ จอด จ่าย จร	491,612.00	ก.พ. 66	มี.ค. 66	ประจำปี
13	สสม.	C-66.1.02.01.0003	งานสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ซ่อมท่อ	400,000.00	ม.ค. 66	-	ประจำปี
14	สสสภ.	C-66.1.02.01.0007	เสาธงชาติ	190,000.00	ก.ค. 66	มี.ค. 66	ประจำปี
15	สสข.	C-66.1.02.04.0001	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (แนวรั้วโดยรอบสำนักงาน)	500,000.00	ธ.ค. 65	มี.ค. 66	ประจำปี
16	สสม.	C-66.1.05.01.0211	งานติดตั้งม่านกรองแสงอาคาร 4 ชั้น	473,200.00	มี.ค. 66	-	ประจำปี
รวม				4,986,066.11			

สายงานบริการด้านตะวันตก

## 2.2 รวก.(กต)

รายการที่มีวงเงินดำเนินการต่ำกว่า 100,001 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย  
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	แผนจ่าย		ประเภท
					เดิม	ใหม่	
1	สสน.	C-65.1.05.01.2028	SOFA พักคอย	67,600.00	ต.ค. 65	-	ผูกพันดำเนินการ
2	สสน.	C-65.1.05.01.2029	เก้าอี้บริการลูกค้า หุ้มเบาะหนังเทียม	10,200.00	ต.ค. 65	-	ผูกพันดำเนินการ
3	สสน.	C-65.1.05.01.2030	ชุดโต๊ะ เก้าอี้พักคอย บริเวณสวนแนวตั้ง	25,200.00	ต.ค. 65	-	ผูกพันดำเนินการ
4	ฝมน.	C-66.1.03.01.0025	งานซื้อพร้อมติดตั้ง Pressure transmitter	55,000.00	ก.ค. 66	มิ.ย. 66	ประจำปี
5	ฝมน.	C-66.1.03.01.0026	งานซื้อพร้อมติดตั้ง Temperature sensor and Transmitter	55,000.00	ก.ค. 66	มิ.ย. 66	ประจำปี
รวม				213,000.00			

รายการที่มีวงเงินดำเนินการระหว่าง 100,001 - 500,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย  
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	แผนจ่าย		ประเภท
					เดิม	ใหม่	
6	ฝคจ.	C-64.1.03.01.0012	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 30 KVA พร้อมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	326,727.10	พ.ค. 66	พ.ค. 66	ผูกพันการจ่ายเงิน
7	สสบ.	C-65.1.06.02.0073	งานติดตั้งหลังคาที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์และที่สูบบุหรี่	433,864.26	เม.ย. 66	เม.ย. 66	ผูกพันการจ่ายเงิน
8	สสบท.	C-66.1.02.02.0009	งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น 1	208,000.00	ม.ค. 66	เม.ย. 66	ประจำปี
9	ฝคจ.	C-66.2.02.03.0200	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่1	148,000.00	จ่ายปี 67	จ่ายปี 67	ประจำปี
รวม				1,116,591.36			





3. การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566  
รายการที่ขออนุมัติจากเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน





3. การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566  
รายการที่ขออนุมัติจากเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน

การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566  
และ รายการที่ขออนุมัติจากเงินสำรองกรณีจำเป็น  
เร่งด่วน หากยังไม่ลงนามสัญญา  
ขอให้หน่วยงานเข้าประชุมชี้แจงเหตุผล ผวก. ใน  
การประชุมคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนฯ ด้วย



### 3.1 การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2

- สำหรับรายการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ขอให้หน่วยงานคาดการณ์แผนใหม่ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- ขอให้ ผงป. จัดทำข้อมูลรายการที่มีแผนเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566 ทุกรายการ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน
- สำหรับรายการใดที่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ปีงบประมาณ 2566 ขอให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการรายการอื่น เพื่อเบิกจ่ายทดแทน

## 3.1 การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ.66 - สายงานบริการด้านตะวันออก

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงินดำเนินการ	แผนทำสัญญา ต.ค. 65 - มี.ค. 66		แผนจ่าย ต.ค. 65 - ม.ค. 66		กรอบจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2566
					เดือน	วงเงิน	เดือน	วงเงิน	
1	สสม.	C-66.1.02.01.0003	งานสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ซ่อมท่อ	400,000.00	ธ.ค. 65	400,000.00	ม.ค. 66	400,000.00	400,000.00
2	สสม.	C-66.1.05.04.0016	จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด180นิ้ว	32,900.00	ม.ค. 66	32,900.00	มี.ค. 66	-	32,900.00
3	สสส.	C-66.1.02.02.0002	งานปรับปรุงคาน้ำฟ้าและห้องเก็บของอาคาร	1,000,000.00	ธ.ค. 65	1,000,000.00	ก.ย. 66	-	1,000,000.00
4	สสส.	C-66.1.02.02.0004	งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร	1,300,000.00	ธ.ค. 65	1,300,000.00	ก.ย. 66	-	1,300,000.00
5	สสส.	C-66.1.02.02.0003	งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำท่วม	2,500,000.00	ธ.ค. 65	2,500,000.00	ก.ย. 66	-	2,500,000.00
6	สสท.	C-66.1.05.01.0391	ลิฟต์โดยสารสำหรับอาคาร 5 ชั้น	2,176,000.00	มี.ค. 66	2,176,000.00	ก.ย. 66	-	2,176,000.00
7	สสป.	C-66.1.05.02.0018	ติดตั้งSolarcellที่หลังคาจวดรณ	3,600,000.00	มี.ค. 66	3,600,000.00	มี.ค. 66	-	3,600,000.00
8	สสมบ.	C-66.1.02.02.0019	ปรับปรุงหลังคาอาคารชั้นคาน้ำฟ้า สสมบ.	4,500,000.00	มี.ค. 66	4,500,000.00	ก.ค. 66	-	4,500,000.00
9	สสมบ.	C-66.1.02.03.0002	ปรับปรุงถนน ลานจวดรณ	4,900,000.00	มี.ค. 66	4,900,000.00	ก.ค. 66	-	4,900,000.00
10	ฟตส.	C-66.2.02.10.0001	โครงการปรับปรุงระบบCallCenter	33,298,015.00	-	33,298,015.00	จ่ายปี 67	-	-
รวมสายงานบริการด้านตะวันออก				53,706,915.00		53,706,915.00		400,000.00	20,408,900.00



## 3.1 การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ.66 - สายงานบริการด้านตะวันออก



ประธาน สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด TOR ของโครงการปรับปรุงระบบ Call Center ของ ฝตส. เนื่องจากที่ได้ประชุมเรื่องอาคาร 100 ปี นางจรรุมาศ ชีวนิขพันธ์ (นักบริหารงาน 7 ฝตส.) รายงานว่าจะขอยกเลิกห้อง Server ที่อาคาร 100 ปี เนื่องจาก Server อยู่ที่เก่า ไม่ได้ย้ายมาที่อาคาร 100 ปี



ประธาน ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการปรับปรุงระบบ Call Center ทบทวน TOR และเข้าดูสถานที่อาคาร 100 ปี อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ารายละเอียดถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

โครงการปรับปรุงระบบ **Call Center** ของ ฝตส.

## 3.1 การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ.66 - สายงานบริการด้านตะวันตก

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	สัญญา	รายการ	วงเงินดำเนินการ	แผนทำสัญญา ต.ค. 65 - มี.ค. 66		ทำสัญญา สูง(ต่ำ) กว่าแผน	แผนจ่าย ต.ค. 65 - มี.ค. 66	
						เดือน	วงเงิน		เดือน	วงเงิน
1	สสน.	C-65.1.05.01.2029		เก้าอี้บริการลูกค้า หุ้มเบาะหนังเทียม	10,200.00	ต.ค. 65	10,200.00	(10,200.00)	ต.ค. 65	10,200.00
2	สสน.	C-65.1.05.01.2030		ชุดโต๊ะ เก้าอี้พักคอย บริเวณสวนแนวตั้ง	25,200.00	ต.ค. 65	25,200.00	(25,200.00)	ต.ค. 65	25,200.00
3	สสน.	C-65.1.05.01.2028		SOFA พักคอย	67,600.00	ต.ค. 65	67,600.00	(67,600.00)	ต.ค. 65	67,600.00
4	สสพ.	C-66.1.02.02.0009		งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น 1	208,000.00	ม.ค. 66	208,000.00	(208,000.00)	ม.ค. 66	166,400.00
5	ฝจส.	C-66.1.05.06.0018		งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำระบบเผื่อสำรอง น้ำสูญเสียที่ชำรุด	40,000,000.00	ก.พ. 66	40,000,000.00	(40,000,000.00)	ม.ค. 66	1,200,000.00
6	ฝจส.	C-65.1.05.06.2000		งานปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการน้ำ สูญเสีย (ติดตั้งใหม่) (เพิ่มเติม)	80,000,000.00	มี.ค. 66	80,000,000.00	(80,000,000.00)	ก.ค. 66	-
7	สสน.	C-66.1.02.02.0005		งานปรับปรุงสภาพภายนอกอาคาร สำนักงาน 3 ชั้น	1,241,270.00	ม.ค. 66	1,241,270.00	(1,241,270.00)	มี.ย. 66	-
8	ฝคจ.	C-66.2.02.03.0201		เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่2	708,000.00	มี.ค. 66	708,000.00	(708,000.00)	จ่ายปี 67	-
9	ฝจส.	C-65.1.05.06.1000		งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำระบบเผื่อสำรอง น้ำสูญเสียที่ชำรุด	2,500,000.00	-	2,500,000.00	(2,500,000.00)	-	-
10	ฝคจ.	C-63.1.03.02.0008		รถบดอัดสันสະเทือนขนาดไม่ต่ำกว่า 3-5 ตัน	5,000,000.00	มี.ค. 66	5,000,000.00	(5,000,000.00)	จ่ายปี 67	-
11	ฝจส.	C-65.1.05.06.0024		งานปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการน้ำ สูญเสีย (ติดตั้งใหม่)	10,000,000.00	มี.ค. 66	10,000,000.00	(10,000,000.00)	-	-
12	สสพ.	C-63.2.24.02.0001		งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประจำ สาขาบางกอกน้อย	37,547,663.84	-	37,547,663.84	(37,547,663.84)	จ่ายปี 67	-
13	สสน.	C-64.2.09.02.0001		งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประจำ สาขานนทบุรี	126,110,000.00	-	126,110,000.00	(126,110,000.00)	จ่ายปี 67	-
14	ฝมน.	C-64.2.21.01.0001		งานจ้างก่อสร้างโรงงานมาตรวัดน้ำ และ อาคารสำนักงาน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	161,000,000.00	-	161,000,000.00	(161,000,000.00)	จ่ายปี 67	-
15	ฝสน.	C-66.2.42.01.0001		งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำพหลโยธิน พร้อมงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	780,000,000.00	-	780,000,000.00	(780,000,000.00)	จ่ายปี 67	-
รวมสายงานบริการด้านตะวันตก					1,244,417,933.84		1,244,417,933.84	(1,244,417,933.84)		1,469,400.00



## 3.1 การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ.66 - สายงานบริการด้านตะวันตก



ผวก. ขอให้พิจารณาจุดเชื่อมต่อการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สำนานำ TOR ของ กปน. พิจารณาร่วมกับ กฟน. เบื้องต้นได้หรือไม่



ชวก.(บร) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำพหลโยธินพร้อมงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างรอการไฟฟ้าแจ้งขนาดหม้อแปลง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุมชน จึงต้อง เปลี่ยนการออกแบบการติดตั้งหม้อแปลงจากภายนอกอาคารเป็นภายในอาคารแทน (Indoor Type) รวมถึง อาจจะต้องมีการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของงานโยธา

งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำพหลโยธิน พร้อมงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 3.1 การติดตามการทําสัญญา ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ.66 – สายงานบริการด้านตะวันตก จัดซื้อโดย ฝจพ.

งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ										
ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	สัญญา	รายการ	วงเงินดำเนินการ	แผนทำสัญญา ต.ค. 65 - มี.ค. 66		ทำสัญญา สูง(ต่ำ) กว่าแผน	แผนจ่าย ต.ค. 65 - ม.ค. 66	
						เดือน	วงเงิน		เดือน	วงเงิน
9	ฝสน.	C-65.1.04.01.0012	ชล.13/2565	รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อม กระเช้า	3,300,000.00	พ.ย. 65	3,300,000.00	(3,300,000.00)	มิ.ย. 66	-
10	ฝคจ.	C-64.1.03.02.0012	ชล.15/2564	รถ excavator ล้อยางเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 170 แรงม้า	12,000,000.00	พ.ย. 65	12,000,000.00	(12,000,000.00)	มิ.ย. 66	-
11	ฝคจ.	C-65.1.04.01.0013	ชล.14/2565	รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ พร้อมหลังคา กระบะอลูมิเนียม	1,311,526.48	ธ.ค. 65	1,311,526.48	(1,311,526.48)	ก.ค. 66	-
12	ฝคจ.	C-65.1.04.01.0010	ชล.11/2565	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ กระบะเท้าย	1,850,500.00	ธ.ค. 65	1,850,500.00	(1,850,500.00)	ส.ค. 66	-
13	ฝคจ.	C-66.1.04.01.0008	ชล.18/2566	รถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน พร้อมติดตั้ง เครนแขนยืด	5,000,000.00	ธ.ค. 65	5,000,000.00	(5,000,000.00)	ก.ค. 66	-
14	ฝคจ.	C-66.1.04.01.0007	ชล.17/2566	รถยนต์บรรทุก ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ พร้อม หลังคากระบะอลูมิเนียม	1,200,000.00	ม.ค. 66	1,200,000.00	(1,200,000.00)	ส.ค. 66	-
15	สสป.	C-66.1.04.01.0006	ชล.16/2566	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ บรรทุกน้ำ	2,336,500.00	มี.ค. 66	2,336,500.00	(2,336,500.00)	จ่ายปี 67	-



### 3.1 การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ.66 — **สายงานบริการด้านตะวันตก** จัดซื้อโดย ฝจพ.



รถ **excavator** ล้อยางเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 170 แรงม้า

กกค.ฝคจ. ชี้แจงว่า ได้ยกเลิกการจัดซื้อครั้งที่ 1 เนื่องจาก Spec ค่อนข้างสูง จึงไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งติดปัญหาชิปขาดแคลน

- ขอให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของงานดังกล่าวว่ามีความจำเป็นที่ต้องใช้ Spec สูงหรือไม่ ใช้งานคุ้มค่าหรือไม่
- ขอให้หน่วยงานจัดทำ Workflow / Timeline เกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์และรถบรรทุก โดยขอให้ผู้รับผิดชอบจัดทำ TOR เข้าชี้แจงในคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณด้วย



### 3.2 รายการที่ขออนุมัติจากเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน

สำหรับหน่วยงานที่ขออนุมัติใช้จากเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2566 ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากโดยหลักการของเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ประกอบกับงานดังกล่าวไม่มีแผนจ่าย หากหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายได้จะสามารถทดแทนรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน



## 3.2 รายการที่ขออนุมัติจากเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน

### สายงานบริการด้านตะวันออก - ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ.66

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงินดำเนินการ	แผนทำสัญญา		ทำสัญญา ต.ค. 65 - ก.พ 66	แผนจ่าย		หน่วยงาน คาดการณ์
					เดือน	วงเงิน		เดือน	วงเงิน	
ผู้จ่าย										
1	สสส.	C-65.1.06.02.0036	งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดทำที่จอดรถ บริเวณโรงไม้เก็บท่อ ห้องเก็บของ และห้องน้ำพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	682,049.36	-	-	-	ก.ค. 66	682,049.36	ก.ค. 66
2	สสส.	C-65.1.06.02.0038	งานติดตั้งจุดให้บริการรับชำระเงิน (ตู้จุดจ่ายจระ) และงานที่ เกี่ยวข้อง	464,830.00	-	-	-	เม.ย. 66	464,830.00	เม.ย. 66
3	สสส.	C-65.1.06.02.0088	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและก่อสร้างห้องควบคุมการจ่ายไฟ	1,845,000.00	-	-	-	พ.ค. 66	1,845,000.00	พ.ค. 66
รวม ผู้จ่าย				2,991,879.36		-	-		2,991,879.36	
ผู้ดำเนินการ										
4	สสญ.	C-65.1.06.02.0067	งานสร้างห้องน้ำคนพิการ	464,942.11	ธ.ค. 65	464,942.11	366,355.14	เม.ย. 66	464,942.11	-
5	สสช.	C-65.1.06.02.0069	จ้างเหมาปรับปรุงเคาน์เตอร์ และพื้นที่ลานกิจกรรมบริเวณ ส่วนจัดเก็บและรับเงิน	620,000.00	ต.ค. 65	620,000.00	368,347.59	เม.ย. 66	620,000.00	เม.ย. 66
6	สสมบ.	C-65.1.06.02.0071	งานปรับปรุงพื้นที่บริการลูกค้า (Front) ชั้น 1 อาคาร 1 และงานปรับปรุงตกแต่งภายในเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ บริเวณพื้นที่บริการลูกค้า	870,000.00	ธ.ค. 65	870,000.00	781,400.00	เม.ย. 66	870,000.00	มี.ค. 66
7	สสท.	C-65.1.06.02.0084	งานปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ	450,000.00	ต.ค. 65	450,000.00	450,000.00	เม.ย. 66	450,000.00	-
8	สสท.	C-65.1.06.02.0085	งานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับ ประชาชน เนื่องจากภัยแล้ง	248,000.00	ต.ค. 65	248,000.00	196,000.00	เม.ย. 66	248,000.00	-
9	สสท.	C-65.1.06.02.0086	งานปรับปรุงหลังคาเมทัลชีส (สถานที่จอดรถจักรยานยนต์ ทางเดินเชื่อมร้านอาหาร)	396,732.00	ต.ค. 65	396,732.00	387,100.00	เม.ย. 66	396,732.00	เม.ย. 66
10	สสม.	C-65.1.06.02.0087	งานปรับปรุงกระเบื้องปูพื้นแกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม.	440,750.00	พ.ย. 65	440,750.00	417,815.00	เม.ย. 66	440,750.00	เม.ย. 66
11	สสท.	C-65.1.06.02.0089	ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการชั้น 1 เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ เคาน์เตอร์รับคำร้อง/ติดตั้งประปาใหม่	466,000.00	ม.ค. 66	466,000.00	466,000.00	ม.ค. 66	466,000.00	ก.พ. 66
รวม ผู้ดำเนินการ				3,956,424.11		3,956,424.11	466,000.00		3,956,424.11	

## 3.2 รายการที่ขออนุมัติจากเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน

### สายงานบริการด้านตะวันออก - ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ.66

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงินดำเนินการ	แผนทำสัญญา		ทำสัญญา ต.ค. 65 - ก.พ 66	แผนจ่าย		หน่วยงาน คาดการณ์
					เดือน	วงเงิน		เดือน	วงเงิน	
ประจำปี										
12	สสมบ.	C-66.1.06.02.0001	งานปรับปรุงพื้นที่คลังพัสดุ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	410,000.00	ต.ค. 65	410,000.00	-	ธ.ค. 65	410,000.00	มี.ค. 66
13	สสมบ.	C-66.1.06.02.0002	งานติดตั้งหลังคาและกันสาดอาคาร 2 พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	360,000.00	ต.ค. 65	360,000.00	-	ธ.ค. 65	360,000.00	มี.ค. 66
14	สสส.	C-66.1.06.02.0004	งานก่อสร้างบันไดหนีไฟ ของอาคารอำนวยการ สำนักงานประชาสัมพันธ์	1,869,158.88	ธ.ค. 65	1,869,158.88	-	ก.ค. 66	1,869,158.88	-
15	สสท.	C-66.1.06.02.0005	งานปรับปรุงโรงอาหาร สำนักงานประชาสัมพันธ์	2,710,281.00	เม.ย. 66	2,710,281.00	-	ก.ย. 66	2,710,281.00	-
16	สสป.	C-66.1.06.02.0006	งานจ้างปรับปรุงห้องรับรองลูกค้า และศูนย์การเรียนรู้ E-learning	93,457.94	ต.ค. 65	93,457.94	93,457.94	ธ.ค. 65	93,457.94	-
17	สสญ.	C-66.1.06.02.0028	งานซื้อสายดับเพลิงขนาด2นิ้วยาว20เมตรพร้อมข้อต่อสวมเร็วลูมิเนียมขนาด 2.5 นิ้วจำนวน 2 เส้นและหัวฉีดฝอยลูมิเนียม (ไม่รวมด้ามหัวฉีดลูมิเนียม)	10,450.00	มี.ค. 66	10,450.00	-	เม.ย. 66	10,450.00	-
รวม ประจำปี				5,453,347.82		5,453,347.82	93,457.94		5,453,347.82	
รวม รายการที่ขออนุมัติใช้จากเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน				12,401,651.29		9,409,771.93	559,457.94		12,401,651.29	



## 3.2 รายการที่ขออนุมัติจากเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน

### สายงานบริการด้านตะวันตก - ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ.66

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงินดำเนินการ	แผนทำสัญญา		ทำสัญญา ต.ค. 65 - ก.พ 66	แผนจ่าย		หน่วยงาน คาดการณ์
					เดือน	วงเงิน		เดือน	วงเงิน	
ผู้จ่าย										
1	ฝสน.	C-60.1.06.02.0223	ก่อสร้างรั้วกำแพง ที่สถานีสูบน้ำคลองเตย	1,339,700.93	-	-	-	เม.ย. 66	1,339,700.93	-
2	สสب.	C-65.1.06.02.0073	งานติดตั้งหลังคาที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์และที่สูบบุหรี่	433,864.26	-	-	-	เม.ย. 66	433,864.26	เม.ย. 66
รวม ผู้จ่าย				1,773,565.19		-	-		1,773,565.19	
ผู้ดำเนินการ										
3	ฝสน.	C-64.1.06.02.0056	งานซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer) ขนาด 7.5 MVA และสวิตช์เกียร์แรงดัน 115 kV ชนิด Hybrid Compact Switchgear พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สจ.มีนบุรี	30,000,000.00	ม.ค. 66	30,000,000.00	-	จ่ายปี 67	-	-
4	สสน.	C-65.1.06.02.0079	งานปรับปรุงพื้นที่บริการลูกค้าชั้น 1 อาคาร 1	1,323,270.00	ต.ค. 65	1,323,270.00	1,323,270.00	พ.ค. 66	1,323,270.00	พ.ค. 66
5	สสพท.	C-65.1.06.02.0080	งานปรับปรุงจุดพักผ่อนหน้าศาลพระภูมิพร้อมจุดบริการน้ำดื่มสำหรับลูกค้า	749,772.00	เม.ย. 66	749,772.00	-	เม.ย. 66	599,817.60	ก.ย. 66
6	สสพท.	C-65.1.06.02.0081	งานปรับปรุงทางเดินเท้าหน้าอาคาร 1 และปรับปรุงภูมิทัศน์จุดจ่ายน้ำ	1,289,862.00	ก.ค. 66	1,289,862.00	-	ก.ค. 66	1,031,889.60	ก.ย. 66
รวม ผู้ดำเนินการ				33,362,904.00		33,362,904.00	1,323,270.00		2,954,977.20	

## 3.2 รายการที่ขออนุมัติจากเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน

### สายงานบริการด้านตะวันตก - ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ.66

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงินดำเนินการ	แผนทำสัญญา		ทำสัญญา ต.ค. 65 - ก.พ 66	แผนจ่าย		หน่วยงาน คาดการณ์
					เดือน	วงเงิน		เดือน	วงเงิน	
ประจำปี										
7	สสต.	C-66.1.06.02.0015	งานจ้างแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานประปาสาขาตากสิน	187,200.00	พ.ย. 65	187,200.00	187,200.00	ธ.ค. 65	187,200.00	-
8	สสบท.	C-66.1.06.02.0020	งานปรับปรุงระบบสายดินภายใน สสบท.	467,245.00	ม.ค. 66	467,245.00	467,245.00	มี.ค. 66	467,245.00	เม.ย. 66
9	สสต.	C-66.1.06.02.0021	งานปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 ชั้น	477,500.00	ธ.ค. 65	477,500.00	460,747.66	มี.ค. 66	477,500.00	-
10	ฝคจ.	C-66.1.06.02.0024	เครื่องมือสำรวจหาตำแหน่งท่อรั่ว Hydrophone	2,716,200.00	ก.พ. 66	2,716,200.00	-	มี.ค. 66	2,716,200.00	-
11	ฝคจ.	C-66.1.06.02.0025	งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดอัตราไหล ชนิดใช้คลื่นอัลตราโซนิคแบบติดตั้งรัดติดกับท่อและฝังกลบถาวร	8,000,000.00	ก.พ. 66	8,000,000.00	-	ก.ย. 66	8,000,000.00	-
12	ฝคจ.	C-66.1.06.02.0026	เครื่องมือสำรวจหาท่อรั่ว แบบหัวรับสัญญาณชนิด Hydrophone (Local Leak Noise Correlator with Hydrophone Sensor)	461,000.00	ก.พ. 66	461,000.00	-	มี.ค. 66	461,000.00	-
13	ฝสน.	C-66.1.06.02.0029	งานซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer) ขนาด 7.5 MVA และสวิตช์เกียร์แรงดัน 115 kV ชนิด Hybrid Compact Switchgear พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สจ.มีนบุรี	5,685,633.33	-	-	-	-	-	-
รวม ประจำปี				17,994,778.33		12,309,145.00	1,115,192.66		12,309,145.00	
รวม รายการที่ขออนุมัติใช้จากเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน				53,131,247.52		45,672,049.00	2,438,462.66		17,037,687.39	





4. ปัญหาการส่งมอบท่อ และ รายงานท่อที่ยังไม่แจ้ง  
กำหนดส่งมอบท่อในระบบ Pipe Order System (POS)

#### 4. ปัญหาการส่งมอบท่อ



จากการประชุมคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ 20 ก.พ.66 เวลา 9.00 น. ผชช.กปน.ระดับ 9 (น.ส.สมพิศ นวพรชัย) รายงาน ผวก. ทราบว่า สายงานบริการมีประเด็นปัญหาไม่สามารถเบิกท่อได้

ผวก. เชิญประชุมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รวก.(กอ) รวก.(ว) , ผอ.ฝจพ. ,ผอ.กจพ.ฝจพ. , ผอ.ฝมส. , ผอ. กมว. , ผจ.สสญ. , ผจ.สสว. , ผอ.กรก.สสบ. และ หน.สพด.สสว.หารือร่วมกัน ในวันที่ 20 ก.พ.66 เวลา 16.00 น.





## 4. ปัญหาการส่งมอบท่อ

- สายงานบริการ รายงานที่ประชุมว่า รายงานท่อที่ยังไม่แจ้งส่งข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ.256 เวลา 14.07 น. จำนวนรวม 110,262 เมตร
- ขอให้สายงานบริการจัดทำแผนความต้องการค่าท่อ และประสานงาน ฝ.จ.พ. เพื่อจัดหาท่อให้ได้ตามแผน
- ผจ.สสญ. ชี้แจงว่า บางงานไม่สามารถคาดการณ์ปริมาณท่อได้ เนื่องจากเป็นงานหมู่บ้านจัดสรร หรือ งานที่รอหนังสือตอบอนุญาต

รายงานท่อที่ยังไม่แจ้งส่งข้อมูล อัปเดต GG Sheet เวลา 14.07น.

BRANCH	8.5					13.5					รวม
	100	150	200	300	รวม	100	150	200	300	รวม	
ทุ่งมหาเมฆ	-	-	-	-	-	138	2,496	-	-	2,634	2,634
สุขุมวิท	984	-	-	-	984	-	-	-	72	72	1,056
พระโขนง	1,524	534	-	-	2,058	-	516	-	-	516	2,574
สมุทรปราการ	660	-	1,602	-	2,262	-	3,834	-	-	3,834	6,096
ชว.ก(1)	3,168	534	1,602	-	5,304	138	6,846	-	72	7,056	12,360
พญาไท	156	-	-	-	156	1,278	966	-	318	2,562	2,718
แมนศรี	48	-	-	-	48	-	1,380	-	-	1,380	1,428
ลาดพร้าว	288	-	-	-	288	444	1,956	-	1,116	3,516	3,804
ชว.ก(2)	492	-	-	-	492	1,722	4,302	-	1,434	7,458	7,950
ประชาชื่น	276	-	-	-	276	4,230	-	-	102	4,332	4,608
บางเขน	3,210	486	444	-	4,140	4,482	1,944	180	102	6,708	10,848
มีนบุรี	1,782	-	-	-	1,782	4,440	4,434	1,938	-	10,812	12,594
สุวรรณภูมิ	1,488	-	-	-	1,488	-	1,872	-	-	1,872	3,360
ชว.ก(3)	6,756	486	444	-	7,686	13,152	8,250	2,118	204	23,724	31,410
รวก.(กอ)	10,416	1,020	2,046	-	13,482	15,012	19,398	2,118	1,710	38,238	51,720
บางกอกน้อย	360	-	-	-	360	438	3,078	600	-	4,116	4,476
ตากสิน	390	-	-	-	390	2,040	5,322	396	-	7,758	8,148
ภาษีเจริญ	1,860	-	-	-	1,860	4,494	8,142	360	900	13,896	15,756
สุขสวัสดิ์	672	-	-	-	672	-	8,826	1,626	2,634	13,086	13,758
ชว.ก(4)	3,282	-	-	-	3,282	6,972	25,368	2,982	3,534	38,856	42,138
นนทบุรี	828	-	-	-	828	-	894	-	-	894	1,722
บางบัวทอง	2,508	-	-	-	2,508	-	1,896	-	2,478	4,374	6,882
มหาสวัสดิ์	4,266	-	162	-	4,428	-	1,932	-	1,440	3,372	7,800
ชว.ก(5)	7,602	-	162	-	7,764	-	4,722	-	3,918	8,640	16,404
รวก.(กต)	10,884	-	162	-	11,046	6,972	30,090	2,982	7,452	47,496	58,542
รวมทั้ง กปน.	21,300	1,020	2,208	-	24,528	21,984	49,488	5,100	9,162	85,734	110,262

## 4. ปัญหาการส่งมอบท่อ

ฟ.พ.

สรุปรายงานการตรวจรับมอบท่อ ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ.2566

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ. 2566

ขนาดท่อ	ชั้นคุณภาพ 8.5				ชั้นคุณภาพ 13.5				
	กองเหลือในสัญญา		สาขา ส่งจ่าย	หมายเหตุ ตรวจรับเดือน ก.พ.66	กองเหลือในสัญญา		สาขา ส่งจ่าย	หมายเหตุ ตรวจรับเดือน ก.พ.66	หมายเหตุ ตรวจรับเดือน มี.ค.66
	พร้อม จ่าย	รอการ ตรวจรับ			พร้อมจ่าย	รอการ ตรวจรับ			
ศก. 100 มม.	36	43,200	22,962	22 ก.พ.66 14400 28 ก.พ.66 7200 2 มี.ค.66 7200	918	343,518	37,482	จำนวน 28800 เมตร	จำนวน 14400 เมตร
ศก. 150 มม.	5,238	24,600	1,494		108	264,108	54,030	จำนวน 34800 เมตร	จำนวน 21600 เมตร
ศก. 200 มม.	60	13,200	2,208	22 ก.พ.66 4800	30	69,630	8,058	จำนวน 19800 เมตร	
ศก. 300 มม.	708		180		648	73,278	12,498	จำนวน 10128 เมตร	จำนวน 6324 เมตร



## 4. ปัญหาการส่งมอบท่อ

ฝ.จ.พ.

รายงานการตรวจรับมอบท่อ ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ.2566

Class 8.5

แผนการตรวจรับท่อ พีวีซี. ชั้นคุณภาพ 8.5 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กพ. 2566

เลขที่สัญญา	คู่สัญญา	100(8.5)				150(8.5)				200(8.5)				300(8.5)			
		พร้อมจ่าย	รอกการ ตรวจรับ	แผน ตรวจรับ	วันที่ ตรวจรับ	พร้อมจ่าย	รอกการ ตรวจรับ	แผน ตรวจรับ	วันที่ ตรวจรับ	พร้อมจ่าย	รอกการ ตรวจรับ	แผน ตรวจรับ	วันที่ ตรวจรับ	พร้อมจ่าย	รอกการ ตรวจรับ	แผน ตรวจรับ	วันที่ ตรวจรับ
ชท.10/2563	บ.ท่อน้ำไทย													708			
ชค.10-1/2566	บ.เอส ซี					5220											
ชค.13-1/2566	บ.บางกอก	36	43,200	ตรวจรับ 22 กพ.66 14400 ตรวจรับ 28 กพ.66 7200													
ชค.13-2/2566	บ.เอส ซี					18	24,600										
ชค.13-3/2566	บ.ไทยมัย									60	13,200	ตรวจรับ 21 กพ.66 4800					

ชค.42/66 ตรวจรับคันเคื่อน มีค.66 ท่อ 100 มม. จำนวน 7200 เมตร

## 4. ปัญหาการ ส่งมอบท่อ

ฝ.จ.พ.

## รายงานการตรวจรับมอบท่อ ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ.2566 Class 13.5

แผนการตรวจรับท่อ พีวีซี. ชั้นคุณภาพ 13.5 ณ วันที่ 31 มค. 2566

เลขที่สัญญา	คู่สัญญา	ลงนามสัญญา	100(13.5)				150(13.5)				200(13.5)				300(13.5)			
			พร้อมจ่าย	รอกการตรวจรับ	แผนตรวจรับ	วันที่ตรวจรับ	พร้อมจ่าย	รอกการตรวจรับ	แผนตรวจรับ	วันที่ตรวจรับ	พร้อมจ่าย	รอกการตรวจรับ	แผนตรวจรับ	วันที่ตรวจรับ	พร้อมจ่าย	รอกการตรวจรับ	แผนตรวจรับ	วันที่ตรวจรับ
ชค.30/2566	บ.เอส ซี.	28 ตค.66	-												204			
ชค.18/2566	บ.ภาคใต้	6 มค.66	372	139,800	ตรวจรับ 2 มีค.66	14400	18	67200	ตรวจรับ 2 มีค.66	14400	30	14,400			360	6324	ตรวจรับ 10 มีค.66	6324
ชค.19/2566	บ.เอส ซี.	17 มค.66	0	58,800	ตรวจรับ 21 กพ.66	14400	-	57600	ตรวจรับ 21 กพ.66	7200		16,200	ตรวจรับ 21 กพ.66	5400		14238	ตรวจรับ 20 กพ.66	3438
ชค.20/2566	บ.คงสงวน	10 มค.66	324					43800	ตรวจรับ 8 มีค.66	7200		28,200	ตรวจรับ 21 กพ.66	7200		4433		
ชค.21/2566	บ.บางกอก	10 มค.66	222	120,600	ตรวจรับ 22 กพ.66	7200		60600	ตรวจรับ 22 กพ.66	13200		1,200				21168	ตรวจรับ 22 กพ.66	840
ชค.22/2566	บ.ไทยมัย	13 มค.66	0	23,400	ตรวจรับ 21 กพ.66	7500		34800	ตรวจรับ 21 กพ.66	7200		9,600	ตรวจรับ 21 กพ.66	7200		26478	ตรวจรับ 21 กพ.66	5850


10128

ภาค	เลขที่สัญญา บริษัท	จำนวนต้องจัดเตรียมในแต่ละเดือน(เงื่อนไขสัญญา)				สัญญา	100 มม.	150 มม.	200 มม.	300 มม.	ตรวจรับเมื่อวันที่
		100 มม.	150 มม.	200 มม.	300 มม.						
1	ชค.18/2566 บ.ภาคใต้	12,492	10,470	4,734	3,510	ชค.18/66	14,400	10,800	14,400	7,800	2กพ.66 16 กพ.66
2	ชค.19/2566 บ.เอส ซี.	5,682	4,560	3,354	1,620	ชค.20/66	12,600	10,800	3,600	3,600	9 กพ.66 16 กพ.66
3	ชค.20/2566 บ.คงสงวน	18,042	11,550	4,242	2,100	ชค.21/66				720	13 กพ.66
4	ชค.21/2566 บ.บางกอก	19,470	11,244	1,200	5,454	ชค.22/66	12600			3150	1 กพ.66
5	ชค.22/2566 บ.ไทยมัย	13,644	6,432	3,870	6,210	ชค.30/66				3600	9 กพ.66




รายงานท่อที่ยังไม่แจ้งกำหนดส่งมอบท่อในระบบ Pipe Order System (POS)  
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 โดย หน.สพด.สสบ.

แยกตามเดือนที่บันทึกสั่งท่อ

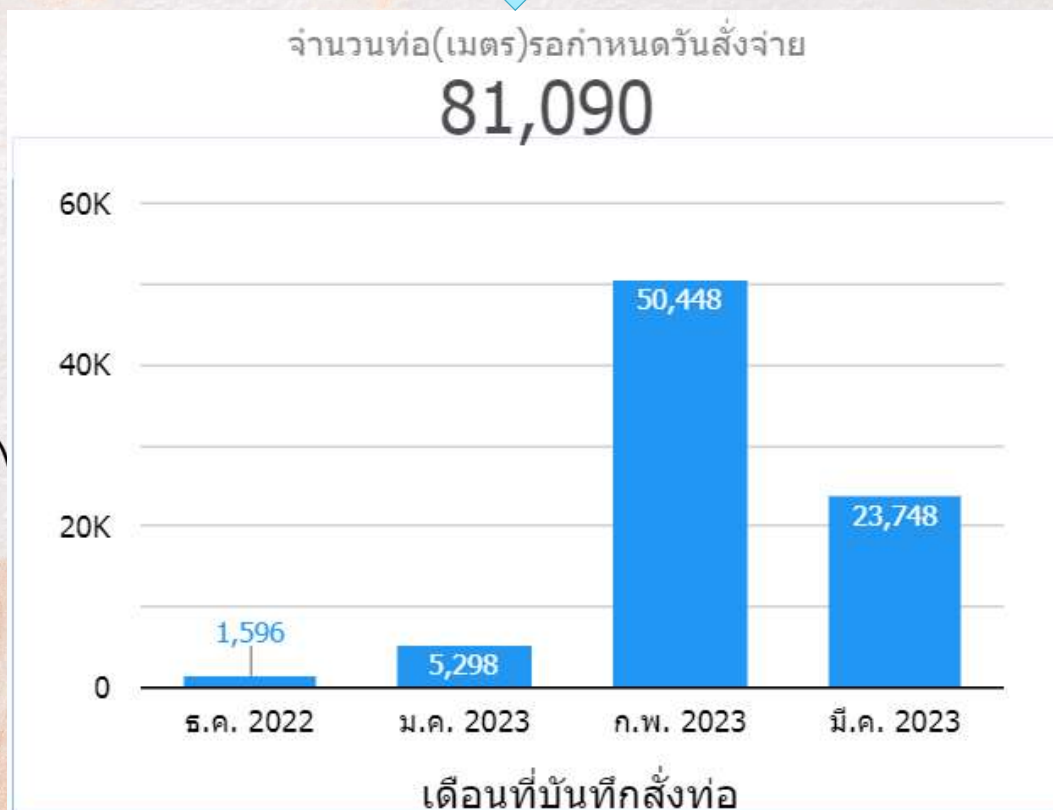

แยกตาม **Class** และขนาดท่อ

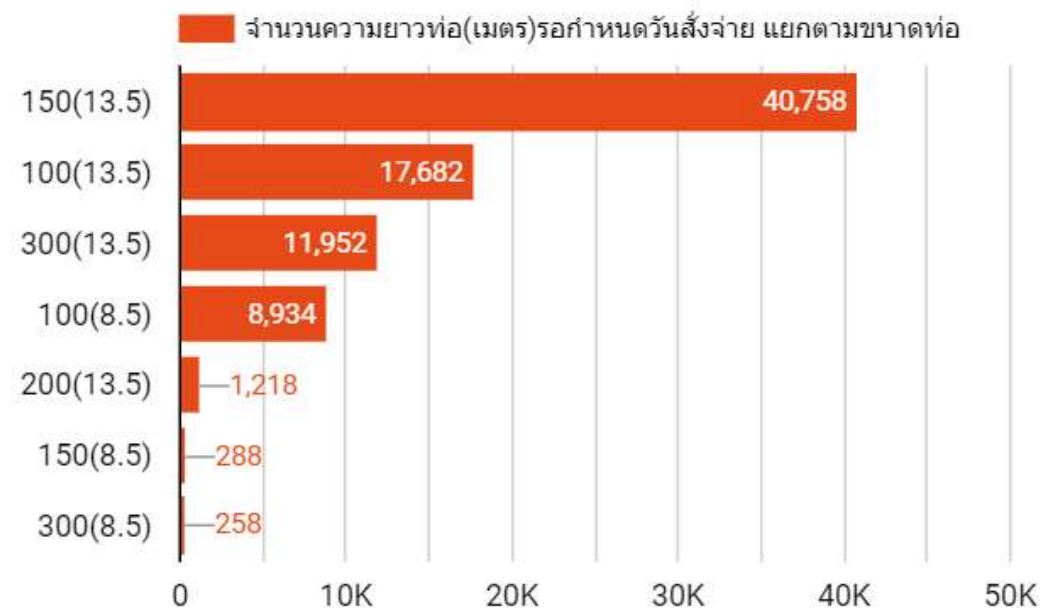

รายงานท่อที่ยังไม่แจ้งกำหนดส่งมอบท่อในระบบ


Pipe Order System (POS)

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 โดย หน.สพด.สสบ.


แยกตามประเภทงาน และขนาดท่อ

จำนวนท่อ(เมตร) รอกำหนดวันส่งจ่าย / แยกตามประเภทงานและขนาดท่อ					
M ขนาดท่อ	งานปรับปรุงลดน้ำสูญเสีย...	งานปรับปรุงกำลังน้ำ (...)	เบิกวางท่อ-เอกชนWB...	งานขยายเขตจำหน่าย...	สำรองคลัง (301)
3. 100(8.5)	-	-	8,574	-	360
3. 150(8.5)	-	-	138	-	150
3. 300(8.5)	-	-	-	-	258
3. 100(13.5)	16,434	1,248	-	-	-
3. 150(13.5)	33,462	6,060	384	852	-
3. 200(13.5)	1,218	-	-	-	-
3. 300(13.5)	5,634	5,796	150	372	-
รวมทั้ง...	56,748	13,104	9,246	1,224	768

สัดส่วนมูลค่า แยกตามประเภทงบประมาณ

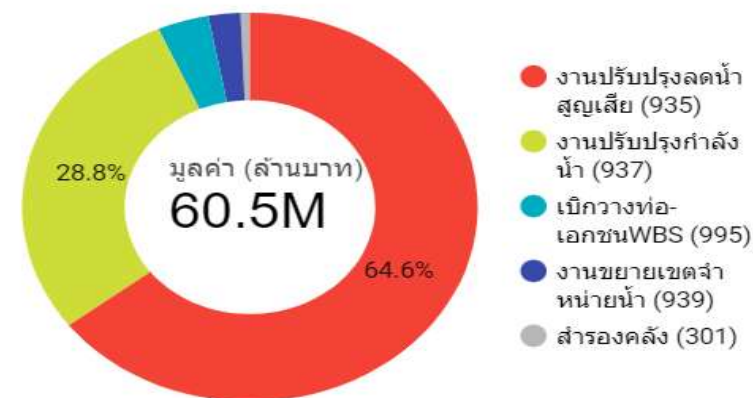

สัดส่วนจำนวน (เมตร) แยกตามประเภทงบประมาณ

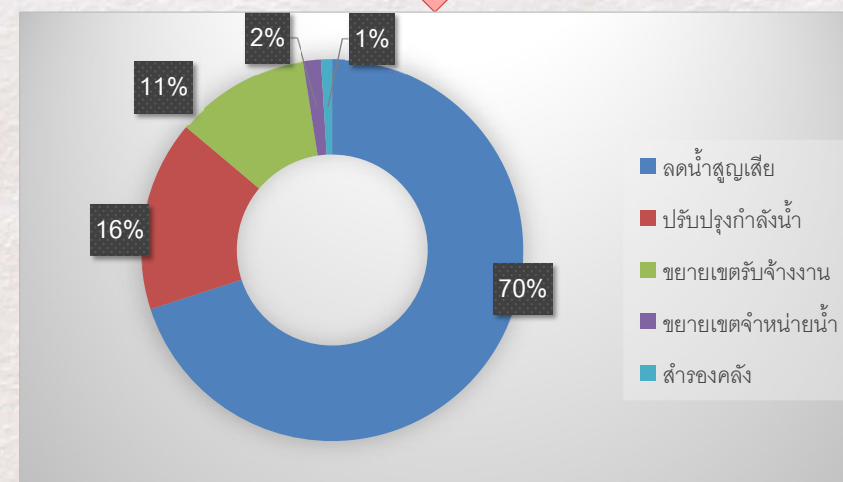





THANK YOU
