




การประปานครหลวง

METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

ผลการดำเนินงานด้านลดน้ำสูญเสีย
ประจำเดือน มีนาคม 2566

ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสม กุมภาพันธ์ 2566 (กปน.)

(%)

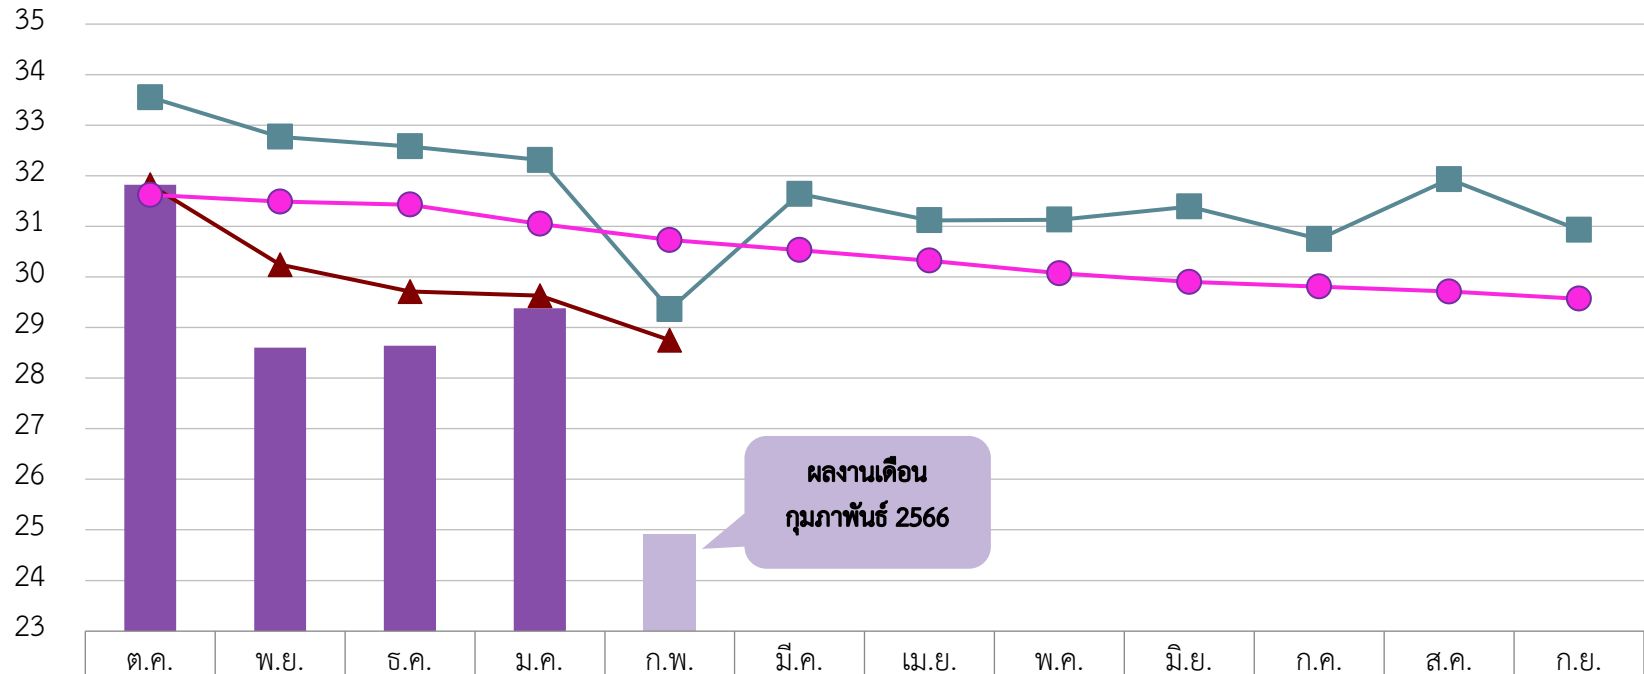

รายเดือน ปี 2566	31.82	28.60	28.64	29.38	24.90							
รายเดือน ปี 2565	33.55	32.77	32.58	32.31	29.36	31.64	31.12	31.13	31.39	30.75	31.93	30.93
สะสม ปี 2566	31.82	30.24	29.71	29.63	28.75							
เป้าหมาย ปี 2566	31.62	31.49	31.43	31.05	30.73	30.53	30.32	30.07	29.90	29.81	29.71	29.57

ผลงานอัตราน้ำสูญเสียเดือนกุมภาพันธ์ 2566

สาขา	ปริมาณน้ำเข้า (ลบ.ม./วัน)		ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม./วัน)		เป้าหมายน้ำจำหน่าย รายเดือน (ลบ.ม./วัน)	% น้ำจำหน่ายเทียบ เป้าหมาย รายเดือน (%)	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)		เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)	
	ม.ค.	ก.พ.	ม.ค.	ก.พ.			ม.ค.	ก.พ.	ม.ค.	ก.พ.
สสท.	229,225.00	230,730.00	153,622.96	175,701.52	156,071.43	12.58	75,602.04	55,028.48	32.98	23.85
สสส.	392,780.00	398,842.00	274,762.21	290,834.99	270,571.43	7.49	118,017.79	108,007.01	30.05	27.08
สสพ.	374,682.00	374,725.00	283,735.25	298,956.00	301,964.29	-1.00	90,946.75	75,769.00	24.27	20.22
สสป.	518,968.00	524,960.00	374,310.36	413,530.29	410,678.57	0.69	144,657.64	111,429.71	27.87	21.23
สสญ.	327,220.00	333,383.00	238,384.68	257,107.14	253,750.00	1.32	88,835.32	76,275.86	27.15	22.88
สสม.	298,184.00	303,498.00	207,932.52	219,236.56	192,250.00	14.04	90,251.48	84,261.44	30.27	27.76
สสล.	284,147.00	286,300.00	215,200.77	226,095.91	232,107.14	-2.59	68,946.23	60,204.09	24.26	21.03
สสช.	224,565.00	229,815.00	170,616.11	179,976.53	181,214.29	-0.68	53,948.89	49,838.47	24.02	21.69
สสข.	191,226.00	188,158.00	156,055.09	170,098.45	158,464.29	7.34	35,170.91	18,059.55	18.39	9.60
สสมบ.	252,087.00	255,283.00	214,812.60	224,742.61	219,321.43	2.47	37,274.40	30,540.39	14.79	11.96
สสสภ.	309,957.00	323,297.00	257,299.15	287,037.26	279,535.71	2.68	52,657.85	36,259.74	16.99	11.22
สสบ.	338,723.00	335,866.00	202,936.51	211,005.14	198,035.71	6.55	135,786.49	124,860.86	40.09	37.18
สสต.	344,347.00	337,379.00	214,613.69	236,733.15	228,821.43	3.46	129,733.31	100,645.85	37.68	29.83
สสภ.	327,921.00	322,934.00	207,143.03	218,183.52	209,285.71	4.25	120,777.97	104,750.49	36.83	32.44
สสว.	363,952.00	365,783.00	213,689.72	225,141.06	208,321.43	8.07	150,262.28	140,641.94	41.29	38.45
สสน.	248,741.00	254,356.00	179,554.63	189,051.89	195,357.14	-3.23	69,186.37	65,304.11	27.81	25.67
สสบท.	231,051.00	233,620.00	160,924.30	168,255.94	149,892.86	12.25	70,126.70	65,364.06	30.35	27.98
สสมส.	263,479.00	255,066.00	173,277.19	179,438.15	189,071.43	-5.10	90,201.81	75,627.85	34.23	29.65
กปน.	5,521,255.00	5,553,995.00	3,898,870.76	4,171,126.08	4,034,714.29	3.38	1,622,384.24	1,382,868.92	29.38	24.90

ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสมเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (เทียบเป้าหมายรายเดือน)

สาขา	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)			เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)			แนวโน้มน้ำ สูญเสีย 3 เดือน ย้อนหลัง	ผลงานสะสม (%)	เป้าหมาย	
	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.			เป้า ดำเนินการ ก.พ. 66 (%)	เป้า ดำเนินการ ปิงฯ 66 (%)
สสพ.	75,253.72	78,122.11	49,703.14	33.10	32.98	23.85	ลดลง	31.51	35.27	33.50
สสส.	110,734.42	121,951.72	97,554.72	28.41	30.05	27.08		29.21	28.39	27.51
สสพ.	86,088.71	93,978.31	68,436.52	23.25	24.27	20.22		23.10	25.70	24.74
สสป.	122,287.45	149,479.56	100,646.19	23.83	27.87	21.23		25.82	26.54	25.28
ชวก.(ก1)	394,364.30	443,531.70	316,340.57	26.28	28.32	22.90		26.88	28.07	26.89
สสญ.	77,508.00	91,796.50	68,894.32	24.26	27.15	22.88		24.83	30.55	29.29
สสม.	89,561.93	93,259.86	76,107.11	30.18	30.27	27.76		29.75	34.83	32.64
สสล.	68,762.03	71,244.44	54,377.89	23.98	24.26	21.03		24.61	26.95	25.52
ชวก.(ก2)	235,831.96	256,300.80	199,379.32	26.12	27.27	23.91		26.37	30.81	29.18
สสช.	51,552.49	55,747.19	45,015.40	22.96	24.02	21.69		24.36	25.24	24.39
สสช.	38,139.69	36,343.28	16,311.86	20.12	18.39	9.60	ลดลง	17.70	21.12	19.81
สสมบ.	35,756.72	38,516.88	27,584.87	14.33	14.79	11.96		14.87	16.63	16.28
สสสภ.	34,258.52	54,413.11	32,750.74	11.23	16.99	11.22		14.61	15.25	14.96
ชวก.(ก3)	159,707.42	185,020.45	121,662.86	16.49	18.31	13.52		17.54	19.08	18.41

ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสมเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (เทียบเป้าหมายรายเดือน)

สาขา	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)			เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)			แนวโน้มน้ำ สูญเสีย 3 เดือน ย้อนหลัง	ผลงานสะสม (%)	เป้าหมาย	
	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.			เป้า ดำเนินการ ก.พ. 66 (%)	เป้า ดำเนินการ ปีงบประมาณ 66 (%)
สสบ.	145,789.15	140,312.70	112,777.55	41.97	40.09	37.18	ลดลง	41.42	43.17	41.57
สสด.	134,844.10	134,057.76	90,905.93	38.22	37.68	29.83	ลดลง	37.98	41.31	40.45
สสภ.	122,546.10	124,803.90	94,613.34	37.04	36.83	32.44	ลดลง	36.13	38.00	36.69
สสว.	152,315.79	155,271.02	127,031.43	41.59	41.29	38.45	ลดลง	41.10	43.35	41.81
ชวก.(ก4)	555,495.14	554,445.38	425,328.25	39.76	39.02	34.58	ลดลง	39.21	41.51	40.18
สสน.	70,229.15	71,492.58	58,984.36	27.67	27.81	25.67		27.82	27.59	26.82
สสบท.	72,284.79	72,464.26	59,038.51	31.16	30.35	27.98	ลดลง	30.01	30.07	29.28
สสมส.	91,352.43	93,208.54	68,309.03	35.23	34.23	29.65	ลดลง	34.08	34.19	33.74
ชวก.(ก5)	233,866.37	237,165.38	186,331.90	31.39	30.88	27.76	ลดลง	30.69	30.70	30.05
กปน.	1,579,265.19	1,676,463.71	1,249,042.90	28.64	29.38	24.90		28.75	30.73	29.57

รายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรมลดน้ำสูญเสียเดือน กุมภาพันธ์ 2566

สาขา	งานสำรวจท่อรั่ว						งานซ่อมท่อ (จุด)									
	Step Test (ครั้ง)		ระยะทางสำรวจท่อรั่ว (กม.)		จำนวนจุดรั่วที่พบ		Reported Burst				Unreported Burst				รวม	
							ท่อจ่าย		ท่อบริการ ⁽¹⁾		ท่อจ่าย		ท่อบริการ ⁽¹⁾			
	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾		
สสท.	4	7	377	587	150	478	4	3	278	190	10	17	114	248	406	458
สสส.	-	1	346	363	296	395	32	35	405	682	9	8	231	282	677	1,007
สสพ.	6	8	519	577	380	362	46	35	487	758	8	29	301	338	842	1,160
สสป.	12	2	271	690	879	806	63	71	600	630	14	22	638	553	1,315	1,276
ภาค 1	22	18	1,513	2,217	1,705	2,041	145	144	1,770	2,260	41	76	1,284	1,421	3,240	3,901
สสญ.	12	7	421	603	398	363	16	22	270	313	14	15	337	275	637	625
สสม.	12	10	468	568	668	393	24	18	272	227	3	14	650	362	949	621
สสล.	11	12	555	474	792	648	40	28	428	447	11	24	730	552	1,209	1,051
ภาค 2	35	29	1,444	1,644	1,858	1,404	80	68	970	987	28	53	1,717	1,189	2,795	2,297
สสข.	6	-	1,064	156	382	402	18	33	387	397	10	15	321	306	736	751
สสข.	4	3	298	260	183	153	19	12	850	602	10	7	143	145	1,022	766
สสมบ.	2	4	378	340	240	242	45	57	334	399	14	18	224	221	617	695
สสสภ.	6	8	595	726	500	607	36	53	308	337	11	25	425	441	780	856
ภาค 3	18	15	2,335	1,481	1,305	1,404	118	155	1,879	1,735	45	65	1,113	1,113	3,155	3,068
รวก.(กอ)	75	62	5,292	5,342	4,868	4,849	343	367	4,619	4,982	114	194	4,114	3,723	9,190	9,266
สสบ.	9	11	756	674	984	1,301	25	28	937	1,000	12	25	924	1,214	1,898	2,267
สสต.	-	4	718	1,362	1,078	878	53	9	1,125	293	9	3	881	288	2,068	593
สสภ.	21	34	1,500	2,188	1,112	1,987	30	32	1,024	673	20	23	995	1,537	2,069	2,265
สสว.	4	8	1,067	1,376	1,495	1,729	37	45	583	603	12	21	1,391	1,523	2,023	2,192
ภาค 4	34	57	4,040	5,601	4,669	5,895	145	114	3,669	2,569	53	72	4,191	4,562	8,058	7,317
สสน.	-	-	267	437	362	280	11	17	420	372	15	17	308	231	754	637
สสบท.	4	-	296	511	492	593	33	43	766	1,070	20	13	421	469	1,240	1,595
สสมส.	-	-	644	1,423	885	1,075	31	48	744	678	18	9	703	873	1,496	1,608
ภาค 5	4	-	1,206	2,370	1,739	1,948	75	108	1,930	2,120	53	39	1,432	1,573	3,490	3,840
รวก.(กต)	38	57	5,247	7,971	6,408	7,843	220	222	5,599	4,689	106	111	5,623	6,135	11,548	11,157
กปน.	113	119	10,539	13,314	11,276	12,692	563	589	10,218	9,671	220	305	9,737	9,858	20,738	20,423

หมายเหตุ :

ข้อมูลผลงานจากระบบ WLMA ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566 ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 บันทึกโดยสำนักงานประปาสาขา


(1) จำนวนงานซ่อมท่อบริการ = ผลรวมของงานซ่อมท่อบริการ + อุปกรณ์ท่อจ่าย + อุปกรณ์ท่อบริการ + อุปกรณ์อื่นๆ

(2) คือ จำนวนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบในช่วงเดือนเดียวกัน ระหว่างปีงบประมาณ 2566 และ ปีงบประมาณ 2565

การดำเนินงานปรับปรุง DM ตามเป้าหมาย RTU ใช้งาน 85%

รูปแบบการดำเนินงาน		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
เปลี่ยนมาตร สวส.กาท. (ชล.32/2564)	แผนงาน	13	9	14	6	2	2	2	2	2	2	2	2
	ผลงาน	13	9	14	2	3							
เปลี่ยนมาตร สพง.กาท. (ชล.31/2564)	แผนงาน	8	8	9	9	9	9	6	8	8	8	8	
	ผลงาน	8	14	12	10	14							
เปลี่ยนมาตร สพง.กาท. (ชล.52/2565)	แผนงาน				8	9	9	6	8	8	8	8	8
	ผลงาน				5	14							
ชล.24/2566	แผนงาน	สัญญาติดอุทธรณ์											
	ผลงาน												
เปลี่ยนมาตรสัญญา 10 ล้าน	แผนงาน											4	8
	ผลงาน												
รับประกัน	แผนงาน			30									
CM/PM เร่งด่วน	แผนงาน			10	10	0	3						
	ผลงาน			0	8	5							
CM/PM ตามแผน	แผนงาน							20	30	20	10	20	10
	ผลงาน												
อัตราการเสีย (0.5%)		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
รวมแผนงาน		12	8	54	24	11	14	25	39	29	19	33	19
ผลงานจริง		12	14	17	16	27							
รวมแผนงานสะสม		12	20	74	98	109	123	148	187	216	235	268	287
ผลงานสะสม		12	26	43	59	86							

การดำเนินงานปรับปรุง DM ตามเป้าหมาย RTU ใช้งาน 85%

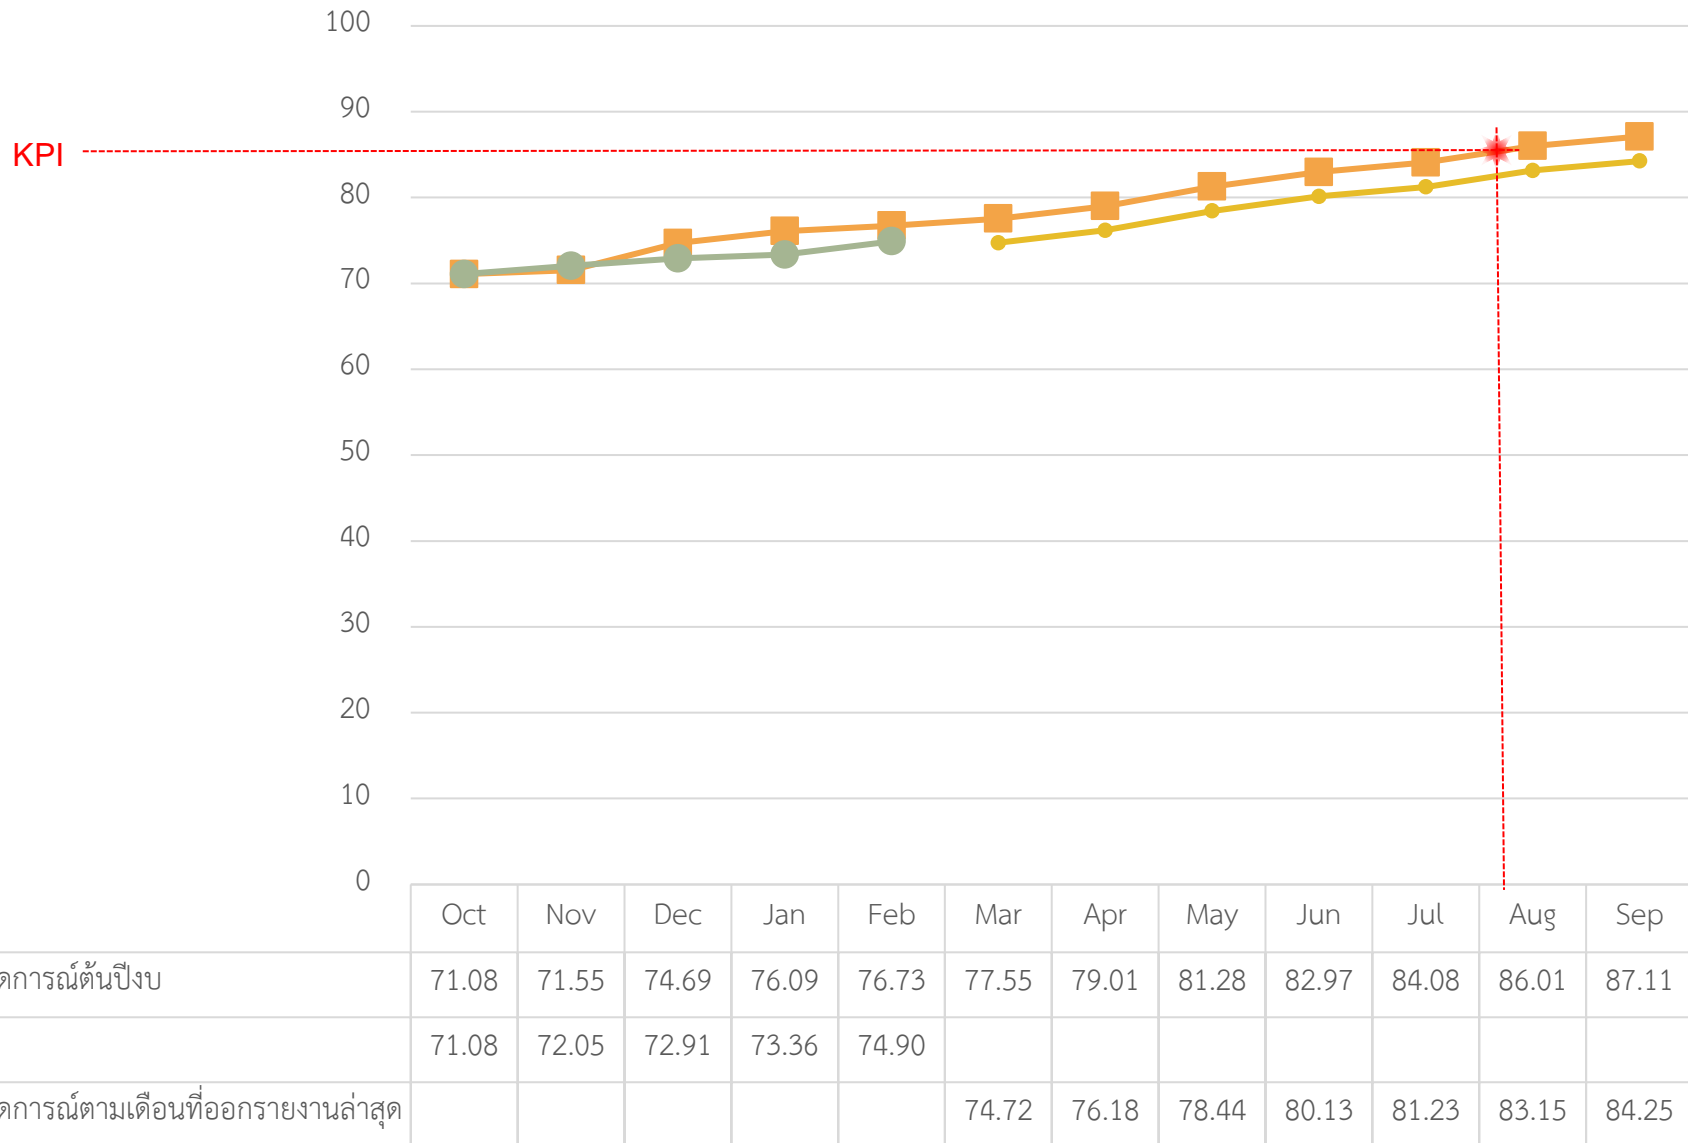

ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย ณ เดือน มีนาคม 2566

ระดับข้อมูล	จำนวนงาน Step Test	จำนวนงาน สร.	ระยะทางที่เดิน	จำนวนจุดรั่วที่พบ	จำนวนงานซ่อมที่เปิดสปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อจ่าย สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อบริการ สปน.	งานซ่อมท่อจ่าย สปน.	งานซ่อมท่อบริการ สปน.	ไม่พบจุดรั่ว สปน.	อื่นๆ สปน.	ยกเลิกงาน สปน.
กปน.	16	712	3,806	3,968	3,951	32	2,322	18	1,215	24	90	4
รวก.(กอ)	14	332	1,632	1,493	1,481	14	869	9	479	14	66	0
รวก.(กต)	2	380	2,174	2,475	2,470	18	1,453	9	736	10	24	4

ระดับข้อมูล	จำนวนงานซ่อมที่เปิดรับแจ้ง	ปิดงานภาคสนามท่อจ่าย – รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนามท่อบริการรับแจ้ง
กปน.	3,266	120	2,700
รวก.(กอ)	1,554	73	1,248
รวก.(กต)	1,712	47	1,452

SCAN หากต้องการดู
รายละเอียดงาน




หมายเหตุ: กรณีทุกตัว DM คาดว่าใช้งานได้หมด จะใช้น้ำเข้า DMA จริงจากอุปกรณ์เครื่องวัดภาคสนาม
กรณีคาดว่ามิบบาง DM ใช้งานไม่ได้ จะใช้น้ำเข้า DMA จากข้อมูลคาดการณ์จากสาขาเดือนก่อนหน้า

***ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน กลส.ฟจส. ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566

จุดงานที่คาดว่าจะดำเนินการในสัญญา CPM ปีงบประมาณ 2566

จำนวนตู้

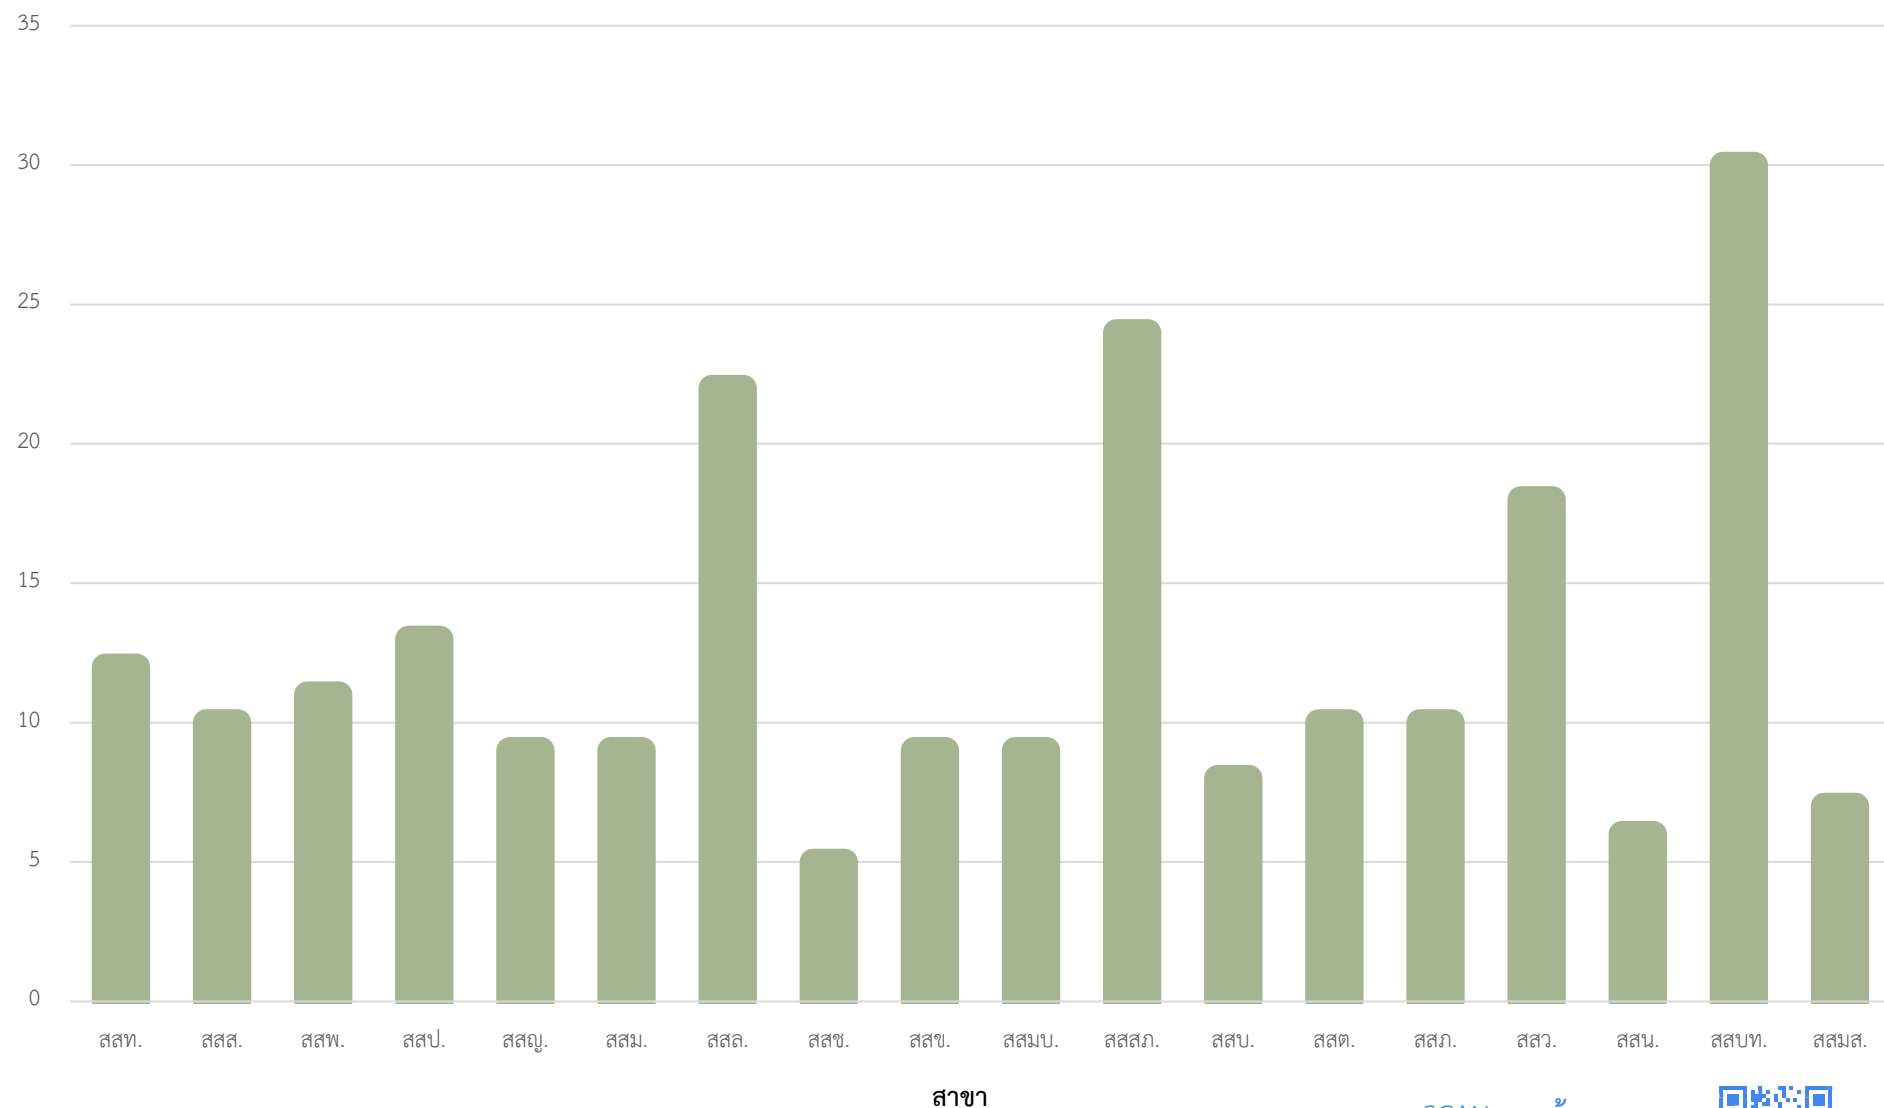

shorturl.at/kpGW6

SCAN หากต้องการ
ดูรายละเอียดงาน ➡



ติดตั้ง DMA ใหม่ (จุดวัดอัตราการไหลและแรงดันน้ำ) สนับสนุนกิจกรรมการจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาสาขา

ลงนามสัญญาวันที่ 19 มี.ค.64 / กช.ผจพ. มีการแก้ไขข้ออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา รายละเอียดวันแจ้งเริ่มงาน
สิ้นสุด วันที่ 21 มี.ย.64 /ประชุม precon วันที่ 19 ต.ค.64เริ่มงานแล้ววันที่ 8 พ.ย. 2564 สิ้นสุด 3 มี.ค.66
ระยะเวลาดำเนินงาน 480 วัน

จุดที่ดำเนินการแล้ว (สสป.4 ,สสส. 3 สสสภ. 4 ,สสมส. 5 ,สสต. 1, สสช. 3 ,สสมบ. 1 ,สสบ. 1 ,สสช.1 และ สสว. 4)

ดำเนินการขอมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงระบบแล้วจำนวน 23 จุด

ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 4 จุด วันที่ 8 ธ.ค. 2565 ค่างาน 2.5 ลบ.

ดำเนินการเชิงคณะกรรมการประชุมฯ (พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โควิด 2019 ค่าปรับร้อยละ 0)

A	อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคากลาง)/ตรวจ SMEs	D	ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)	แผนการดำเนินงาน
B	ยื่นเอกสารประกวดราคา	E	ลงนามสัญญา	เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน
C	ตรวจเอกสาร	F	ดำเนินงานตามสัญญา	ล่าช้ากว่าแผน

ติดตั้ง DMA ใหม่

เป้าหมาย

ติดตั้ง DMA ใหม่ (จุดวัดอัตราการไหลและแรงดันน้ำ) สนับสนุนกิจกรรมการจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาสาขา

รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2565												2566											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
งานปรับปรุงประสิทธิภาพ (ติดตั้ง ใหม่) เลขที่ ซล.58/2565 (กลุ่มที่ 1 พื้นที่บริการ 1,2 และกลุ่มที่ 2 พื้นที่บริการ 3,4 และ 5)	กลุ่มที่ 1 43 จุด	43 ลบ.																								
	กลุ่มที่ 2 47 จุด	47 ลบ.																								

TOR แล้วเสร็จวันที่ 19 ธ.ค.65 ,ราคากลางแล้วเสร็จ /ฝจพ. จัดทำประกาศประกวดราคาฯ

หมายเหตุ

A อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคากลาง)/ตรวจ SMEs

B ยื่นเอกสารประกวดราคา

C ตรวจเอกสาร

D ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)

E ลงนามสัญญา

F ดำเนินงานตามสัญญา

แผนการดำเนินงาน

เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน

ล่าช้ากว่าแผน

งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 1, 2 3 และ 4 5 และ (ส่วนต่อขยาย)

เป้าหมาย	บริหารข้อมูลฯ
----------	---------------

รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2565			2566											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 1						F											
			F														
งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 2,3			F			A	B	C	D	E	F						
			F			A											
			A	B	C	D	E	F									
						F											
งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 2,3 (ส่วนต่อขยาย)	18 จุด	0.8 ล้านบาท	F														
			F														
			A	B	C	D	E	F									
						F											
งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 4,5			F			A	B	C	D	E	F						
			F			A											
			A	B	C	D	E	F									
						F											
งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 4,5 (ส่วนต่อขยาย)	20 จุด	0.8 ล้านบาท	F														
			F														
			A	B	C	D	E	F									
						F											

สัญญาบริหารข้อมูล repeat order พื้นที่บริการ 2,3,4,5 ดำเนินการโดยบริษัทฯ เซนส์ อินโฟเทค จำกัด
ระยะเวลา 120 วัน (ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 65 ถึง 1 เม.ย. 66) ประชุมก่อนเริ่มงานแล้ววันที่ 7 ธ.ค. 65



- A

อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคากลาง)/ตรวจ SMEs
- B

ยื่นเอกสารประกวดราคา
- C

ตรวจเอกสาร
- D

ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)
- E

ลงนามสัญญา
- F

ดำเนินงานตามสัญญา

- แผนการดำเนินงาน
- เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน
- ล่าช้ากว่าแผน
- Repeat order

ผลการปฏิบัติงานสนับสนุน เดือนกุมภาพันธ์ 2566

คำร้อง (Request)

งานสำรวจหาท่อรั่วหน้าหมู่บ้านลิวี่ ถ.บางนา-ตราด สสสภ.

การดำเนินการ :

- วันที่ดำเนินการ : 1 กุมภาพันธ์ 2566
- Office Survey : รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากทีมงาน กรร.สสสภ.
- Site Survey : ตรวจสอบระบบท่อบริเวณหน้าหมู่บ้านลิวี่ ถ.บางนา-ตราด ดำเนินการร่วมกับ สปน.สาขา โดย 1) ทดสอบ Chlorine จากแหล่งน้ำต้องสงสัยที่พบในพื้นที่เปรียบเทียบกับค่าที่วัดจากระบบ โดยค่าที่วัดได้จากระบบมีค่า 1.54 และจากแหล่งน้ำในพื้นที่พบค่า CL ช่วง 0.05-0.47 และ 2) สำรวจหาท่อรั่วละเอียดโดย Ground microphone พร้อมเสนอแนะแนวทางการตรวจวัดอัตราการไหลแก่สาขาและแนวทางการปรับปรุงท่อ
- ผลการตรวจสอบ : เจ้าหน้าที่สาขาได้ดำเนินการวัดค่าอัตราการไหลด้วย Ultrasonic Flow Meter และรับแนวทางการปรับปรุงท่อในพื้นที่ต่อไป



ผลการปฏิบัติงานสนับสนุน เดือนกุมภาพันธ์ 2566

งานวันนักประดิษฐ์ 2566 ไบเทค บางนา

การดำเนินการ :

วันที่ดำเนินการ : 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 (5 วัน)

รายละเอียด : ทีมนักวิจัย ฝจส. ในนาม กปน. นำผลงานระบบวิเคราะห์เสียงน้ำรั่วด้วยปัญญาประดิษฐ์และบริหารจัดการข้อมูลผ่านเครือข่ายคราวด์ หรือ “ธารารักษ์” เข้าร่วมจัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรม ระบบวิเคราะห์เสียงน้ำรั่วด้วยปัญญาประดิษฐ์และบริหารจัดการข้อมูลผ่านเครือข่ายคราวด์ หรือ “ธารารักษ์” แก่ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และนำไปพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกต่อไป



ผลการปฏิบัติงานสนับสนุน เดือนกุมภาพันธ์ 2566

คำร้อง (Request)

อบรมผู้รับจ้างภายนอก หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพช่างสำรวจหาท่อรั่ว (พื้นฐาน) 1/2566

การดำเนินการ :

วันที่ดำเนินการ : 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00-16.30 น. (3 วัน)

รายละเอียด : เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร “มาตรฐานวิชาชีพช่างสำรวจหาท่อรั่ว” (พื้นฐาน) รุ่นที่ 1/2566 หัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับน้ำสูญเสียและเครื่องมือสำหรับการสำรวจหาท่อรั่วทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ”

จำนวนผู้เข้าอบรม : บริษัทเอกชน 10 บริษัทฯ และส่วนบุคคล รวมมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 68 คน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการสำรวจหาท่อรั่วสำหรับงานลดน้ำสูญเสียที่จะเข้าทำงานร่วมกับ กปน. และหน่วยงานด้านโครงการระบบน้ำประปาทั่วประเทศ




สถานะเบิกจ้าง ขอซื้อขอจ้าง ลงนาม และแจ้งเริ่มงาน งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2566

สาขา	แผน (1,200 กม.)	เบิกจ้างแล้ว				ขอซื้อขอจ้างแล้ว			ลงนามแล้ว				แจ้งเริ่มงานแล้ว		
		ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน	ฝจพ.	สาขา	รวม	ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน	ฝจพ.	สาขา	รวม
สสส.	78	0	54.214	54.214	69.51%	0	37.874	37.874	0	22.028	22.028	28.24%	0	0	0
สสพ.	65	0	72.079	72.079	110.89%	0	28.127	28.127	0	28.127	28.127	43.27%	0	0	0
สสป.	97	0	103.798	103.798	107.01%	0	89.263	89.263	0	60.046	60.046	61.90%	0	0	0
สสท.	30	0	26.386	26.386	87.95%	0	12.805	12.805	0	8.108	8.108	27.03%	0	0	0
ชาว.(ก1)	270	0	256.477	256.477	94.99%	0	168.069	168.069	0	118.309	118.309	43.82%	0	0	0
สสญ.	53	0	53.297	53.297	100.56%	0	48.143	48.143	0	14.213	14.213	26.82%	0	0	0
สสม.	20	0	20.390	20.390	101.95%	0	8.304	8.304	0	4.644	4.644	23.22%	0	0	0
สสล.	51	0	51.318	51.318	100.62%	0	51.276	51.276	0	27.057	27.057	53.05%	0	0	0
ชาว.(ก2)	124	0	125.005	125.005	100.81%	0	107.723	107.723	0	45.914	45.914	37.03%	0	0	0
สสช.	55	0	55.002	55.002	100.00%	0	40.433	40.433	0	30.73	30.73	55.87%	0	0	0
สสข.	35	0	46.259	46.259	132.17%	0	46.259	46.259	0	35.213	35.213	100.61%	0	14.102	14.102
สสมบ.	40	0	46.403	46.403	116.01%	0	46.403	46.403	0	16.811	16.811	42.03%	0	0	0
สสสภ.	13	0	13.492	13.492	103.78%	0	13.492	13.492	0	11.312	11.312	87.02%	0	7.712	7.712
ชาว.(ก3)	143	0	161.156	161.156	112.70%	0	146.587	146.587	0	94.066	94.066	65.78%	0	21.814	21.814
รวก.(กอ)	537	0	542.638	542.638	101.05%	0	422.379	422.379	0	258.289	258.289	48.10%	0	21.814	21.814
สสب.	95	0	96.950	96.950	102.05%	0	96.95	96.95	0	96.95	96.95	102.05%	0	43.964	43.964
สสด.	74	0	74.157	74.157	100.21%	0	74.157	74.157	0	51.898	51.898	70.13%	0	51.898	51.898
สสภ.	90	0	90.460	90.460	100.51%	0	76.196	76.196	0	51.88	51.88	57.64%	0	18.225	18.225
สสว.	70	0	72.110	72.110	103.01%	0	45.65	45.65	0	45.65	45.65	65.21%	0	0	0
ชาว.(ก4)	329	0	333.677	333.677	101.42%	0	292.953	292.953	0	246.378	246.378	74.89%	0	114.087	114.087
สสน.	75	0	75.713	75.713	100.95%	0	75.713	75.713	0	43.329	43.329	57.77%	0	0	0
สสบพ.	48	0	50.617	50.617	105.45%	0	35.554	35.554	0	19.848	19.848	41.35%	0	0	0
สสมส.	61	0	61.578	61.578	100.95%	0	61.578	61.578	0	34.8	34.8	57.05%	0	11.543	11.543
ชาว.(ก5)	184	0	187.908	187.908	102.12%	0	172.845	172.845	0	97.977	97.977	53.25%	0	11.543	11.543
รวก.(กต)	513	0	521.585	521.585	101.67%	0	465.798	465.798	0	344.355	344.355	67.13%	0	125.63	125.63
Agenda base	150	0	153.204	153.204	102.14%	0	114.396	114.396	0	18.184	18.184	12.12%	0	0	0
กปน.	1,200	0	1,217.427	1,217.427	101.45%	0	1,002.573	1,002.573	0	620.828	620.828	51.74%	0	147.444	147.444

ผลการเบิกจ่ายสะสม ปีงบประมาณ 2566 เทียบแผนเบิกจ่ายสะสมที่ 1,200 กม.

ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้น ก.พ. 66 = 1,249.195 กม. (ข้อมูล ณ 1 มี.ค. 66)

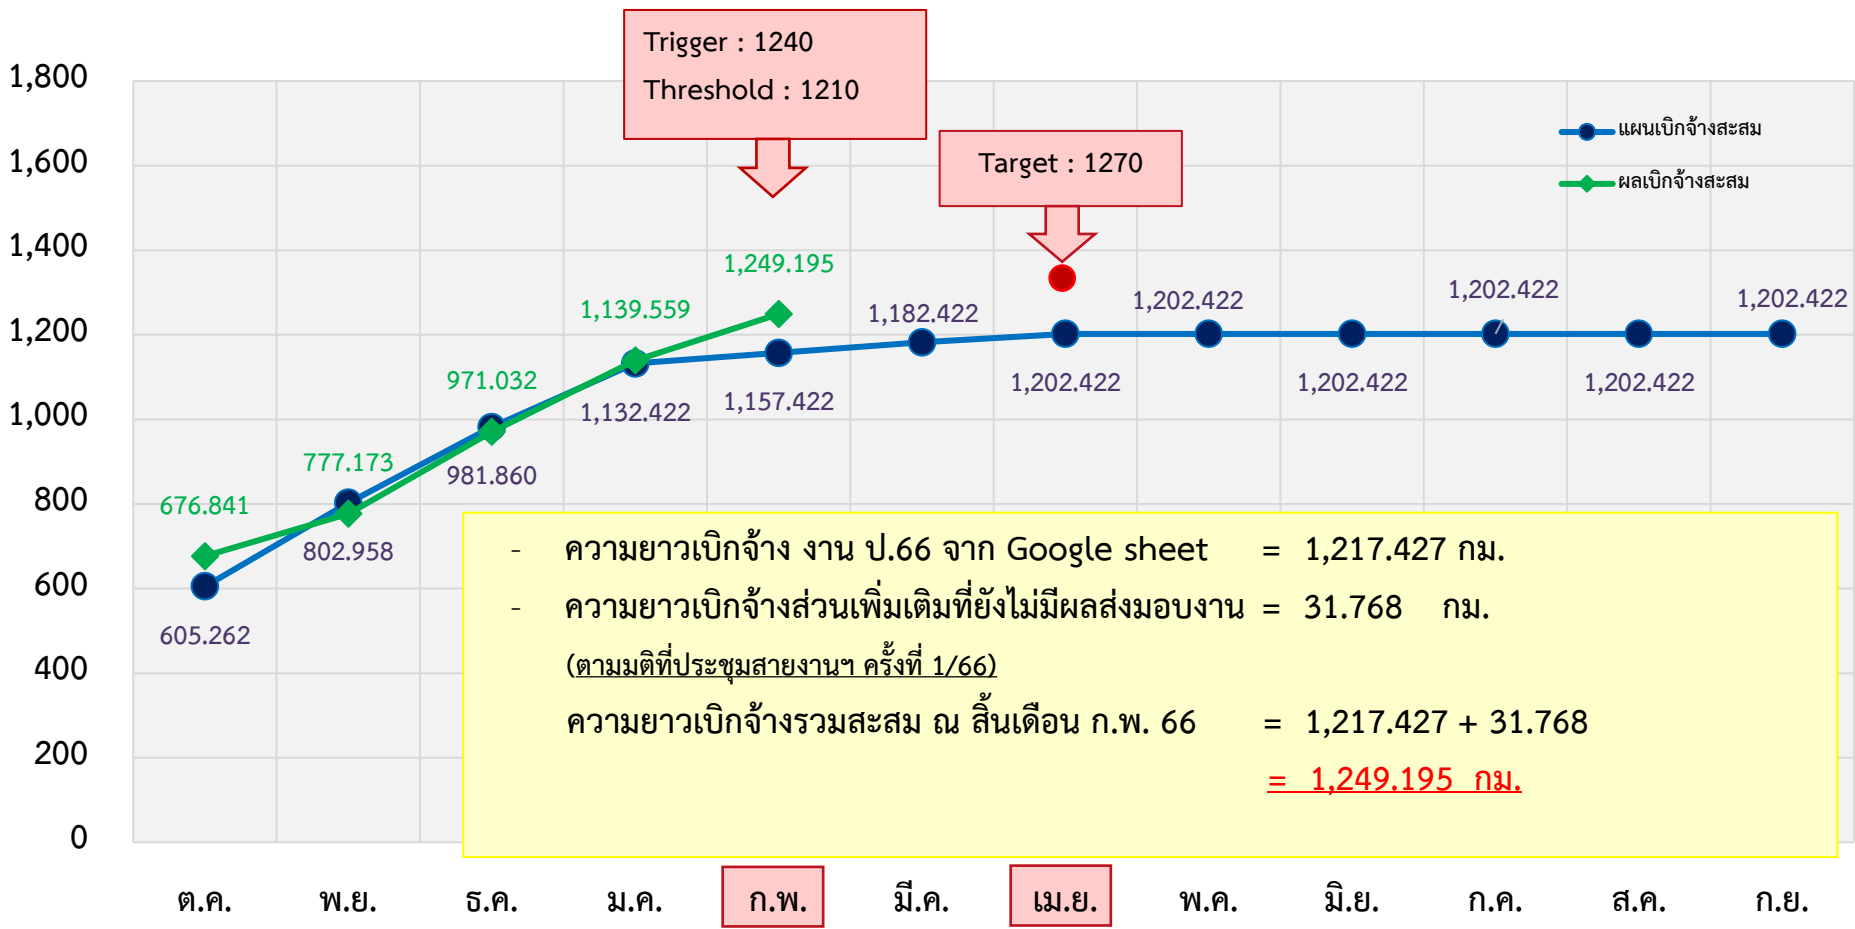

ส่งมอบงานปรับปรุงท่อฯ ปีงบประมาณ 2566


ผลงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2566

สาขา	เป้าหมาย ผลส่งมอบงาน	ผลการลงนาม ปีงบฯ 66	ผลงานปรับปรุงท่อ					
			รายเดือน ก.พ.66			สะสม ต.ค.65-ก.พ.66		
			แผนงาน	ผลงาน	ผลต่าง +/-	แผนงาน	ผลงาน	ผลต่าง +/-
สสส.	75.000	22.028	5.000	4.933	(0.067)	17.000	17.640	0.640
สสพ.	62.000	28.127	4.000	4.450	0.450	23.000	25.654	2.654
สสป.	97.000	60.046	10.000	10.227	0.227	35.000	37.315	2.315
สสท.	30.000	8.108	1.500	2.749	1.249	12.500	14.061	1.561
ชวก.(ก1)	264.000	118.309	20.500	22.359	1.859	87.500	94.670	7.170
สสญ.	50.000	14.213	3.600	1.230	(2.370)	16.700	17.887	1.187
สสม.	20.000	4.644	2.600	1.767	(0.833)	3.600	4.549	0.949
สสล.	51.000	27.057	2.900	0.000	(2.900)	10.750	16.990	6.240
ชวก.(ก2)	121.000	45.914	9.100	2.997	(6.103)	31.050	39.426	8.376
สสช.	52.000	30.730	4.000	4.269	0.269	15.000	16.479	1.479
สสข.	35.000	35.213	2.200	6.244	4.044	13.500	19.231	5.731
สสมบ.	40.000	16.811	5.000	1.289	(3.711)	10.000	17.757	7.757
สสสภ.	25.000	11.312	2.000	6.072	4.072	5.500	15.842	10.342
ชวก.(ก3)	152.000	94.066	13.200	17.874	4.674	44.000	69.309	25.309
รวก.(กอ)	537.000	258.289	42.800	43.230	0.430	162.550	203.405	40.855
สสب.	95.000	96.950	6.500	13.293	6.793	20.500	23.979	3.479
สสด.	74.000	51.898	3.000	5.182	2.182	11.000	20.409	9.409
สสภ.	90.000	51.880	3.000	3.339	0.339	8.500	10.022	1.522
สสว.	70.000	45.650	5.000	5.020	0.020	15.000	15.215	0.215
ชวก.(ก4)	329.000	246.378	17.500	26.834	9.334	55.000	69.625	14.625
สสน.	75.000	43.329	4.500	3.337	(1.163)	15.500	16.642	1.142
สสบท.	48.000	19.848	6.000	6.551	0.551	20.000	27.212	7.212
สสมส.	61.000	34.800	8.100	3.585	(4.515)	38.400	31.773	(6.627)
ชวก.(ก5)	184.000	97.977	18.600	13.473	(5.127)	73.900	75.627	1.727
รวก.(กต)	513.000	344.355	36.100	40.307	4.207	128.900	145.252	16.352
Agenda base	150.000	18.184	11.000	13.484	2.484	35.000	56.523	21.523
กปน.	1200.000	620.828	89.900	97.021	7.121	326.450	405.180	78.730

หมายเหตุ : 1. คาดการณ์ผลการส่งมอบงานปีงบประมาณ 2566 จาก สกส. สำนักงานประปาสาขาและ ABS
2. ผลการลงนามปีงบฯ 66 จาก Google sheet ณ วันที่ ณ 1 มี.ค.66 และผลงานปรับปรุงท่อรายเดือน จาก Google sheet ณ วันที่ ณ 2 มี.ค.66
3. ผลงานปรับปรุงท่อมีผลงานปรับปรุงท่อที่มีผลลดน้ำสูญเสียรวมอยู่สะสม 0.918 กิโลเมตร

แผนส่งมอบงานปรับปรุงท่อฯ สะสม ปีงบประมาณ 2566 เดิม (1,200 กม.)

ขอให้สาขาคาดการณ์แผนส่งมอบงานปรับปรุงท่อฯ รายเดือนตามเป้าใหม่ (1,270 กม.)

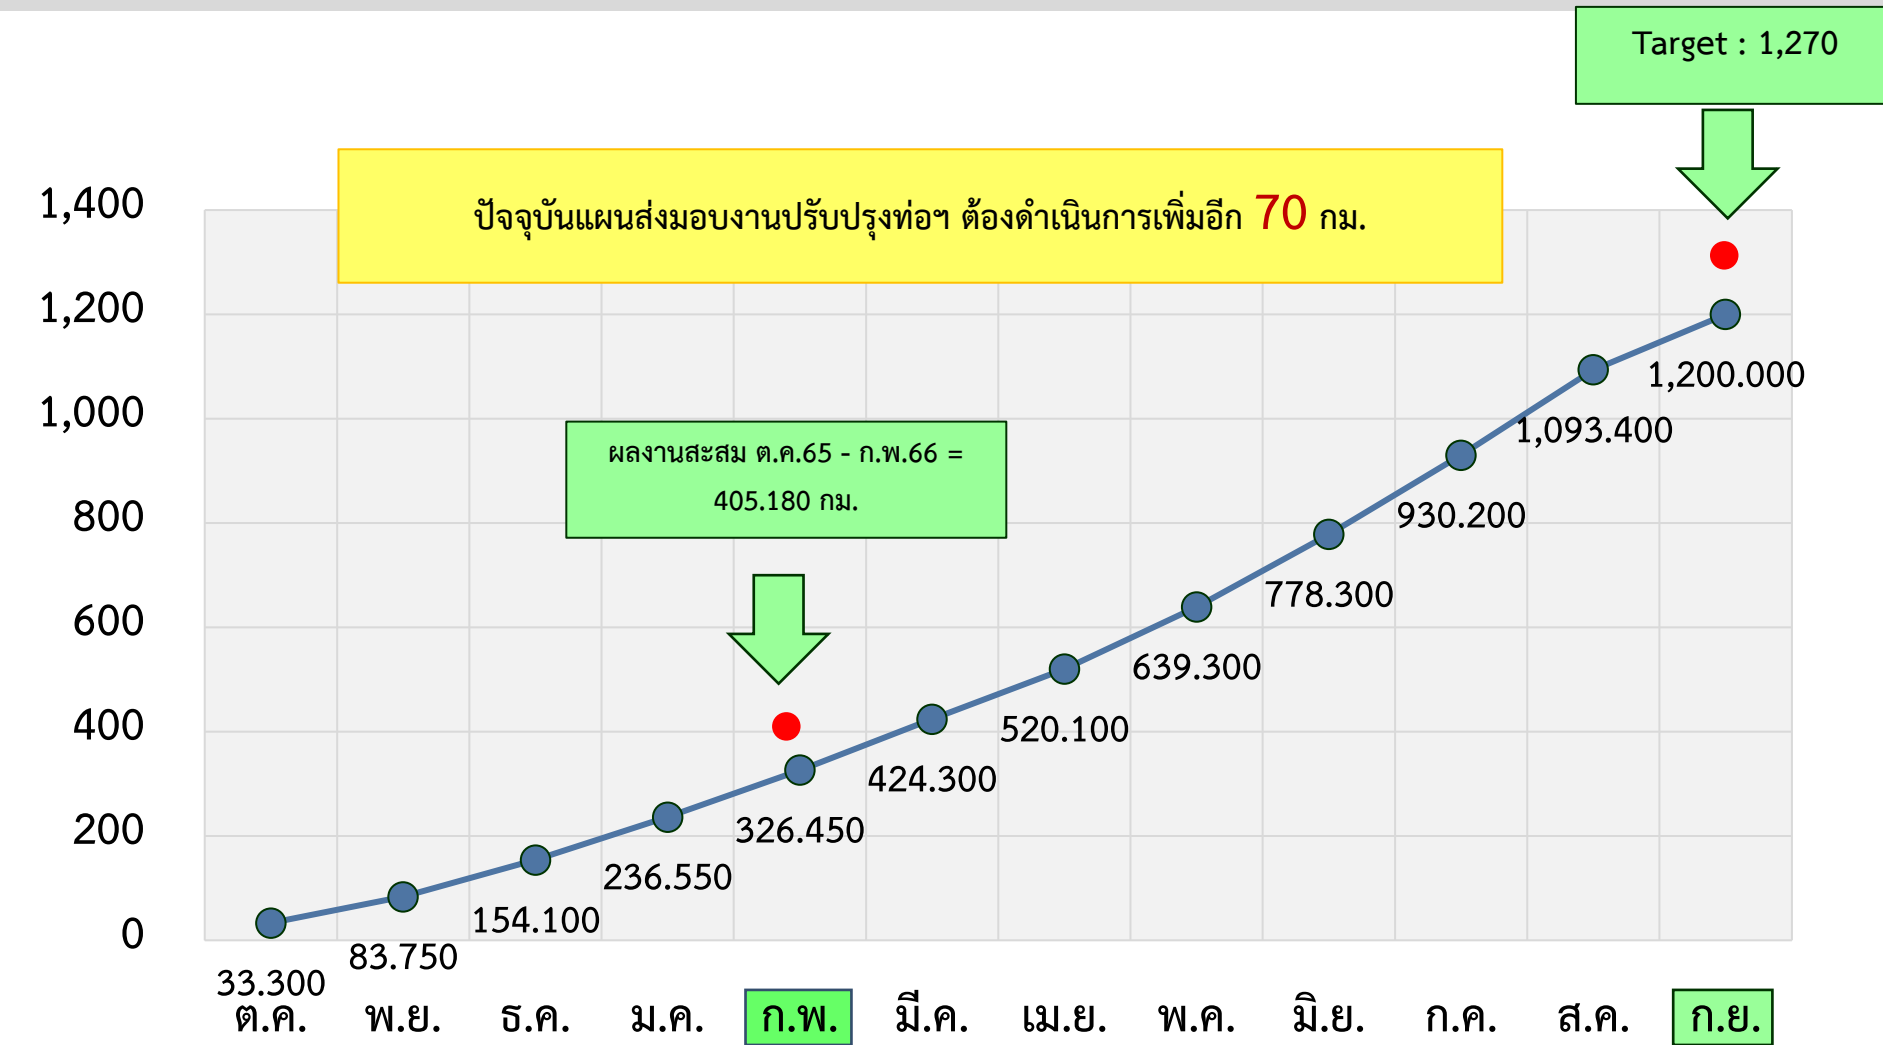

คาดการณ์ผลส่งมอบงาน งานปรับปรุงท่อฯ ปีงบประมาณ 2566

หน่วย : กิโลเมตร

สาขา/Agenda base	เป้า 1,200 กม.	คาดการณ์ส่งมอบงาน ปีงบฯ 66 (กม.) (ไม่รวมสัญญา PBC)	สัญญา PBC ที่คาดว่าจะส่งมอบงาน ในปีงบฯ 66	งานปรับปรุงกำลังน้ำ ที่คาดว่าจะ ส่งมอบงานในปีงบฯ 66	รวมคาดการณ์ส่งมอบทั้งหมด "งาน ป./งาน PBC/งานปรับปรุงกำลังน้ำ" (ไม่รวม กม. จากสาขาที่แจ้งบเพิ่ม)	
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3)	เทียบเป้า 1,200 กม.
สสส.	75	75.000	0.000	2.000	77.000	▲ 2
สสพ.	62	62.000	0.000	2.000	64.000	▲ 2
สสป.	97	97.000	5.000	0.000	102.000	▲ 5
สสท.	30	30.000	0.000	0.000	30.000	0
ชวก.(ก1)	264	264.000	5.000	4.000	273.000	▲ 9
สสญ.	50	49.690	2.640	0.000	52.330	▲ 2
สสม.	20	20.000	1.000	2.000	23.000	▲ 3
สสล.	51	51.000	0.000	0.000	51.000	0
ชวก.(ก2)	121	120.690	3.640	2.000	126.330	▲ 5
สสช.	52	52.000	2.000	3.000	57.000	▲ 5
สสข.	35	35.000	0.000	1.542	36.542	▲ 2
สสมบ.	40	40.000	0.000	0.000	40.000	0
สสสภ.	25	25.000	0.000	0.000	25.000	0
ชวก.(ก3)	152	152.000	2.000	4.542	158.542	▲ 7
รวก.(กอ)	537	536.690	10.640	10.542	557.872	▲ 21
สสบ.	95	95.000	1.256	0.000	96.256	▲ 1
สสด.	74	74.000	0.000	0.000	74.000	0
สสภ.	90	85.000	5.000	1.000	91.000	▲ 1
สสว.	70	70.000	0.000	0.000	70.000	0
ชวก.(ก4)	329	324.000	6.256	1.000	331.256	▲ 2
สสน.	75	75.000	0.000	0.000	75.000	0
สสบท.	48	70.000	0.000	0.000	70.000	▲ 22
สสมส.	61	66.021	0.000	0.000	66.021	▲ 5
ชวก.(ก5)	184	211.021	0.000	0.000	211.021	▲ 27
รวก.(กต)	513	535.021	6.256	1.000	542.277	▲ 29
Agenda base	150	150.000	0.000	0.000	150.000	0
กปน.	1,200.00	1221.711	16.896	11.542	1250.149	▲ 50

หมายเหตุ : - คาดการณ์ผลส่งมอบงานตามบันทึกที่ กปทผจส77/2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

- อัปเดตผลการคาดการณ์งานปรับปรุงกำลังน้ำ ณ วันที่ 9 ก.พ. 66

คาดการณ์งานค้างและผลส่งมอบงาน งานปรับปรุงท่อฯ ปีงบประมาณ 2566

สาขา Appendix Group	คาดการณ์ผลส่งมอบงานปีงบประมาณ 66 สัญญา ป. (1)	คาดการณ์ผลส่งมอบงานปีงบประมาณ 66 PBC (2)	รวมคาดการณ์ผลส่งมอบงานปีงบประมาณ 66 (1)+(2)	คาดการณ์ผลส่งมอบงานปีงบประมาณ 66 ปรับปรุงกำลังน้ำ
สสส.	75.000	0.000	75.000	2.000
สสพ.	62.000	0.000	62.000	2.000

สาขาคาดการณ์ปีงบฯ 66 ผลงานส่งมอบงานปรับปรุงท่อฯ อยู่ที่ 1,221.711 กม. และ PBC อยู่ที่ 16.896 กม. ปรับปรุงกำลังน้ำ อยู่ที่ 11.542 กม. รวมเป็น 1,250.149 กม.

ดำเนินการเพิ่มอีกประมาณ 20 กม.

ปรับปรุงกำลังน้ำ สาขายังส่งมาไม่ครบ หากได้ข้อมูลครบ
คาดการณ์การดำเนินการเพิ่มเติมอาจน้อยลง

รวม(งบฯ)	1,221.711	16.896	1,238.607	1.000
สสส.	75.000	0.000	75.000	
สสพ.	70.000	0.000	70.000	
สสผส.	66.021	0.000	66.021	
รวม(งบฯ)	211.021	0.000	211.021	0.000
รวม(กต)	535.021	6.256	541.277	1.000
Appendix Group	1,000.000	0.000	1,000.000	0.000
กปน.	1,221.711	16.896	1,238.607	11.542

เรื่องอื่น ๆ

การกรอกข้อมูล MNF ปีงบประมาณ 2565 และ 2566

ผลงานปรับปรุงห้อง ปิงบา 66 สกส ☆ 📄 🗑

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help Last edit was seconds ago

100% B % .0 .00 122 Sarabun 10 B I & A



N26 fx

DMA										MNF ก่อน-หลัง																	
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 (ม.)										* MNF ก่อน หมายถึง MNF ก่อนดำเนินการปรับปรุงห้องเสียบ้านฯ																	
Code	ปี	สาขา	สัญญา	เส้นทางที่	รหัสเส้นทาง	ความยาว สามแบบ (ม.)	แบบเสถียร	สาขา update DMA		สถานที่	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 (ม.)													MNF (ลบ.ม./ชม.)			
																									ก่อน*	หลัง	ผลต่าง
4593	2566	สสส.	ป.07-01(66)	1	807-64-C00987	926	07-01-075-65			งานพัฒนาการ สิ่งแวดล้อม (ช่วงแยกคลองตัน ถึง ขอยพัฒนาการ 9) ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	0	0	0		
4594	2566	สสส.	ป.07-01(66)	2	4-C00218,807-64-C00219,807-64-C	1027	07-01-078-65			ขอยพัฒนาการ 39 และขอยรามคำแหง 41 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ													0	0	0		
4595	2566	สสส.	ป.07-01(66)	3	807-64-C00203	495	07-01-084-65			ขอยรามคำแหง 89 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ													0	0	0		
4596	2566	สสส.	ป.07-01(66)	4	807-64-C00568,807-64-C00569	2670	07-01-100-65			ขอยรามคำแหง 8 แยก 8,10 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ													0	0	0		
4597	2566	สสส.	ป.07-01(66)	5	807-64-C00563	960	07-01-104-65			ขอยรามคำแหง 12 แยก 4 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ													0	0	0		
4598	2566	สสส.	ป.07-01(66)	6	807-64-C00244	1968	07-01-124-65			ขอยปรีดิพนมยงค์ 46 ถนนสุขุมวิท 71 เขตวัฒนา													0	0	0		
4599	2566	สสส.	ป.07-01(66)	7	807-64-C00449	1886	07-01-143-65			ขอยรัตนมัย 51 ขอยถนนพญาไทถึงถนนเพชร ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย													0	0	0		
4600	2566	สสส.	ป.07-02(66)	1	807-64-C00570	1254	07-01-097-65			ขอยรามคำแหง 12 แยก 2 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ													0	0	0		
4601	2566	สสส.	ป.07-02(66)	2	807-64-C00561	576	07-01-098-65			ขอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ													0	0	0		
4602	2566	สสส.	ป.07-02(66)	3	807-64-C00566,807-64-C00567	1698	07-01-105-65			ขอยรามคำแหง 8 แยก 4, 6													0	0	0		
4603	2566	สสส.	ป.07-02(66)	4	807-64-C00206	966	07-01-106-65			ขอยรามคำแหง 22 (ฝั่งซ้าย) ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ													0	0	0		
4604	2566	สสส.	ป.07-02(66)	5	807-64-C00696	1194	07-01-123-65			ขอยปรีดิพนมยงค์ 42 ถนนสุขุมวิท 71 เขตวัฒนา													0	0	0		
4605	2566	สสส.	ป.07-02(66)	6	807-64-C00329	861	07-01-128-65			แยกคลองตัน (ช่วงคลองแสนแสบ ถึง ถนนกำแพงเพชร 7) ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง													0	0	0		
4606	2566	สสส.	ป.07-02(66)	7	807-64-C00323	672	07-01-144-65			ขอยรามคำแหง 34 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ													0	0	0		
4607	2566	สสส.	ป.07-02(66)	8	807-64-C00222	612	07-01-159-65			ขอยรามคำแหง 43 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ													0	0	0		
4608	2566	สสส.	ป.07-02(66)	9	807-64-C00223	516	07-01-160-65			ขอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ													0	0	0		
4609	2566	สสส.	ป.07-02(66)	10	807-64-C00207	1122	07-01-164-65			ขอยรามคำแหง 11 และขอยรามคำแหง 13 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ													0	0	0		
4610	2566	สสส.	ป.07-02(66)	11	807-64-C00547	630	07-01-172-65			ขอยรามคำแหง 30 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ													0	0	0		
4611	2566	สสส.	ป.07-03(66)	1	807-64-C00711/TT2/TT3/TT4/TT5	486	07-01-049-65			ขอยพัฒนาการ 63 (ช่วงขอยนาสุทธานคม)													0	0	0		
4612	2566	สสส.	ป.07-03(66)	2	807-64-C00310	420	07-01-134-65			รามคำแหง 59													0	0	0		
4613	2566	สสส.	ป.07-03(66)	3	807-64-C00209	468	07-01-137-65			รามคำแหง 17													0	0	0		
4614	2566	สสส.	ป.07-03(66)	4	807-64-C00235	537	07-01-140-65			อ.เบ็ดเตล็ดแยก 6, 8													0	0	0		
4615	2566	สสส.	ป.07-03(66)	5	807-64-C00319	420	07-01-148-65			ขอยรามคำแหง 79/1													0	0	0		
4616	2566	สสส.	ป.07-03(66)	6	807-64-C00225	576	07-01-173-65			ขอยรามคำแหง 49 และ ขอยรามคำแหง 49/2													0	0	0		
4617	2566	สสส.	ป.07-03(66)	7	807-64-C00586/584	481	07-01-178-65			ขอยพัฒนาการ 20 แยก 2													0	0	0		
4618	2566	สสส.	ป.07-03(66)	8	807-64-C00589	462	07-01-182-65			ขอยพัฒนาการ 20 แยก 6													0	0	0		
4619	2566	สสส.	ป.07-03(66)	9	807-64-C00564	894	07-01-184-65			ขอยรามคำแหง 8 แยก 2													0	0	0		
4620	2566	สสส.	ป.07-03(66)	10	807-64-C00560	3252	07-01-192-65			ขอยรามคำแหง 14 และ 18 (หมู่บ้านเนินเขียน 1,3)													0	0	0		
4621	2566	สสส.	ป.07-03(66)	11	807-64-C00676	2042	07-01-203-65			ขอยปิ่นจาม, ขอยพรหมเทวี, ขอยธนาคารกรุงเทพ และ ขอยถนนขอยเบ็ดเตล็ดแยก 6, 8													0	0	0		



ผลงานคงเหลือ ปีงบประมาณ 2566 สรุปผลงาน 66 Check สรุป MNF 66 ข้อมูลจาก คลส (สกส) ค่าการเพิ่มความยาวสามแบบ ลดน้ำ 66 งาน ป-66 สกส คลส ปรับปรุงค่าส่งน้ำ-66 สกส คลส 11

ชี้ท “งาน ป.XX สกส
กรอก”

ปัจจุบันการกรอก MNF คิดเป็น 23.0% ของเส้นทางส่งมอบแล้ว (ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 66)

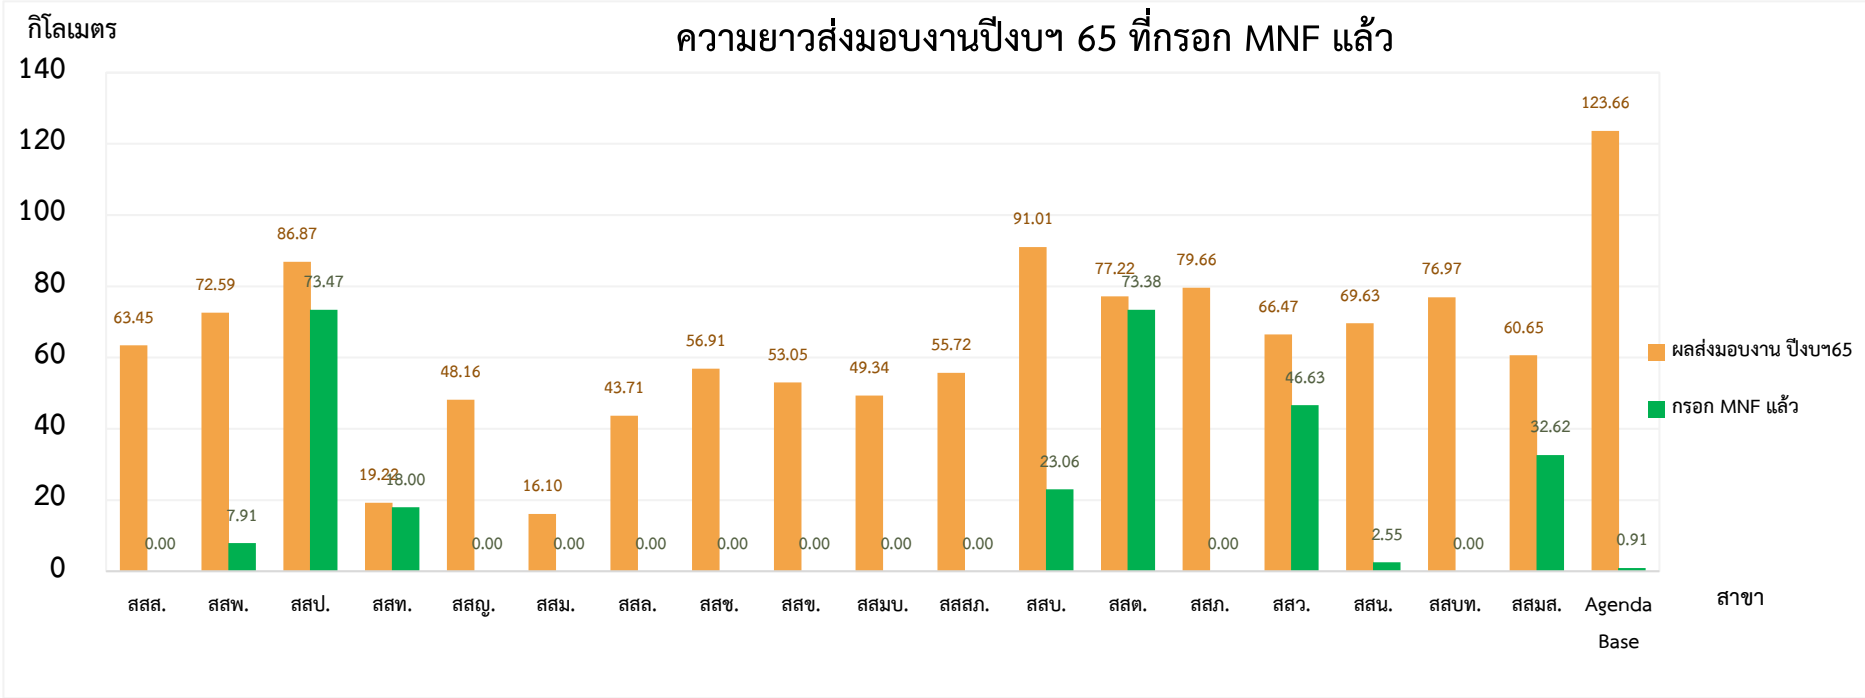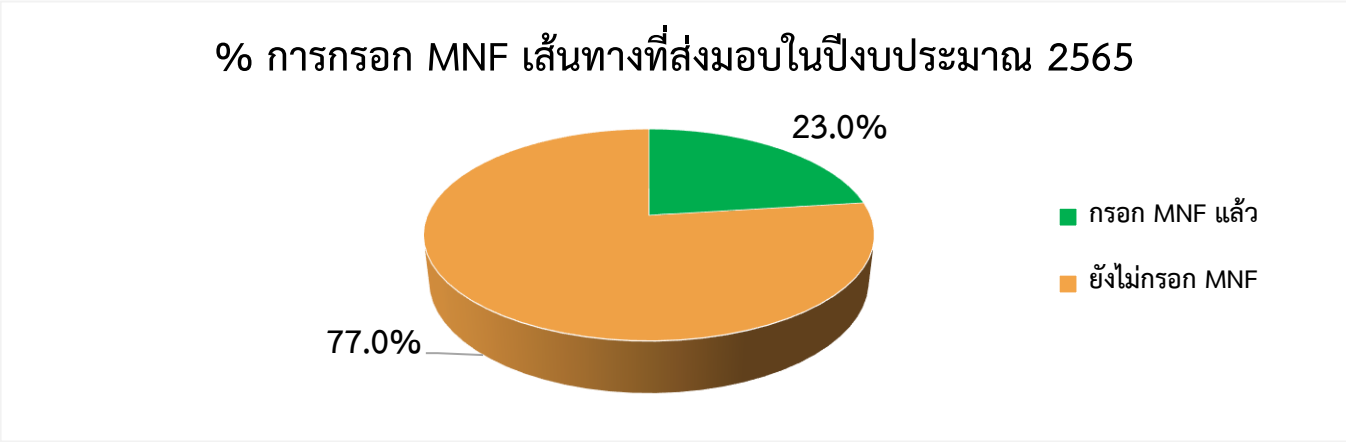

ปัจจุบันการกรอก MNF คิดเป็น 2.8% ของเส้นทางส่งมอบงาน (ข้อมูล ณ 2 มี.ค. 66)

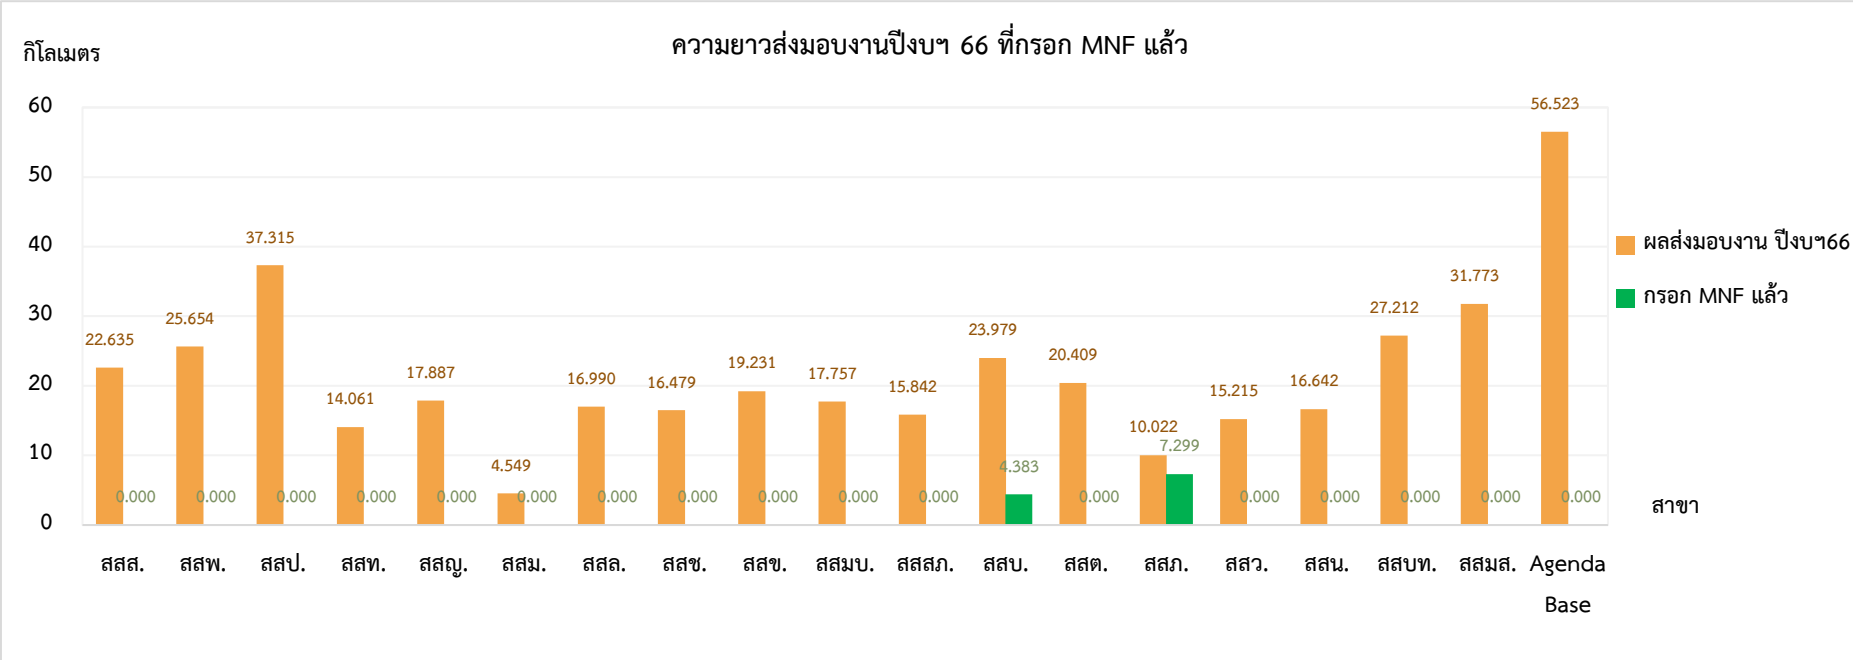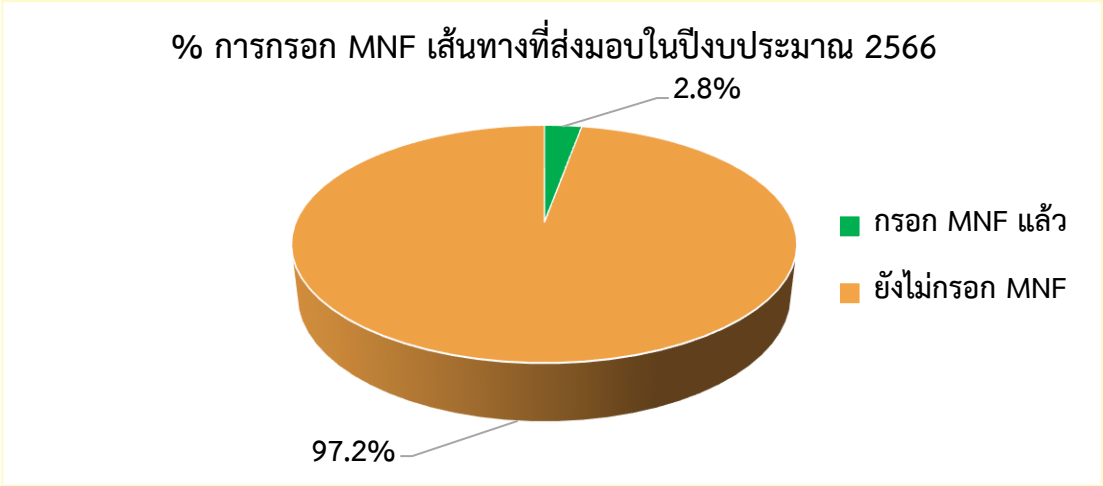

เรื่องอื่น ๆ

การเสนอขอยกเว้น (Waive) เส้นทางที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ขอให้สาขาจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการขอ waive เส้นทางที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- Timeline กิจกรรมตามแผนงาน รายสัญญา/รายเส้นทาง ที่จะเสนอขอยกเว้น (waive) ว่าได้รับผลกระทบอย่างไร สาเหตุที่ได้รับผลกระทบ ช่วงเวลาใดของสัญญา จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ 2566
- แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค เพื่อแสดงให้เห็นว่า กปน. ได้พยายามบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างสุดความสามารถแล้ว
- เอกสาร/หลักฐานประกอบ เช่น หนังสือของ กปน. หนังสือจากหน่วยงานภายนอก นโยบายภาครัฐ หนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ หนังสืออนุญาตให้เข้าพื้นที่ของ กทม. ประกาศ ครม. เป็นต้น

สรุปรายละเอียดจุดงานปรับปรุงมาตรา (DM) พื้นที่บริการภาค 1 และ 2 สัญญาเลขที่ ชล.32/2564

ที่	สาขา	จุดตามTOR		ติดตั้งแล้ว	จุดงานในพื้นที่ PBC				แนวทางแผนงาน /คาดการณ์แล้วเสร็จ
		300 มม.	200 มม.	รวม	อยู่ใน PBC	ติดตั้งมาตร แล้วเสร็จ	*รอตติมาตร	ตู้ Online	
1	สสส.	-	35	9	12	9	3	7	*ติดตั้งในพื้นที่ PBC 3 จุด/ อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้ง
2	สสพ.	-	19	17	12	11	1	10	*ติดตั้งในพื้นที่ PBC 1 จุด/ อยู่ระหว่างสาขาดำเนินการย้ายตู้ RTU
3	สสป.	-	14	-	ไม่มี PBC				
4	สสท.	4	24	14	13	12	1	10	*ติดตั้งในพื้นที่ PBC 1 จุด/ อยู่ระหว่างสาขาดำเนินการติดตั้งตู้ RTU
5	สสญ.	-	9	-	ไม่มี PBC				
6	สสม.	21	18	12	21	10	11	9	*ติดตั้งในพื้นที่ PBC 11 จุด/ อยู่ระหว่างสาขาดำเนินการขออนุญาตเจ้าของพื้นที่
7	สสล.	-	36	9	ไม่มี PBC				
รวม		25	155	61	58	42	16	36	ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 66
		180							

รายละเอียดจุดติดตั้งที่ดำเนินการแล้ว งานปรับปรุงมาตรฯ (DM) พื้นที่บริการภาค 1 และ 2 สัญญาเลขที่ ชล.32/2564

ลำดับที่	ลำดับที่ (ตาม TOR)	สาขา	หมายเลข DM	สถานที่	ขนาดศก.มาตร ๑ (มม.)	พื้นที่ PBC	ตรวจรับมอบงาน
1	4	สสส.	DM-07-01-05-04	ปาก ช.สุขุมวิท41 (300 มม.) ตู้ RTU (07M40 เดิม)	200	✓	รอส่งมอบงานครั้งที่ 5
2	5	สสส.	DM-07-01-06-01	ซอย ปาก ช.สุขุมวิท 53 (300 มม.) ตู้ RTU (07M41 เดิม)	200	✓	รอส่งมอบงานครั้งที่ 5
3	13	สสส.	DM-07-04-16-01	อ่อนนุช 17 ติดคลองประเวศฝั่งขวา	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่ 4
4	14	สสส.	DM-07-04-16-04	อ่อนนุช 17 คลองโองค์อ่างฝั่งซ้าย	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่ 4
5	22	สสส.	DM-07-05-03-01	อาคาร แผนรักษาสายส่งใต้ดิน ถนน รัชดาภิเษก 07M109	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่ 4
6	23	สสส.	DM-07-05-03-02	ถนนรัชดาภิเษก ใกล้ปากซอยสุขุมวิท 16 หน้าอาคารเอ็กซ์เชนจ์ทาวเวอร์	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่ 3
7	24	สสส.	DM-07-05-04-01	อาคาร แผนรักษาสายส่งใต้ดิน ถนน รัชดาภิเษก 07M110	200	✓	รอส่งมอบงานครั้งที่ 5
8	27	สสส.	DM-07-05-13-01	ใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ถ.รัชดาฯ07M130	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่ 3
9	32	สสส.	DM-07-05-13-02	หน้าอาคาร เดอะปาร์ค ตรงข้าม ธ.กสิกรไทย คลองเตย	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่ 3
10	36	สสพ.	DM-13-02-04-04	ริมทางรถไฟสายเก่า ข้างคลองบางจาก	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่ 3
11	37	สสพ.	DM-13-01-03-01	ถ.อ่อนนุช ข้างซอยอ่อนนุช 24 (หน้าร้านขายศาลพระภูมิ)	200	-	รอส่งมอบงานครั้งที่ 5
12	38	สสพ.	DM-13-01-07-02	ถ.อ่อนนุช ข้างซอยอ่อนนุช 29 (หน้ากิตติอิมพรคลินิก)	200	-	รอปรับค่า K
13	39	สสพ.	DM-13-03-01-01	ถ.อ่อนนุช ข้างซอยอ่อนนุช 66 (หน้าร้านตัดผม)	200	-	รอแก้สายสัญญาณ
14	40	สสพ.	DM-13-03-01-03	ถ.ศรีนครินทร์ ข้างปั๊มเอสโซ่ (ตรงข้าม ซอยโสอุดร)	200	-	ส่งงานแล้วครั้งที่ 3
15	41	สสพ.	DM-13-03-04-02	ตรงข้าม ช.อ่อนนุช 65	200	-	ส่งงานแล้วครั้งที่ 4
16	43	สสพ.	DM-13-03-06-03	ช.อ่อนนุช 65	200	-	รอแก้สายสัญญาณ
17	44	สสพ.	DM-13-02-03-02	ถ.สุขุมวิท ข้าง ช.สุขุมวิท 52	200	✓	รอส่งมอบงานครั้งที่ 5
18	45	สสพ.	DM-13-07-02-01	ถ.สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 105 ข้างซอยลาซาล 55 ตรงข้ามร้านข้าวหนึ่ง	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่ 3
19	47	สสพ.	DM-13-02-01-02	ถ.สุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท 50 (เกษมสุวรรณ)(หน้าโลตัสสุขุมวิท)	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่ 3
20	48	สสพ.	DM-13-07-05-02	ถ.สุขุมวิท ช.สุขุมวิท 107 ปาก ช.แบร์ริง (หน้า 7-Eleven)	200	✓	รอส่งมอบงานครั้งที่ 5

รายละเอียดจุดติดตั้งที่ดำเนินการแล้ว งานปรับปรุงมาตรฯ (DM) พื้นที่บริการภาค 1 และ 2 สัญญาเลขที่ ซล.32/2564

ลำดับที่	ลำดับที่ (ตาม TOR)	สาขา	หมายเลข DM	สถานที่	ขนาดศก.มาตร ๑ (มม.)	พื้นที่ PBC	ตรวจรับมอบงาน
21	49	สสพ.	DM-13-04-04-02	ถ.บางนา-ตราด ก่อนถึงเซ็นทรัลบางนา (กม2+900)	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่ 4
22	50	สสพ.	DM-13-07-07-05	ถ.สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 113 ใน ปชช.สมุทรปราการ (ตรงข้ามซอยเทวา)	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่ 3
23	51	สสพ.	DM-13-07-06-03	ถ.ศรีนครินทร์ ซ.ศรีदान 3 ตรงข้ามตึก DTAC	200	✓	รอแก้ไขสายสัญญาณ
24	52	สสพ.	DM-13-07-05-03	ถ.สุขุมวิท ใต้สะพานสำโรง	200	✓	รอส่งมอบงานครั้งที่ 5
25	53	สสพ.	DM-13-07-01-02	ถ.สุขุมวิท 105 ใกล้ซอยลาซาล 23 หน้าบริษัทคริสตินนี่	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่ 3
26	54	สสพ.	DM-13-07-06-02	ถ.ศรีนครินทร์ ตรงข้าม ม.ลดาวัลย์ (หน้าปั๊มปิโตรนาส)	200	✓	รอส่งมอบงานครั้งที่ 5
27	78	สสพ.	DM-05-03-02-03	ใกล้ซอยเจริญกรุง 79 ถนนเจริญกรุง (ตรงข้ามมูลนิธิสตรีไทยมุสลิม)	300	-	ส่งงานแล้วครั้งที่ 3
28	80	สสพ.	DM-05-01-09-02	หน้าบ้านเลขที่ 946/40 ถ.พระราม 4 (ใกล้โรงแรมดุสิต)	300	-	ส่งงานแล้วครั้งที่ 1
29	81	สสพ.	DM-05-02-02-01	เยื้องวัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง(ใกล้สามแยก)	200	✓	รอปรับค่า K
30	82	สสพ.	DM-05-02-03-01	ปากซอยสาทร 11 (ข้างร้านอาหารภัทรา)	300	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่ 1
31	83	สสพ.	DM-05-02-03-03	ปากซอยบำเพ็ญกุศล (ตรงข้าม 7-Eleven) ถ.จันทร์	200	✓	รอเชื่อมโยงระบบ
32	84	สสพ.	DM-05-02-04-02	ปากซอยสาทร 11	300	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่ 1
33	85	สสพ.	DM-05-02-05-01	หน้าบ้านชินขีรฐา ข้างซอยสาทร 3	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่ 4
34	86	สสพ.	DM-05-02-07-01	ปากซอยจันทร์ 16 ถ.จันทร์	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่ 3
35	90	สสพ.	DM-05-04-01-01	ปากซอยจันทร์ 45 ถ.จันทร์	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่ 4
36	91	สสพ.	DM-05-04-03-02	ปากซอยจันทร์ 27 ถ.จันทร์	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่ 3
37	92	สสพ.	DM-05-04-04-01	ปากซอยสาธุประดิษฐ์ 16 ถ.สาธุประดิษฐ์	200	✓	รอส่งมอบงานครั้งที่ 5
38	95	สสพ.	DM-05-04-08-01	หน้าบริษัท เค.จี.เอส.สตีล จำกัด ถ.พระราม 3 ใกล้ซอยพระราม 3 ซอย 23	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่ 3

รายละเอียดจุดติดตั้งที่ดำเนินการแล้ว งานปรับปรุงมาตรฯ (DM) พื้นที่บริการภาค 1 และ 2 สัญญาเลขที่ ชล.32/2564

ลำดับที่	ลำดับที่ (ตาม TOR)	สาขา	หมายเลข DM	สถานที่	ขนาดศก.มาตรา (มม.)	พื้นที่ PBC	ตรวจรับมอบงาน
39	97	สสท.	DM-05-04-09-01	ถ.พระราม 3 ใกล้ ซอยพระราม 3 ซอย 22	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่3
40	98	สสท.	DM-05-04-10-04	ถ.พระราม 3 หน้าบริษัท น้ำแข็งสตูล จำกัด	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่3
41	108	สสม.	DM-06-04-01-02	ใต้สะพานเจริญผล ฝั่งใต้ ใกล้ตุ่มทรศัพท	300	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่3
42	111	สสม.	DM-06-04-05-04	ปากซอยจุฬา 4 ถ.บรรทัดทอง	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่4
43	112	สสม.	DM-06-02-07-01	ริม ถ.เยาวราช (ฝั่งซ้าย) ใกล้แยกเฉลิมบุรี หน้า ทบ.544	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่4
44	113	สสม.	DM-06-02-06-01	ริมถนนเยาวราช (ฝั่งซ้าย) ใกล้แยกราชวงศ์	200	✓	รอคืนสภาพพื้นผิว
45	114	สสม.	DM-06-02-06-02	ริม ถ.ทรงวาด หน้า ทบ.1093	200	✓	รอคืนสภาพพื้นผิว
46	117	สสม.	DM-06-03-04-02	บริเวณริมถนนดำรงศรีรักษ์ เชิงสะพานข้ามคลองมหานาค หน้าร้านขายไม้	300	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่1
47	118	สสม.	DM-06-04-03-01	หน้าโรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ	200	-	ส่งงานแล้วครั้งที่3
48	122	สสม.	DM-06-04-01-03	ใต้สะพานหัวช้าง ฝั่งบริษัท สยามนิสสัน จำกัด	300	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่2
49	124	สสม.	DM-06-04-04-02	บริเวณตรอกราษฎร์อุทิศ ถ.พระราม 4	300	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่2
50	125	สสม.	DM-06-04-04-04	ตรงข้ามซอยจุฬาลงกรณ์ 4 ถ.บรรทัดทอง	300	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่2
51	130	สสม.	DM-06-04-06-03	ริมถนนราชดำริ หน้าสวนลุมพินี	300	-	รอการไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์
52	141	สสม.	DM-06-04-05-03	แยกสะพานอ่อน ถ.บรรทัดทอง	200	✓	ส่งงานแล้วครั้งที่3

รายละเอียดจุดติดตั้งที่ดำเนินการแล้ว งานปรับปรุงมาตรฯ (DM) พื้นที่บริการภาค 1 และ 2 สัญญาเลขที่ ชล.32/2564

ลำดับที่	ลำดับที่ (ตาม TOR)	สาขา	หมายเลข DM	สถานที่	ขนาดศก.มาตรฯ (มม.)	พื้นที่ PBC	ตรวจรับมอบงาน
53	157	สสส.	DM-12-03-01-02	ปั้ม ปตท. โกสยอลาดพร้าว 61	200	-	รอส่งมอบงานครั้งที่ 5
54	161	สสส.	DM-12-03-06-01	หน้า ร.ร.วัดบึงทองหลาง (ลาดพร้าว 101)	200	-	ส่งงานแล้วครั้งที่4
55	162	สสส.	DM-12-03-08-01	ซ.โพธิ์แก้ว ใกล้ ม.พิบูลย์	200	-	ส่งงานแล้วครั้งที่4
56	163	สสส.	DM-12-03-08-02	ถ.ลาดพร้าว ซอย 101 ตรงข้าม ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง	200	-	ส่งงานแล้วครั้งที่4
57	164	สสส.	DM-12-03-09-02	ถ.ลาดพร้าว ซอย 107	200	-	ส่งงานแล้วครั้งที่5
58	168	สสส.	DM-12-07-09-01	ถ.คูบอน ซ.คูบอน 27 (ตรงข้าม ซ.สายธารณี)	200	-	ส่งงานแล้วครั้งที่4
59	170	สสส.	DM-12-04-06-01	ถ.ลาดพร้าว ปาก ซ.ลาดพร้าว 112	200	-	ส่งงานแล้วครั้งที่4
60	171	สสส.	DM-12-04-07-01	ถ.ลาดพร้าว ซอย 124	200	-	ส่งงานแล้วครั้งที่4
61	175	สสส.	DM-12-05-02-01	ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม ตรงข้าม ถ.สุคนธ์สวัสดิ์ ม.มาสเตอร์พีช	200	-	ส่งงานแล้วครั้งที่4

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 66

สรุปรายละเอียดจุดงานปรับปรุงมาตรฯ (DM) พื้นที่บริการภาค 3, 4 และ 5 สัญญาเลขที่ ชล.31/2564

ที่	สาขา	จุดในสัญญา			ติดตั้งแล้ว			งาน PBC				แนวทางแผนงาน /คาดการณ์แล้วเสร็จ
		300 มม.	200 มม.	รวม	300 มม.	200 มม.	รวม	อยู่ใน PBC	ติดตั้งมาตร	รอตติมาตร	ค่า F Online ได้ ใน WLMA	
1	สสช.	1	-	1	-	-	-	มาตรา DM ส่วนใหญ่ มีรับประกันฯ ชล.32-2/2563 (UHM)				
2	สสช.	2	2	4	1	1	2	ไม่มี PBC				
3	สสมบ.	2	5	7	2	5	7	ไม่มี PBC				
4	สสสภ.	7	17	24	5	11	16	9	9	-	9	
5	สสบ.	13	14	27	10	13	23	9	8	1	8	มีอุปสรรคน้ำใต้ดิน ยังไม่สามารถติดตั้งมาตราได้
6	สสต.	10	22	32	10	15	25	9	8	1	8	1 จุด (สสต. จะขอปิดท่อประธาน)
7	สสภ.	8	7	15	7	6	13	4	4	-	3	(ติดตั้งมาตรPBCแล้วเสร็จ)
8	สสว.	8	8	16	8	3	11	4	4	-	4	(ติดตั้งมาตรPBCแล้วเสร็จ)
9	สสน.	5	11	16	2	7	9	ไม่มี PBC				
10	สสบท.	6	10	16	6	10	16	ไม่มี PBC				
11	สสมส.	4	8	12	4	8	12	8	8	-	8	(ติดตั้งมาตรPBCแล้วเสร็จ)
รวม		66	104	170	55	78	134	43	41	2	40	ข้อมูลศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566
		170			134							

สรุปรายละเอียดจุดงานปรับปรุงมาตรฯ (DM) สัญญาซื้อขายเลขที่ ชล.52/2565

ลำดับที่	สาขา	จำนวนจุดติดตั้ง (TOR)		จุดที่ปรับจำนวน		ดำเนินการติดตั้งมาตราแล้ว		ค่า F Online ได้ใน WLMA
		ศก. 200 มม.	ศก. 300 มม.	ศก. 200 มม.	ศก. 300 มม.	ศก. 200 มม.	ศก. 300 มม.	
1	สสส.	7	9	7	9	-	2	2
2	สสพ.	9	4	9	4	-	-	2
3	สสป.	7	7	7	7	2	-	
4	สสท.	1	5	1	5	-	-	
5	สสม.	3	-	3	-	-	-	
6	สสญ.	-	1	-	1	-	-	
7	สสล.	6	5	6	5	-	-	
8	สสช.	1	2	1	2	-	-	
9	สสข.	4	-	4	-	-	-	
10	สสมบ.	8	2	8	2	-	-	
11	สสสภ.	2	3	2	3	-	-	
12	สสบ.	5	3	5	3	3	3	6
13	สสว.	3	8	3	8	-	-	
14	สสต.	14	4	14	4	3	-	2
15	สสภ.	2	7	2	7	-	-	
16	สสน.	9	3	9	3	-	-	
17	สสบท.	2	6	2	6	1 ครอบคลุมสัญญา	6	6
18	สสมส.	2	4	2	4	-	1	1
รวม		85	73	85	73	9	12	
		158		158		21		19

ข้อมูลวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

ขอบคุณครับ
