

A background image of a desk with various items: a laptop on the left, a notebook with a pen on it in the center, a green ruler on the right, and a set of keys hanging from the ruler. The text is overlaid on this image.

รายงานติดตามงานโครงการหมู่บ้านจัดสรร

โดย : คณะทำงานย่อยตรวจสอบและติดตามการขอใช้น้ำประปาโครงการหมู่บ้านจัดสรร

การเข้าใช้งาน

หน้า intranet http://intra.mwa.co.th/departmap_new.html

เลือก

1

ระบบสารสนเทศผู้บริหาร

ระบบงานและบริหารค้นหาข้อมูล

บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำ (CIS)

ระบบ KM Portal

งานวิจัยและพัฒนา (R&D)

2


DAVIS
MWA DATA WAREHOUSE

CIC
Corporate Information Center

กดเลือกเพื่อไปหน้า website <https://davis.mwa.co.th>



1 ผู้บริหาร

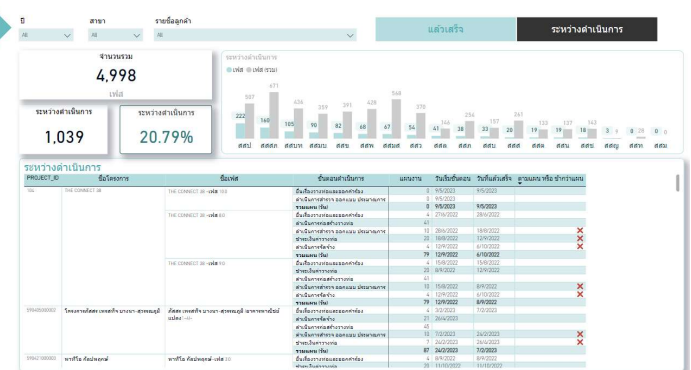

<https://davis.mwa.co.th>



รายงานติดตามงานโครงการหมู่บ้านจัดสรร สำหรับผู้บริหาร

รายชื่อลูกค้า

All

ปี

All

แล้วเสร็จ

ระหว่างดำเนินการ

จำนวนรวม

1,416

โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่

5/15/2023

ระหว่างดำเนินการ


853

โครงการ

เพิ่ม 1 โครงการ

โครงการหมู่บ้านจัดสรร ระหว่างดำเนินการ 60.24%

● โครงการ ● โครงการ (รวม)

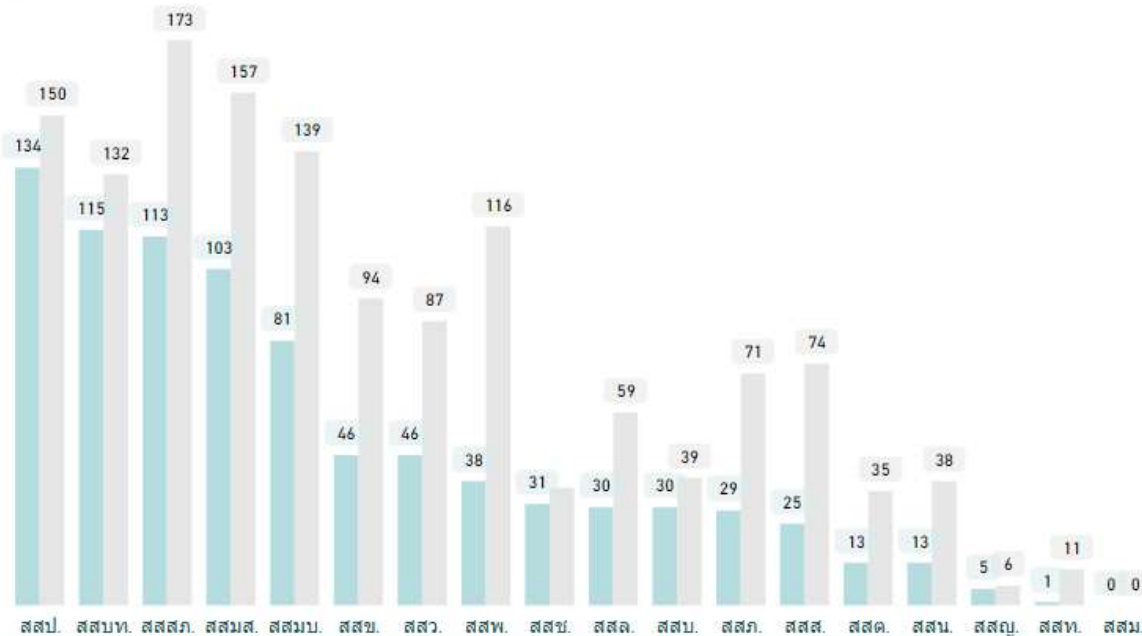

PROJECT_ID	ชื่อโครงการ	จำนวนเฟส
660502000001	โครงการ เวนิว ไอดี ราชพฤกษ์ - 345	1
660428000002	โครงการ วี คอมพาวด์ ราชพฤกษ์ - 345	1
660425000001	คาวาวิลล์ เทพารักษ์ ธนสิทธิ์	1
660424000001	S Gate Life ราชพฤกษ์ กาญจนภิเษก 2	1
660420000002	โกสเด้น ทาวน์ เกษตร-นวมินทร์ ถนนสาธารณะ	1
660419000001	เดอะเทรนต์ - วงแหวน หทัยราษฎร์	1
660412000001	เมย์ฟิลด์ รามอินทรา-คูบอน	1
660329000003	Chayada Biz Place	1
660322000002	GRAND PLENO พระราม9 - มอเตอร์เวย์	1
660322000001	เศรษฐสิริ รามอินทรา-เสรีไทย (ช่วงหน้าโครงการ) ซอยกาญจนภิเษก 11/3	2
660316000001	เดอะ เวลล์ 88 วิลเลจ	1
660315000003	วรารมย์ สุขสวัสดิ์ 76 ระยะ 1 (ซอยประชาอุทิศ 131) ถนนประชาอุทิศ	1
660313000003	โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ บางแค (BBS-BK)	1
660310000001	อัลติจูด คราฟท์ ไวบ์ บางนา	4
660308000003	Centro ทวีวัฒนา 1	1
660308000002	The city ทวีวัฒนา 1	1
660308000001	โครงการ หทัยราษฎร์ คอลเลคชั่น	1
660307000001	โครงการ ริทโม พาร์ควิ ชัยพฤกษ์ แจ้งวัฒนะ	1
660303000004	โครงการบ้านฟ้า ทาวน์นี้ ศรีนครินทร์ - เทพารักษ์	2
660303000003	บ้านกลางเมือง THE EDITION ปิ่นเกล้า-บรมฯ โครงการ 2	1

จำนวนรวม

5,005

+ 47 เฟส

เฟส

ระหว่างดำเนินการ

1,045

ระหว่างดำเนินการ

ลดลง 52 เฟส

ระหว่างดำเนินการ

เฟส เฟส (รวม)



ระหว่างดำเนินการ

PROJECT_ID	ชื่อโครงการ	ชื่อเฟส	ขั้นตอนดำเนินการ	แผนงาน	วันเริ่มขั้นตอน	วันที่แล้วเสร็จ	ตามแผน หรือ ช้ากว่าแผน
660502000001	โครงการ เวนิว ไอดี ราชพฤกษ์ - 345	โครงการ เวนิว ไอดี ราชพฤกษ์ - 345-เฟส 10	ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ รวมแผน (วัน)	0 0 0	2/5/2023 3/5/2023 2/5/2023	3/5/2023	✗
660428000002	โครงการ วิ คอมมพาวด์ ราชพฤกษ์-345	โครงการ วิ คอมมพาวด์ ราชพฤกษ์-345-เฟส 10	ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ รวมแผน (วัน)	0 0 0	2/5/2023 3/5/2023 2/5/2023	3/5/2023	✗
660425000001	คาซ่าริลล์ เทพารักษ์ ธนสิทธิ์	คาซ่าริลล์ เทพารักษ์ ธนสิทธิ์-เฟส 10	ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ รวมแผน (วัน)	0 0 0	2/5/2023 10/5/2023 10/5/2023	3/5/2023 11/5/2023	✗
660424000001	S Gate Life ราชพฤกษ์ กาญจนาคัย 2	S Gate Life ราชพฤกษ์ กาญจนาคัย 2-เฟส 10	ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ รวมแผน (วัน)	0 0 0	2/5/2023 10/5/2023 10/5/2023	10/5/2023	✗
660420000002	โกลเด้น ทาวน์ เกษตร-นวนินทร์ (ถนน สาธารณะ	โกลเด้น ทาวน์ เกษตร-นวนินทร์ (ถนนสาธารณะ เฟส 2)-	ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ รวมแผน (วัน)	0 0 0	7/5/2023 8/5/2023 7/5/2023	8/5/2023	✗
660419000001	เดอะเทรนต์ - วงแหวน หทัยราษฎร์	เดอะเทรนต์ - วงแหวน หทัยราษฎร์-เฟส 10	ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ ชำระเงินค่าวางท่อ ดำเนินการจัดจ้าง ดำเนินการก่อสร้างวางท่อ รวมแผน (วัน)	2 10 30 60 60 162	19/4/2023 19/4/2023 19/4/2023	19/4/2023 2/5/2023	✗
660412000001	เมย์ฟีลด์ รามอินทรา-คูบอน	เมย์ฟีลด์ รามอินทรา-คูบอน-เฟส 10	ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	2 10	12/4/2023 12/4/2023	12/4/2023 2/5/2023	✗



5/15/2023

ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ



จบการนำเสนอ


โครงการ และรายเฟส

ปี
 All
 สถานงาน
 All
 ภาค
 All
 สาขา
 All

โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หมายถึง
 1 โครงการที่ไม่ **UPLOAD**
MASTER PLAN FILE
 ในระบบ CIS
 2 โครงการที่ไม่ **UPLOAD**
PROGRESS FILE
 ในระบบ CIS

ทั้งนี้ ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ

โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน 19.01%

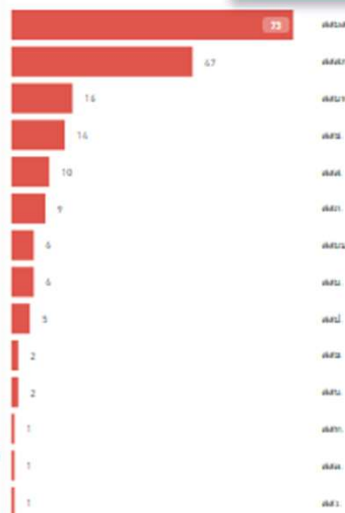

เฟสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน 63.30%



รายงานติดตามงานติดตั้งระบบโครงการหมู่บ้านจัดสรร

ข้อมูล ณ วันที่ 12-Mar-23 06:00 AM


โครงการ และรายเฟส

ปี
 All
 สถานงาน
 All
 ภาค
 All
 สาขา
 All


โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หมายถึง
 1 โครงการที่ไม่ **UPLOAD**
MASTER PLAN FILE
 ในระบบ CIS
 2 โครงการที่ไม่ **UPLOAD**
PROGRESS FILE
 ในระบบ CIS

ทั้งนี้ ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ

โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน 6.24%



เฟสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน 28.56%



เฟสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หมายถึง
 1 เฟสที่ไม่ **UPLOAD** แบบแปลนงาน
 วางท่อรายเฟส
 ในระบบ CIS
 2 เฟสที่ไม่ **อัปโหลด** แผนงาน
 ในระบบ CIS

ทั้งนี้ ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ
