

A top-down view of a desk with various office supplies. On the left is a silver laptop. In the center is an open white notebook with a silver pen resting on it. To the right of the notebook is a green ruler with yellow markings. Above the ruler is a silver paperclip. Below the ruler is a red folder or book. A keychain with a yellow key is attached to the folder. The background is a solid dark grey.

# รายงานติดตามงานโครงการหมู่บ้านจัดสรร

โดย : คณะทำงานย่อยตรวจสอบและติดตามการขอใช้น้ำประปาโครงการหมู่บ้านจัดสรร



# รายงานติดตามงานติดตั้งระบบโครงการหมู่บ้านจัดสรร

ข้อมูล ณ วันที่

7/10/2023

## โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

เดือนนี้


0.94%



## เฟสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

เดือนนี้

14.41%

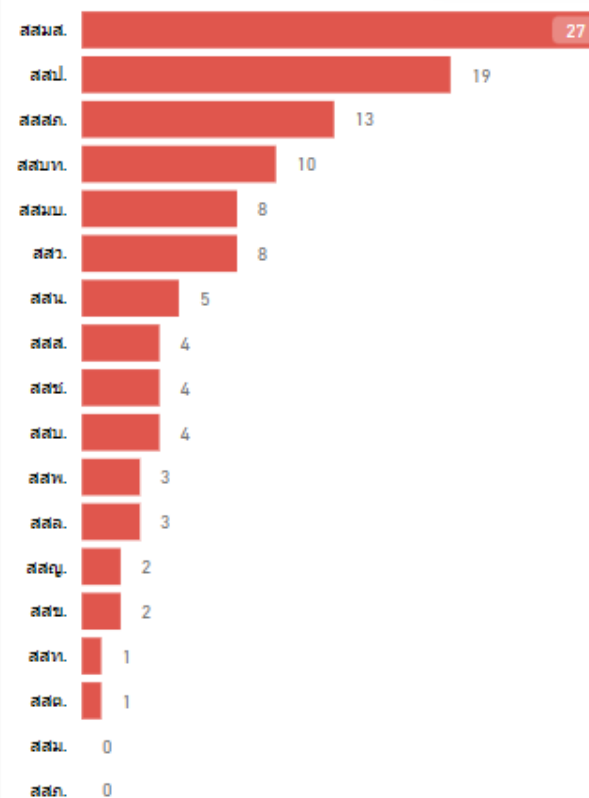

ปี

All

เลือก ปี และเดือน

All

สายงาน

All

ภาค

All

โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

หมายถึง

1 โครงการที่ไม่ UPLOAD  
MASTER PLAN FILE

ในระบบ CIS

2 โครงการที่ไม่ UPLOAD  
PROGRESS FILE

ในระบบ CIS

ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ

เฟสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หมายถึง  
1 เฟสที่ไม่ UPLOAD แบบแปลนงาน  
วางท่อระบายน้ำ


ในระบบ CIS

2 เฟสที่ไม่อัปโหลดแผนงาน  
ในระบบ CIS

ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ

## ข้อมูลโครงการ ฯ เดือน มิ.ย. 66

### โครงการใหม่ (รายเดือน)

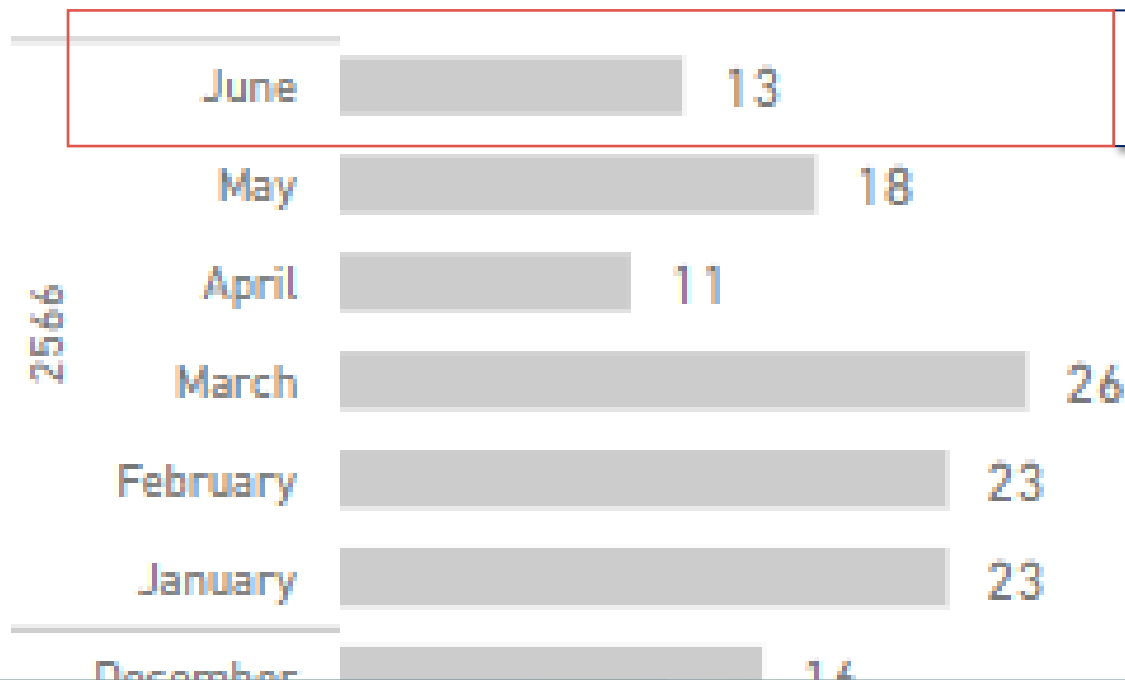

ยื่นเรื่องขอเปิดโครงการ ฯ ใหม่ 13 โครงการ

เทียบกับเดือน พ.ค. 66


ลดลง 5 โครงการ

เทียบกับเดือน มิ.ย. 65

ลดลง 16 โครงการ

โครงการ ฯ ที่ยื่นขอวางท่อ  
จำนวนสะสม 1,472 โครงการ

ระหว่างดำเนินการ ลดลง ▼ 22 โครงการ  
เมื่อเทียบกับ พ.ค. 66

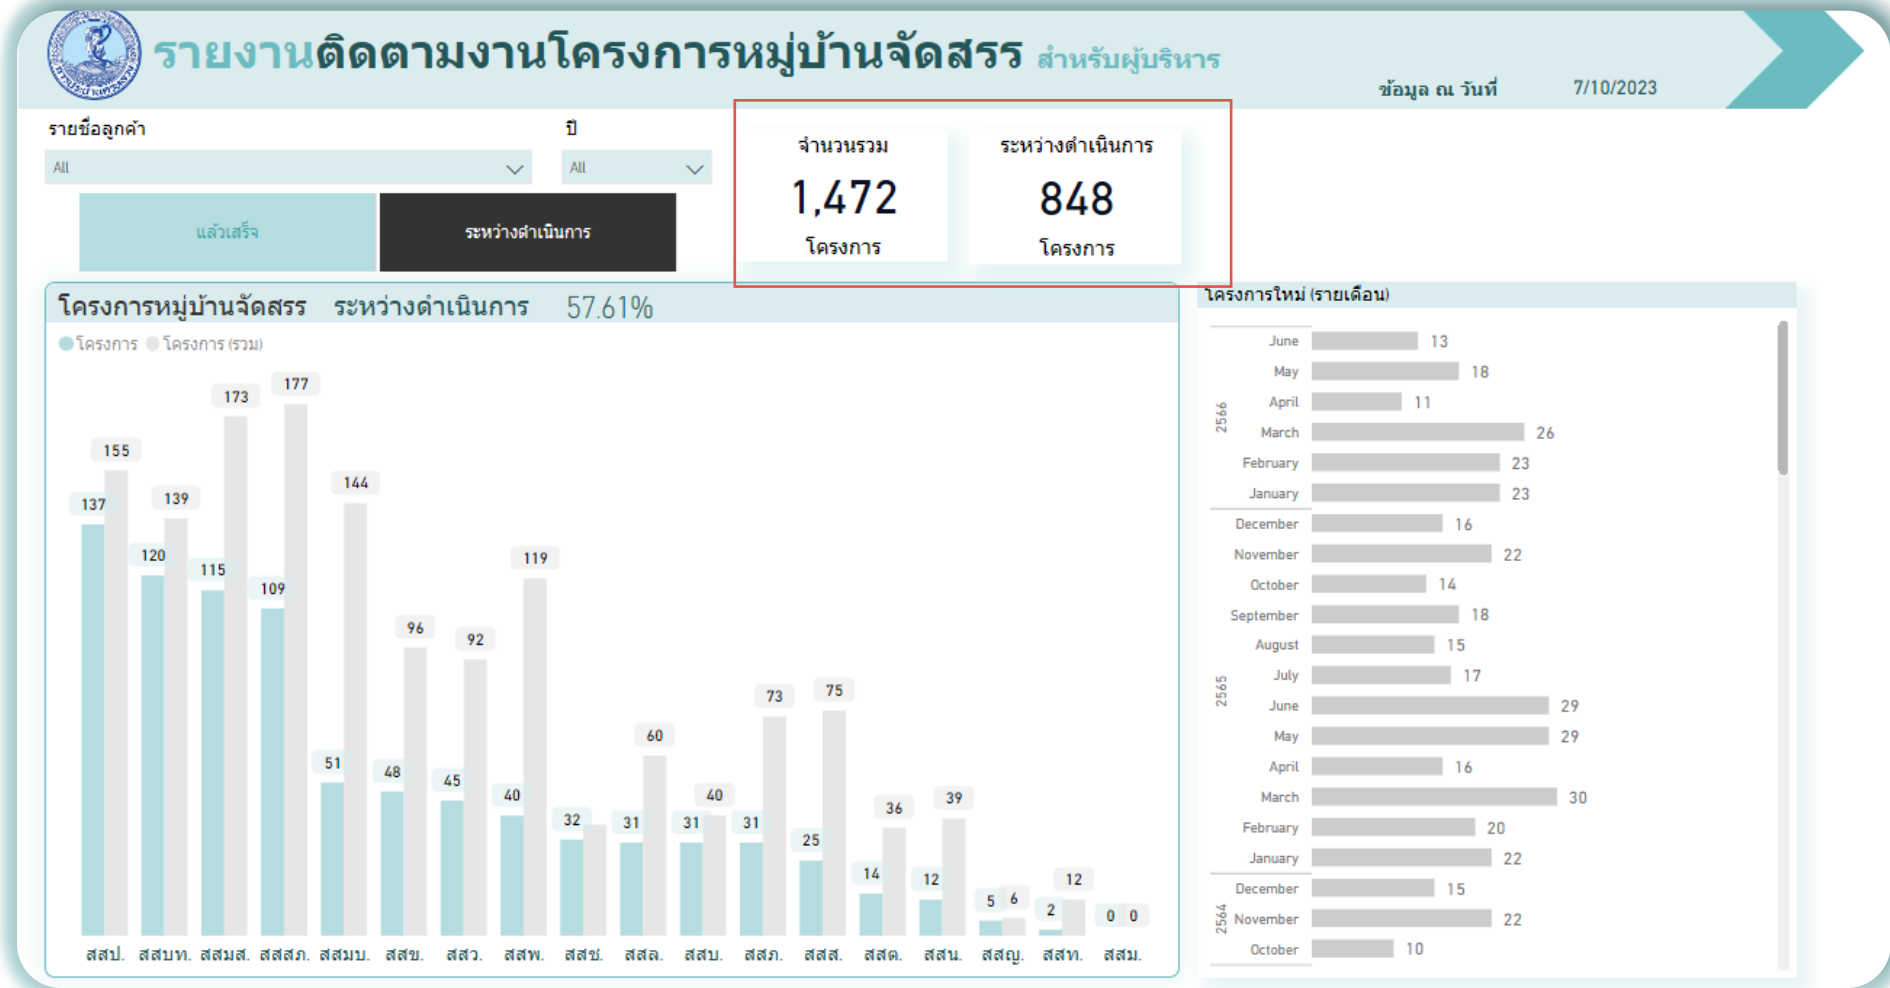

## ข้อมูล เฟส เดือน มิ.ย. 66

รายชื่อลูกค้า

ยื่นเรื่องขอเปิดเฟส ใหม่  
เดือน มิ.ย. 66

เฟสใหม่

111

เฟส

สาขา

All

ปี

All

เลือก ปี และเดือน


2566 06

แล้วเสร็จ

ระหว่างดำเนินการ

ระหว่างดำเนินการ

เฟส เฟส (รวม)

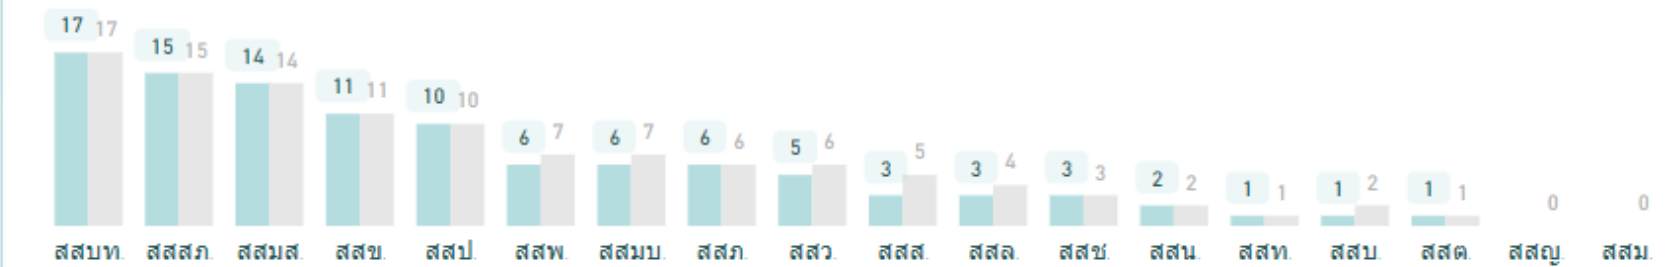

เทียบกับเดือน พ.ค. 66


ลดลง 3 เฟส

เทียบกับเดือน มิ.ย. 65

เพิ่มขึ้น 6 เฟส

# เฟส ระหว่างดำเนินการ

ลดลง ▼ 128 เฟส เมื่อเทียบกับ พ.ค. 66

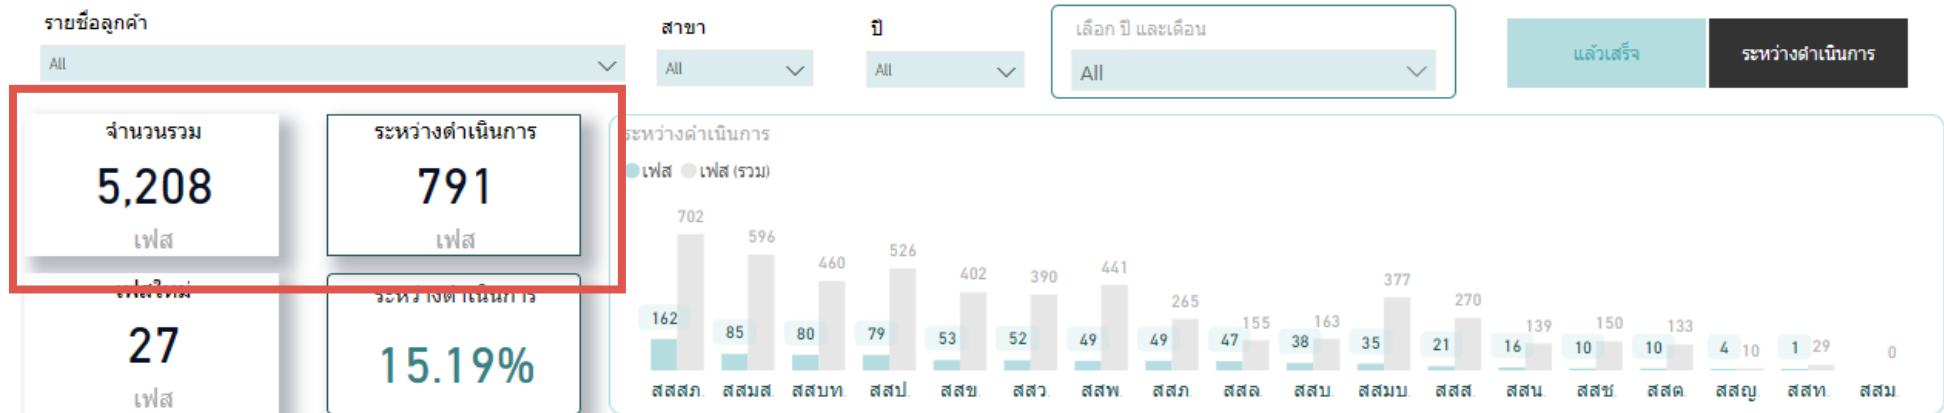

## ระหว่างดำเนินการ

PROJECT_ID	ชื่อโครงการ	%ความก้าวหน้าโครงการ	ชื่อเฟส	% ความก้าวหน้าเฟส	ขั้นตอนดำเนินการ	แผนงาน	วันเริ่มขั้นตอน	วันที่แล้วเสร็จ	ตามแผน หรือ ช้ากว่าแผน
660629000001	อณาสรี ปิ่นเกล้า-กาญจนา	5	อณาสรี ปิ่นเกล้า-กาญจนา-เฟส 1.0	0	ยื่นเรื่องวางท่อและออกสำรวจ	0	03/07/2566	03/07/2566	✗
660623000001	S Happy Home	10	S Happy Home-เฟส 1.0	0	ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	03/07/2566		✗
660622000001	MILFORD LADPRAO-RAMKHAMHAENG (เฟส 1.0)	0	MILFORD LADPRAO-RAMKHAMHAENG (เฟส 1.0)-	0	ยื่นเรื่องวางท่อและออกสำรวจ	0	06/07/2566	07/07/2566	✗
660617000001	โครงการ บริหาเนย ประชาอุทิศ 90	9	โครงการ บริหาเนย ประชาอุทิศ 90-เฟส 0.1	0	ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	07/07/2566		✗
660615000002	PLEND บางใหญ่ 3	0	PLEND บางใหญ่ 3-เฟส 1.0	0	ยื่นเรื่องวางท่อและออกสำรวจ	0	05/07/2566	05/07/2566	✗
			PLEND บางใหญ่ 3-เฟส 2.0	0	ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	19/06/2566	19/06/2566	✗
660615000001	เทอร์พีด เทเลส ราชพฤกษ์ - รัตนธิเบศร์	4	เทอร์พีด เทเลส ราชพฤกษ์ - รัตนธิเบศร์ -เฟส 1.0	0	ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	29/06/2566	29/06/2566	✗
660614000001	เดอะราม อเวนิว ราชพฤกษ์	0	เดอะราม อเวนิว ราชพฤกษ์ -เฟส 1.0	0	ยื่นเรื่องวางท่อและออกสำรวจ	0	29/06/2566	29/06/2566	✗
660613000005	Chod Biz @ Bangna km. 8 Phase 2	0	Chod Biz @ Bangna km. 8 Phase 2-เฟส 1.0	20	ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	22/06/2566	22/06/2566	✗
					ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	22/06/2566	22/06/2566	✗
					ยื่นเรื่องวางท่อและออกสำรวจ	0	04/07/2566	04/07/2566	✗
					ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	04/07/2566	04/07/2566	✗
					ยื่นเรื่องวางท่อและออกสำรวจ	1	13/06/2566	15/06/2566	✗
					ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	15	15/06/2566	29/06/2566	
					ชำระเงินค่าวางท่อ	1	29/06/2566	03/07/2566	✗
					ดำเนินการจัดจ้าง	0	03/07/2566		✗
					ดำเนินการก่อสร้างวางท่อ	0			✗
660609000001	Grand Plenn เวสต์เอนด์	10	Grand Plenn เวสต์เอนด์-เฟส 1.0	0	ยื่นเรื่องวางท่อและออกสำรวจ	0	29/06/2566	29/06/2566	✗

เฟสที่ยื่นขอวางท่อประปา ปีพ.ศ. 2559 - 2564

และมีสถานะงาน “ระหว่างดำเนินการ” จำนวน 20 เฟส



ข้อมูลวันที่ 10 ก.ค. 66



ป

Multiple s...

สายงาน

All

ภาค

All

สาขา

All

## ติดตามโครงการ และ เฟส

1,075

จำนวนโครงการ


492

ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)

ระหว่างดำเนินการ (เฟส)

20

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

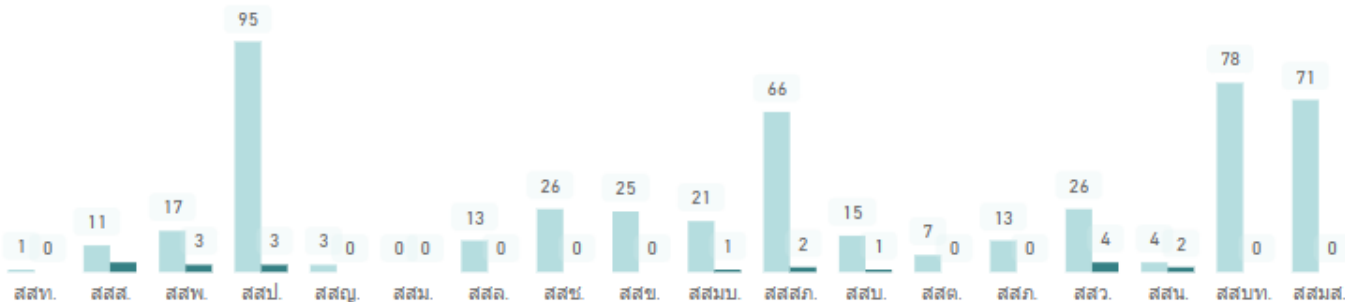

### รายชื่อโครงการ&เฟส

PROJECT_ID	ชื่อโครงการ	ความก้าวหน้าโครงการ (%)	Phase_ID	ชื่อเฟส	ขั้นตอนดำเนินงาน	แผนงาน (วัน)	วันเริ่มตามแผน	วันสิ้นสุดตามแผน	ดำเนินการจริง (วัน)	เริ่มขั้นตอน	สิ้นสุดขั้นตอน	F
641207000001	โอลิมปิก 2 ประจำปี 90 ระยะ 1 (ชื่อย่อประจำปี 90) ถนน ประจำปี 90	6	649999570210	ทางเข้าโครงการ โอลิมปิก 2 ประจำปี 90 (ชื่อย่อ ประจำปี 90) ถนน ประจำปี 90	ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง	3				20/12/2564	20/12/2564	
					ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	15				20/12/2564	09/02/2565	
					ชำระเงินค่าวางท่อ	7				09/02/2565	28/02/2565	
					ดำเนินการจัดจ้าง	30				28/02/2565	08/03/2566	
					ดำเนินการก่อสร้างวางท่อ	45				08/03/2566	08/03/2566	
641203000001	วารีโอ ทุ	50	649999556373	วารีโอ ทุ เฟส 1-	ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง	4				13/12/2564	13/12/2564	
					ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	10				13/12/2564	14/12/2565	
					ชำระเงินค่าวางท่อ	0				14/02/2565	14/02/2565	
					ดำเนินการจัดจ้าง	0				14/02/2565		
					ดำเนินการก่อสร้างวางท่อ	0						
641201000003	รัตนนิมิตร์- ราชพฤกษ์ (ส่วนกลาง)	5	649999535865	รัตนนิมิตร์-ราชพฤกษ์ (ส่วน กลาง)-เฟส 1.0	ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง	3				02/12/2564	07/12/2564	
					ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	14				07/12/2564	17/12/2564	
					ชำระเงินค่าวางท่อ	7				17/12/2564	22/12/2564	
					ดำเนินการจัดจ้าง	30				22/12/2564	20/04/2566	
					ดำเนินการก่อสร้างวางท่อ	30				20/04/2566	20/04/2566	
649999535875	รัตนนิมิตร์-ราชพฤกษ์ (ส่วนกลาง)			รัตนนิมิตร์-ราชพฤกษ์ (ส่วนกลาง)-เฟส 1.0	ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง	3				02/12/2564	07/12/2564	



# การเข้าใช้งาน

intranet [http://intra.mwa.co.th/departmap\\_new.html](http://intra.mwa.co.th/departmap_new.html)

เลือก

1

The screenshot shows the MWA Intranet homepage. At the top left is the MWA logo. To its right is a 'Single Sign-on' button and social media icons for Facebook and Twitter. Below these are navigation tabs: 'หน้าหลัก' (Home), 'Internet กปน.' (Internet MWA), 'หน่วยงานภายใน' (Internal Organization), 'หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง' (Related Organizations), and 'แผนผังเว็บไซต์' (Website Map). A green banner displays '1125 News' and 'ข่าวแจ้งเดือน'. Below this is a row of service tiles: 'ปฏิทินกิจกรรม (Calendar)', 'สื่อประชาสัมพันธ์ (Multimedia)', 'e-HR Pay Slip', 'ทำแบบสำรวจ (Survey)', and 'แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)'. On the left, a 'เมนูหลัก' (Main Menu) dropdown is open, listing various systems. A red box labeled '1' highlights 'ระบบสารสนเทศผู้บริหาร' (Executive Information System). A red arrow points from this box to a red box labeled '2' which highlights the 'DAVIS MWA DATA WAREHOUSE' icon in the main content area. A yellow banner at the bottom contains the text 'กดเลือกเพื่อไปหน้า website <https://davis.mwa.co.th>'. Other visible elements include a 'ระบบสารสนเทศผู้บริหาร' (Executive Information System) icon, a 'CPM' logo, a 'ศูนย์ศึกษา EVM' (EVM Study Center) icon, a 'ยกร่างสคริปต์ กปน. ฉบับที่ 4' (Drafting MWA Script Version 4) icon, a 'คู่มือเอกลักษณ์องค์กร' (Corporate Identity Manual) icon, a 'คู่มือการกำหนดผลตอบแทน' (Return on Investment Determination Manual) icon, and a 'ระบบสารสนเทศ' (Information System) icon. A cartoon character is in the bottom right corner with a speech bubble saying 'สวัสดีครับ... ผมช่วยหาคำตอบให้ครับ...' (Hello... I will help you find the answer...).

ระบบสารสนเทศผู้บริหาร

ระบบงานและบริหารค้นหาข้อมูล

บุคลากรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำ (CIS)

ระบบ KM Portal

งานวิจัยและพัฒนา (R&D)

ระบบสารสนเทศผู้บริหาร

CPM

ศูนย์ศึกษา EVM หรือ BSC

ยกร่างสคริปต์ กปน. ฉบับที่ 4

คู่มือเอกลักษณ์องค์กร

คู่มือการกำหนดผลตอบแทน

ระบบสารสนเทศ

DAVIS MWA DATA WAREHOUSE

CIC Corporate Information Center

i-connex

ระบบแฟร้ง

คุณภาพน้ำแบบ Real Time

ผู้บริหารระดับสูง

เชื่อมต่อระบบ EVM

สำหรับผู้บริหาร

ดูทั้งหมด

สวัสดีครับ... ผมช่วยหาคำตอบให้ครับ...

กดเลือกเพื่อไปหน้า website <https://davis.mwa.co.th>



*จบการนำเสนอ*
