

A top-down view of a desk with various office supplies. On the left is a silver laptop. In the center is an open white notebook with a silver pen resting on it. To the right of the notebook is a green ruler with yellow markings. Above the ruler is a silver paperclip. Below the ruler is a red folder or book. A keychain with a yellow key is attached to the folder. The background is a solid dark grey.

รายงานติดตามงานโครงการหมู่บ้านจัดสรร

โดย : คณะทำงานย่อยตรวจสอบและติดตามการขอใช้น้ำประปาโครงการหมู่บ้านจัดสรร

ติดตามโครงการ และ เฟส

1,517

จำนวนโครงการ


853

ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)

ระหว่างดำเนินการ (เฟส)

841


โครงการ และเฟส ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

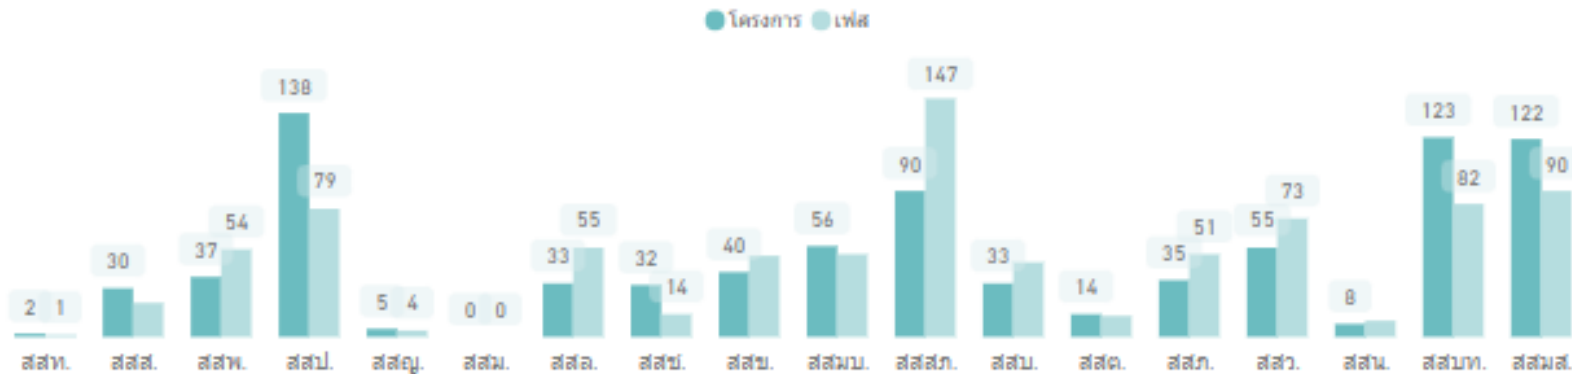

รายชื่อโครงการ&เฟส

PROJECT_ID	ชื่อโครงการ	ความก้าวหน้าโครงการ (%)	Phase_ID	ชื่อเฟส	ความก้าวหน้าเฟส (%)	สาขางาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	แผนงาน (วัน)	เริ่มขั้นตอน	สิ้นสุดขั้นตอน	วันดำเนินการจริง
660901000002	CENTRO ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า	10	669999416238	CENTRO ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า-เฟส 1.0	0	ส่งดำเนินการ	ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0 0	06/09/2566 06/09/2566		
660829000002	ศุภาสีป ทรัพย์สิน รามอินทรา 117	1	669999414793	ศุภาสีป ทรัพย์สิน รามอินทรา 117-เฟส 1.0	0	บันทึกแบบสำรวจ	ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0 0	04/09/2566 04/09/2566		
660829000001	โครงการศุภาสีป พาร์ควิลล์กาญจนาภิเษก - ซอยกษัตริยา	10	669999415594	โครงการศุภาสีป พาร์ควิลล์กาญจนาภิเษก - ซอยกษัตริยา-เฟส 1.0	0	ส่งดำเนินการ	ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0 0	05/09/2566 05/09/2566		
660824000001	Pleno สุขุมวิท - บางนา 3	0	669999411336	Pleno สุขุมวิท - บางนา 3 เฟส 0.1-	0	ส่งดำเนินการ	ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0 0	31/08/2566 31/08/2566		
			669999412709	Pleno สุขุมวิท - บางนา 3 เฟส 1.0-	0	ส่งดำเนินการ	ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0 0	01/09/2566 01/09/2566		
660811000001	MITHI HOUSE	1	669999405541	MITHI HOUSE เฟส 1.0-เฟส 1.0	1	จัดทำใบแจ้งราคา	ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง	2	21/08/2566	22/08/2566	1 วัน
							ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	10	22/08/2566	04/09/2566	13 วัน
							ชำระเงินค่าวางท่อ	30	04/09/2566		
							ดำเนินการจัดจ้าง	30			
							ดำเนินการก่อสร้างวางท่อ	60			

โครงการ ฯ และเฟส ที่ข้อมูล / เอกสารในระบบฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน สะสมถึง ส.ค. 66



9/7/2023

เฟสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

All All All All

หมายถึง


ในระบบ CIS

ในระบบ CIS

ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ

สะสมถึงเดือนนี้

14.86%

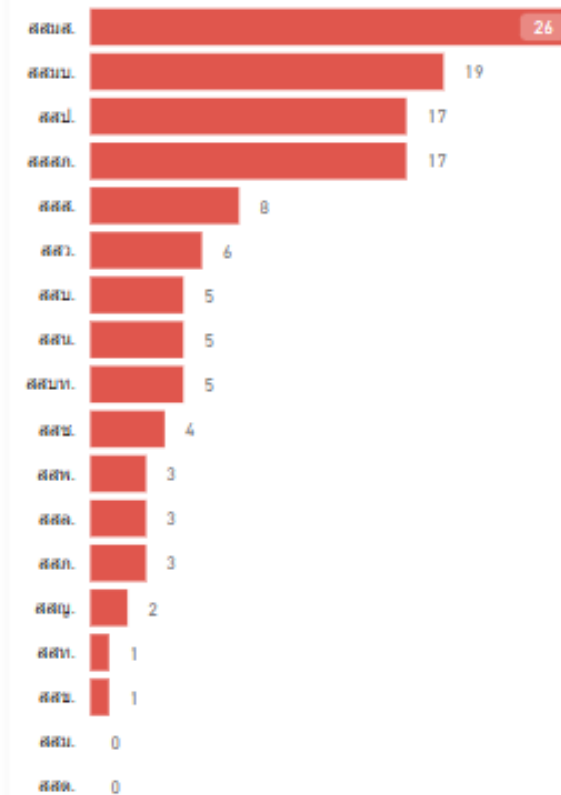


ทั้งนี้ไม่รวมโครงการทำงานแล้วเสร็จ

8/31/2566

จำนวนโครงการ ฯ ใหม่ เดือน ส.ค. 66

8 โครงการ


โครงการใหม่ (รายเดือน)

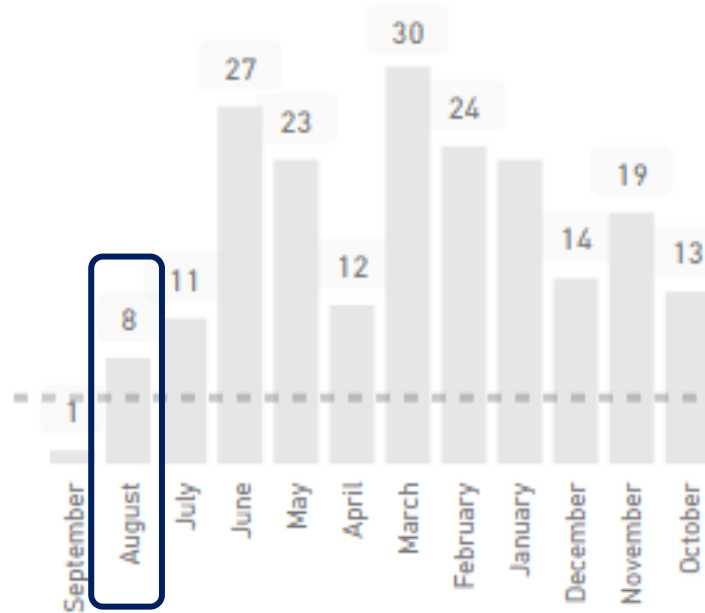

2566

โครงการหมู่บ้านจัดสรร

● โครงการ ● โครงการ (รวม)

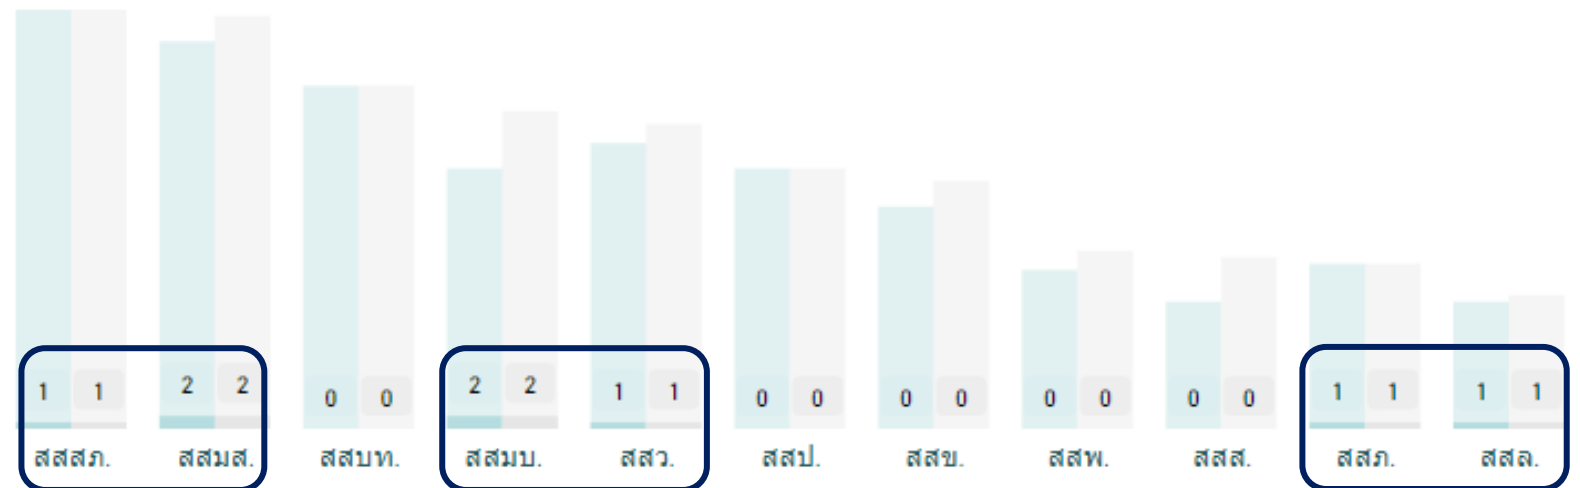


โครงการ ฯ ที่ยื่นคำร้องในปีงบ 2566 จำนวน 210 โครงการ

แล้วเสร็จจำนวน 10 โครงการ

● โครงการ ● โครงการ (รวม)

ระหว่างดำเนินการ จำนวน 200 โครงการ

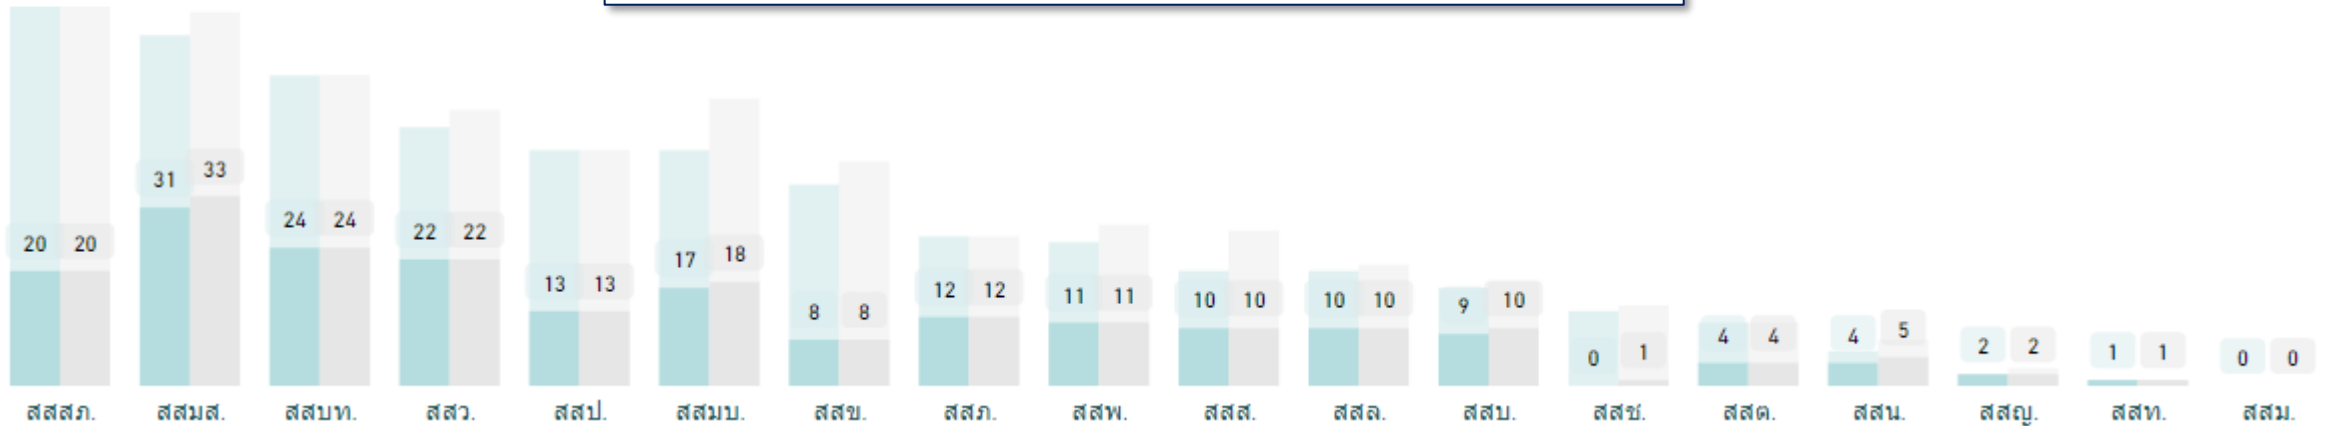


โครงการ ฯ ที่ยื่นคำร้อง
ก่อนปีงบ 2566 จำนวน
1,306 โครงการ

โครงการหมู่บ้านจัดสรร

● โครงการ ● โครงการ (รวม)

ระหว่างดำเนินการ จำนวน 653 โครงการ

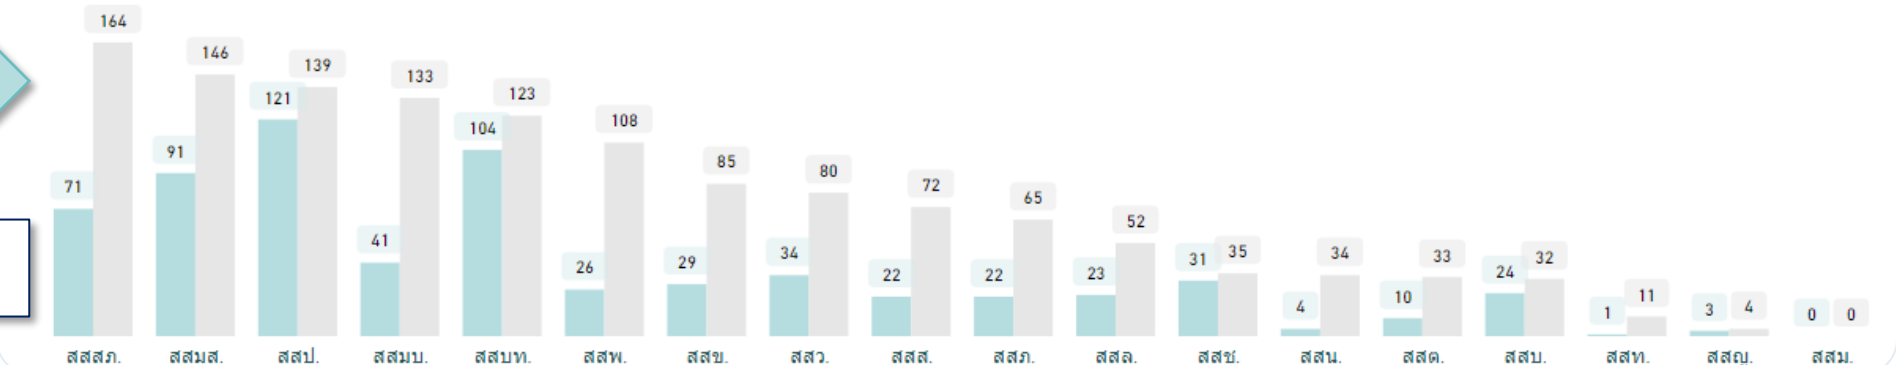


แล้วเสร็จจำนวน 653 โครงการ

โครงการ ฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สะสมถึงเดือน ส.ค. 66

จำนวน 853 โครงการ


โครงการหมู่บ้านจัดสรร

● โครงการ ● โครงการ (รวม)

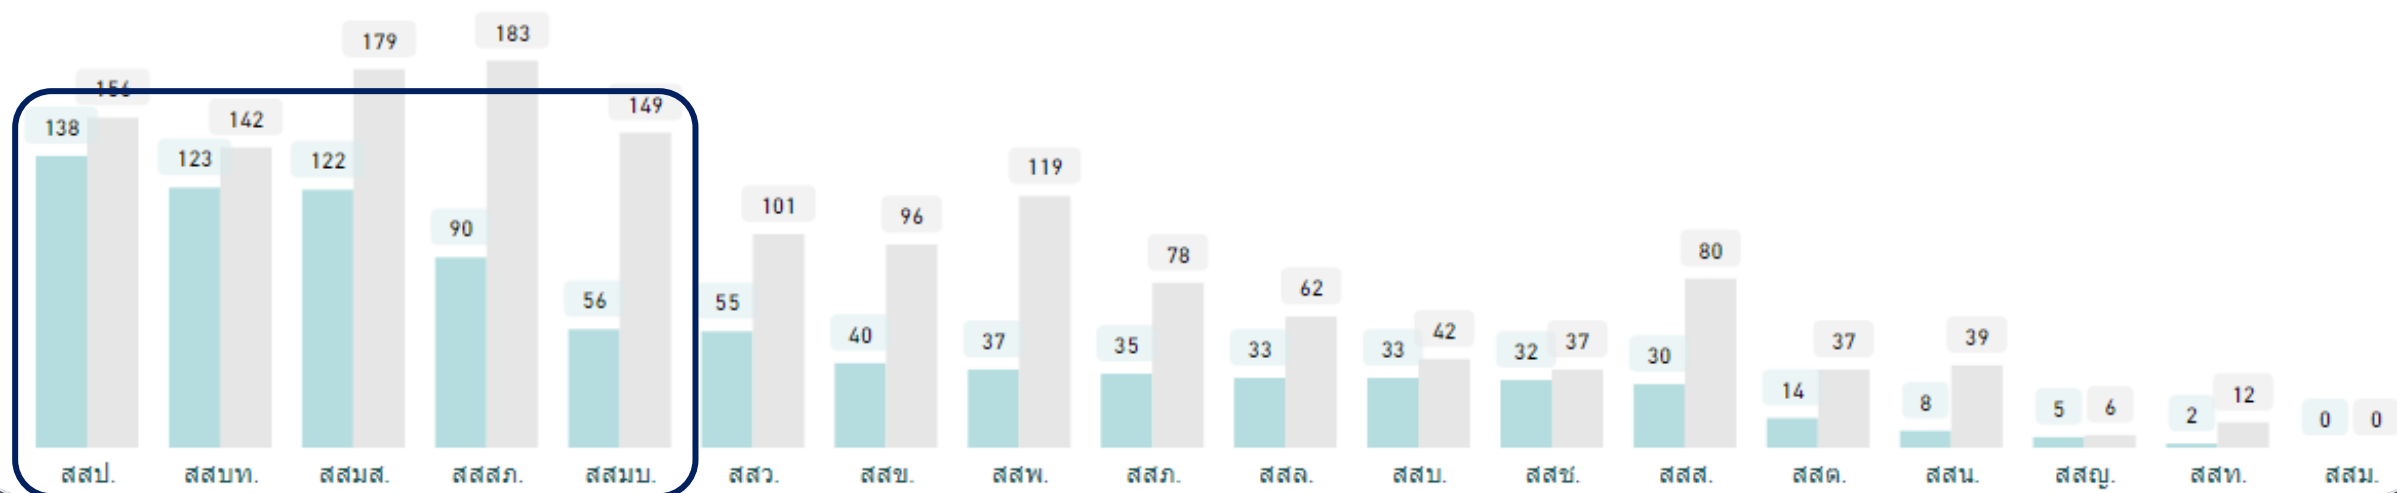

เฟส ที่ยื่นคำร้อง เดือน ส.ค. 66 (เฟสใหม่) มีจำนวน 106 เฟส
เพิ่มขึ้น 5 เฟส เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. 66

● เฟส ● เฟส (รวม)

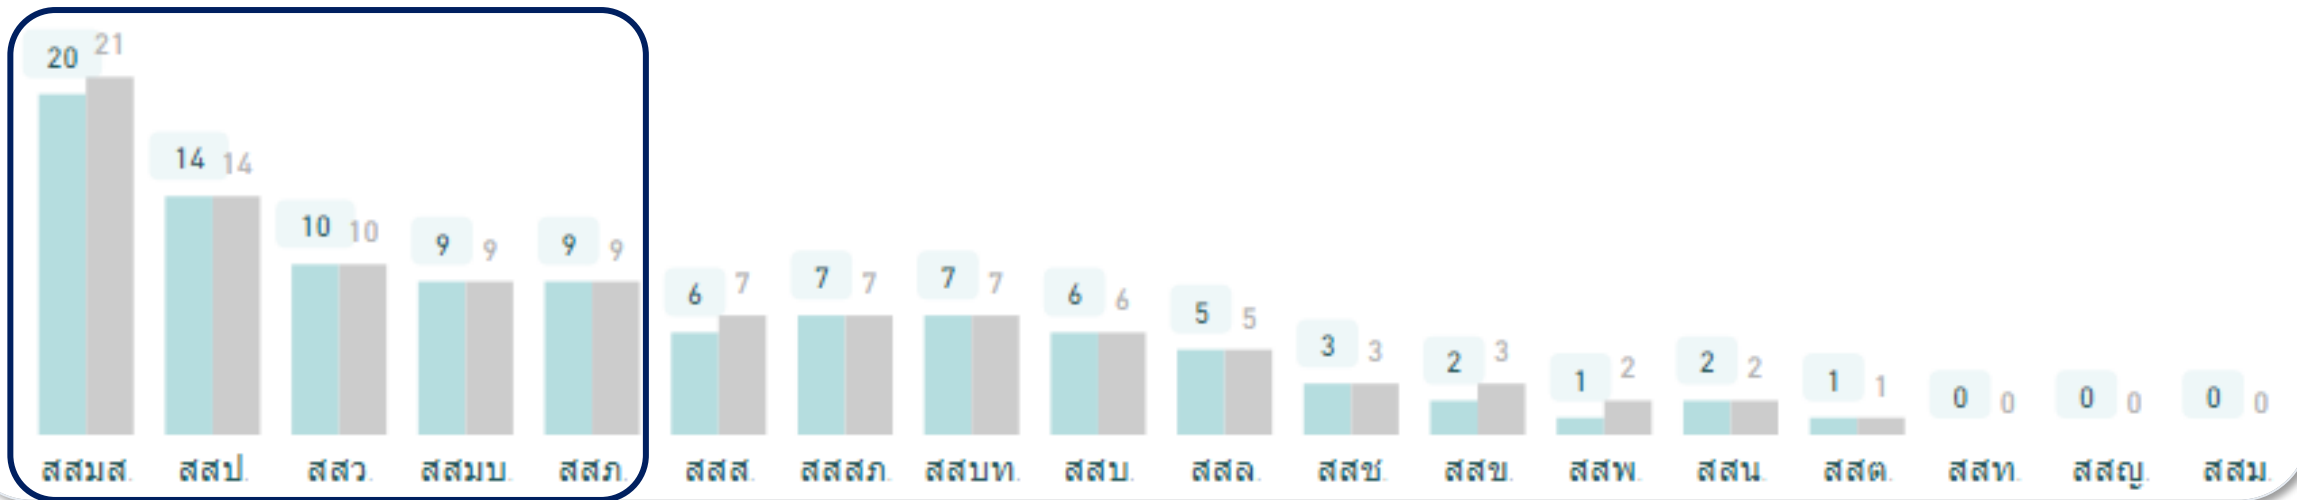

เฟส ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สะสมถึงเดือน ส.ค. 66 มีจำนวน 841 เฟส
เพิ่มขึ้น 68 เฟส เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. 66


จำนวนรวม
5,404
เฟส

ระหว่างดำเนินการ
841
เฟส

ระหว่างดำเนินการ




ระหว่างดำเนินการ **15.56%**

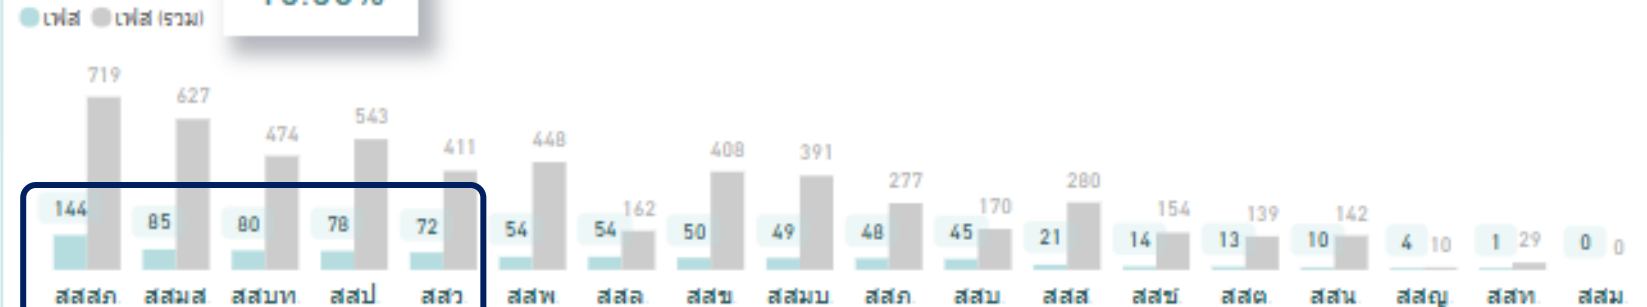


เฟส ที่ยื่นคำร้องก่อนปีงบประมาณ 2566 และอยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน **144** เฟส จากจำนวน 4,545 เฟส


ปีงบประมาณ 2561 จำนวน **1** เฟส

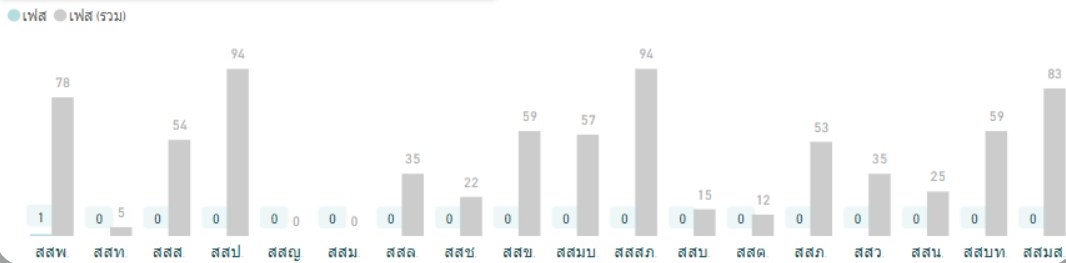


ปีงบประมาณ 2562 จำนวน **2** เฟส

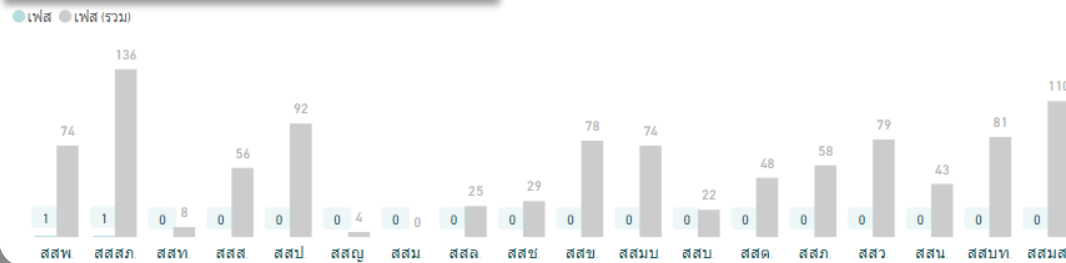


ปีงบประมาณ 2563 จำนวน **2** เฟส

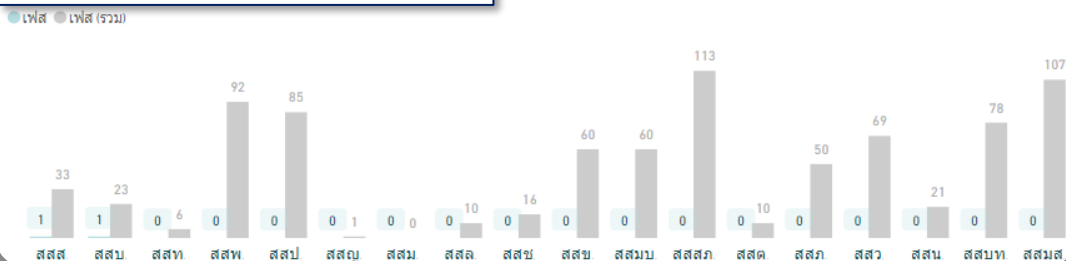

ปีงบประมาณ 2564 จำนวน **13** เฟส

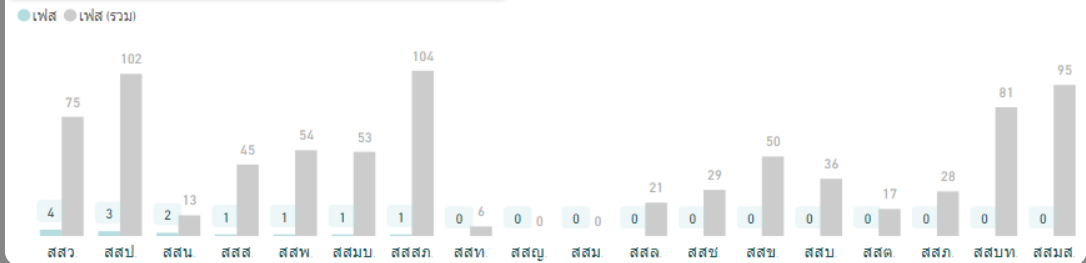

ปีงบประมาณ 2565 จำนวน **126** เฟส

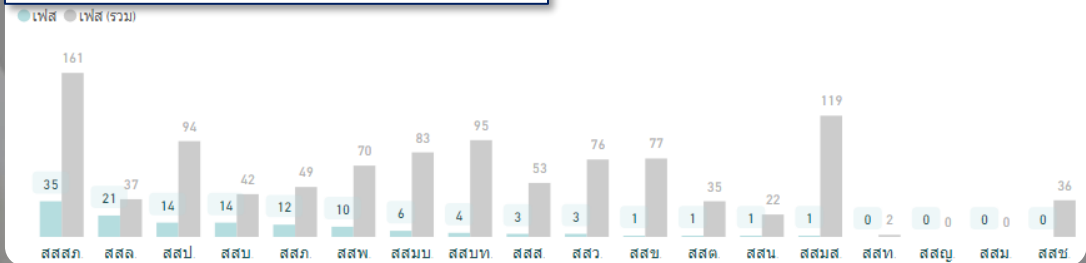



จบการนำเสนอ
