



**การประปานครหลวง**  
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

## ผลการดำเนินงานด้านลดน้ำสูญเสีย ประจำเดือน กันยายน 2566

25 กันยายน 2566

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

เป้าหมาย

จ้างสำรวจหาท่อรั่วด้วยดาวเทียม

รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปี 2566												ปี 2567				
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
งานจ้างสำรวจหาบริเวณ ที่มีท่อรั่วในระบบท่อจ่าย น้ำด้วยระบบดาวเทียม	5,000 กม.	6.965 ล้านบาท			A		B/C/D	E	F										
					A		B/C/D	E	F										
			ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 66 และเริ่มงานสัญญา เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 66 (สิ้นสุดสัญญา																

ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 66 และเริ่มงานสัญญา เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 66 (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 มี.ค. 67) โดยดำเนินการถ่ายภาพดาวเทียมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 66 และส่งมอบงานครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการถ่ายภาพดาวเทียมครั้งที่ 2



A

อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคาากลาง)

B

ยื่นเอกสารประกวดราคา

C

ตรวจเอกสาร

D

ดำเนินการขออนุมัติจ้าง

E

ลงนามสัญญา

F

ดำเนินงานตามสัญญา



แผนการดำเนินงาน



เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน




ล่าช้ากว่าแผน

ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (สวม.กท.ฝจส.) ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2566

## การดำเนินงานปรับปรุงมาตรวัดน้ำระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2566

รูปแบบการดำเนินงาน		ต.ค.65 - พ.ค.66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวม
สัญญาปรับปรุงมาตรวัดน้ำ ระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย	แผนงาน	156	18	13	18	20	225
	ผลงาน	189	22	23	12		246
CM/PM	CM	16	6	3			25
	PM	48	42	174			264

# การดำเนินงานปรับปรุง DM ตามเป้าหมาย RTU ใช้งาน 85%

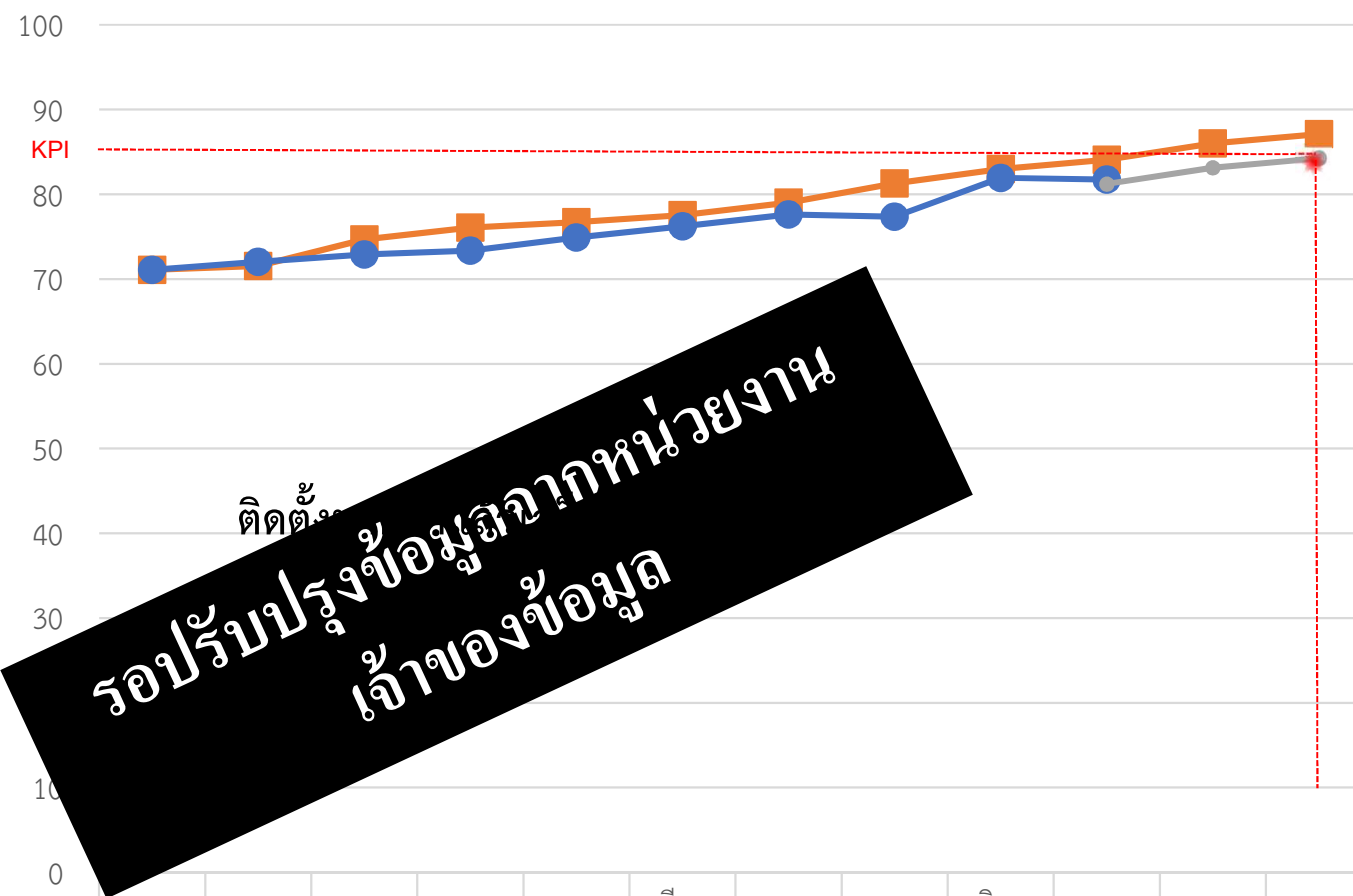

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
%ผู้ใช้ได้คาดการณ์ต้นปีงบประมาณ	71.08	71.55	74.69	76.09	76.73	77.55	79.01	81.28	82.97	84.08	86.01	87.11
ผลงาน %	71.08	72.05	72.91	73.36	74.90	76.23	77.63	77.35	81.95	81.76		
%ผู้ใช้ได้คาดการณ์ตามเดือนที่ออกรายงานล่าสุด										81.23	83.15	84.25

สรุปรายละเอียดจุดงานปรับปรุงมาตรา (DM) พื้นที่บริการภาค 1 และ 2 สัญญาเลขที่ ซล.32/2564

ที่	สาขา	จุดติดตั้งตาม TOR		ติดตั้งมาตรฐานแล้วเสร็จ	จุดงานในพื้นที่ PBC				แนวทางแผนงาน / คาดการณ์แล้วเสร็จ
		300 มม.	200 มม.	รวม	จำนวนจุดในพื้นที่ PBC	ติดตั้งมาตรฐานแล้วเสร็จ	*รอตติมาตร	ตู้ Online สมบูรณ์	
1	สสส.	-	35	12	9	9	-	9	-
2	สสพ.	-	19	18	11	11	-	11	-
3	สสป.	-	14	10	ไม่มี PBC				
4	สสท.	4	24	14	12	12	-	12	-
5	สสญ.	-	9	-	ไม่มี PBC				
6	สสม.	21	18	21	21	15	6	15	*รอผู้ขายเข้าดำเนินการ 6 จุด
7	สสล.	-	36	15	ไม่มี PBC				
รวม		25	155	90	53	47	6	47	ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2566
		180							

## รายละเอียดจุดติดตั้งที่ดำเนินการแล้ว สัญญาเลขที่ ชล.32/2564

ลำดับที่	ลำดับที่ (TOR)	สาขา	DM	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดมาตร (มม.)	วันที่ ติดบรจบ	พร้อมส่งมอบงาน	หมายเหตุ
1	4	สสส.	DM-07-01-05-04	ปาก ช.สุขุมวิท41 (300 มม.) ตู้ RTU (07M40 เดิม)	200	23 ม.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว (5)	
2	5	สสส.	DM-07-01-06-01	ซอย ปาก ช.สุขุมวิท 53 (300 มม.) ตู้ RTU (07M41 เดิม)	200	2 ก.พ. 66	ส่งมอบไปแล้ว (5)	
3	13	สสส.	DM-07-04-16-01	อ่อนนุช 17 ติดคลองประเวศฝั่งขวา	200	13 ธ.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว (4)	
4	14	สสส.	DM-07-04-16-04	อ่อนนุช 17 คลองโอง่างฝั่งซ้าย	200	6 ธ.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว (4)	
5	22	สสส.	DM-07-05-03-01	อาคาร แผนรักษาสายส่งใต้ดิน ถนนรัชดาภิเษก 07M109	200	23 ธ.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว (4)	
6	23	สสส.	DM-07-05-03-02	ถนนรัชดาภิเษก ใกล้ปากซอยสุขุมวิท 16 หน้าอาคารเอ็กซ์เชนจ์ทาวเวอร์	200	15 ก.ย. 65	ส่งมอบไปแล้ว (3)	
7	24	สสส.	DM-07-05-04-01	อาคาร แผนรักษาสายส่งใต้ดิน ถนนรัชดาภิเษก 07M110	200	23 ธ.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว (7)	
8	26	สสส.	DM-07-05-11-03	ถ.พระราม 4 แยกเกษมราษฎร์ หน้า ธ.ธนชาต	200	11 ก.ย. 66	ส่งมอบไปแล้ว (10)	
9	27	สสส.	DM-07-05-13-01	ใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถ.รัชดาฯ 07M130	200	26 ก.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว (3)	

## รายละเอียดจุดติดตั้งที่ดำเนินการแล้ว สัญญาเลขที่ ชล.32/2564

ลำดับที่	ลำดับที่ (TOR)	สาขา	DM	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดมาตร (มม.)	วันที่ ตัดบรรจบ	พร้อมส่งมอบ งาน	หมายเหตุ
10	31	สสส.	DM-07-05-11-02	ถ.พระราม 4 ข้างอาคารสิรินรัตน์ (เยื้องอาคารมาลีนนท์)	200	18 ก.ย. 66	รอกกราฟ 7 วัน	
11	32	สสส.	DM-07-05-13-02	หน้าอาคาร เดอะปาร์ค ตรงข้าม ธ.กสิกรไทย คลองเตย	200	13 ก.ย. 65	ส่งมอบไปแล้ว(3)	
12	34	สสส.	DM-07-07-07-02	ตรงข้ามทางเข้าหมู่บ้านเคหะธานี 4 ถ.ราษฎร์พัฒนา RTU-DMA	200	7 ก.ย. 66	ส่งมอบไปแล้ว(10)	
13	36	สสพ.	DM-13-02-04-04	ริมทางรถไฟสายเก่า ข้างคลองบางจาก	200	11 ต.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว(3)	
14	37	สสพ.	DM-13-01-03-01	ถ.อ่อนนุช ข้างซอยอ่อนนุช 24 (หน้าร้านขายศาลพระ ภูมิ)	200	4 ต.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว(7)	
15	38	สสพ.	DM-13-01-07-02	ซอยอ่อนนุช 29	200	4 ต.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว(7)	
16	39	สสพ.	DM-13-03-01-01	ถ.อ่อนนุช ข้างซอยอ่อนนุช 66 (หน้าร้านตัดผม)	200	27 ต.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว(8)	
17	40	สสพ.	DM-13-03-01-03	ถ.ศรีนครินทร์ ข้างปั๊มเอสโซ่ (ตรงข้าม ซอยโสอุดร)	200	20 ต.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว(3)	
18	41	สสพ.	DM-13-03-04-02	ตรงข้าม ซ.อ่อนนุช 65	200	6 ต.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว(4)	
19	42	สสพ.	DM-13-07-07-01	ระหว่างซอยแบริ่ง 32 และ 34 ถนนสุขุมวิท 107	200	25 ก.ค. 66	รอกกราฟ 7 วัน	
20	43	สสพ.	DM-13-03-06-03	ซ.อ่อนนุช 65	200	6 ต.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว(7)	
21	44	สสพ.	DM-13-02-03-02	ถ.สุขุมวิท ข้างซอยสุขุมวิท 52	200	13 ธ.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว(5)	



## รายละเอียดจุดติดตั้งที่ดำเนินการแล้ว สัญญาเลขที่ ชล.32/2564

ลำดับที่	ลำดับที่ (TOR)	สาขา	DM	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดมาตรฐาน (มม.)	วันที่ ตัดบรรจบ	พร้อมส่งมอบงาน	หมายเหตุ
22	45	สสพ.	DM-13-07-02-01	ถ.สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 105 ข้างซอยลาซาล 55 ตรงข้ามร้านข้าวนี้	200	11 ต.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว (3)	
23	47	สสพ.	DM-13-02-01-02	ถ.สุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท 50 (เกษมสุวรรณ)(หน้าโลตัสสุขุมวิท)	200	22 ก.ย. 65	ส่งมอบไปแล้ว (3)	
24	48	สสพ.	DM-13-07-05-02	ถ.สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 107 ปากซอยแบร์ริง (หน้า 7-11	200	25 พ.ย. 65	ส่งมอบไปแล้ว (9)	
25	49	สสพ.	DM-13-04-04-02	ถ.บางนา-ตราด ก่อนถึงเซ็นทรัล บางนา (กม.2+900	200	29 พ.ย. 65	ส่งมอบไปแล้ว (4)	
26	50	สสพ.	DM-13-07-07-05	ถ.สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 113 ใน ปปช. สมุทรปราการ (ตรงข้ามซอยเทวา)	200	25 ก.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว (3)	
27	51	สสพ.	DM-13-07-06-03	ถ.ศรีนครินทร์ ซอยศรีด่าน 3 ตรงข้ามตึก DTAC	200	1 ธ.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว (7)	
28	52	สสพ.	DM-13-07-05-03	ถ.สุขุมวิท ใต้สะพานสำโรง	200	1 ธ.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว (7)	
29	53	สสพ.	DM-13-07-01-02	ถ.สุขุมวิท 105 ใกล้ซอยลาซาล 23 หน้า บริษัทคริสตินี่	200	27 ก.ย. 65	ส่งมอบไปแล้ว (3)	
30	54	สสพ.	DM-13-07-06-02	ถ.ศรีนครินทร์ ตรงข้าม ม.ลดาวัลย์ (หน้าปั๊มปีโตรนาส)	200	1 พ.ย. 65	ส่งมอบไปแล้ว (8)	



## รายละเอียดจุดติดตั้งที่ดำเนินการแล้ว สัญญาเลขที่ ชล.32/2564

ลำดับที่	ลำดับที่ (TOR)	สาขา	DM	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดมาตร (มม.)	วันที่ ตัดบรรจุ	พร้อมส่งมอบงาน	หมายเหตุ
31	56	สสป.	DM-17-03-06-01	ถ.สวนส้ม-การไฟฟ้า ข้างซอยบางโปรง 12	200	2 พ.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว (6)	
32	57	สสป.	DM-17-10-06-01	ถ.เทพารักษ์ ได้สะพานคลองบางเหี้ย (ใกล้ ซ. อบต.1)	200	25 พ.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว (7)	
33	58	สสป.	DM-17-07-01-01	ถ.แพรกษา ใกล้ซอยเทศบาลบางปู 22 (หน้า ร้านอิสราการไฟฟ้า)	200	11 ก.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว (8)	
34	60	สสป.	DM-17-09-01-01	ถ.เทพารักษ์ หน้าบริษัทไทยอริฟู้ดส์	200	11 พ.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว (6)	
35	61	สสป.	DM-17-09-02-02	ถ.เทพารักษ์ ตรงข้ามบริษัทไทยอริฟู้ดส์	200	23 พ.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว (7)	
36	62	สสป.	DM-17-07-09-02	ตรงข้ามเยื้องปากซอยแพรกษา 10/2 ถนนแพรกษา	200	11 ก.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว (8)	
37	63	สสป.	DM-17-08-02-01	ถ.เทพารักษ์ หน้าปั๊ม ปตท. (Big C บางพลี) ตรงข้าม ม.นิลบลิลล์	200	11 พ.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว (6)	
38	64	สสป.	DM-17-09-07-03	ถ.เมืองใหม่บางพลี ข้างบริษัท ENKEI	200	18 ก.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว (9)	



## รายละเอียดจุดติดตั้งที่ดำเนินการแล้ว สัญญาเลขที่ ชล.32/2564

ลำดับที่	ลำดับที่ (TOR)	สาขา	DM	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดมาตร (มม.)	วันที่ ตัดบรรจบ	พร้อมส่งมอบงาน	หมายเหตุ
39	67	สสป.	DM-17-10-07-02	คลองกันยา (มุ่งหน้าบางป่อ)	200	25 พ.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว (7)	
40	68	สสป.	DM-17-11-04-01	ถ.สุขุมวิท-ลาดห้วย ริมคลองนาเกลือ การเคหะบางพลี	200	18 ก.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว (9)	
41	78	สสท.	DM-05-03-02-03	ใกล้ซอยเจริญกรุง 79 ถนนเจริญกรุง (ตรงข้ามมูลนิธิสตรีไทยมุสลิม)	300	30 มิ.ย. 65	ส่งมอบไปแล้ว (3)	
42	80	สสท.	DM-05-01-09-02	หน้าบ้านเลขที่ 946/40 ถ.พระราม 4 (ใกล้โรงแรมดุสิต)	300	28 มิ.ย. 65	ส่งมอบไปแล้ว (1)	
43	81	สสท.	DM-05-02-02-01	เยื้องวัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง(ใกล้สามแยก)	200	8 พ.ย. 2565	ส่งมอบไปแล้ว (8)	
44	82	สสท.	DM-05-02-03-01	ปากซอยสาทร 11 (ข้างร้านอาหารภัทรา)	300	10 ก.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว (1)	
45	83	สสท.	DM-05-02-03-03	ปากซอยบำเพ็ญกุศล (ตรงข้าม 7-Eleven) ถ.จันทน์	200	12 พ.ย. 65	ส่งมอบไปแล้ว (6)	
46	84	สสท.	DM-05-02-04-02	ปากซอยสาทร 11	300	10 ก.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว (1)	
47	85	สสท.	DM-05-02-05-01	หน้าบ้านชินนิษฐา ซอยซอยสาทร 3	200	12 พ.ย. 65	ส่งมอบไปแล้ว (4)	

## รายละเอียดจุดติดตั้งที่ดำเนินการแล้ว สัญญาเลขที่ ชล.32/2564

ลำดับที่	ลำดับที่ (TOR)	สาขา	DM	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดมาตรฐาน (มม.)	วันที่ ติดบรจบ	พร้อมส่งมอบ งาน	หมายเหตุ
48	86	สสท.	DM-05-02-07-01	ปากซอยจันทน์ 16 ถ.จันทน์	200	25 ต.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว(3)	
49	90	สสท.	DM-05-04-01-01	ปากซอยจันทน์ 45 ถ.จันทน์	200	8 พ.ย. 65	ส่งมอบไปแล้ว(4)	
50	91	สสท.	DM-05-04-03-02	ปากซอยจันทน์ 27 ถ.จันทน์	200	25 ต.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว(3)	
51	92	สสท.	DM-05-04-04-01	ปากซอยสาธุประดิษฐ์ 16 ถ.สาธุประดิษฐ์	200	18 ต.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว(5)	
52	95	สสท.	DM-05-04-08-01	หน้าบริษัท เค.จี.เอส.สตีล จำกัด ถ.พระราม 3 ใกล้ ซอยพระราม 3 ซอย 23	200	29 ก.ย. 65	ส่งมอบไปแล้ว(3)	
53	97	สสท.	DM-05-04-09-01	ถ.พระราม 3 ใกล้ ซอยพระราม 3 ซอย 22	200	1 ต.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว(3)	
54	98	สสท.	DM-05-04-10-04	ถ.พระราม 3 หน้าบริษัท น้ำเฮงสตีล จำกัด	200	18 ต.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว(3)	
55	107	สสม.	DM-06-06-09-0	บริเวณหน้าปั้มเซลล์ ถ.บรรทัดทอง เชียงสะพานเจริญผล	200	13 ก.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว (10)	
56	108	สสม.	DM-06-04-01-02	ใต้สะพานเจริญผล ฝั่งใต้ ใกล้ตู้โทรศัพท์	300	1 ก.ย. 65	ส่งมอบไปแล้ว(3)	
57	111	สสม.	DM-06-04-05-04	ปากซอยจุฬา 4 ถ.บรรทัดทอง	200	30 ส.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว(4)	
58	112	สสม.	DM-06-02-07-01	ริม ถ.เยาวราช (ฝั่งซ้าย) ใกล้แยกเฉลิมบุรี หน้า ทบ.544	200	26 ธ.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว(4)	



## รายละเอียดจุดติดตั้งที่ดำเนินการแล้ว สัญญาเลขที่ ชล.32/2564

ลำดับที่	ลำดับที่ (TOR)	สาขา	DM	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดมาตรฐาน (มม.)	วันที่ตัดบรรจบ	พร้อมส่งมอบงาน	หมายเหตุ
59	113	สสม.	DM-06-02-06-01	ริมถนนเยาวราช (ฝั่งซ้าย) ใกล้แยกราชวงศ์	200	30 ม.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว(6)	
60	114	สสม.	DM-06-02-06-02	ริม ถ.ทรงวาด หน้า ทบ.1093	200	20 ธ.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว(8)	
61	115	สสม.	DM-06-02-07-02	ริมถนนมิตรภาพไทย-จีน (ตรงข้ามวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร)	200	5 ก.ย. 66	ส่งมอบไปแล้ว (10)	
62	117	สสม.	DM-06-03-04-02	บริเวณริมถนนดำรงรักษ์ เชียงสะพานข้ามคลองมหานาค หน้าร้านขายไม้	300	31 พ.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว(1)	
63	118	สสม.	DM-06-04-03-01	หน้าโรงแรมอินมา ถ.ราชดำริ	200	8 ก.ย. 65	ส่งมอบไปแล้ว(3)	
64	119	สสม.	DM-06-03-06-02	ซอยหม่อมเชื้อม ริม ถ.บำรุงเมือง ข้างร้าน Starbucks สาขา SOHO	300	23 ก.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว(9)	
65	122	สสม.	DM-06-04-01-03	ใต้สะพานหัวช้าง ฝั่งบริษัท สยามนิสสัน จำกัด	200	18 ส.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว(2)	
66	124	สสม.	DM-06-04-04-02	บริเวณตรอกราชบุรุษอุทิศ ถ.พระราม 4	300	16 ส.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว(2)	
67	125	สสม.	DM-06-04-04-04	ตรงข้ามซอยจุฬาลงกรณ์ 4 ถ.บรรทัดทอง	300	2 ส.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว(2)	
68	130	สสม.	DM-06-04-06-03	ริมถนนราชดำริ หน้าสวนลุมพินี	300	23 ส.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว(6)	

## รายละเอียดจุดติดตั้งที่ดำเนินการแล้ว สัญญาเลขที่ ชล.32/2564

ลำดับที่	ลำดับที่ (TOR)	สาขา	DM	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดมาตร (มม.)	วันที่ ติดบรจบ	พร้อมส่งมอบ งาน	หมายเหตุ
69	131	สสม.	DM-06-05-01-01	ตรงข้ามบริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด ถ.สามเสน	300	23 มี.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว(6)	
70	132	สสม.	DM-06-06-08-03	ถ.บรรทัดทอง บริเวณใต้สะพานเจริญผล (ฝั่งมัสยิด)	200	14 ก.ย. 66	ส่งมอบไปแล้ว(10)	
71	134	สสม.	DM-06-05-08-01	หน้าท่าवासกรี ถ.สามเสน (ข้างคลองวัดราชาธิวาส)	300	16 มี.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว(6)	
72	137	สสม.	DM-06-06-04-01	บริเวณริม ถ.ราชปรารภ ตรงข้ามปั๊มเอสโซ่	300	13 ก.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว(8)	
73	138	สสม.	DM-06-06-05-03	แยกอุรุพงษ์ ฝั่งตรงข้ามธนาคารไทยธนาคาร (เพิ่มเติม)	300	20 ก.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว(9)	
74	141	สสม.	DM-06-04-05-03	แยกสะพานอ่อน ถ.บรรทัดทอง	200	20 ก.ย. 65	ส่งมอบไปแล้ว(3)	
75	144	สสม.	DM-06-06-12-01	หน้าโรงเรียนดอนบอสโก ถ.เพชรบุรี	300	27 ก.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว(9)	
76	152	สสล.	DM-12-04-01-01	ถ.ลาดพร้าว ปาก ซ.ลาดพร้าว 50	200	27 เม.ย. 66	ส่งมอบไปแล้ว(6)	
77	157	สสล.	DM-12-03-01-02	ปั๊ม ปตท. ใกล้ซอยลาดพร้าว 61	200	7 ก.พ. 66	ส่งมอบไปแล้ว(5)	
78	159	สสล.	DM-12-03-04-02	ถ.ลาดพร้าว ระหว่าง ซ.ลาดพร้าว 87-89	200	9 พ.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว(6)	



## รายละเอียดจุดติดตั้งที่ดำเนินการแล้ว สัญญาเลขที่ ชล.32/2564

ลำดับที่	ลำดับที่ (TOR)	สาขา	DM	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดมาตร (มม.)	วันที่ ตัดบรรจบ	พร้อมส่งมอบงาน	หมายเหตุ
79	160	สสล.	DM-12-03-05-01	ถ.ลาดพร้าว เยื้อง ธ.กรุงเทพ (ลาดพร้าว 99)	200	20 มี.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว (6)	
80	161	สสล.	DM-12-03-06-01	หน้า ร.ร.วัดบึงทองหลาง (ลาดพร้าว 101)	200	16 ธ.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว (4)	
81	162	สสล.	DM-12-03-08-01	ช.โพธิ์แก้ว ไกล่ ม.พิบูลย์	200	16 ธ.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว (4)	
82	163	สสล.	DM-12-03-08-02	ถ.ลาดพร้าว ซอย 101 ตรงข้าม ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง	200	16 ธ.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว (4)	
83	164	สสล.	DM-12-03-09-02	ถ.ลาดพร้าว ซอย 107	200	8 ก.พ. 66	ส่งมอบไปแล้ว (5)	
84	166	สสล.	DM-12-04-01-02	ถ.ลาดพร้าว ซอย 62 หน้า ร.ร.ถนนมพิศ	200	13 มี.ค. 66	ส่งมอบไปแล้ว (6)	
85	168	สสล.	DM-12-07-09-01	ถ.คูบอน ช.คูบอน 27 (ตรงข้าม ช.สยายธรรม)	200	9 ธ.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว (4)	
86	169	สสล.	DM-12-04-05-01	ถ.ลาดพร้าว ช.ลาดพร้าว 90 หน้า บ.แมงป่องจำกั๊ด	200	9 พ.ย. 66	ส่งมอบไปแล้ว (6)	
87	170	สสล.	DM-12-04-06-01	ถ.ลาดพร้าว ปาก ช.ลาดพร้าว 112	200	15 พ.ย. 65	ส่งมอบไปแล้ว (4)	

## รายละเอียดจุดติดตั้งที่ดำเนินการแล้ว สัญญาเลขที่ ชล.32/2564

ลำดับที่	ลำดับที่ (TOR)	สาขา	DM	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดมาตร (มม.)	วันที่ ตัดบรรจบ	พร้อมส่งมอบงาน	หมายเหตุ
88	171	สสส.	DM-12-04-07-01	ถ.ลาดพร้าว ซอย 124	200	15 พ.ย. 65	ส่งมอบไปแล้ว (4)	
89	172	สสส.	DM-12-04-08-01	ถ.ลาดพร้าว ซอย 128/4	200	7 เม.ย. 66	ส่งมอบไปแล้ว (6)	
30	175	สสส.	DM-12-05-02-01	ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม ตรงข้าม ถ.สุคนธ์สวัสดิ์ ม.มาสเตอร์พีช	200	9 ธ.ค. 65	ส่งมอบไปแล้ว (4)	



**สรุปรายละเอียดจุดงานปรับปรุงมาตรา (DM) สัญญาเลขที่ ผจส.ชล.1/2566**

ลำดับที่	สาขา	จุดติดตั้งตาม TOR	ติดตั้งมาตราฯ แล้วเสร็จ	รอติดตั้งมาตราฯ	ตู้ Online สมบูรณ์
		ขนาด 200 มม.			
1	สสส.	1	-	1	-
2	สสพ.	5	4	1	4
3	สสป.	4	-	4	-
4	สสท.	2	-	2	-
5	สสญ.	1	1	-	1
6	สสม.	3	1	2	1
7	สสล.	4	2	2	2
8	สสช.	2	2	-	2
9	สสสภ.	5	-	5	-
10	สสภ.	3	-	3	-
11	สสว.	5	-	5	-
รวม		35	10	25	10

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2566



## รายละเอียดจุดติดตั้งที่ดำเนินการแล้ว สัญญาเลขที่ ฝอส.ชล.1/2566

ลำดับที่	หมายเลข DM	สถานที่	รูปแบบติดตั้ง Type	ขนาดศก.มาตรา (มม.)	วันที่ตัดบรจบ
1	DM-13-02-08-01	ถ.รถไฟสายเก่า ปากซอยสเตท	D-1	200	7 ก.ย. 66
2	DM-13-03-06-02	ช.สุขุมวิท77(อ่อนนุช) หน้าปั้ม ESSO	D-1	200	5 ก.ย. 66
3	DM-13-05-08-01	ถ.บางนา-ตราด ปากซอยราม 2 (หน้าดีแคทลอนส์ไตร์บางนา)	D-1	200	5 ก.ย. 66
4	DM-13-04-01-04	ปากซอยบางนา-ตราด 14 โรงแรม AVANA ถนนบางนา-ตราด	D-1	200	31 ส.ค. 66
5	DM-03-06-07-02	ถ.พระราม 9 แยกถนนเพชรพระราม	D-1	200	7 ก.ย. 66
6	DM-06-06-10-01	แยกมิตรสัมพันธ์ ถ.เพชรบุรี ตู้ขวา(ทดแทน DM6551)	D-1	200	19 ก.ย. 66
7	DM-12-03-04-01	ถ.ลาดพร้าว ระหว่าง ช.ลาดพร้าว 85-87	D-1	200	12 ก.ย. 66
8	DM-12-04-09-01	ถ.ลาดพร้าว ปาก ช.ลาดพร้าว 138	D-1	200	12 ก.ย. 66
9	DM-15-08-06-03	ซอยสรณคมณ์ ก่อนถึงสะพานข้ามคลองระบายน้ำ	D-1	200	14 ก.ย. 66
10	DM-15-04-02-02	ถ.เทศบาลรังสรรค์เหนือ	D-1	200	14 ก.ย. 66

สรุปรายละเอียดจุดงานปรับปรุงมาตรา (DM) พื้นที่บริการภาค 3, 4 และ 5 สัญญาเลขที่ ชล.31/2564

ที่	สาขา	จุดในสัญญา			ติดตั้งแล้ว			งาน PBC				แนวทางแผนงาน /คาดการณ์แล้วเสร็จ
		300 มม.	200 มม.	รวม	300 มม.	200 มม.	รวม	อยู่ใน PBC	ติดตั้งมาตร	รอตติมาตร	ค่า F Online ได้ ใน WLMA	
1	สสช.	1	-	1	1	-	1	มาตรา DM ส่วนใหญ่ มีรับประกันฯ ชล.32-2/2563 (UHM)				
2	สสช.	2	2	4	2	2	4	ไม่มี PBC				
3	สสทบ.	2	5	7	2	5	7	ไม่มี PBC				
4	สสสภ.	8	17	25	8	17	25	9	9	-	9	(ติดตั้งมาตรPBCแล้วเสร็จ)
5	สสพ.	12	15	27	12	15	27	8	8	-	8	(ติดตั้งมาตรPBCแล้วเสร็จ)
6	สสต.	10	22	32	10	22	32	7	7	-	7	(ติดตั้งมาตรPBCแล้วเสร็จ)
7	สสภ.	8	7	15	8	7	15	1	1	-	=	(ติดตั้งมาตรPBCแล้วเสร็จ)
8	สสว.	8	4	12	8	4	12	4	4	-	4	(ติดตั้งมาตรPBCแล้วเสร็จ)
9	สสน.	5	11	16	5	11	16	ไม่มี PBC				
10	สสบท.	6	10	16	6	10	16	ไม่มี PBC				
11	สสมส.	4	11	15	4	11	15	8	8	-	8	(ติดตั้งมาตรPBCแล้วเสร็จ)
รวม		66	104	170	66	104	170	37	37	-	36	ส่งมอบงานที่ 6 (งวดสุดท้าย) แล้ว เมื่อวันที่19 กันยายน 2566
		170			170							

## สรุปรายละเอียดจุดงานปรับปรุงมาตรา (DM) สัญญาซื้อขายเลขที่ ชล.52/2565

ลำดับที่	สาขา	จำนวนจุดติดตั้ง (TOR)		จุดที่ปรับจำนวน		ดำเนินการติดตั้งมาตราแล้ว		ค่า F Online ได้ ใน WLMA
		ศก. 200 มม.	ศก. 300 มม.	ศก. 200 มม.	ศก. 300 มม.	ศก. 200มม.	ศก. 300 มม.	
1	สสส.	7	9	7	9	5	3	7
2	สสพ.	9	4	9	4	9 <small>ครบตามสัญญา</small>	4	10
3	สสป.	7	7	7	7	7 <small>ครบตามสัญญา</small>	7	13
4	สสท.	1	5	1	5	1 <small>ครบตามสัญญา</small>	5	6
5	สสม.	3	-	3	-	-	-	-
6	สสญ.	-	1	-	1	-	-	-
7	สสล.	6	5	6	5	-	-	-
8	สสช.	1	2	1	2	1 <small>ครบตามสัญญา</small>	2	2
9	สสข.	4	-	4	-	-	-	-
10	สสมบ.	8	2	8	2	2	1	3
11	สสสภ.	2	3	3	3	-	-	-
12	สสบ.	5	3	5	3	3	3	6
13	สสด.	14	4	14	4	12	2	14
14	สสภ.	2	7	2	7	-	3	3
15	สสว.	3	8	3	8	-	6	6
16	สสน.	9	3	9	3	6	1	7
17	สสบท.	2	6	1	6	1 <small>ครบตามสัญญา</small>	6	6
18	สสมส.	2	4	2	4	2	1	2
รวม		85	73	85	73	49	44	85
		158		158		93		

ข้อมูลวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566

ปรับปรุงมาตรวัดน้ำในระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย (DMA)

เป้าหมาย

ปรับปรุงมาตรวัดน้ำในระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย (DMA) สนับสนุนกิจกรรมการจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาสาขา

รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2566												2567											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
งานปรับปรุงมาตรฯ สัญญา ซล.24/2566	135 จุด	42.8 ล้านบาท						E	F																	
			คกก.ฯ กรมบัญชีกลาง					E	F																	
			พิจารณาผลยุทธวิธี																							

ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.66 และเริ่มงานสัญญา เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 66 (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 เม.ย. 66) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ วันที่ 8 ส.ค. 66

หมายเหตุ

A อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคาากลาง)/ตรวจ SMEs

B ยื่นเอกสารประกวดราคา

C ตรวจเอกสาร

D ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)

E ลงนามสัญญา

F ดำเนินงานตามสัญญา

แผนการดำเนินงาน

เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน

ล่าช้ากว่าแผน

ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (สวม.กท.ฝจส.) ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2566

ติดตั้ง DMA ใหม่

เป้าหมาย

ติดตั้ง DMA ใหม่ (จุดวัดอัตราการไหลและแรงดันน้ำ) สนับสนุนกิจกรรมการจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาสาขา

รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2563			2564										2565										2566											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	ก.ค.	
งานซื้องานติดตั้งเครื่องวัด DMA ใหม่ ปีงบฯ 2564	27 จุด	20 ล้านบาท																																			

ลงนามสัญญาวันที่ 19 มี.ค.64 / กจช.ฝจพ. มีการแก้ไขขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา รายละเอียดวันแจ้งเริ่มงาน สิ้นสุด วันที่ 21 มิ.ย.64 /ประชุม precon วันที่ 19 ต.ค.64 เริ่มงานแล้ววันที่ 8 พ.ย. 2564 สิ้นสุด 3 มี.ค.66 ระยะเวลาดำเนินงาน 480 วัน

ดำเนินการจำนวน 27 จุด ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 4 จุด วันที่ 8 ธ.ค. 2565

คณะกรรมการฯ มีมติตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โควิด 2019 ค่าปรับร้อยละ 0 ให้ระยะเวลาอีก 119 วัน (กำหนดสิ้นสุดสัญญาใหม่ 30 มิ.ย.66) ส่งมอบงานงวดที่ 2 (15 มิ.ย.66)

ส่งมอบงานครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย วันที่ 12 ก.ค.2566) อยู่ระหว่างตรวจสอบความเรียบร้อยและขั้นตอนการเบิกจ่ายค่างาน (งานแล้วเสร็จ) ขั้นตอนการลงนามรายงานผลการตรวจรับฯ ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) และการออกหนังสือ (C.O.C) ให้ผู้ขาย



- A อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคากลาง)/ตรวจ SMEs
- B ยื่นเอกสารประกวดราคา
- C ตรวจเอกสาร

- D ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)
- E ลงนามสัญญา
- F ดำเนินงานตามสัญญา

- แผนการดำเนินงาน
- เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน
- ล่าช้ากว่าแผน

ติดตั้ง DMA ใหม่

เป้าหมาย

ติดตั้ง DMA ใหม่ (จุดวัดอัตราการไหลและแรงดันน้ำ) สนับสนุนกิจกรรมการจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาสาขา

รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2565												2566											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
งานปรับปรุงประสิทธิภาพ (ติดตั้ง ใหม่) เลขที่ ชล.58/2565 (กลุ่มที่ 1 พื้นที่บริการ 1,2 และกลุ่มที่ 2 พื้นที่บริการ 3,4 และ 5)	กลุ่มที่ 1 43 จุด	43 ลบ.																								
	กลุ่มที่ 2 47 จุด	47 ลบ.																								

TOR แล้วเสร็จวันที่ 19 ธ.ค.65 ,ราคากลางแล้วเสร็จ วันที่ 7 ก.พ.66  
/ฝจพ. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 11 พ.ค.66 ทดสอบการเชื่อมโยงระบบ และการ  
ตรวจสอบคุณสมบัติอุปกรณ์ฯ พิจารณาผลฯ ต่อรอราคา การอุทธรณ์ผลฯ แล้วเสร็จ  
ได้ผู้ชนะฯ และคาดว่าจะลงนามสัญญาวันที่ 15 สิงหาคม 2566  
เริ่มงานวันที่ 20 กันยายน 2566-สิ้นสุดวันที่ 13 กันยายน 2567 ระยะเวลาดำเนินงาน 360 วัน  
ประชุมเริ่มงานวันที่ 21 กันยายน 2566

หมายเหตุ

- A อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคากลาง)/ตรวจ SMEs  
B ยื่นเอกสารประกวดราคา  
C ตรวจเอกสาร

- D ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)  
E ลงนามสัญญา  
F ดำเนินงานตามสัญญา

- แผนการดำเนินงาน  
เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน  
ล่าช้ากว่าแผน


สรุปสถานะการขออนุญาต งานปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย (ติดตั้งใหม่) เลขที่ ชล.58/2565

กลุ่ม	ทั้งสิ้น(จุด)	สถานะการขออนุญาต (จุด)				คงเหลือ (จุด)
		จัดทำเอกสารยื่นขอ อนุญาต	นัดตรวจพื้นที่	ได้รับ อนุญาต	รวม	
ชล.58-1/2565 (พื้นที่บริการ 1,2)	43	4	2	9	15	28
ชล.58-2/2565 (พื้นที่บริการ 3,4 และ 5)	47	23	3	12	38	9
<b>รวม</b>	<b>90</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>53</b>	<b>37</b>

รายการที่	รายการ	การจ่ายค่างาน
1	กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่บริการ 1,2	งวดที่ 1 ร้อยละสี่สิบ (40%) คิดเป็นจำนวน 17 จุด
		งวดที่ 2 ร้อยละสี่สิบ (40%) คิดเป็นจำนวน 17 จุด
		งวดที่ 3 ร้อยละยี่สิบ (20%) คิดเป็นจำนวน 9 จุด
2	กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่บริการ 3,4 และ 5	งวดที่ 1 ร้อยละสี่สิบ (40%) คิดเป็นจำนวน 18 จุด
		งวดที่ 2 ร้อยละสี่สิบ (40%) คิดเป็นจำนวน 18 จุด
		งวดที่ 3 ร้อยละยี่สิบ (20%) คิดเป็นจำนวน 11 จุด

# จุดสำรวจ เลขที่ ชล.58/2565

## ตำแหน่งขอตู้เพิ่ม

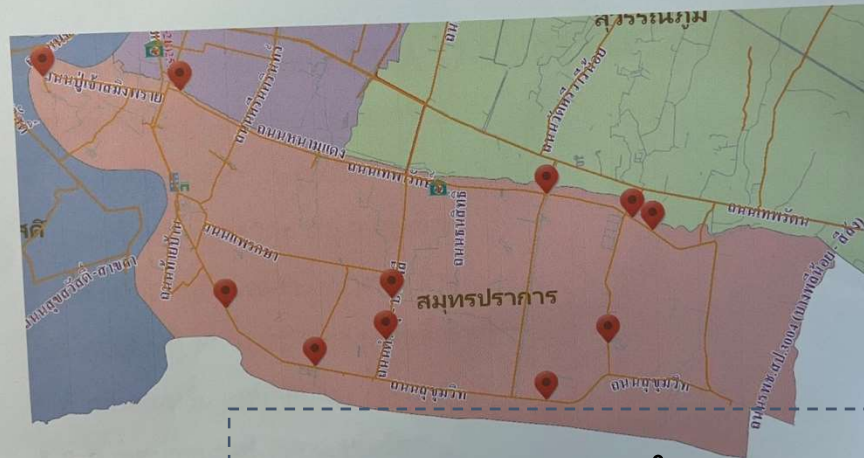

สาขาสมุทรปราการ จำนวน 11 จุด

## ตำแหน่งขอตู้เพิ่ม

- 1.ได้ทางด่วนเจ้าสรวงพราญ DMA 17-03-01 ตรงข้ามตู้ 17-03-01-02
- 2. ตรงข้ามตู้ 17-06-02-01 ถ.เทพารักษ์
- 3. ข.วิทยการบอน ถนนสุขุมวิท
- 4. ตรงข้ามตากอาอาศบางปู ถ.สุขุมวิท
- 5. ตรงข้ามหมู่บ้านรังสิตา ถ.บางพลี-ตำหรุ
- 6. ตรงข้ามตู้ 17-11-02-05 ถ.บางพลี-ตำหรุ
- 7. สุทินแมนชั่น ถนนคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ
- 8. ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ.สุขุมวิท

## ตำแหน่งขอตู้เพิ่ม

- 9. คลองหัวเกลือ ถ.เทพารักษ์
- 10. คลองบ้นหย้า ถ.เทพารักษ์
- 11. คลองลาดสี ถ.ลาดหญ้า



งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 1, 2 3 และ 4 5

เป้าหมาย

บริหารข้อมูลฯ

รายการ	ปริมาณงาน (ตัว)	งบประมาณ	2565			2566															
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				
งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 1																					
			F																		
			F																		
งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 2,3 (ฝจส.จท.19/2566)	702					A	B	C	D	E	F										
						A	B	C	D	E	F										
งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 4,5 (ฝจส.จท.20/2566)						A	B	C	D	E	F										
						A	B	C	D	E	F										

สัญญาบริหารข้อมูล พื้นที่บริการ 2,3,4,5 ดำเนินการโดยบริษัทฯ เซนส์ อินโฟเทค จำกัด  
ระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 66 ถึง 2 เม.ย. 69)

สัญญา ฝจส.จท.19/2566 ส่งมอบงานที่ 1 (วันที่ 27/ก.ค.66) เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้วเสร็จ

สัญญา ฝจส.จท.20/2566 ส่งมอบงานที่ 1 (วันที่ 25/ก.ค.66) เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้วเสร็จ



หมายเหตุ

A อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคาากลาง)/ตรวจ SMEs

B ยื่นเอกสารประกวดราคา

C ตรวจเอกสาร

D ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)

E ลงนามสัญญา

F ดำเนินงานตามสัญญา

แผนการดำเนินงาน

เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน

ล่าช้ากว่าแผน

# สัญญาจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย (PBC) จำนวน 13 สัญญา

สาขา	สัญญาเลขที่	บริษัท/ห้าง/ร้าน	วันเริ่มงาน	สถานะปัจจุบัน	Base Line	อัตราน้ำสูญเสีย ณ ส.ค. 66	จุดวัดผล (ปัจจุบัน)	ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยที่ ลดได้ ของปีงบประมาณ 2566
ภาษีเจริญ	จบส.1/2562	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	1-ต.ค.-64	ดำเนินการตามสัญญา	48.49	39.53	35.89	857,641.86
มหาสวัสดิ์	จบส.2/2565	บริษัท โยโกกาว่า (ประเทศไทย) จำกัด	6-พ.ค.-65	ดำเนินการตามสัญญา	50.34	41.39	47.25	768,150.05
สุขสวัสดิ์	จบส.3/2565	บริษัท แอล บี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	9-พ.ค.-65	ดำเนินการตามสัญญา	55.56	40.84	51.95	641,474.45
ตากสิน	จบส.1/2563	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	1-ม.ค.-65	ดำเนินการตามสัญญา	60.71	52.53	55.47	621,290.84
พระโขนง	จบส.1/2565	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	7-มิ.ย.-65	ดำเนินการตามสัญญา	43.62	36.82	41.44	446,073.05
สุขุมวิท	จบส.4/2565	กิจการร่วมค้า แมค วอเตอร์	1-ส.ค.-65	ดำเนินการตามสัญญา	39.48	32.18	38.54	301,291.23
สุวรรณภูมิ	จบส.9/2565	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	25-ก.ค.-65	ดำเนินการตามสัญญา	30.86	22.62	30.25	268,201.54
ประชาชื่น	จบส.8/2565	บริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	6-พ.ค.-65	ดำเนินการตามสัญญา	42.51	31.89	39.30	246,859.07
สมุทรปราการ	จบส.2/2562	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	11-ต.ค.-64	ดำเนินการตามสัญญา	43.33	32.36	32.83	230,104.43
บางกอกน้อย	จบส.8/2563	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	1-ธ.ค.-64	ดำเนินการตามสัญญา	54.21	43.04	48.24	229,329.73
ทุ่งมหาเมฆ	จบส.5/2565	กิจการร่วมค้า แมค วอเตอร์	6-พ.ค.-65	ดำเนินการตามสัญญา	46.49	37.91	43.67	168,763.88
แมนศรี	จบส.7/2565	กิจการร่วมค้า แมค วอเตอร์	6-พ.ค.-65	ดำเนินการตามสัญญา	51.64	44.71	47.68	123,133.07
พญาไท	จบส.6/2565	บริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	6-พ.ค.-65	ดำเนินการตามสัญญา	37.32	33.79	34.47	-5,615.91


หมายเหตุ : 1. อ้างอิงข้อมูลน้ำสูญเสียเริ่มต้น ปี 63

2. ข้อมูลสถานะอ้างอิงจากหน่วยงานฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฝจส.) ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2566

ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยปี 66 ที่ลดได้ : 857,641.86 ลบ.ม./เดือน

## ผลการดำเนินงานสัญญาในปัจจุบัน

### ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.1/2562 พื้นที่สาขาภาษีเจริญ

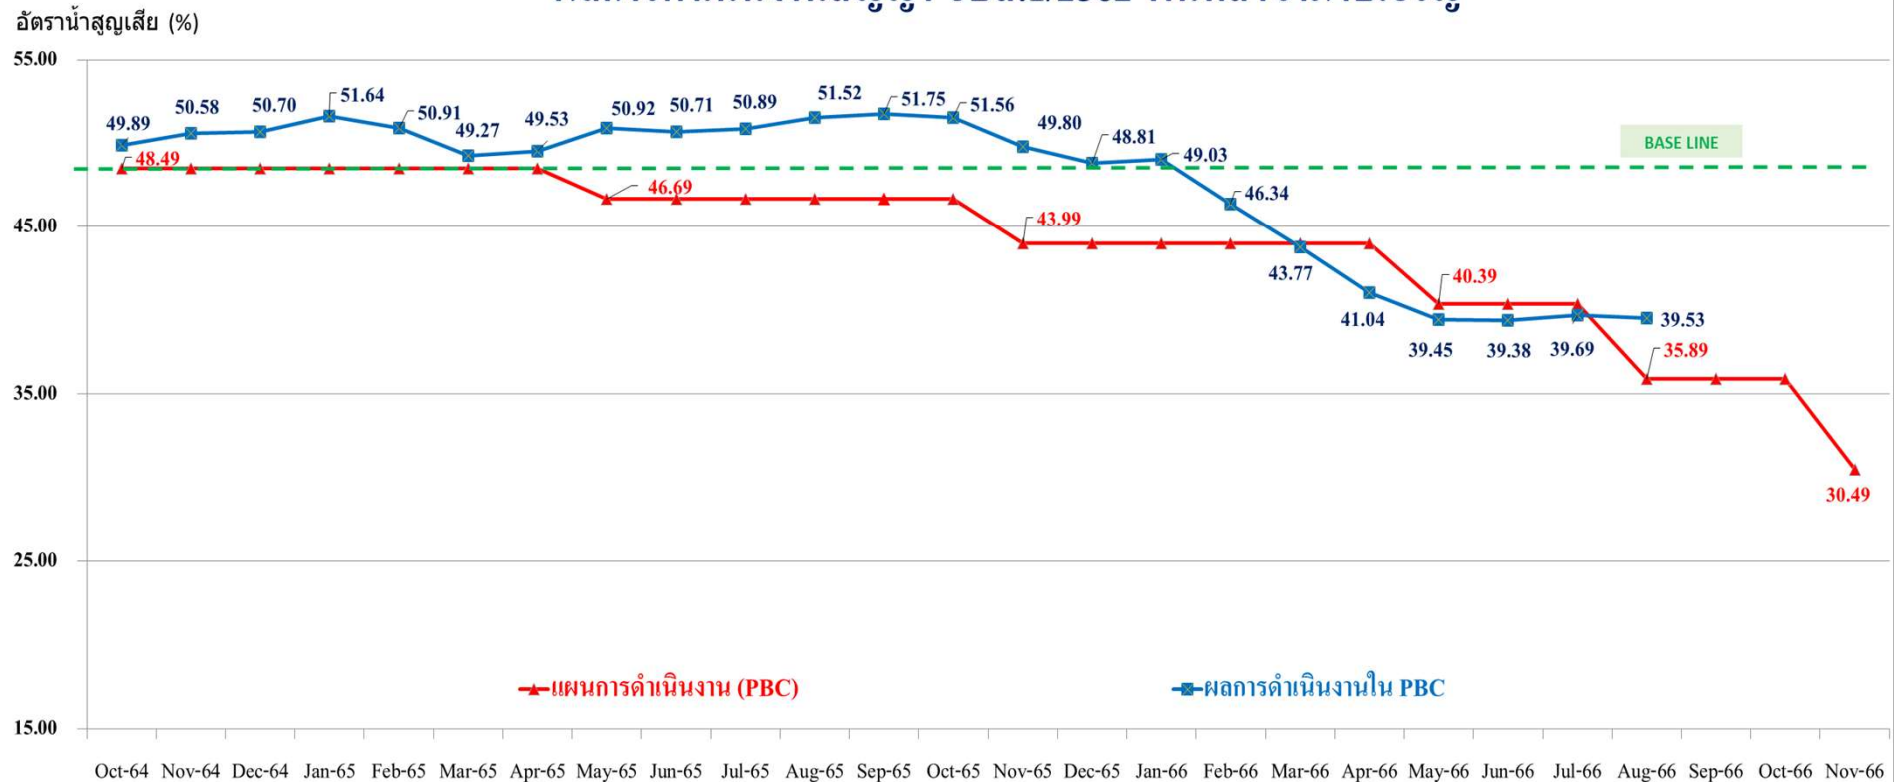

สาขา	สสภ.
สัญญาเลขที่	จบส.1/2562
วันที่เริ่มงาน	1-ต.ค.-64
Base Line (%)	48.49


ผู้รับจ้าง : บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

แรงดันน้ำ Base Line (เมตร)	แรงดันน้ำ ส.ค.66 (เมตร)	ผลซ่อมท่อใต้ดิน (ALC) (เฉลี่ย/เดือน)	
3.75	4.53	ท่อจ่ายน้ำ	ท่อบริการ
		12.52	637.61

ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยปี 66 ที่ลดได้ : 230,104.43 ลบ.ม./เดือน

## ผลการดำเนินงานสัญญาในปัจจุบัน

### ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.2/2562 พื้นที่สาขาสมุทรปราการ

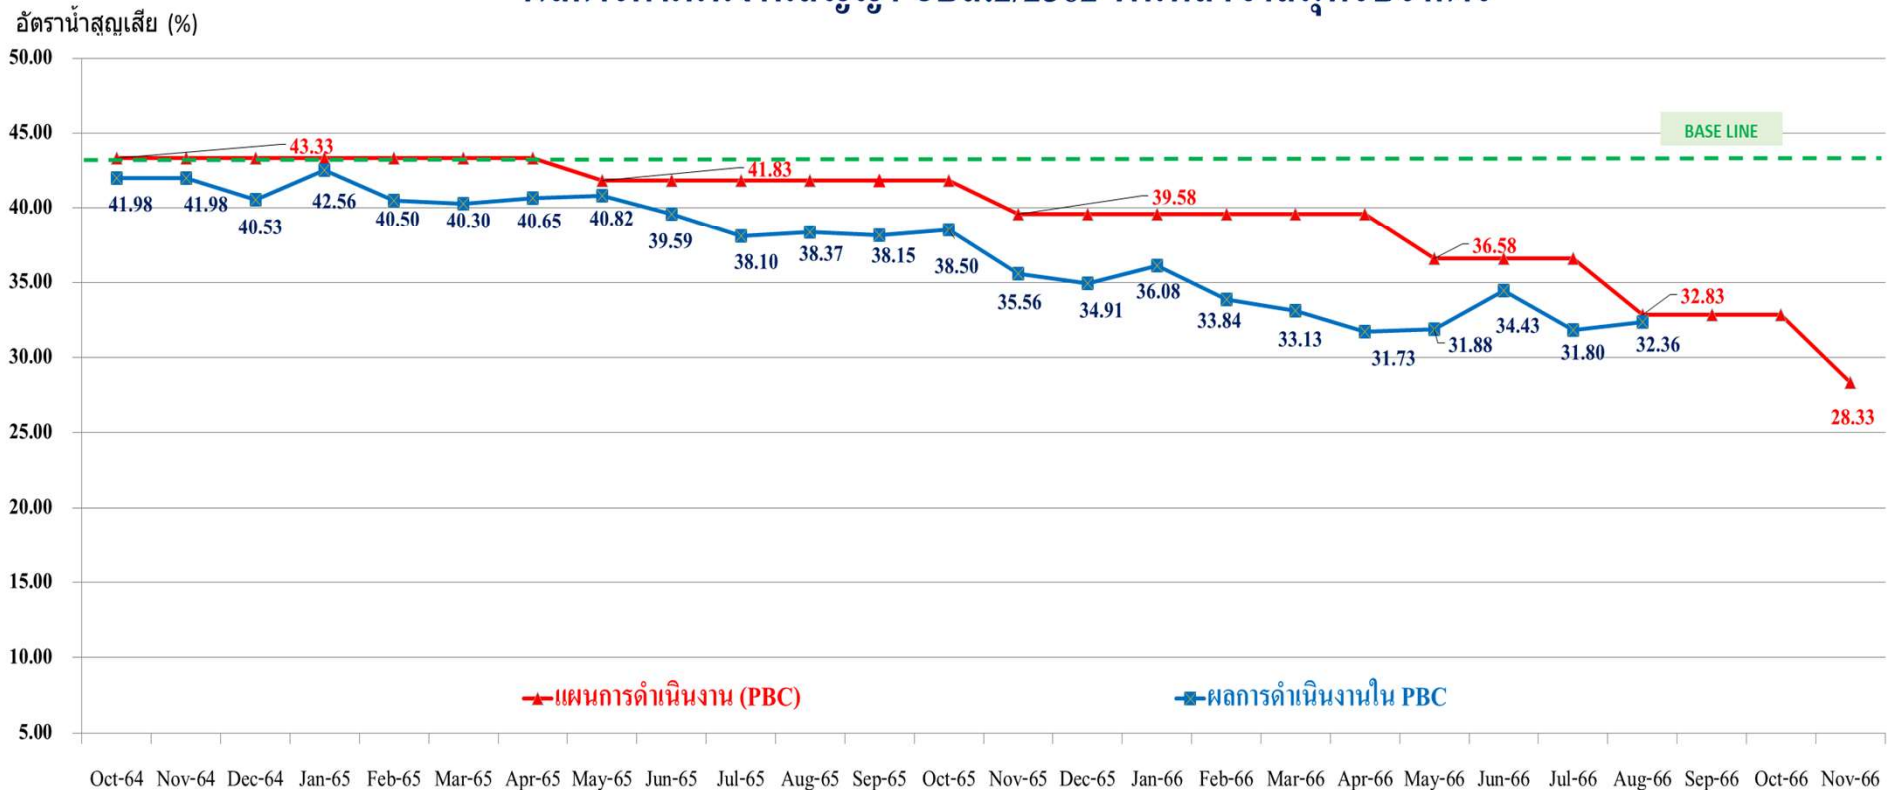


สาขา	สสป.
สัญญาเลขที่	จบส.2/2562
วันที่เริ่มงาน	11-ต.ค.-64
Base Line (%)	43.33

ผู้รับจ้าง : บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด			
แรงดันน้ำ Base Line (เมตร)		ผลซ่อมท่อใต้ดิน (ALC) (เฉลี่ย/เดือน)	
แรงดันน้ำ ส.ค.66 (เมตร)		ท่อจ่ายน้ำ	ท่อบริการ
3.64		3.87	103.96
4.12			

ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยปี 66 ที่ลดได้ : 229,329.73 ลบ.ม./เดือน

## ผลการดำเนินงานสัญญาในปัจจุบัน

### ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.8/2563 พื้นที่สาขาบางกอกน้อย

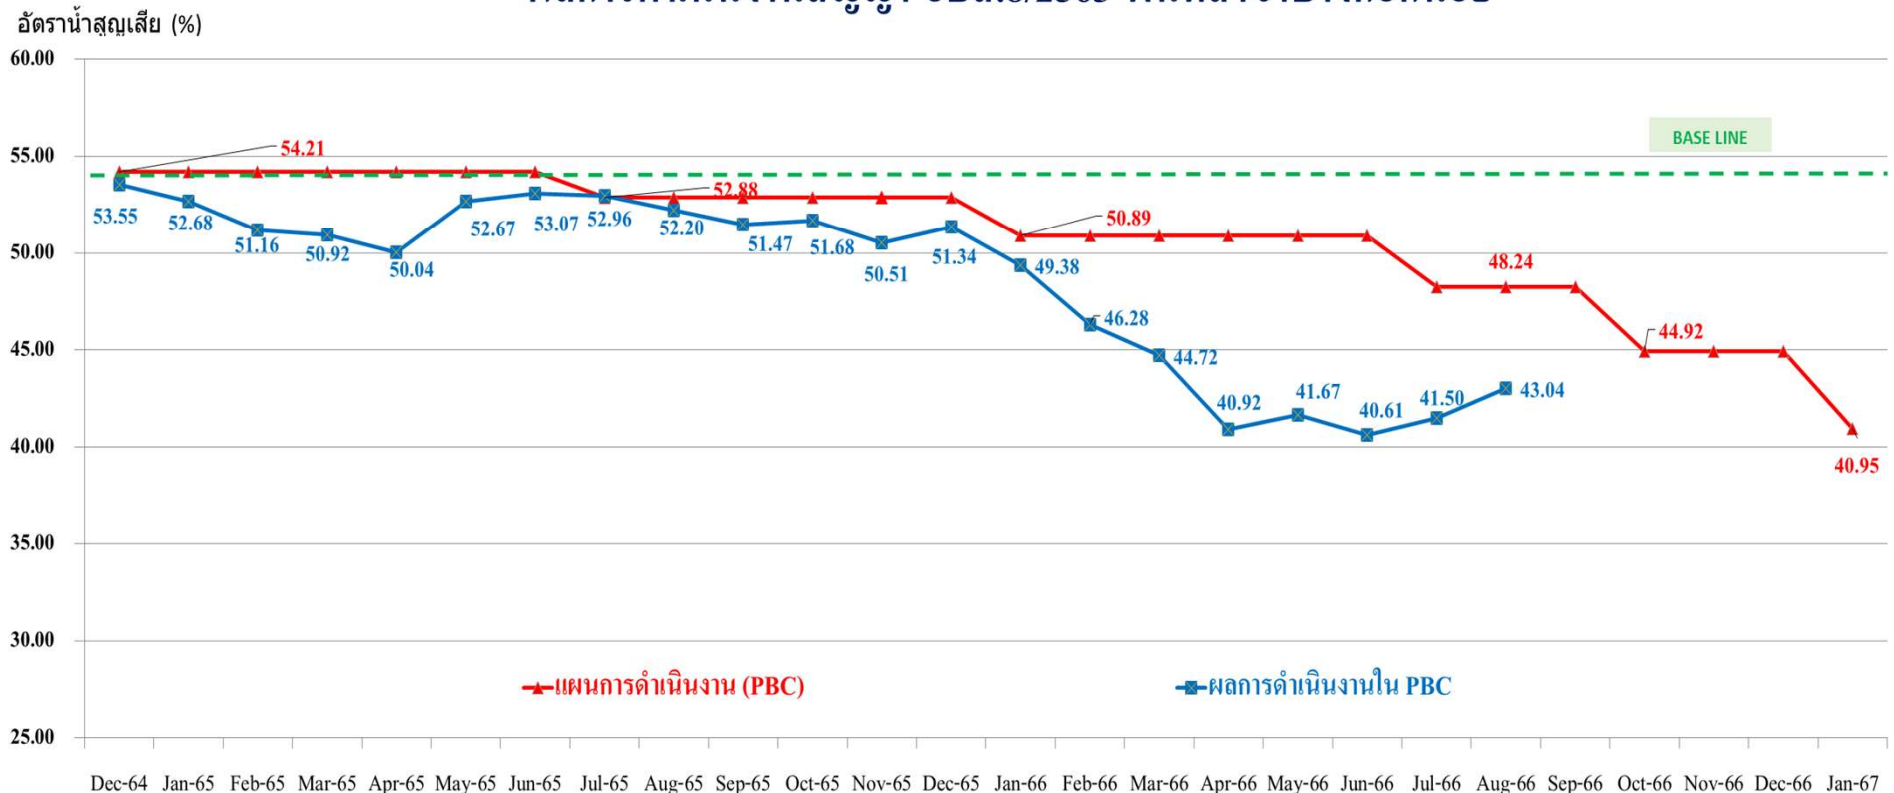

สาขา	สสบ.
สัญญาเลขที่	จบส.8/2563
วันที่เริ่มงาน	1-ธ.ค.-64
Base Line (%)	54.21


ผู้รับจ้าง : บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

แรงดันน้ำ Base Line (เมตร)	แรงดันน้ำ ส.ค.66 (เมตร)	ผลซ่อมท่อใต้ดิน (ALC) (เฉลี่ย/เดือน)	
4.47	4.47	ท่อจ่ายน้ำ	ท่อบริการ
		4.48	299.95

ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยปี 66 ที่ลดได้ : 621,290.84 ลบ.ม./เดือน

## ผลการดำเนินงานสัญญาในปัจจุบัน

### ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.1/2563 พื้นที่สาขาตากสิน

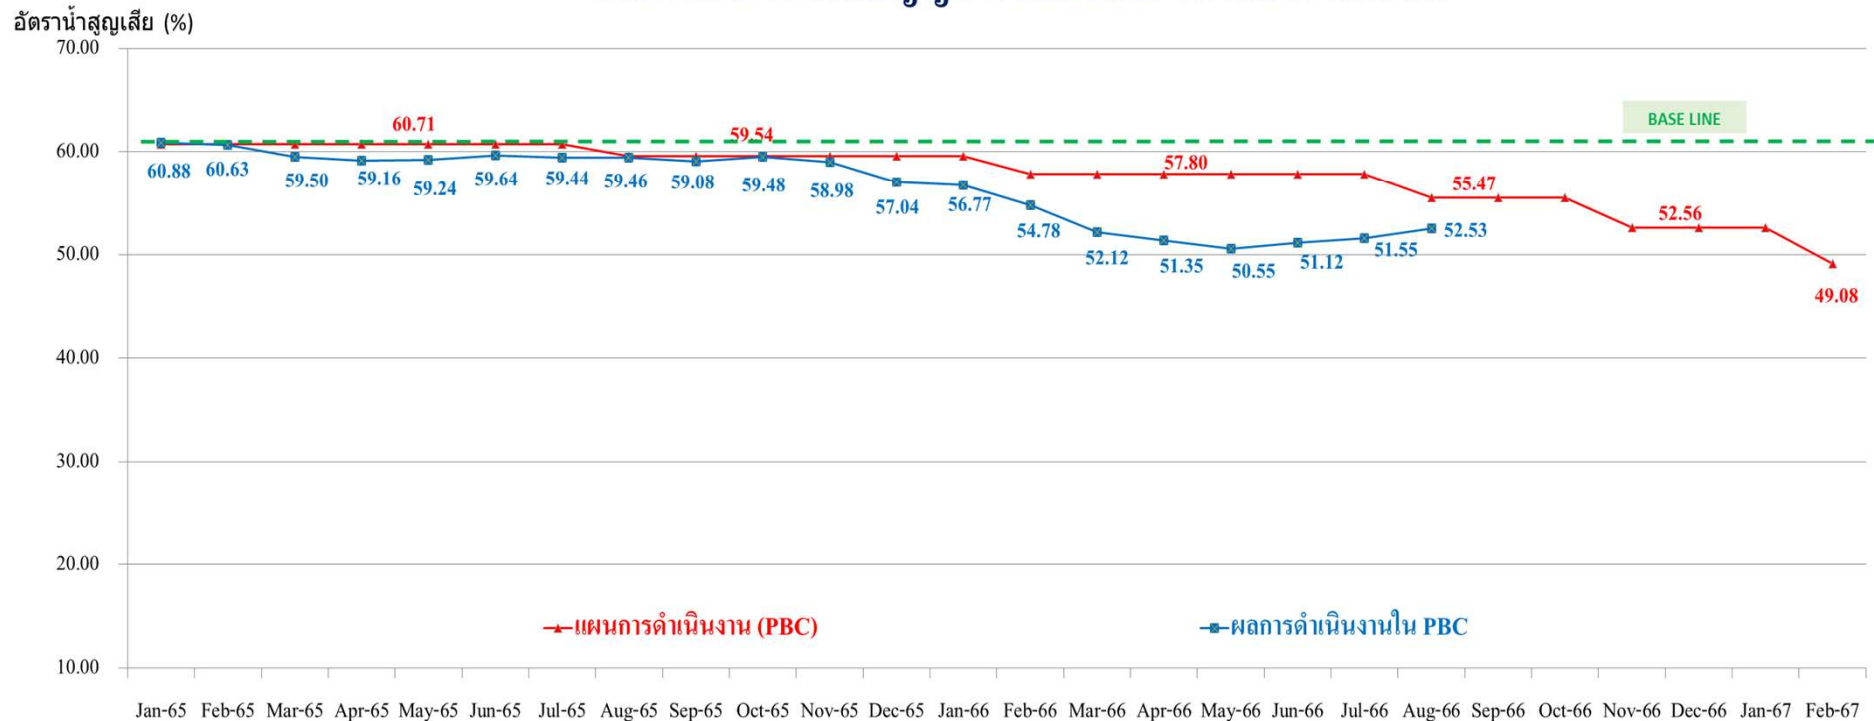

สาขา

สสท.

สัญญาเลขที่

จบส.1/2563

วันที่เริ่มงาน

1-ม.ค.-65

Base Line (%)

60.71

ผู้รับจ้าง : บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

แรงดันน้ำ Base Line  
(เมตร)

4.13

แรงดันน้ำ ส.ค.66  
(เมตร)

5.06

ผลซ่อมท่อใต้ดิน (ALC) (เฉลี่ย/เดือน)

ท่อจ่ายน้ำ

3.95

ท่อบริการ


494.00



ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยปี 66 ที่ลดได้ : 446,073.05 ลบ.ม./เดือน

## ผลการดำเนินงานสัญญาในปัจจุบัน

### ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.1/2565 พื้นที่สาขาพระโขนง

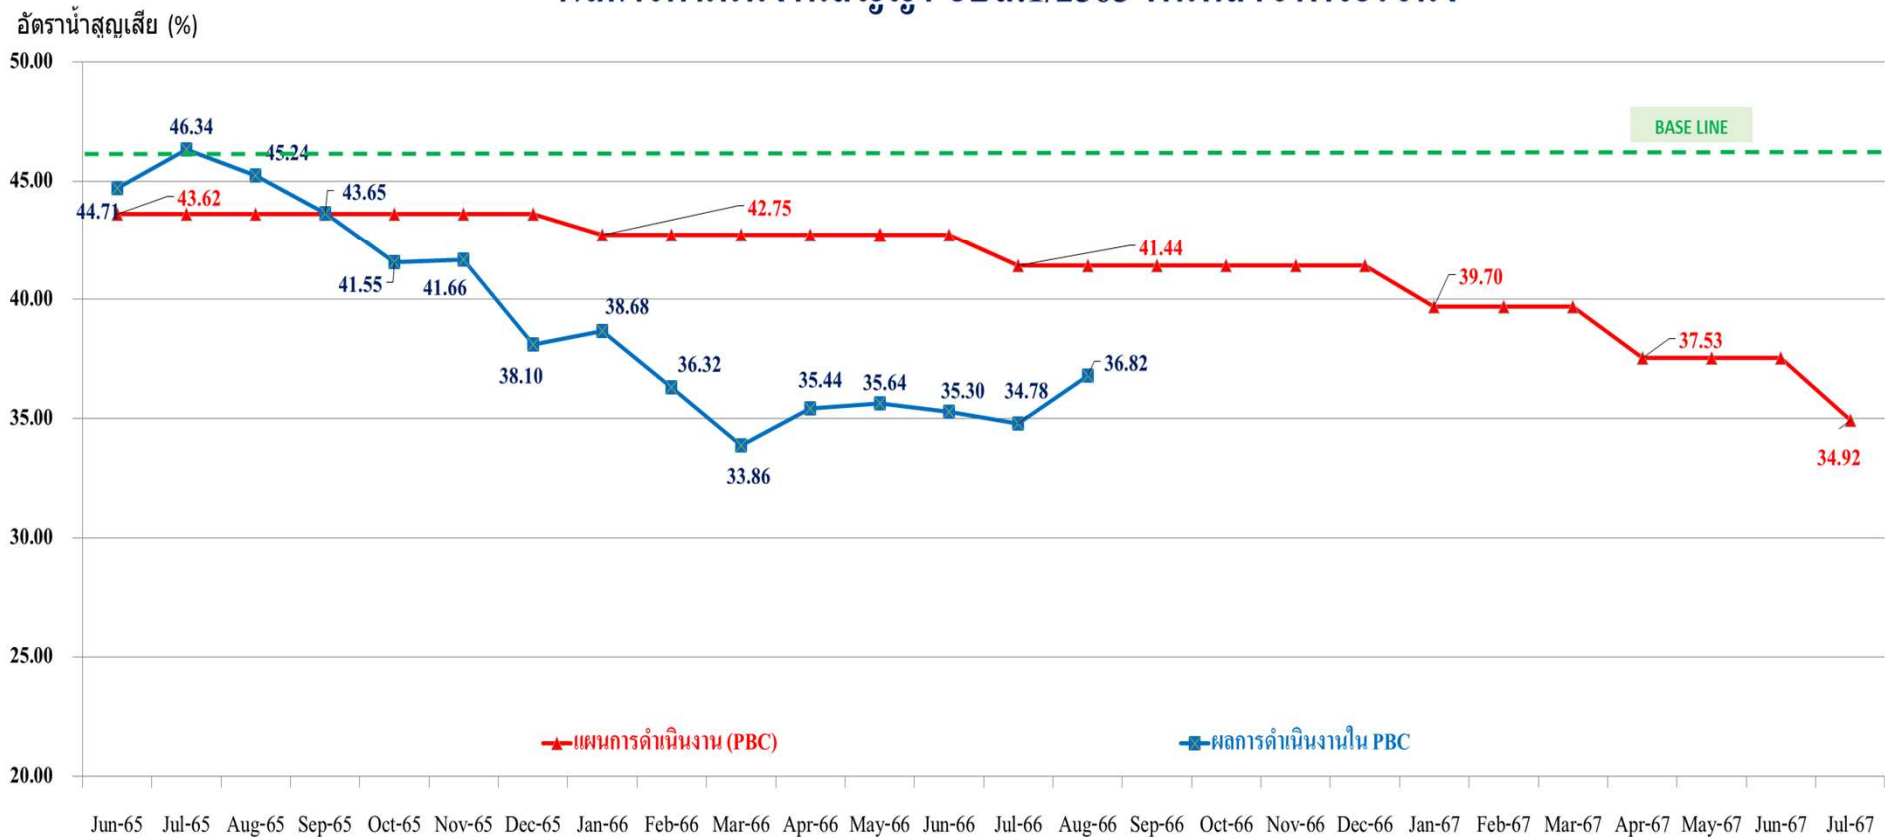


สาขา	สสพ.	ผู้รับจ้าง : บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด			
สัญญาเลขที่	จบส.1/2565	แรงดันน้ำ Base	แรงดันน้ำ ส.ค.66	ผลซ่อมท่อใต้ดิน (ALC) (เฉลี่ย/เดือน)	
วันที่เริ่มงาน	7-มิ.ย.-65	Line (เมตร)	(เมตร)	ท่อจ่ายน้ำ	ท่อบริการ
Base Line (%)	43.62	4.34	4.01	7.67	109.67

ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยปี 66 ที่ลดได้ : 768,150.05 ลบ.ม./เดือน

## ผลการดำเนินงานสัญญาในปัจจุบัน

### ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.2/2565 พื้นที่สาขามหาสวัสดิ์

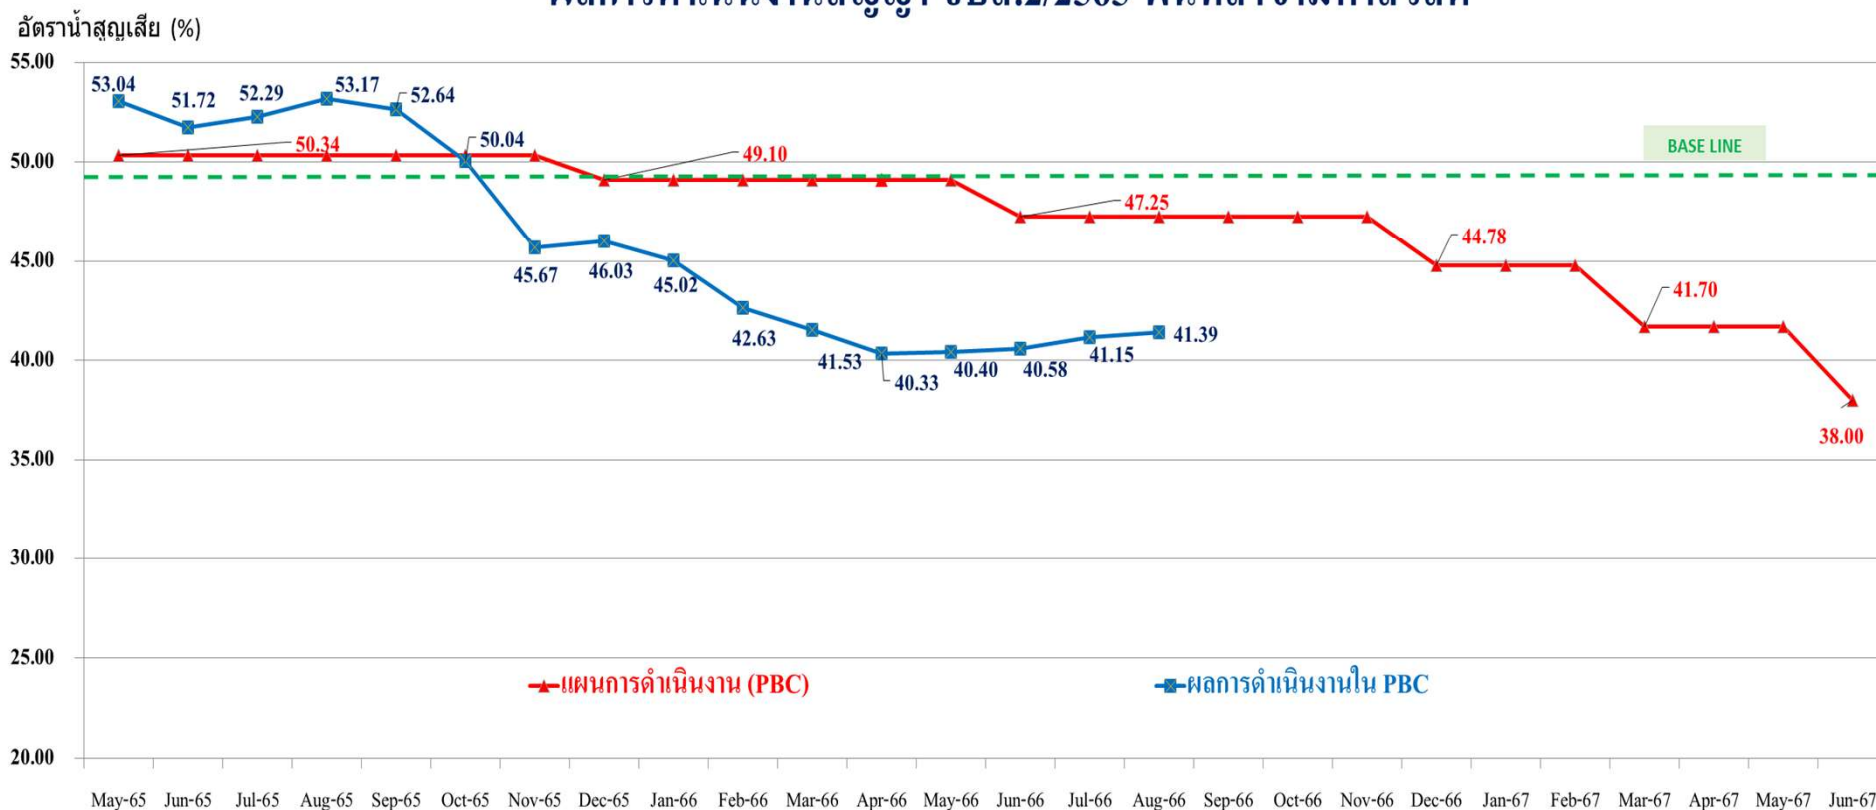

สาขา

สสมส.

สัญญาเลขที่

จบส.2/2565

วันที่เริ่มงาน

6-พ.ค.-65

Base Line (%)

50.34

ผู้รับจ้าง : บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด

แรงดันน้ำ Base  
Line (เมตร)

9.19

แรงดันน้ำ ส.ค.66  
(เมตร)

8.41

ผลซ่อมท่อใต้ดิน (ALC) (เฉลี่ย/เดือน)

ท่อจ่ายน้ำ

8.00

ท่อบริการ


751.38



ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยปี 66 ที่ลดได้ : 641,474.45 ลบ.ม./เดือน

## ผลการดำเนินงานสัญญาในปัจจุบัน

### ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.3/2565 พื้นที่สาขาสุขสวัสดิ์

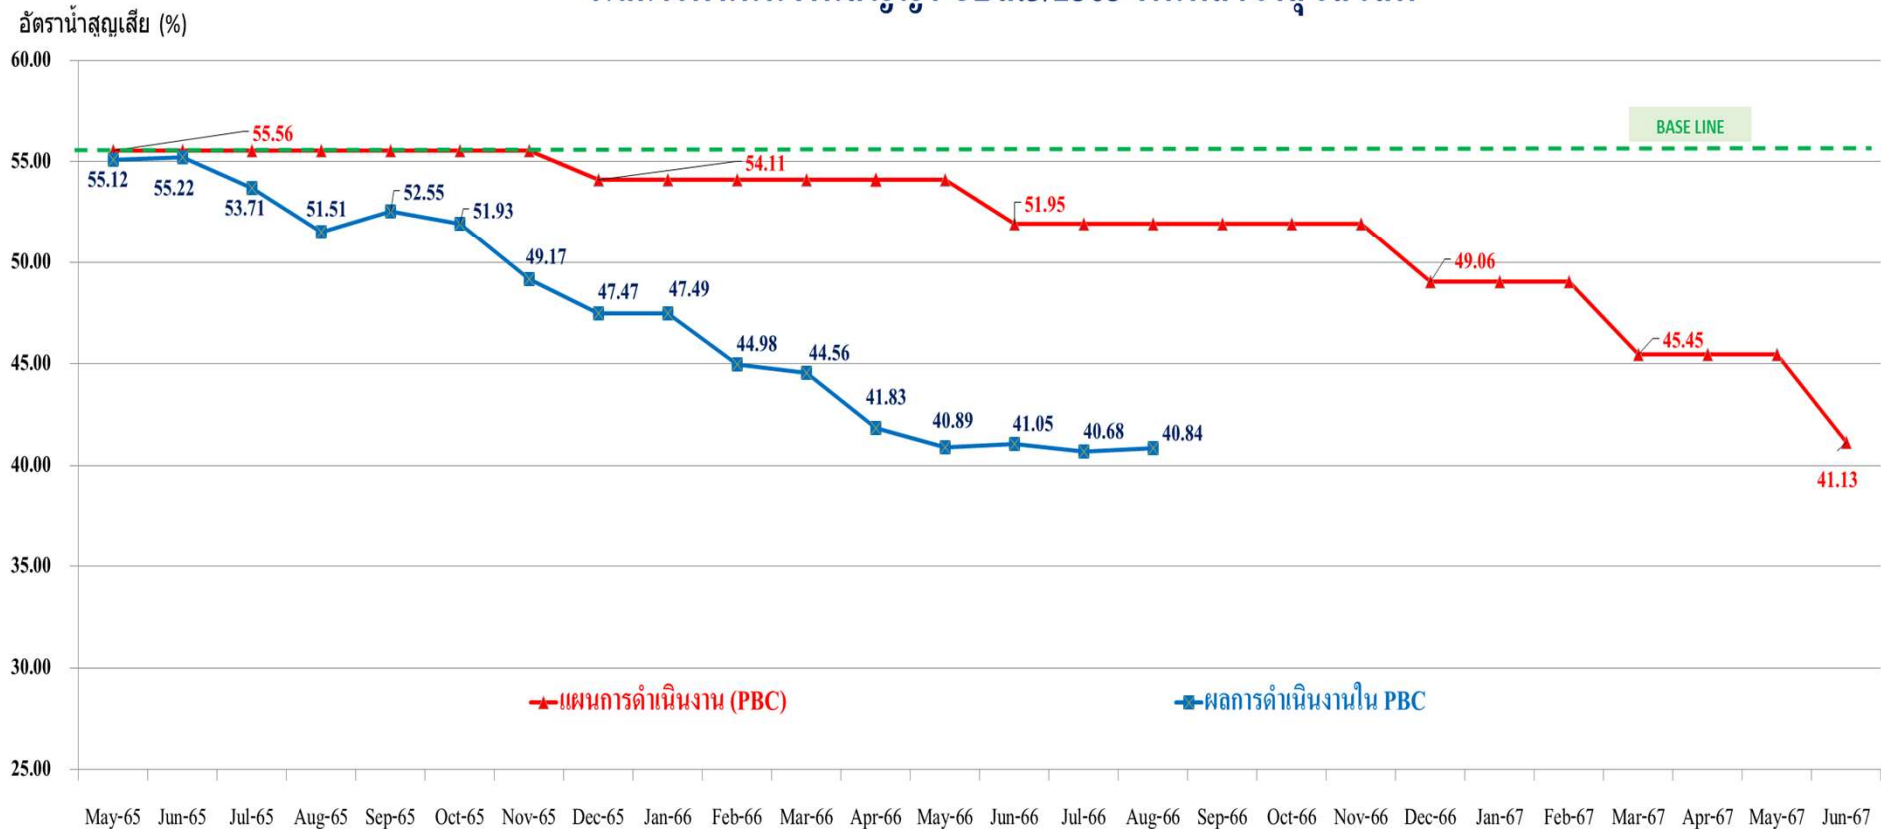

สาขา

สสว.

ผู้รับจ้าง : บริษัท แอล บี เอ็นจิเนียริง จำกัด

สัญญาเลขที่

จบส.3/2565

แรงดันน้ำ Base  
Line (เมตร)

แรงดันน้ำ ส.ค.66  
(เมตร)

ผลซ่อมท่อใต้ดิน (ALC) (เฉลี่ย/เดือน)

วันที่เริ่มงาน

9-พ.ค.-65

ท่อจ่ายน้ำ

ท่อบริการ

Base Line (%)

55.56

5.76

5.76


16.31

616.94

ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยปี 66 ที่ลดได้ : 301,291.23 ลบ.ม./เดือน

## ผลการดำเนินงานสัญญาในปัจจุบัน

### ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.4/2565 พื้นที่สาขาสุขุมวิท

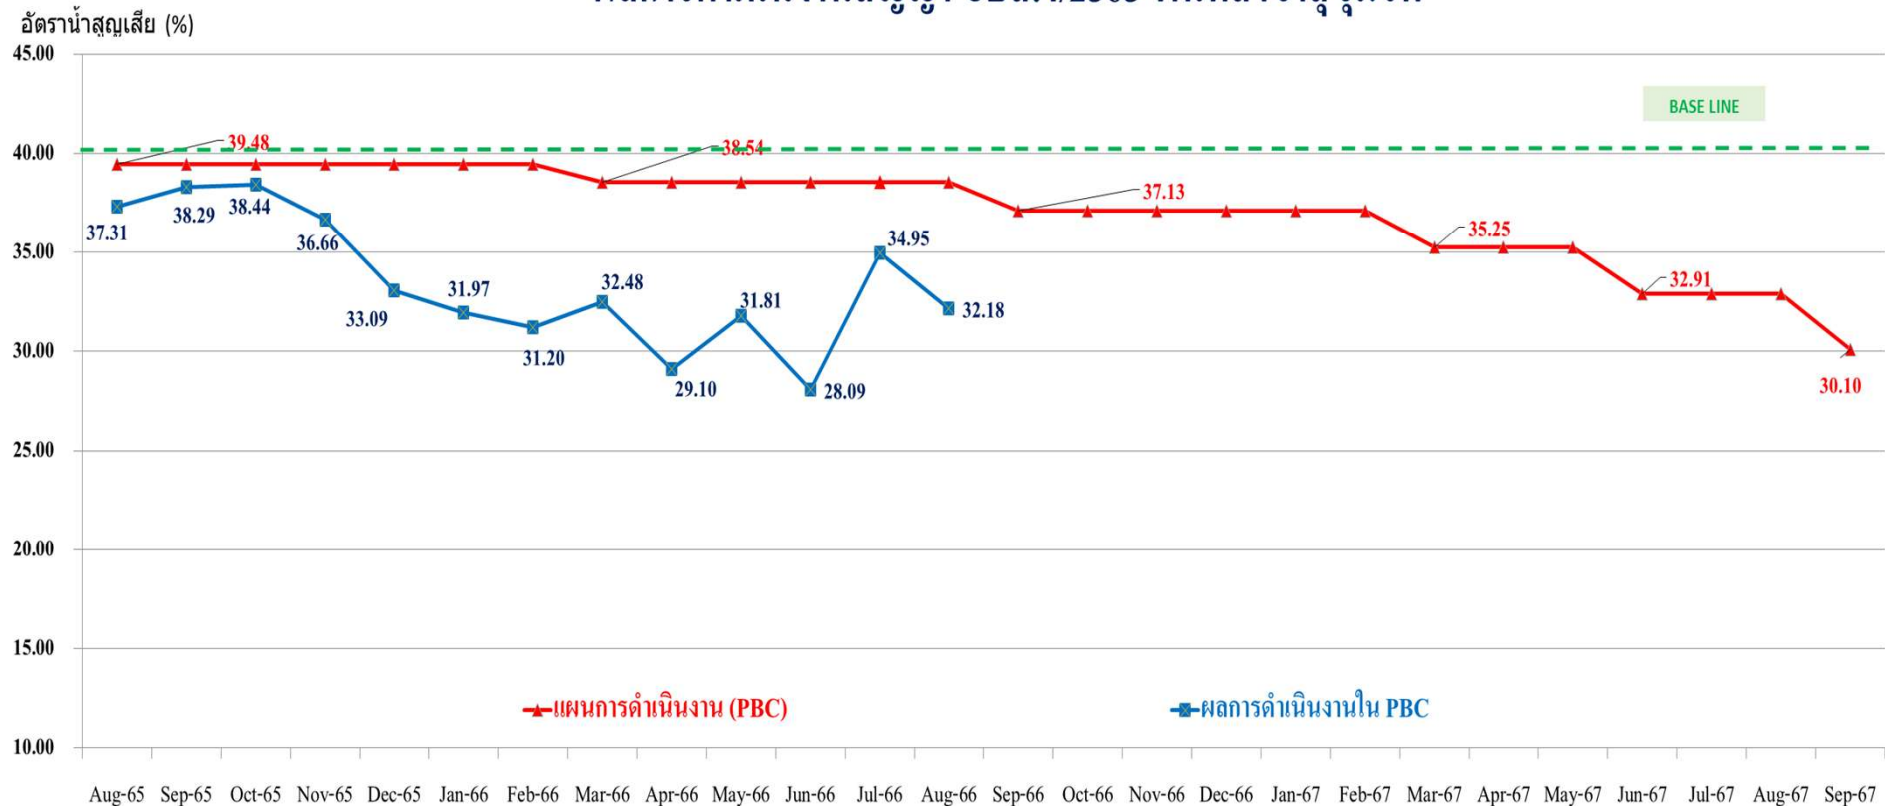

สาขา

สสส.

ผู้รับจ้าง : กิจการร่วมค้า แมค วอเตอร์

สัญญาเลขที่

จบส.4/2565

วันที่เริ่มงาน

1 ส.ค.65

แรงดันน้ำ Base  
Line (เมตร)

5.48

แรงดันน้ำ ส.ค.66  
(เมตร)

5.11

ผลซ่อมท่อใต้ดิน (ALC) (เฉลี่ย/เดือน)

ท่อจ่ายน้ำ

6.85

ท่อบริการ

58.00


Base Line (%)

39.48

ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยปี 66 ที่ลดได้ : 168,763.88 ลบ.ม./เดือน

## ผลการดำเนินงานสัญญาในปัจจุบัน

### ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.5/2565 พื้นที่สาขาทุ่งมหาเมฆ

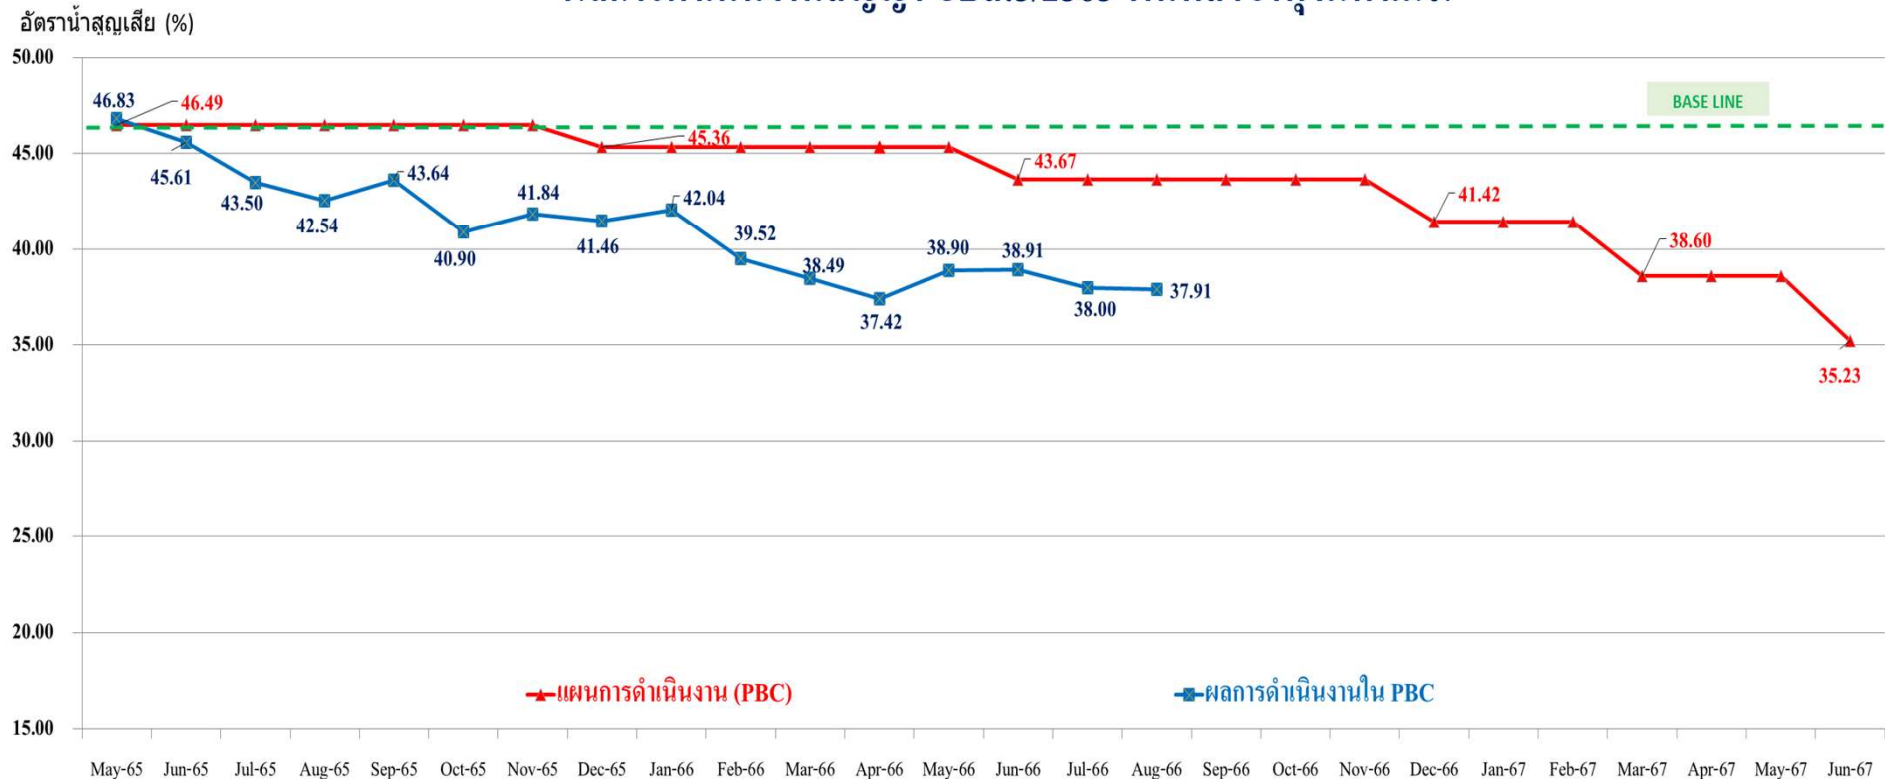

สาขา	สสท.
สัญญาเลขที่	จบส.5/2565
วันที่เริ่มงาน	6-พ.ค.-65
Base Line (%)	46.49

ผู้รับจ้าง : กิจการร่วมค้า แมค วอเตอร์


แรงดันน้ำ Base Line (เมตร)	แรงดันน้ำ ส.ค.66 (เมตร)
3.24	3.83

ผลซ่อมท่อใต้ดิน (ALC) (เฉลี่ย/เดือน)	
ท่อจ่ายน้ำ	ท่อบริการ
2.44	212.06

ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยปี 66 เพิ่มขึ้น : 5,615.91 ลบ.ม./เดือน

## ผลการดำเนินงานสัญญาในปัจจุบัน

### ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.6/2565 พื้นที่สาขาพญาไท

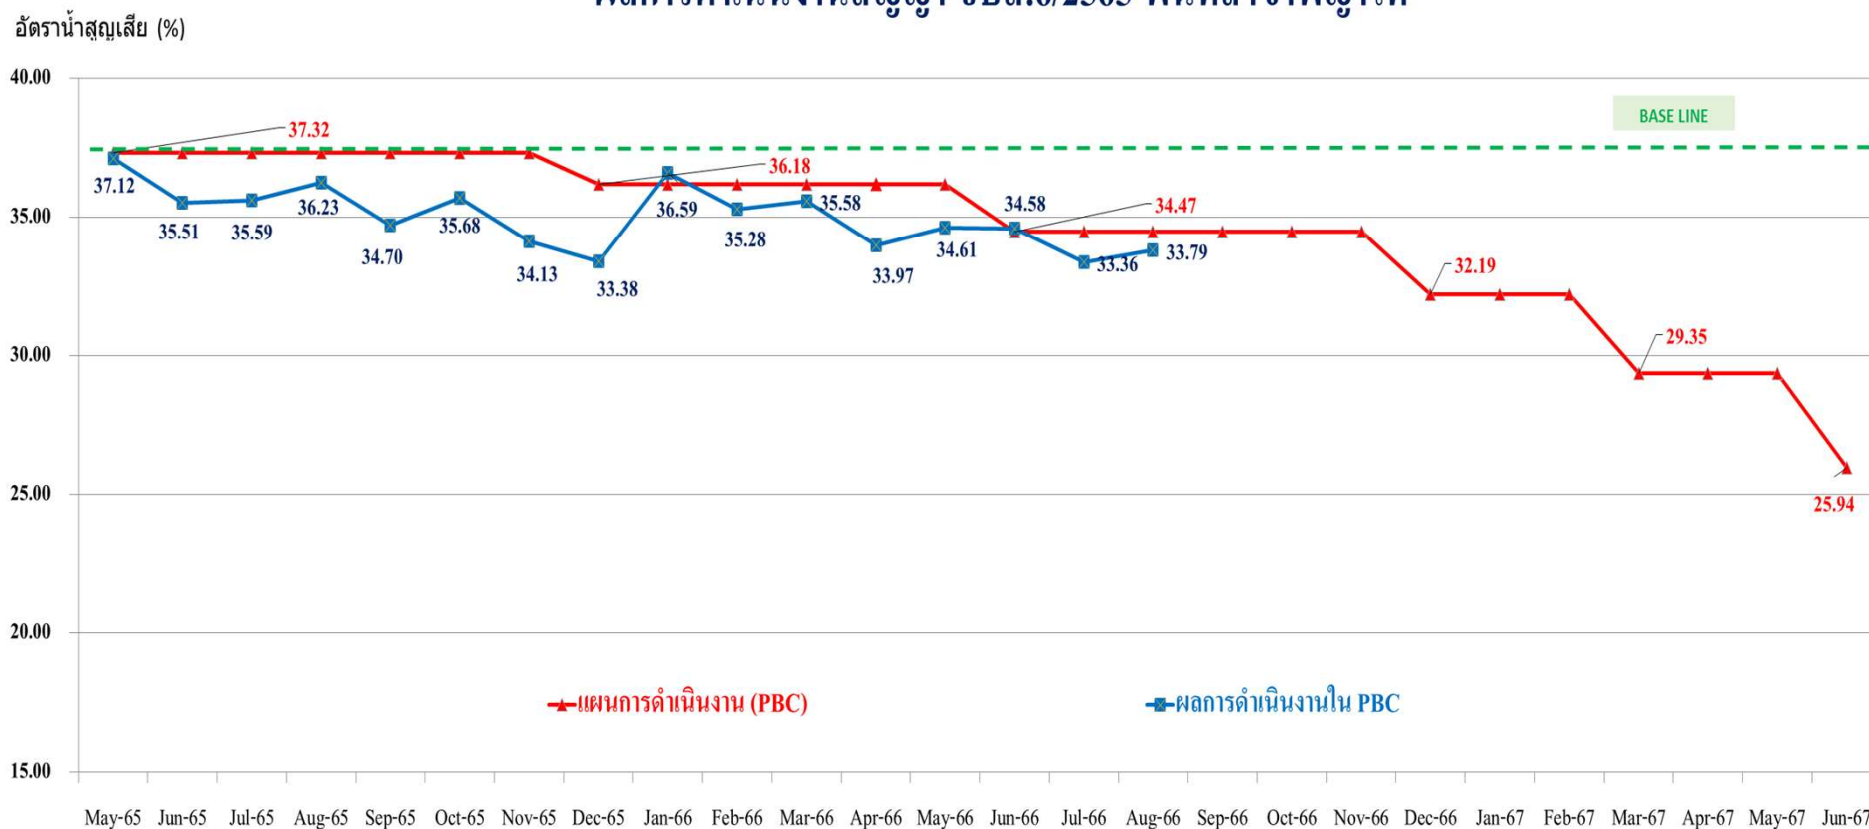

สาขา

สัญญา.

ผู้รับจ้าง : บริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริง จำกัด

สัญญาเลขที่

จบส.6/2565

วันที่เริ่มงาน

6-พ.ค.-65

แรงดันน้ำ Base  
Line (เมตร)

3.51

แรงดันน้ำ ส.ค.66  
(เมตร)

3.50

ผลซ่อมท่อใต้ดิน (ALC) (เฉลี่ย/เดือน)

ท่อจ่ายน้ำ

3.31

ท่อบริการ

137.13

Base Line (%)


37.32

ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยปี 66 ที่ลดได้ : 123,133.07 ลบ.ม./เดือน

## ผลการดำเนินงานสัญญาในปัจจุบัน

### ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.7/2565 พื้นที่สาขาแม่ศรี

อัตราน้ำสูญเสีย (%)

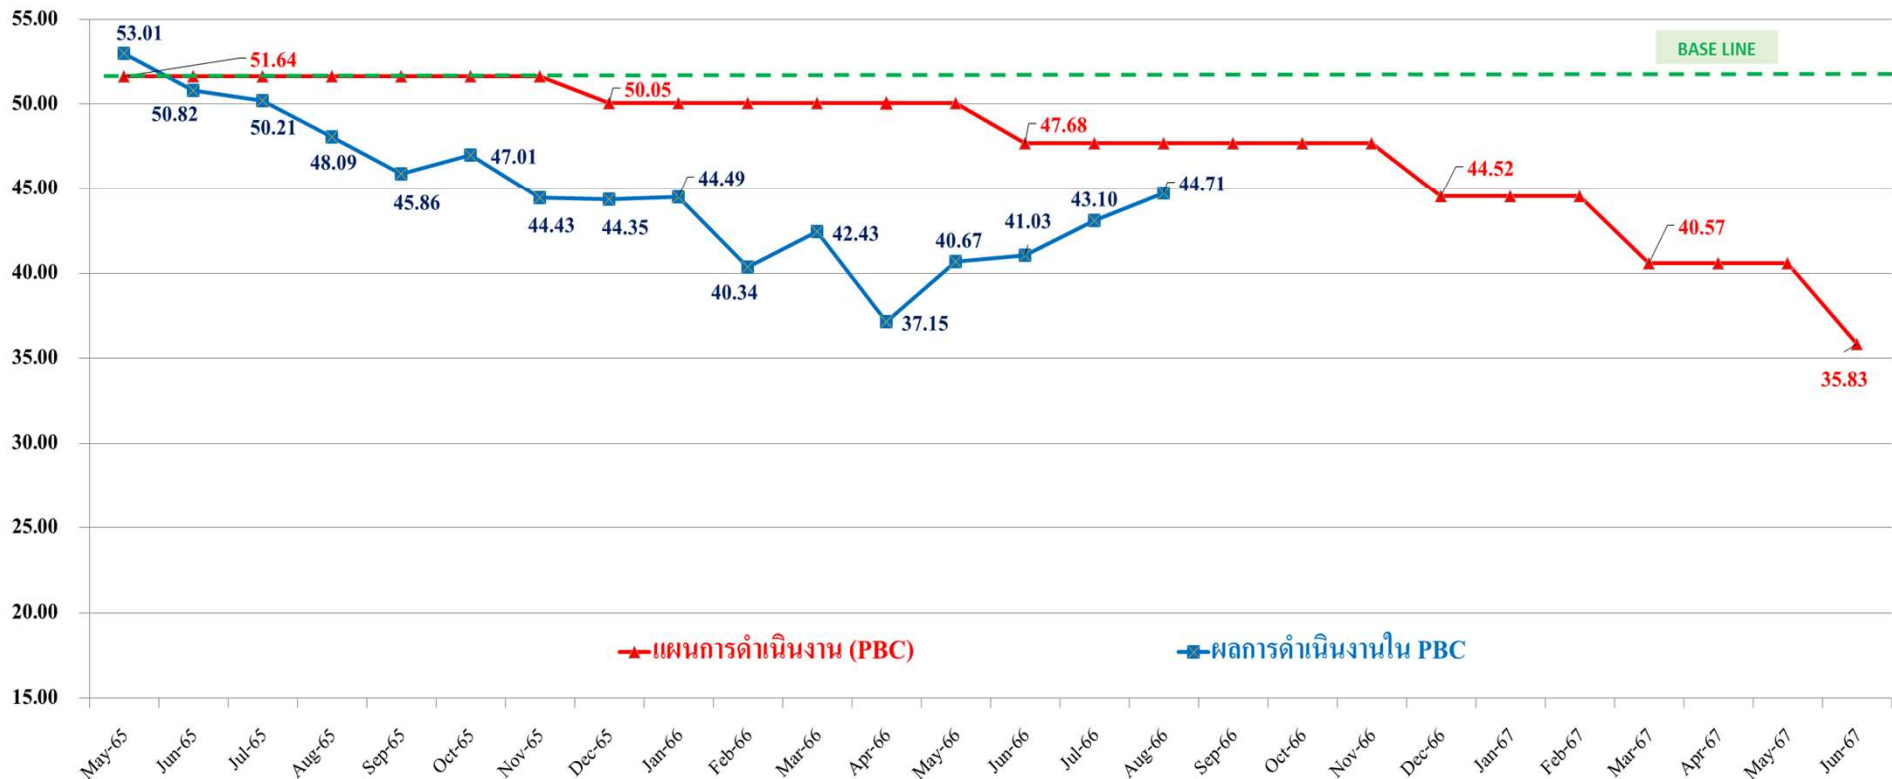

สาขา

สสม.

ผู้รับจ้าง : กิจการร่วมค้า แมค วอเตอร์

สัญญาเลขที่

จบส.7/2565

แรงดันน้ำ Base  
Line (เมตร)

4.19

แรงดันน้ำ ส.ค.66  
(เมตร)

4.31

ผลซ่อมท่อใต้ดิน (ALC) (เฉลี่ย/เดือน)

ท่อจ่ายน้ำ

3.00

ท่อบริการ

97.38

วันที่เริ่มงาน

6-พ.ค.-65


Base Line (%)

51.64

ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยปี 66 ที่ลดได้ : 246,859.07 ลบ.ม./เดือน

## ผลการดำเนินงานสัญญาในปัจจุบัน

### ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.8/2565 พื้นที่สาขาประชาชน

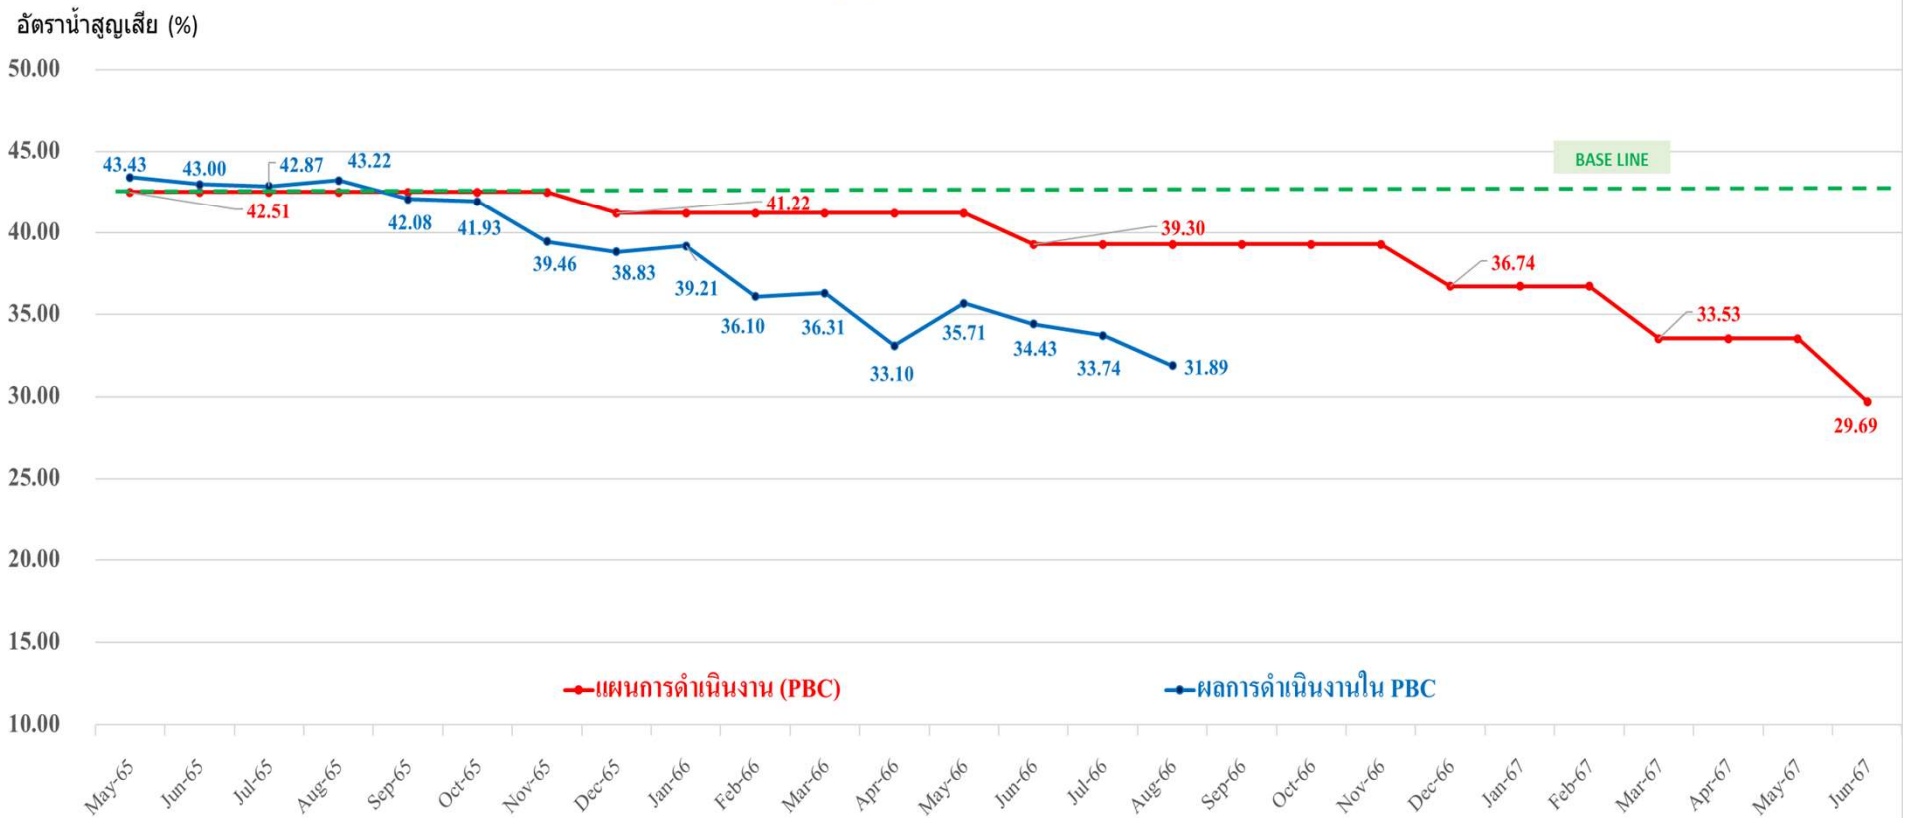

สาขา	สสช.
สัญญาเลขที่	จบส.8/2565
วันที่เริ่มงาน	6-พ.ค.-65
Base Line (%)	42.51


ผู้รับจ้าง : บริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริง จำกัด			
แรงดันน้ำ Base Line (เมตร)	แรงดันน้ำ ส.ค.66 (เมตร)	ผลซ่อมท่อใต้ดิน (ALC) (เฉลี่ย/เดือน)	
		ท่อจ่ายน้ำ	ท่อบริการ
6.10	6.83	4.81	270.19



ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยปี 66 ที่ลดได้ : 268,201.54 ลบ.ม./เดือน

## ผลการดำเนินงานสัญญาในปัจจุบัน

### ผลการดำเนินงานสัญญา จบส.9/2565 พื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ

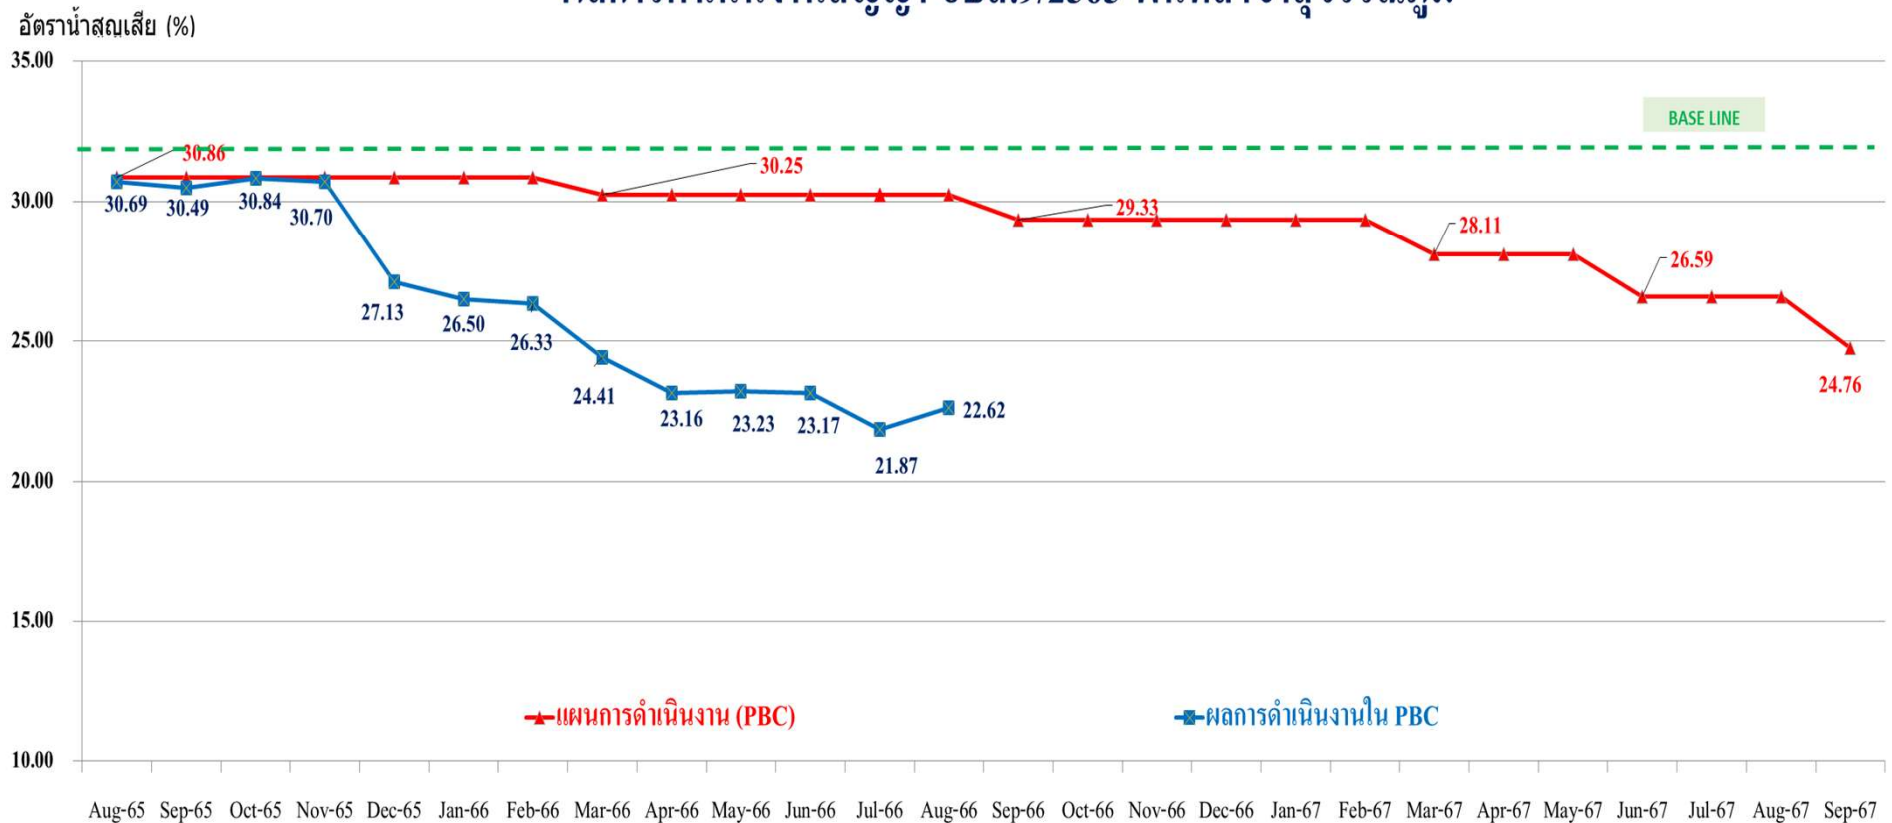

สาขา	สสสภ.
สัญญาเลขที่	จบส.9/2565
วันที่เริ่มงาน	25 ก.ค.65
Base Line (%)	30.86

ผู้รับจ้าง : บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

แรงดันน้ำ Base Line (เมตร)	แรงดันน้ำ ส.ค.66 (เมตร)
5.83	6.46

ผลซ่อมท่อใต้ดิน (ALC) (เฉลี่ย/เดือน)	
ท่อจ่ายน้ำ	ท่อบริการ
11.92	111.31

# ผลการดำเนินงานสัญญาในปัจจุบัน

## สถานงานปรับปรุงท่อในสัญญาจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย (PBC)

สาขา	สัญญาเลขที่	เป้าหมายตามสัญญา (กม.)	ความยาวท่อที่ผู้รับจ้าง เสนอเส้นทางปรับปรุง (กม.)	ความยาวท่อที่ผู้รับจ้าง เสนอเส้นทางปรับปรุง (%)	ความยาวท่อ ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ (กม.)	ความยาวท่อ ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ (%)
สสภ	จบส.1/2562	16.00	13.09	81.83	2.96	18.49
สสป	จบส.2/2562	9.00	8.05	89.44	2.25	24.96
สสบ	จบส.8/2563	8.50	10.81	127.26	0.88	10.40
สสต	จบส.1/2563	16.00	20.29	126.83	0.00	0.00
สสพ	จบส.1/2565	10.00	14.54	145.40	0.00	0.00
สสมส	จบส.2/2565	9.00	10.69	118.80	0.47	5.18
สสว	จบส.3/2565	11.50	5.48	47.68	0.99	8.57
สสส	จบส.4/2565	10.00	6.68	66.77	0.00	0.00
สสท	จบส.5/2565	9.50	9.99	105.17	0.83	8.78
สสญ	จบส.6/2565	9.50	13.90	146.37	1.05	11.05
สสม	จบส.7/2565	9.00	10.63	118.16	0.00	0.00
สสช	จบส.8/2565	10.00	10.40	104.00	0.00	0.00
สสสภ	จบส.9/2565	10.00	8.00	80.02	0.396	3.96
รวม		138.000	135.89	98.47	8.76	6.35



# สถานะเบิกจ่าย ขอซื้อขอจ้าง ลงนาม และแจ้งเริ่มงาน งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2566


สาขา	แผน (1,200 กม.)	เบิกจ่ายแล้ว				ขอซื้อขอจ้างแล้ว			ลงนามแล้ว				แจ้งเริ่มงานแล้ว		
		ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน	ฝจพ.	สาขา	รวม	ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน	ฝจพ.	สาขา	รวม
สสส.	78	0	89.859	89.859	115.20%	0	78.155	78.155	0	78.155	78.155	100.20%	0	30.316	30.316
สสพ.	65	0	81.745	81.745	125.76%	0	63.268	63.268	0	63.268	63.268	97.34%	0	44.252	44.252
สสป.	97	0	103.798	103.798	107.01%	0	98.625	98.625	0	98.625	98.625	101.68%	0	84.09	84.09
สสท.	30	0	28.660	28.660	95.53%	0	25.21	25.21	0	25.21	25.21	84.03%	0	21.67	21.67
ชวก.(ก1)	270	0	304.062	304.062	112.62%	0	265.258	265.258	0	265.258	265.258	98.24%	0	180.328	180.328
สสญ.	53	0	53.309	53.309	100.58%	0	48.155	48.155	0	48.155	48.155	90.86%	0	14.079	14.079
สสม.	20	0	29.497	29.497	147.49%	0	19.116	19.116	0	19.116	19.116	95.58%	0	10.848	10.848
สสล.	51	0	59.012	59.012	115.71%	0	59.012	59.012	0	59.012	59.012	115.71%	0	44.107	44.107
ชวก.(ก2)	124	0	141.818	141.818	114.37%	0	126.283	126.283	0	126.283	126.283	101.84%	0	69.034	69.034
สสช.	55	0	55.026	55.026	100.05%	0	50.607	50.607	0	50.607	50.607	92.01%	0	30.73	30.73
สสข.	35	0	46.259	46.259	132.17%	0	46.259	46.259	0	46.259	46.259	132.17%	0	46.259	46.259
สสมบ.	40	0	62.613	62.613	156.53%	0	62.613	62.613	0	62.613	62.613	156.53%	0	55.627	55.627
สสสภ.	13	0	13.492	13.492	103.78%	0	13.492	13.492	0	13.492	13.492	103.78%	0	7.712	7.712
ชวก.(ก3)	143	0	177.39	177.39	124.05%	0	172.971	172.971	0	172.971	172.971	120.96%	0	140.328	140.328
รวก.(กอ)	537	0	623.27	623.27	116.07%	0	564.512	564.512	0	564.512	564.512	105.12%	0	389.69	389.69
สสบ.	95	0	111.882	111.882	117.54%	0	111.66	111.66	0	111.66	111.66	117.54%	0	97.958	97.958
สสต.	74	0	84.823	84.823	114.63%	0	72.13	72.13	0	72.13	72.13	97.47%	0	72.13	72.13
สสภ.	90	0	90.460	90.460	100.51%	0	90.46	90.46	0	90.46	90.46	100.51%	0	84.172	84.172
สสว.	70	0	79.467	79.467	113.52%	0	74.927	74.927	0	74.927	74.927	107.04%	0	54.134	54.134
ชวก.(ก4)	329	0	366.632	366.632	111.44%	0	349.177	349.177	0	349.177	349.177	106.13%	0	308.394	308.394
สสน.	75	0	82.001	82.001	109.33%	0	78.711	78.711	0	78.711	78.711	104.95%	0	53.33	53.33
สสปท.	48	0	59.999	59.999	125.00%	0	59.999	59.999	0	59.999	59.999	125.00%	0	47.634	47.634
สสมส.	61	0	75.565	75.565	123.88%	0	75.565	75.565	0	75.565	75.565	123.88%	0	69.275	69.275
ชวก.(ก5)	184	0	217.565	217.565	118.24%	0	214.275	214.275	0	214.275	214.275	116.45%	0	170.239	170.239
รวก.(กต)	513	0	584.197	584.197	113.88%	0	576.145	576.145	0	563.452	563.452	109.83%	0	478.633	478.633
Agenda base	150	0	160.011	160.011	106.67%	0	153.713	153.713	0	153.713	153.713	102.48%	0	111.734	111.734
กปน.	1,200	0	1,367.478	1,367.478	113.96%	0	1,307.393	1,307.393	0	1,281.677	1,281.677	106.81%	0	980.057	980.057



สแกนเพื่ออัปเดตข้อมูลสถานะงาน  
ปีงบประมาณ 2566

## ผลการเบิกจ้างสะสม ปีงบประมาณ 2566 เทียบแผนเบิกจ้างสะสมที่ 1,200 กม.

ผลการเบิกจ้างสะสม ณ 21 ก.ย.66 = 1,399.246 กม. (ข้อมูล ณ 21 ก.ย.66)

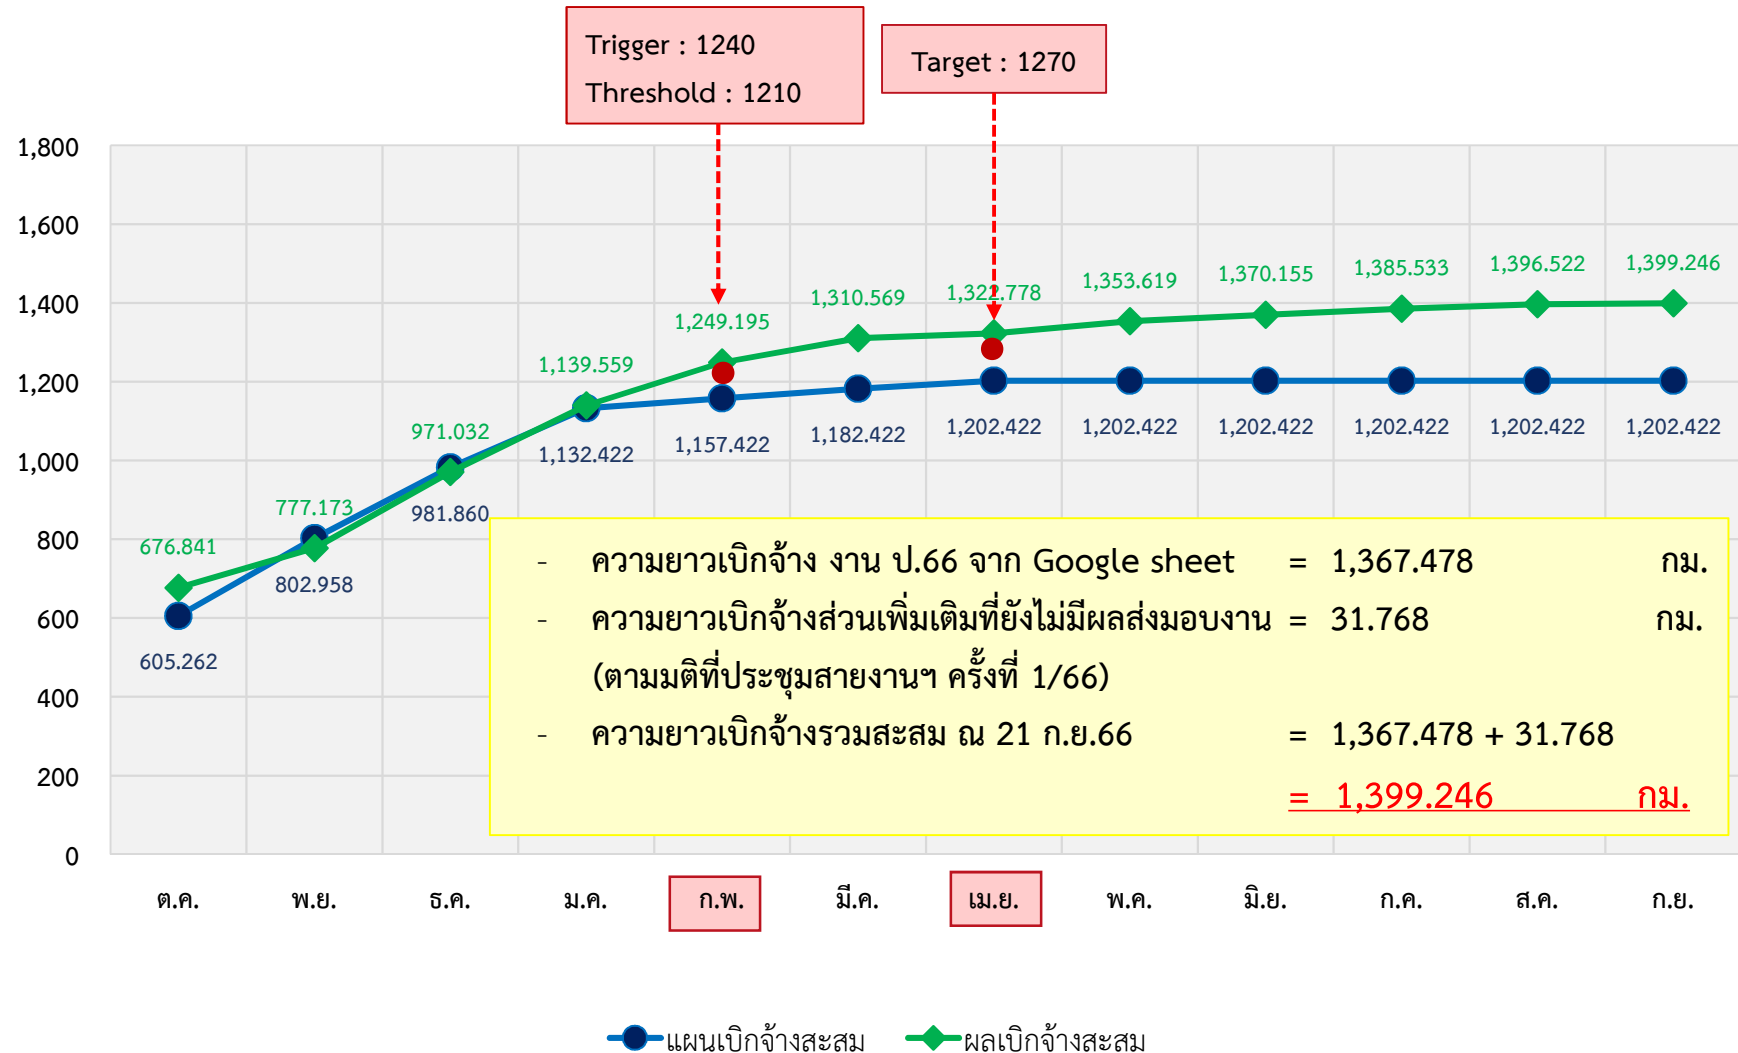

# ผลงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2566

สาขา	เป้าหมาย ผลส่งมอบงาน	ผลการลงนาม ปีงบฯ 66	ผลงานปรับปรุงท่อ					
			รายเดือน ก.ย.66			สะสม ต.ค.65-ก.ย.66		
			แผนงาน	ผลงาน	ผลต่าง +/-	แผนงาน	ผลงาน	ผลต่าง +/-
สสส.	75.000	78.155	7.000	6.918	(0.082)	75.000	75.404	0.404
สสพ.	62.000	63.268	6.000	5.026	(0.974)	62.000	64.126	2.126
สสป.	97.000	98.625	7.000	8.734	1.734	97.000	102.136	5.136
สสท.	30.000	25.21	3.000	0.000	(3.000)	30.000	29.301	(0.699)
รวม.(ก1)	264.000	265.258	23.000	20.678	(2.322)	264.000	270.967	6.967
สสญ.	50.000	48.155	5.000	0.500	(4.500)	50.000	50.008	0.008
สสม.	20.000	19.116	0.000	0.000	0.000	20.000	11.277	(8.723)
สสล.	51.000	59.012	5.000	5.072	0.072	51.000	48.643	(2.357)
รวม.(ก2)	121.000	126.283	10.000	5.572	(4.428)	121.000	109.928	(11.072)
สสช.	52.000	50.607	5.000	3.496	(1.504)	52.000	52.431	0.431
สสข.	35.000	46.259	3.500	0.000	(3.500)	35.000	37.116	2.116
สสมบ.	40.000	62.613	3.500	5.046	1.546	40.000	40.199	0.199
สสสภ.	25.000	13.492	2.500	0.000	(2.500)	25.000	28.562	3.562
รวม.(ก3)	152.000	172.971	14.500	8.542	(5.958)	152.000	158.308	6.308
รวม.(ก๔)	537.000	564.512	47.500	34.792	(12.708)	537.000	539.203	2.203
สสบ.	95.000	111.66	9.500	9.648	0.148	95.000	95.008	0.008
สสด.	74.000	72.13	7.000	6.771	(0.229)	74.000	79.220	5.220
สสภ.	90.000	90.46	9.000	6.215	(2.785)	90.000	84.491	(5.509)
สสว.	70.000	74.927	7.000	6.218	(0.782)	70.000	72.254	2.254
รวม.(ก4)	329.000	349.177	32.500	28.852	(3.648)	329.000	330.973	1.973
สสน.	75.000	78.711	7.000	2.426	(4.574)	75.000	67.653	(7.347)
สสบท.	48.000	59.999	3.000	2.886	(0.114)	48.000	69.568	21.568
สสมส.	61.000	75.565	1.600	8.635	7.035	61.000	75.189	14.189
รวม.(ก5)	184.000	214.275	11.600	13.947	2.347	184.000	212.410	28.410
รวม.(ก๕)	513.000	563.452	44.100	42.799	(1.301)	513.000	543.383	30.383
Agenda base	150.000	153.713	15.000	16.539	1.539	150.000	164.072	14.072
กปน.	1200.000	1,281.677	106.600	94.130	(12.470)	1200.000	1246.658	46.658


หมายเหตุ : 1. ผลการลงนามปีงบฯ 66 จาก Google sheet ณ วันที่ 21 ก.ย.66 (11.00 น.) และผลงานปรับปรุงท่อรายเดือน จาก Google sheet ณ วันที่ 20 ก.ย.66 (13.30 น.)

2. ผลงานปรับปรุงท่อที่มีผลลดน้ำสูญเสียรวมอยู่สะสม 36.170 กิโลเมตร

3. ผลงาน PBC รวมอยู่สะสม 7.258 กิโลเมตร

## แผนส่งมอบงานปรับปรุงท่อฯ สะสม ปีงบประมาณ 2566 เดิม (1,200 กม.)

Target : 1,270

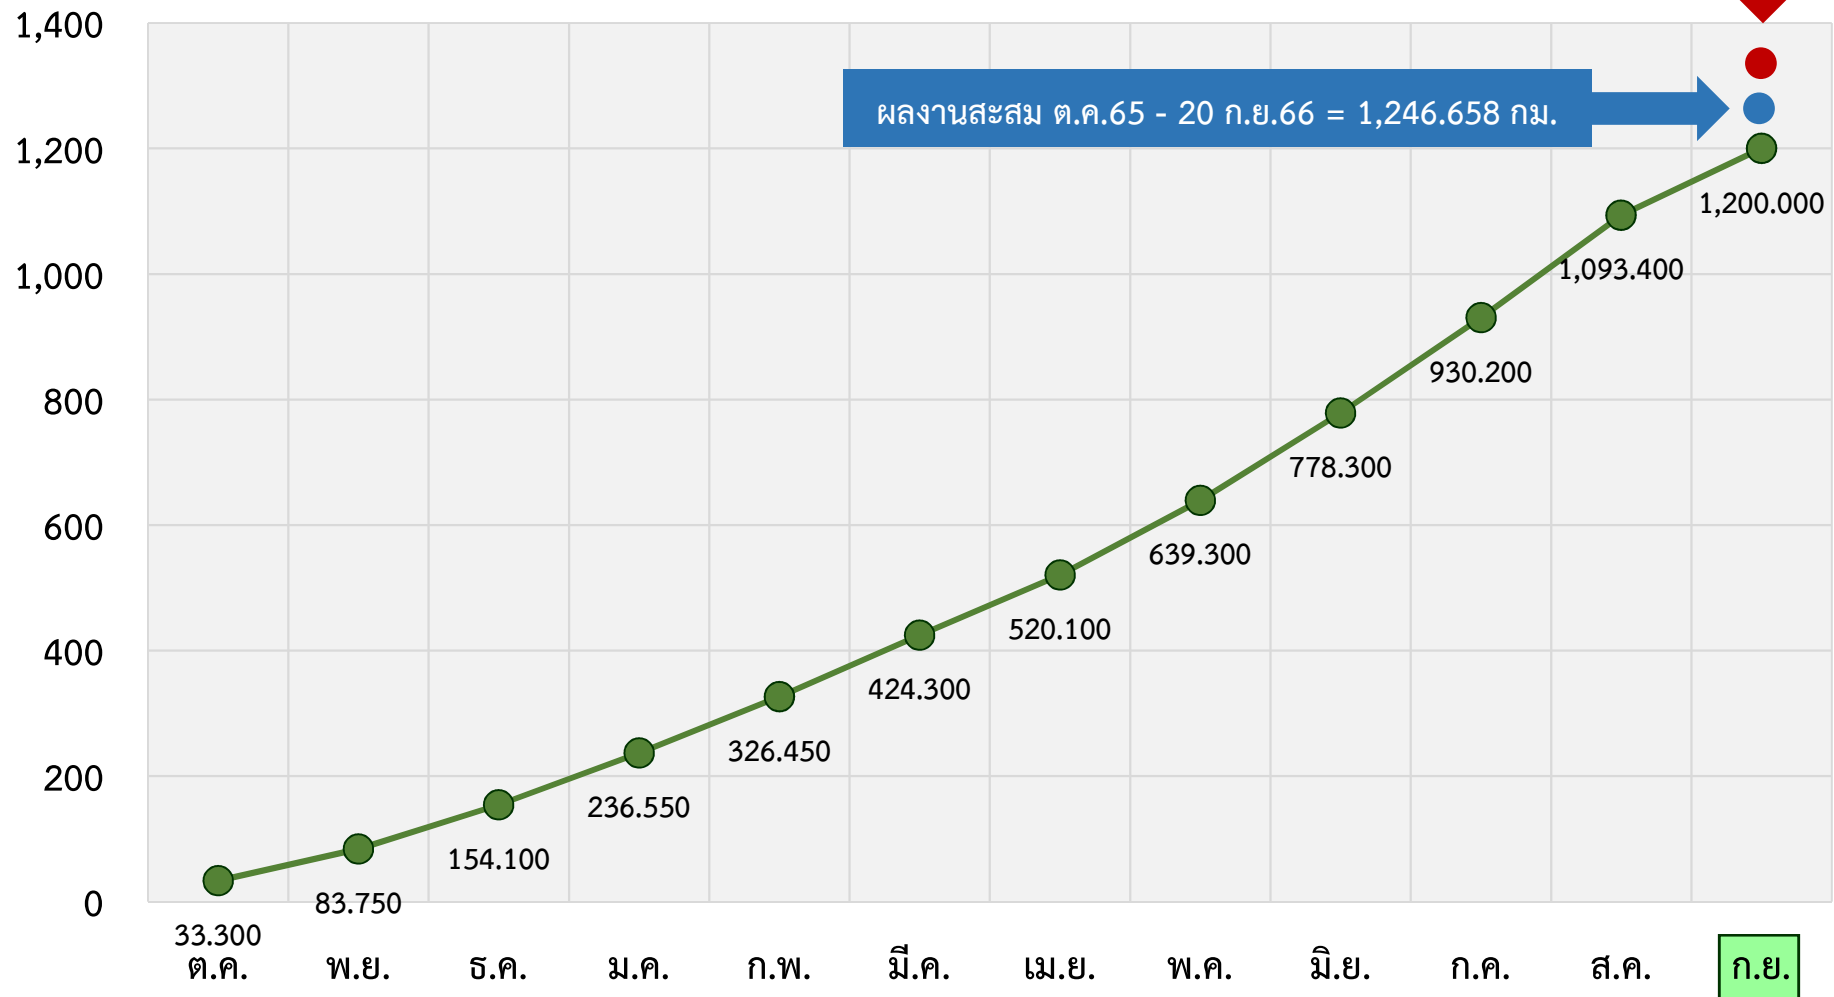

ต้องดำเนินการเพิ่มอีก 23.342 กม. เพื่อให้ครบ 1,270 กม. ณ 30 กันยายน 2566

## การขอยกเว้น (Waive) ตัวชี้วัด สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ช่วง ครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ 2566


ตามที่ ฝบบ. มีบันทึกเรื่องการขอยกเว้น (Waive) ตัวชี้วัด และแจ้งแนวทางการขอยกเว้น (Waive) ตัวชี้วัด หากเกิดกรณีการดำเนินงานได้ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก อยู่เหนือการควบคุม จนเป็นเหตุให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

กปท.ฝจส. ได้มีบันทึกที่ กปทฝจส45/2566 ขอความอนุเคราะห์คาดการณ์งานก่อสร้าง วางท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและส่งผลกระทบต่อแผนการส่งมอบงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมหลักฐานและเหตุผลประกอบ เช่น หนังสือของ กปน. หนังสือจากหน่วยงานภายนอก นโยบายภาครัฐ เป็นต้น และส่งกลับมาที่ กปท.ฝจส. ภายในสิ้นเดือน กันยายน 2566 เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ ฝบบ. ต่อไป


**ประเภทงานที่สามารถขอ Waive ได้ อาทิ เช่น**

- งานปรับปรุงท่อสัญญา PBC
- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (งาน ป.)

## แนวทางการติดตามผลส่งมอบงานภายในช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2567



ขอความร่วมมือสาขา และ ABS อัปเดตผลส่งมอบงานใน Google sheet ให้เป็นปัจจุบัน ทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เพื่อสรุปข้อมูลแจ้งให้ผู้บริหารทราบ



ขอความร่วมมือสาขากรอกผลงานส่งมอบงานปรับปรุงท่อกๆ PBC

# การกรอกผลส่งมอบงานปรับปรุงท่อฯ PBC

การกรอกผลงาน PBC สามารถกรอกได้ในแบบฟอร์ม Google sheet “ผลงานปรับปรุงท่อ ปิงบา 66\_สกล” ในชีท “PBC-66”

ผลงานปรับปรุงท่อ ปิงบา 66\_สกล

docs.google.com/spreadsheets/d/1hXEBVQPdFfCdsrMXBrAWkPSGGXvqMTgs5I5hj0BGeE4/edit#gid=1258137167

MWA etc Gmail YouTube Maps Translate News

ผลงานปรับปรุงท่อ ปิงบา 66\_สกล

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

100% B % 0.00 123 Sarab... - 10 + B I A

A1

	A	B	C	D	F	G	H	I	J					
1		สสส. 7-107	สสส. 209-309	สสส. 411-511	สสส. 815-915	สสส. 1017-1117	สสส. 1219-1319	สสส. 1421-1521	สสส. 1623-1723					
2		สสพ. 108-208	สสพ. 310-410	สสพ. 512-612	สสพ. 916-1016	สสพ. 1118-1218	สสพ. 1320-1420	สสพ. 1522-1622	สสพ. 1724-1824					
3		ผลงานรายเดือน PBC ปิงบาประมาณ 2566 (ม.)												
4														
5	Code	ปี	สาขา	สัญญา	รหัสเส้นทาง	ความยาวตามแบบ (ม.)	แบบเลขที่	DMA	สถานที่					
6														
7		2566	สสส.											
74		2566	สสส.											
75		2566	สสส.											
76		2566	สสส.											
77		2566	สสส.											
78		2566	สสส.											
79		2566	สสส.											
80		2566	สสส.											
81		2566	สสส.											
82		2566	สสส.											
83		2566	สสส.											
84		2566	สสส.											
85		2566	สสส.											
86		2566	สสส.											
87		2566	สสส.											
88		2566	สสส.											
89		2566	สสส.											
90		2566	สสส.											

ผลงานปรับปรุงท่อ ปิงบา 66

งาน ป-66 สกล กรอก (สกล) คำนวณความยาวส่งมอบ ลดน้ำฯ66 ข้อมูลจาก คลส สรุป MNF 66 ปรับปรุงกำลังน้ำ-66 สกล กรอก PBC-66

## การจัดสรรความยาวท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2567 (1,200 กม.)

สาขา	คิดสัดส่วนโดยใช้ปริมาณ นสส. รวม กปน. 8 เดือน (หักปริมาณ นสส. ท่อประธาน 5%) 100% นสส. สาขา (NP_T_NE)				ร่าง กม. 67		
	ABS	สาขา	รวม	+/- กม. ช่วยเหลือ	ABS	สาขา	รวม
สสส.	7	86	93	-10	7	76	83
สสพ.	0	73	73	-5	0	68	68
สสป.	37	85	122		37	85	122
สสท.	0	30	30		0	30	30
ชวก.(ก1)	44	274	318		44	259	303
สสญ.	0	50	50		0	50	50
สสม.	0	20	20		0	20	20
สสล.	0	57	57	-7	0	50	50
ชวก.(ก2)	0	127	127		0	120	120
สสช.	0	47	47		0	47	47
สสข.	0	32	32		0	32	32
สสมบ.	0	22	22	10+5+3=18	0	40	40
สสสภ.	0	36	36	4	0	40	40
ชวก.(ก3)	0	137	137		0	159	159
รวก.(กอ)	44	538	582		44	538	582
สสบ.	38	85	123		38	85	123
สสด.	21	85	106		21	85	106
สสภ.	6	86	92		6	86	92
สลว.	41	84	125		41	84	125
ชวก.(ก4)	106	340	446		106	340	446
สสน.	0	53	53		0	53	53
สสบท.	0	46	46	10	0	56	56
สสมส.	0	73	73	-10	0	63	63
ชวก.(ก5)	0	172	172		0	172	172
รวก.(กต)	106	512	618		106	512	618
กปน.	150	1050	1200		150	1050	1200

หมายเหตุ

ร่างการจัดสรรความยาวท่อ ปีงบประมาณ 67 จากการประชุมหารือการจัดสรรความยาวท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566



## ขอให้สาขาคัดเลือกเส้นทางปรับปรุงท่อสำหรับ Agenda base ในปีงบประมาณ 2567

สจท.กปท. ได้มีบันทึกที่ สจทกปท54/2566 ขอให้สาขาคัดเลือกเส้นทางปรับปรุงท่อสำหรับ Agenda base ในปีงบประมาณ 2567 ตามปริมาณงานที่ Agenda base ได้รับ โดยเป็นเส้นทางที่มีความเสื่อมต่อเหมาะสม มีความจำเป็นต้องดำเนินการ ไม่อยู่ในพื้นที่ PBC และผ่านความเห็นชอบจากผู้ช่วยฯ แต่ละสายงาน ส่งบันทึกแนบรายละเอียดเส้นทางตามแบบฟอร์ม พร้อมทั้ง Soft File (Excel) และแผนที่พร้อม Highlight เส้นทาง ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ สจท.กปท. ภายในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566


สาขา	กม. ที่ต้องส่งให้ ABS	กม. ที่ได้รับแล้ว	กม. ที่ต้องส่งเพิ่ม
สสส.	7	10.238	-
สสป.	37	79.158	-
สสบ.	38	-	38
สสต.	21	-	21
สสภ.	6	-	6
สสว.	41	21.140	19.860

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

## ผลการติดตามการกรอกข้อมูล MNF ปีงบประมาณ 2565


ปัจจุบันการกรอก MNF คิดเป็น 68.2 % ของเส้นทางส่งมอบแล้ว (ข้อมูล ณ 5 ก.ย.66)

% การกรอก MNF เส้นทางที่ส่งมอบในปีงบประมาณ 2565

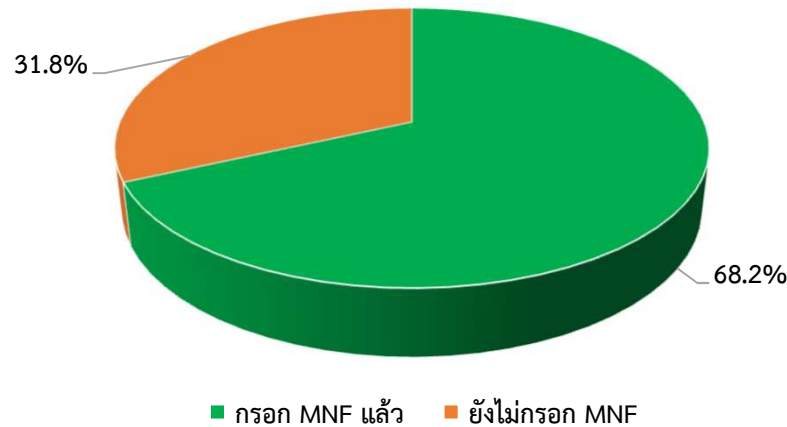

ความยาวส่งมอบงานปีงบประมาณ 65 ที่กรอก MNF แล้ว


กิโลเมตร

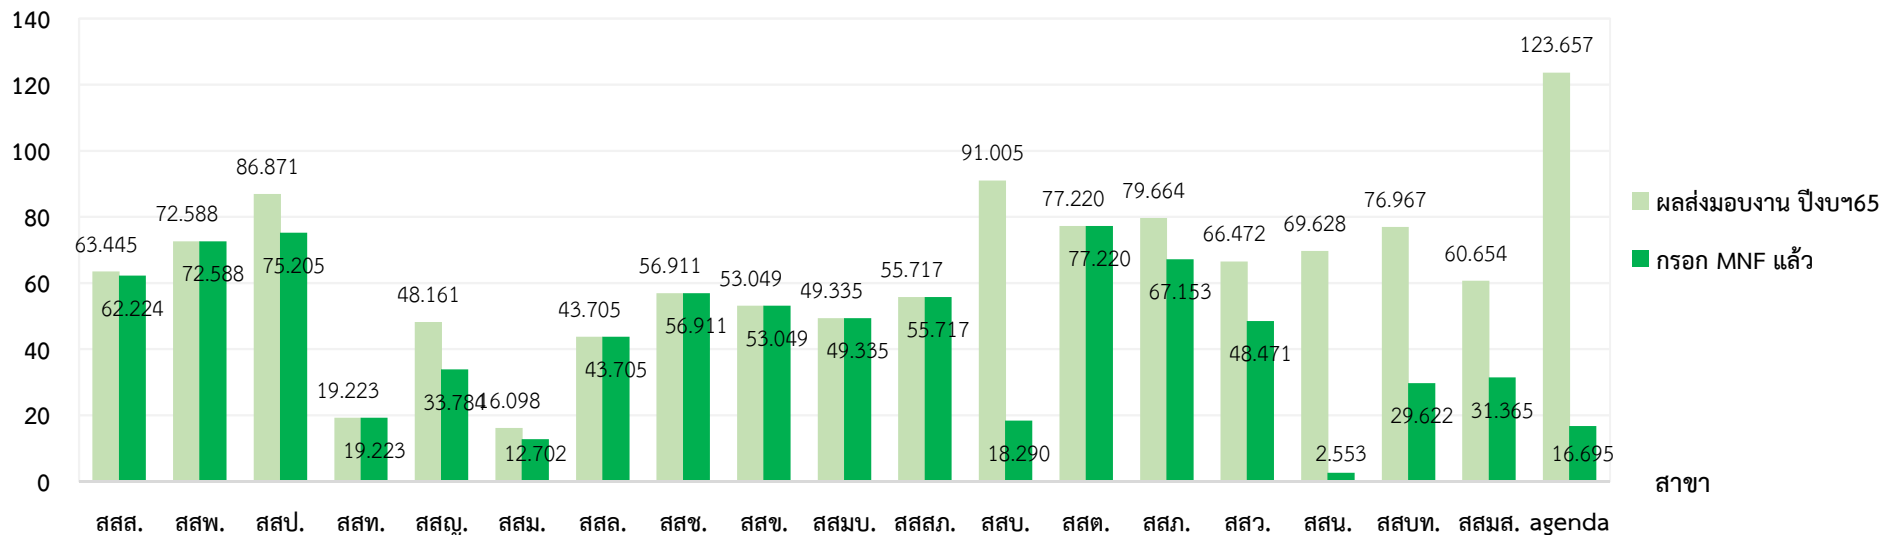

## ผลการติดตามการกรอกข้อมูล MNF ปีงบประมาณ 2566


ปัจจุบันการกรอก MNF คิดเป็น 32.7% ของเส้นทางส่งมอบงาน (ข้อมูล ณ 5 ก.ย.66)

% การกรอก MNF เส้นทางที่ส่งมอบในปีงบประมาณ 2566

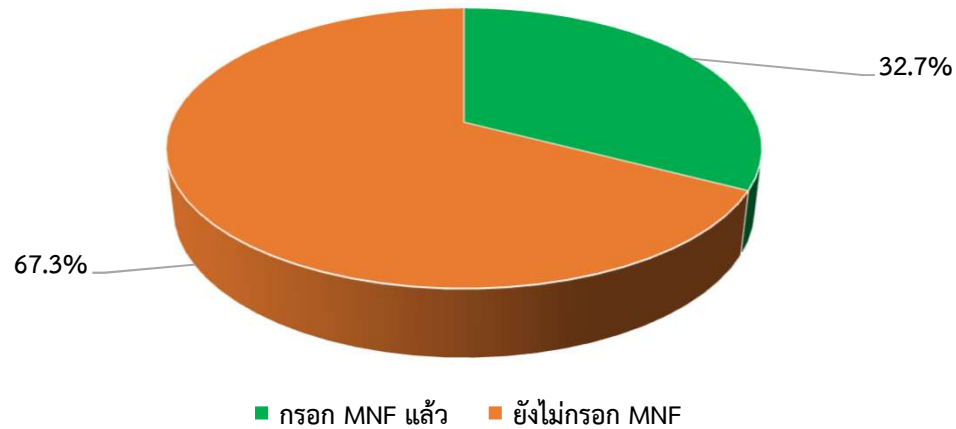

กิโลเมตร

ความยาวส่งมอบงานปีงบประมาณ 66 ที่กรอก MNF แล้ว

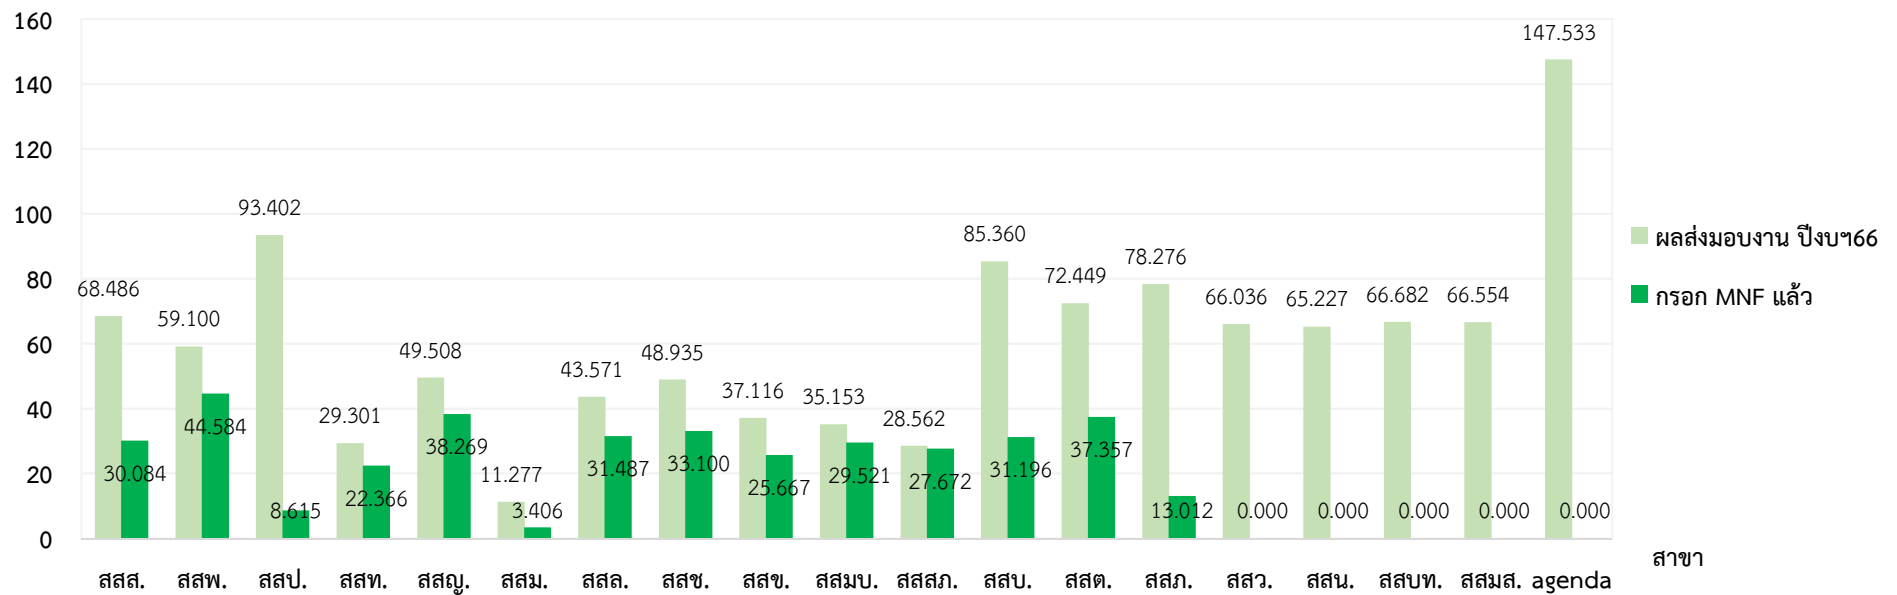

## QR Code กรอก MNF ปีงบฯ 2565 และ 2566




ผลงานปรับปรุงท่อ ปีงบฯ 65



ผลงานปรับปรุงท่อ ปีงบฯ 66

# การประเมินผลผู้รับจ้างในระบบ PMS

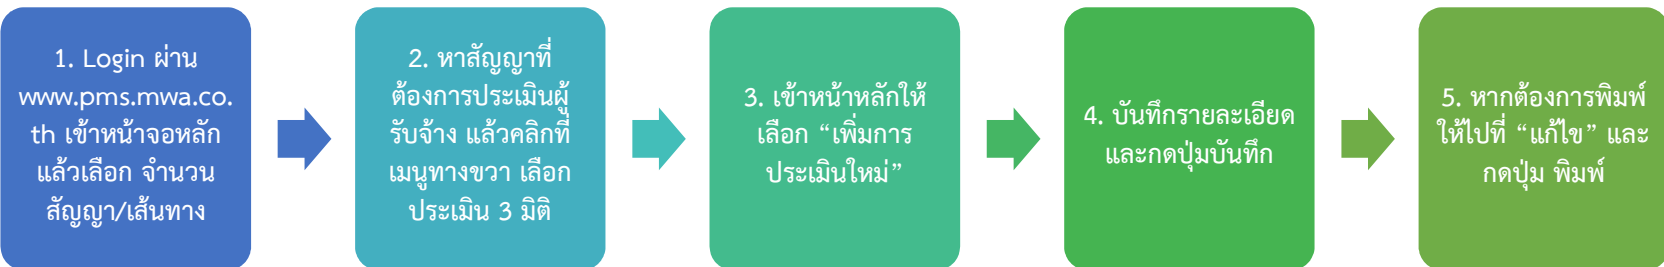

ระบบบริหารจัดการงานทางท่อ  
Pipeline Management System - PMS

26 มิถุนายน 2566 เวลา 11:31:13 น.

นายผู้คุมงานทดสอบ ทดสอบ

1

1/3

จำนวนสัญญา/เส้นทาง

0

ความยาวโดยรวม (เมตร)

8.00

มูลค่าโครงการ(ล้านบาท)

1

งานตรวจสอบสอนหน้างาน

1

ใบแจ้งารอนุมัติ

0

รายงานผลอนุมัติ

2

งานสั่งการเฉพาะอย่างค้าง

0

งานสั่งการเฉพาะอย่างเกินกำหนด

+ เพิ่มงานเฉพาะอย่าง

ส.รื่อง	เลขที่ใบแจ้ง	เลขที่สัญญา	เส้นทาง	ประเภทงาน	ลักษณะงาน	วันที่ใบแจ้ง	บริเวณก่อสร้าง	ช่วงเวลาปฏิบัติงาน	หัวหน้างาน	สถานะใบแจ้ง	แก้ไข
M	R651500001	ป.15-06(65)	1 - งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย	งานใหม่	1 - Case 1 : งานก่อสร้าง	17/03/65	0+0.000 - 10+0.000	09:00 - 16:00	นายชัชชัย ทดสอบ -00200034	ยังไม่ออกตรวจงาน	
C	R651500002	ป.15-06(65)	1 - งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย	งานใหม่	1 - Case 1 : งานก่อสร้าง	17/03/65	0+0.000 - 10+0.000	09:00 - 16:00	นายชัชชัย ทดสอบ -00200034	รอการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน	

ระบบบริหารจัดการงานทางท่อ  
Pipeline Management System - PMS

26 มิถุนายน 2566 เวลา 11:31:32 น.

นายผู้คุมงานทดสอบ ทดสอบ

208 - รายละเอียดสัญญา/เส้นทาง

← กลับหน้าหลัก

เลขที่สัญญา	เส้นทาง	ผู้รับเหมา	ประเภทสัญญา	ช่วงวันที่	จำนวนวันที่เหลือ	มูลค่า	เบิกเงินแล้ว	%	ผู้คุมงาน	สถานะสัญญา
ป.15-06(65)	3 เส้นทาง	00200034 - บริษัท ที.ที.พี. อี.ที.พี. จำกัด	สัญญาปกติ	-	-	7,999,747.00	0	0	นายจิตติพงษ์ รัตมิต	สร้างสัญญา
-	1 - งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย					2,765,044.00				
-	2 - งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย					4,133,147.00				
-	3 - งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย					1,100,492.00				

2

☒ สรุปต่างเส้นทาง  
☒ ประเมินการ  
☒ กระดาษทด  
☒ บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน  
☒ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
☒ รายงานการสรุปผลการก่อสร้าง  
☒ P1  
☒ P2  
☒ ประเมิน 3 มิติ  
☒ สืบค้นแบบประเมิน 3 มิติ  
☒ ใบแจ้งเตือน

ระบบบริหารจัดการงานทางท่อ  
Pipeline Management System - PMS

26 มิถุนายน 2566 เวลา 09:52:11 น.

นายผู้คุมงานทดสอบ ทดสอบ

241 - แสดงรายการประเมินของสัญญา

เลขที่สัญญา

ป.15-06(65)

3

+ เพิ่มการประเมินใหม่

ประเมินครั้งที่	ช่วงวันที่	ผลแบบประเมินที่ 1	ผู้บันทึก
1	-		นายผู้คุมงานทดสอบ
2	-		นายผู้คุมงานทดสอบ

ระบบบริหารจัดการงานทางท่อ  
Pipeline Management System - PMS

26 มิถุนายน 2566 เวลา 09:52:11 น.

นายผู้คุมงานทดสอบ ทดสอบ

242 - รายละเอียดและผลการประเมิน (แบบประเมินที่ 1)

เลขที่สัญญา

ป.15-06(65)

ผู้รับจ้าง

การประเมิน

☐ ระหว่างก่อสร้าง  
☐ เริ่มงาน-งานเสร็จ

ประเมินจากวันที่

26/06/2566

4

บันทึก

ระบบบริหารจัดการงานทางท่อ  
Pipeline Management System - PMS

26 มิถุนายน 2566 เวลา 09:52:11 น.

นายผู้คุมงานทดสอบ ทดสอบ

241 - แสดงรายการประเมินของสัญญา

เลขที่สัญญา

ป.15-06(65)

3

+ เพิ่มการประเมินใหม่

ประเมินครั้งที่	ช่วงวันที่	ผลแบบประเมินที่ 1	ผู้บันทึก	วันที่ประเมิน
1	-		นายผู้คุมงานทดสอบ ทดสอบ	26/06/2566 11:27
2	-		นายผู้คุมงานทดสอบ ทดสอบ	26/06/2566 11:27
3	-		นายผู้คุมงานทดสอบ ทดสอบ	26/06/2566 11:32
4	-		นายผู้คุมงานทดสอบ ทดสอบ	28/06/2566 14:29
5	-		นายผู้คุมงานทดสอบ ทดสอบ	28/06/2566 14:30
6	-		นายผู้คุมงานทดสอบ ทดสอบ	28/06/2566 14:31

5

แก้ไข

ขอบคุณครับ
