

# ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ

รายงานผลดำเนินการประจำเดือน





FEB 2024



# งานสำรวจหาท่อรั่วในท่อประธาน (ALC)

## แผนที่แสดงสมดุลน้ำ(Water Balance) ท่อประธาน

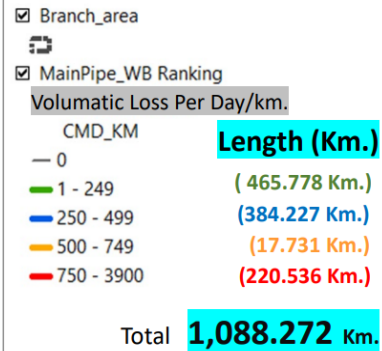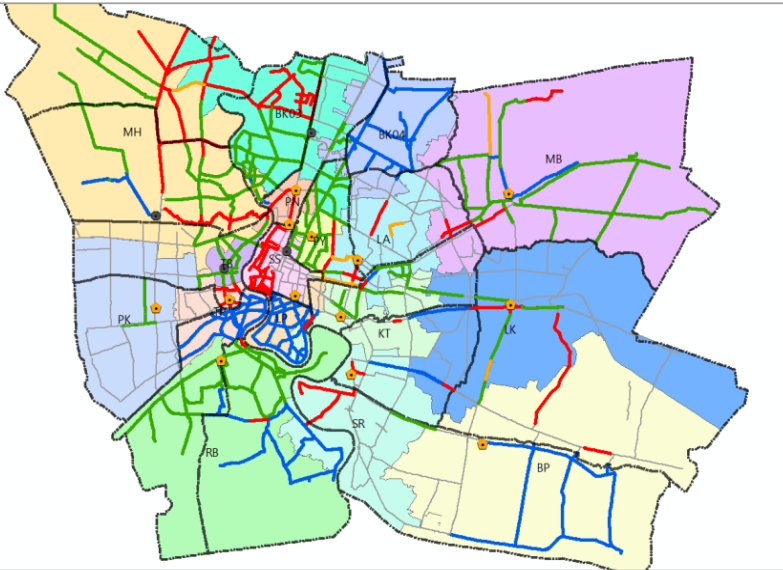

## ALC-MAIN PIPE LENGTH INSPECTION 2567 (KM.)

ระยะทางสำรวจหาท่อรั่ว (มค.67)


- 1.) กปน.ดำเนินการเอง 82.30 กม.
- 2.) สำรวจเทคโนโลยีใหม่ จท.75/2565 2.00 กม.
- 3.) ข้างเอกชนสำรวจท่อรั่ว จท.(ฝคจ) 8/2567 4.00 กม.

**ระยะทางรวมใน มค.67 คือ 88.30 กม.**



**จำนวนจุดรั่วท่อประธานที่ระบุได้ในเดือน**  
**มกราคม 2567 “6 จุด” ความยาวท่อประธาน**  
**สำรวจได้ในเดือน “88.30 กิโลเมตร”**

## ปริมาณน้ำสูญเสียสะสมในระบบท่อประธานที่ลดลงได้ประจำปีงบประมาณ 2567 (ลูกบาศก์เมตร)

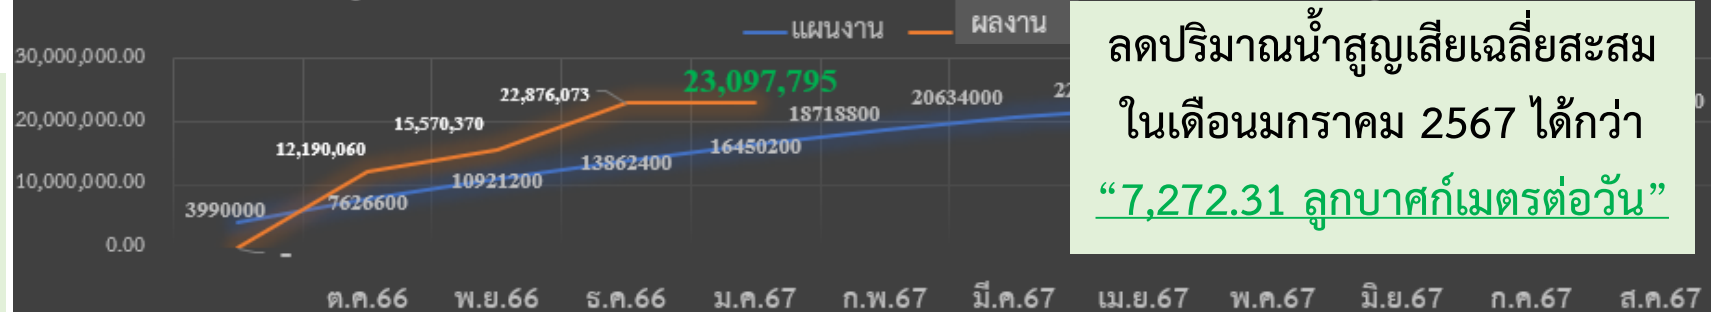


**ลดปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยสะสม**  
**ในเดือนมกราคม 2567 ได้กว่า**  
**“7,272.31 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน”**

แผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6

รหัส - ชื่อโครงการ	แผนงาน	ปี 67		ปี 68		ปี 69		ปี 70	
SO1-T3-P1 โครงการปรับปรุงท่อประปา	แผนงานที่ 1 : งานสำรวจท่อประธานแตกรั่ว	540	20	540	20	540	20	540	20

ผลดำเนินการซ่อมท่อประชาชนประจำปีงบประมาณ 2567

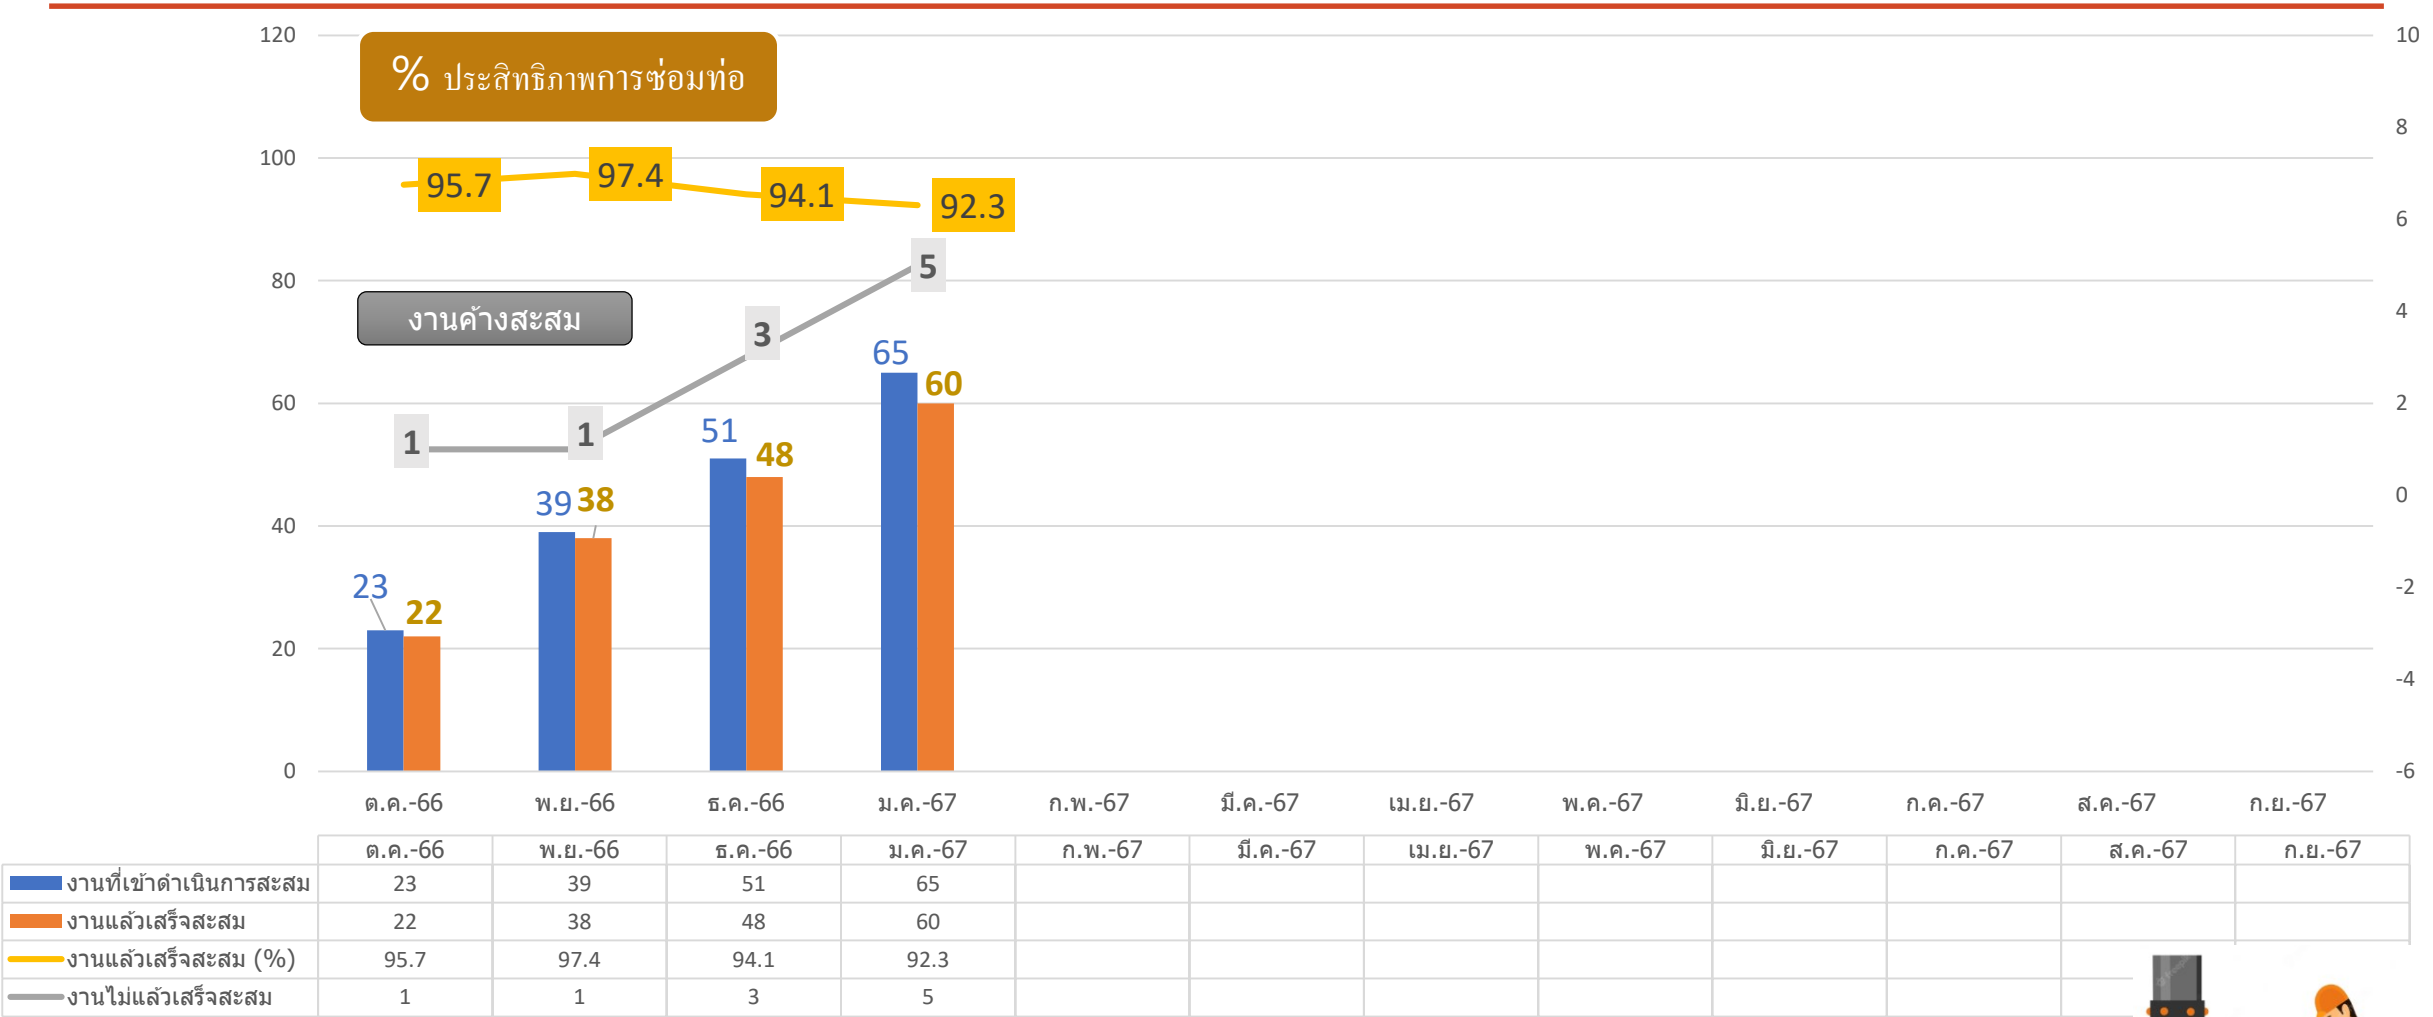

ข้อมูลล่าสุด 7 กพ. 67

■ งานที่เข้าดำเนินการสะสม   ■ งานแล้วเสร็จสะสม   — งานแล้วเสร็จสะสม (%)   — งานไม่แล้วเสร็จสะสม




# สถิติตามประเภทงานซ่อมรายเดือน

## (งานที่ค้งค้าง)

เลขงาน	พิกัดจุดงาน	พื้นที่สาขา	วันที่เริ่มเข้าดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
Job 46/67	ท่อ600 ถนนวิภาวดีขาออก ตรงข้าม สรง ประภา	สสข	14 ธ.ค. 66	-ท่อ600 cross (ยกเลิกการใช้งาน) รั่ว -ทำเรื่องขออนุญาต เข้าพื้นที่/ก่อสร้าง -รอกการอนุญาตเข้าพื้นที่ -กצר.เข้าสร้างหลุมงานเอง ประมาณ ปลาย ก.พ. 67
Job 52/67	ท่อ 1200 ST ถนนสาทรเหนือตัดถนนศาลา แดง หน้าร้านKFC	สสท	28 ธ.ค.66	-ท่อรั่วรอยเชื่อมต่อท่อ -ซ่อมจุดรั่วด้วยการเชื่อมภายในท่อ โดยนักประดาน้ำ แล้ว 2 ครั้ง(เหลือเข้าดำเนินการอีก 2 ครั้ง) -คาดการณ์ ซ่อมจุดรั่วแล้วเสร็จ 2 มี.ค. 67
Job 62/67	ท่อ1200จุดงานหน้า รร พินุลประชาสรรค์ อุโมงค์ดินแดง	สสญ	21 ม.ค. 67	-น้ำรั่วขึ้นผิวจราจร (แนวท่อ1200) / นำเข้าสัญญาก่อสร้าง หลุมงาน -พจร.กำลังสร้างหลุมงาน คาดแล้วเสร็จ 8 /2/2567 -เข้าสำรวจ+ซ่อมโดยนักประดาน้ำ ประมาณ 13/2/2567
Job 63/67	ท่อ 1000 st หน้า สน.สุทธิสาร ถนนรัชดาฯ	สสญ	25 ม.ค. 67	-สำรวจพบจุดรั่วโดย ALC // นำเข้าสัญญาก่อสร้างหลุม งาน -พจร. ก่อสร้างบ่อแล้วเสร็จ 1/2/67 -กำหนดเข้าซ่อมโดยนักประดาน้ำ 6/2/67



# ผลการดำเนินงานบริหารแรงดันน้ำ 162 จุด ปีงบประมาณ 67

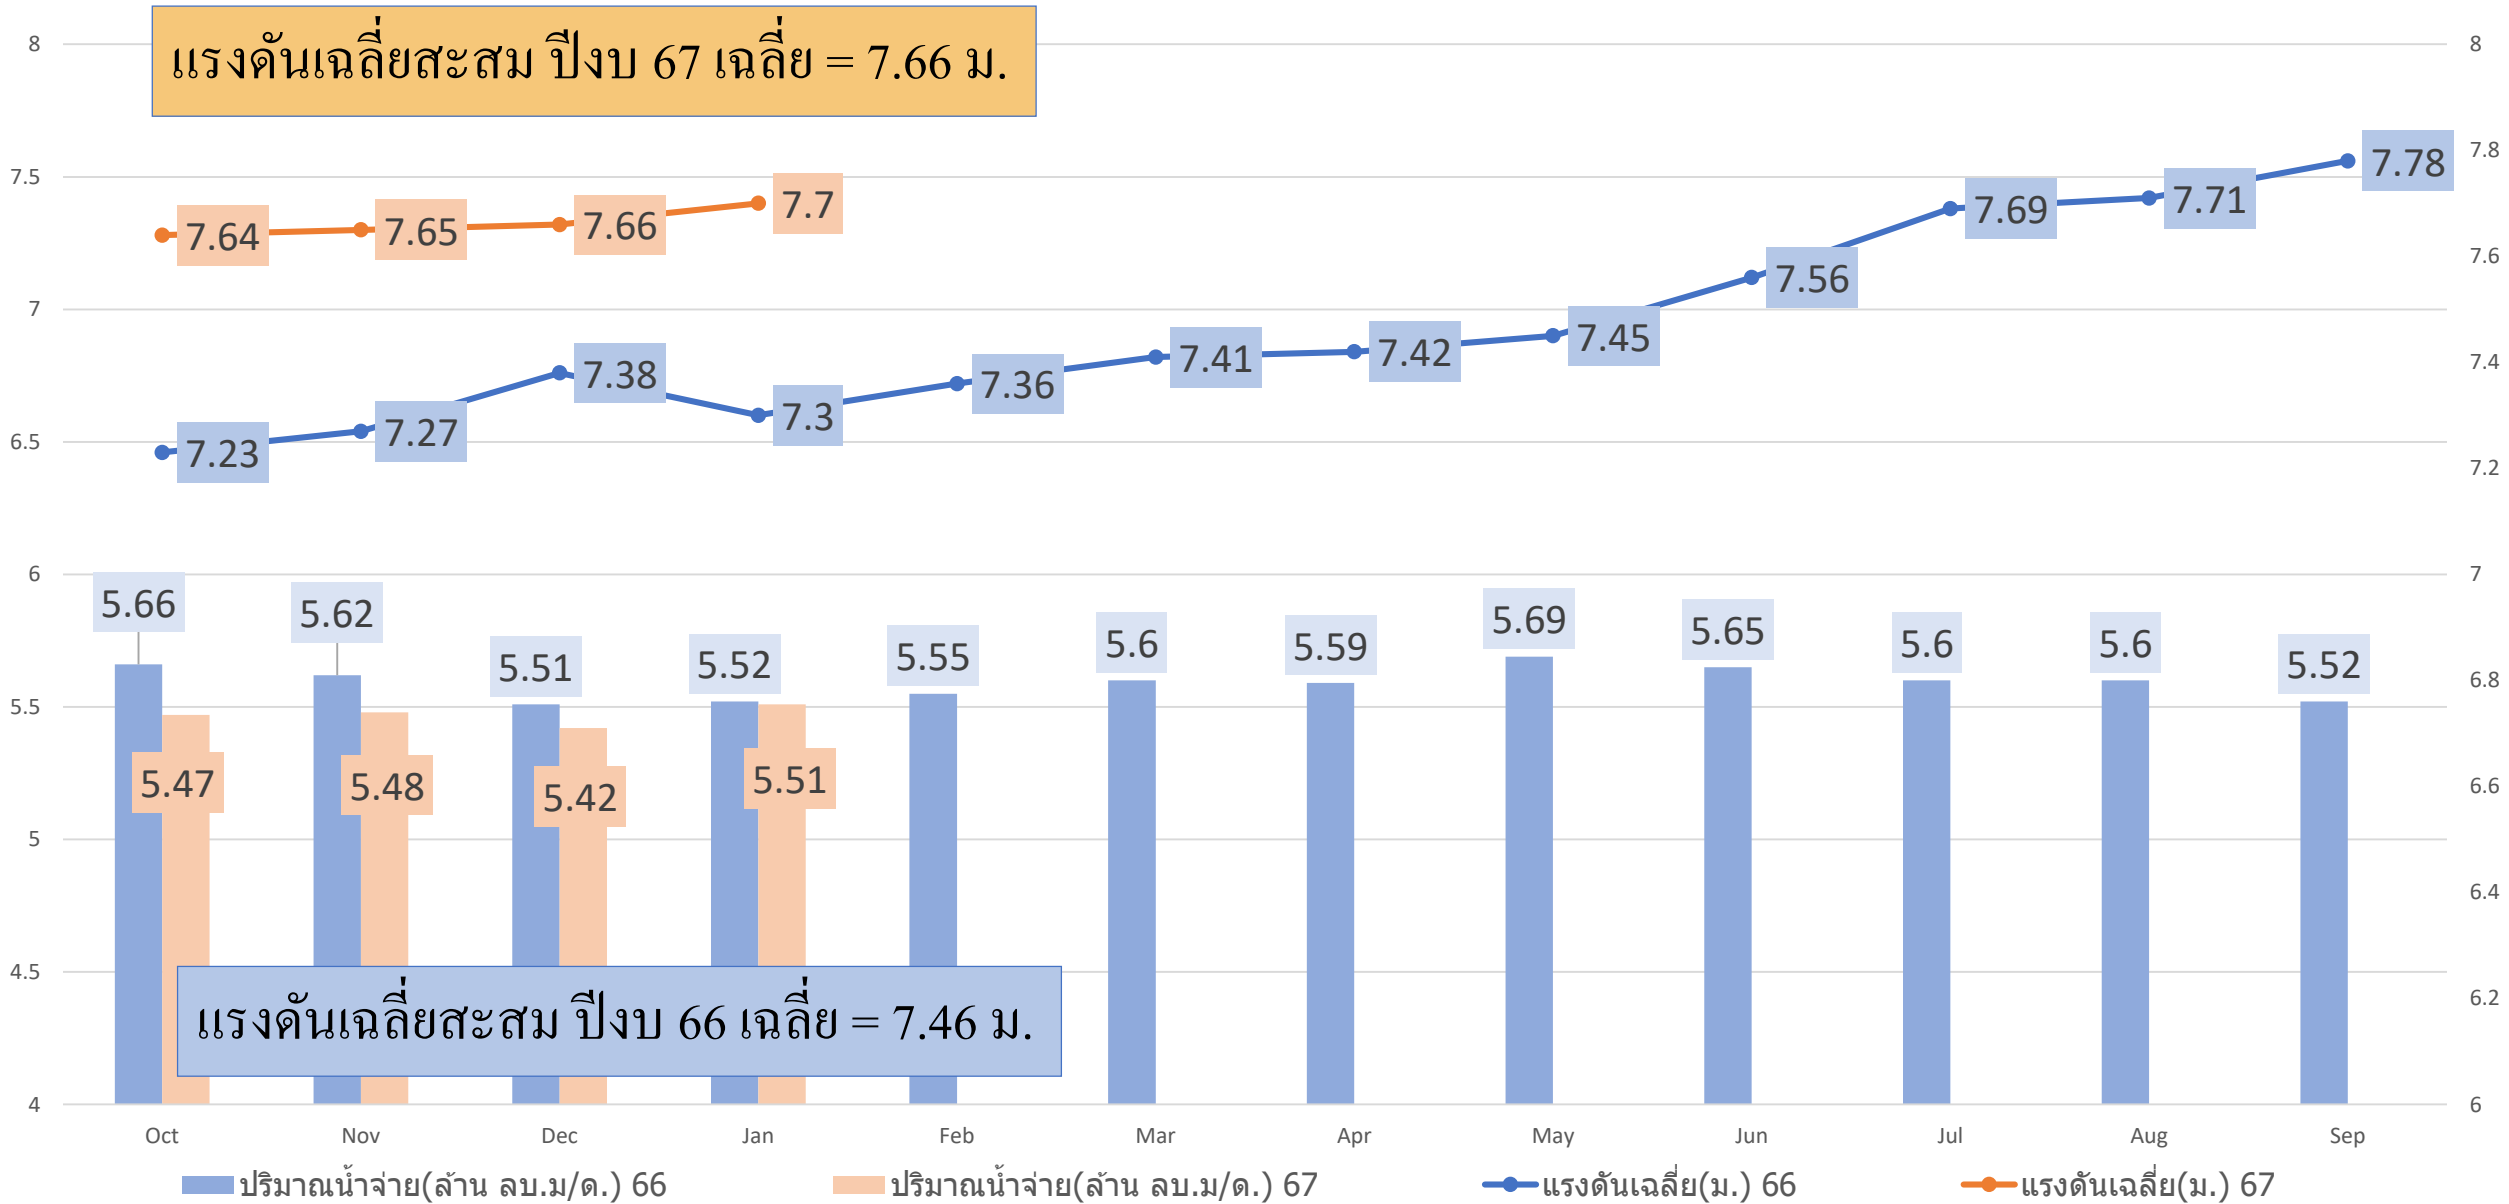



# จบการนำเสนอ
