

ระบบติดตามความก้าวหน้างานโครงการหมู่บ้านจัดสรร

การประชุมสายงานบริการด้านตะวันตกและบริการด้านตะวันออก
ครั้งที่ 4/2567

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.



ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา

<https://davis.mwa.co.th>

- โดย คณะทำงานด้านบำรุงรักษาของสำนักงานประปาสาขา



รายงานติดตามงานติดตั้งประจำปีโครงการหมู่บ้านจัดสรร

ข้อมูล ณ วันที่

9/4/2024

โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

สะสมถึงเดือนนี้

0.47%

สะสมถึงเดือนก่อน

0.36%




เฟสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

สะสมถึงเดือนก่อน

5.29%

สะสมถึงเดือนนี้

7.79%

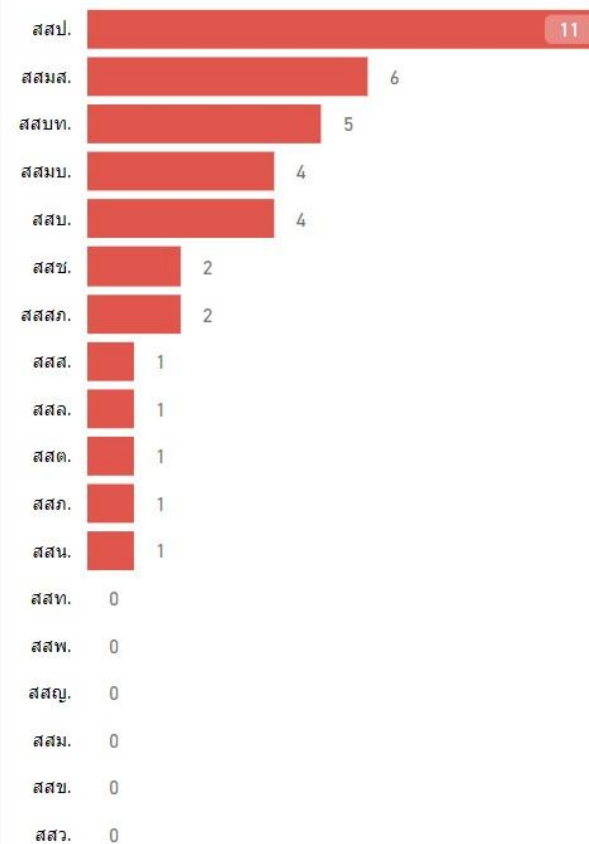

ปี

ทั้งหมด

สายงาน

ทั้งหมด

ภาค

ทั้งหมด

สาขา

ทั้งหมด

โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

หมายถึง

1 โครงการที่ไม่ **UPLOAD**
MASTER PLAN FILE

ในระบบ CIS

2 โครงการที่ไม่ **UPLOAD**
PROGRESS FILE

ในระบบ CIS

ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ

เฟสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หมายถึง

1 เฟสที่ไม่ **UPLOAD** แบบแปลนงาน
วางท่อรายเฟส

ในระบบ CIS

2 เฟสที่ไม่ **อัปโหลด** แผนงาน
ในระบบ CIS

ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ

DateTH

1/10/2559

31/3/2567

รายเฟส

เจ้าของโครงการ (ราย)

652

จำนวนเฟสทั้งสิ้น

5,988

ระหว่างดำเนินการ

680

ข้อมูลไม่ครบ

53

ไม่ครบถ้วน (%)

7.79%

ปี

ทั้งหมด

สายงาน

ทั้งหมด

ภาค

ทั้งหมด

สาขา

ทั้งหมด

จำนวนเฟสแยกสายงาน


รวม(กค)

3,459

รวม(กค)

2,529


จำนวนเฟสที่ข้อมูลไม่ครบ

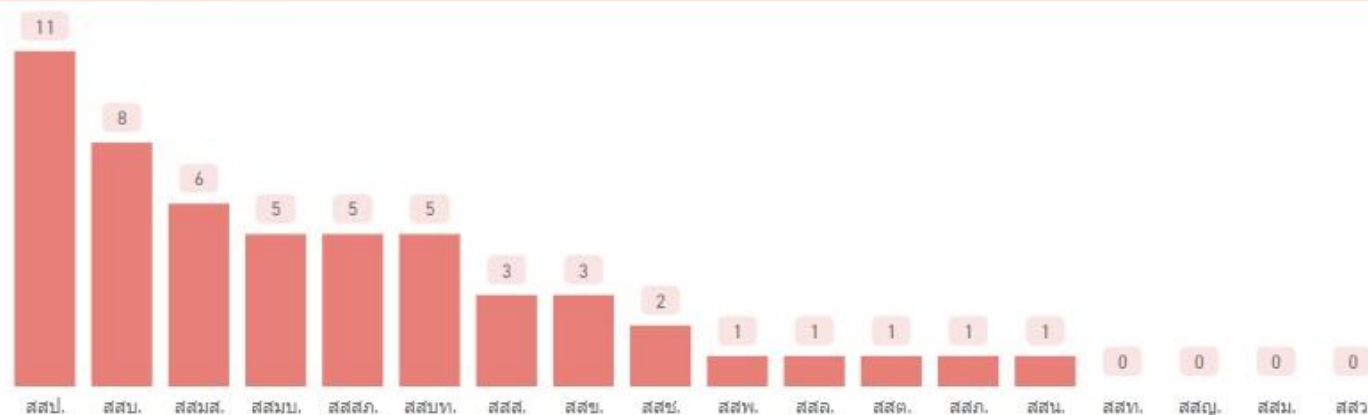

ชื่อเฟส

เลขที่สำรอง	เฟส	แผนงาน	แบบวางท่อ
679999073100	คิวเรเตอร์-ศรีนครินทร์-เทพารักษ์ 96-เฟส 2.0	✗	✗
679999072919	CHAIYAPRUEK พระราม2 (ระยะ 1) ถนน อนามัยงามเจริญ-	✓	✗
679999072906	MANATANA ปิ่นเกล้า-สาย3-เฟส 2.0	✗	✗
679999072848	สิววรรณ เนเจอร์ พลัส (บางปู 104)-เฟส 0.1	✗	✗
679999072827	โครงการ แกรนด์ สิววรรณ 2 (สุขุมวิท- บางปู)-เฟส 1.0	✗	✗
679999072129	เสนาพาร์ควิลล์ 2 รามอินทรา-วงแหวน (เฟส 1.0)-	✗	✗
679999072047	ดี อาร์ทีเคิล นอร์ท ราชพฤกษ์-เฟส 1.0	✗	✗

ไม่ป้อนแผนงาน (รายเฟส)



ไม่มีไฟล์แบบวางท่อในระบบ CIS (รายเฟส)



ข้อมูล ณ วันที่

9/4/2024

สาขา

ทั้งหมด

ปี

ทั้งหมด

เลือก ปี-เดือน

ทั้งหมด

จำนวนเฟสแยกปีงบประมาณ

2567 256

2566 46

2565 8

2564 3

จำนวนเฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการ แยกตามขั้นตอน

ดำเนินการ ยื่นเรื่องวางท่อมากกว่า 1 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

0 / 0

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนยื่นเรื่องวางท่อ (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead line (วัน): 1

ระยะเวลา ยื่นเรื่องวางท่อ มากที่สุด
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

0

วันทำการ

ดำเนินการ สำรวจ ออกแบบ แঙ্গราคามากกว่า 10 วันทำ...
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

15 / 39

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอน สำรวจ ออกแบบ แ้งราคา (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

สสป. 679999035329

Dead Line (วัน): 10

35

สสมบ. 679999041127

31

สสมบ. 679999041407

30

ระยะเวลา สำรวจ ออกแบบ แ้งราคา มากที่สุด
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

35

วันทำการ

ดำเนินการ ข้าราชการมากกว่า 20 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

76 / 121

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนข้าราชการ (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead Line (วัน): 20

สสว. 649999098508

695

สสว. 649999583258

545

สสส. 659999387178

382

ระยะเวลา ข้าราชการ มากที่สุด
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

695

วัน

ดำเนินการ จัดจ้างมากกว่า 40 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

19 / 114

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนจัดจ้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead Line (วัน): 40

สสช. 669999272377

120

สสช. 669999433070

116

สสช. 669999479778

58

ระยะเวลา จัดจ้าง มากที่สุด
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

120

วันทำการ

ดำเนินการ ก่อสร้างมากกว่า 120 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

0 / 39

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนก่อสร้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead Line (วัน): 120

สสว. 669999284726

88

สสมบ. 659999574170

86


สสน. 669999393369

86

ระยะเวลา ก่อสร้าง มากที่สุด
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

88

วัน

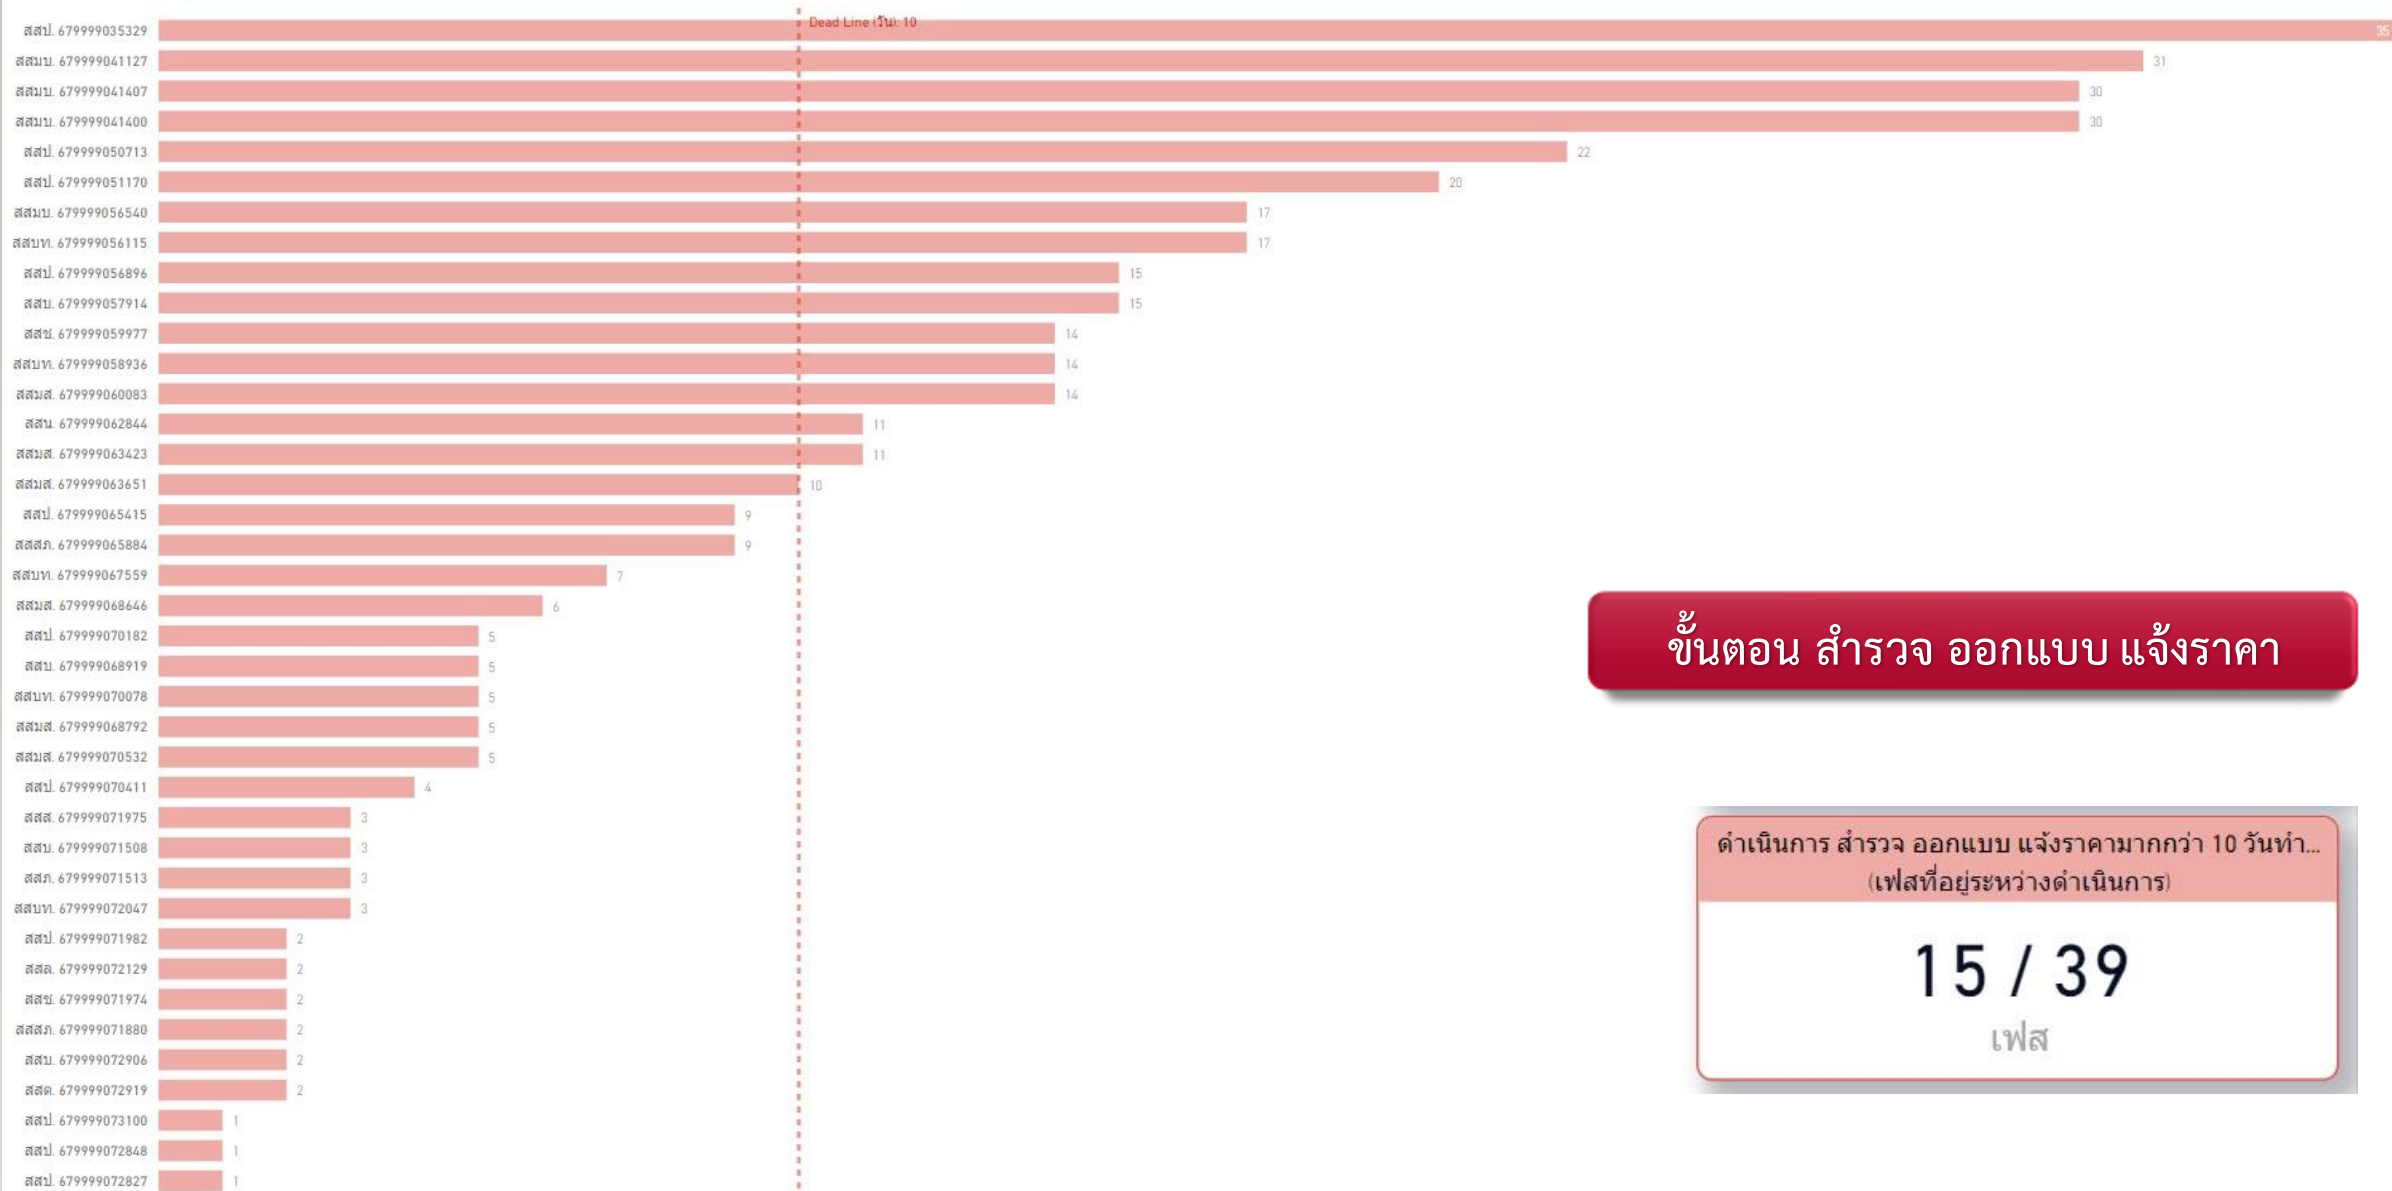


ขั้นตอน สํารวจ ออกแบบ แ้จรงราคา

ดำเนินการ สํารวจ ออกแบบ แ้จรงราคามากกว่า 10 วันทำ...
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

15 / 39


เฟส

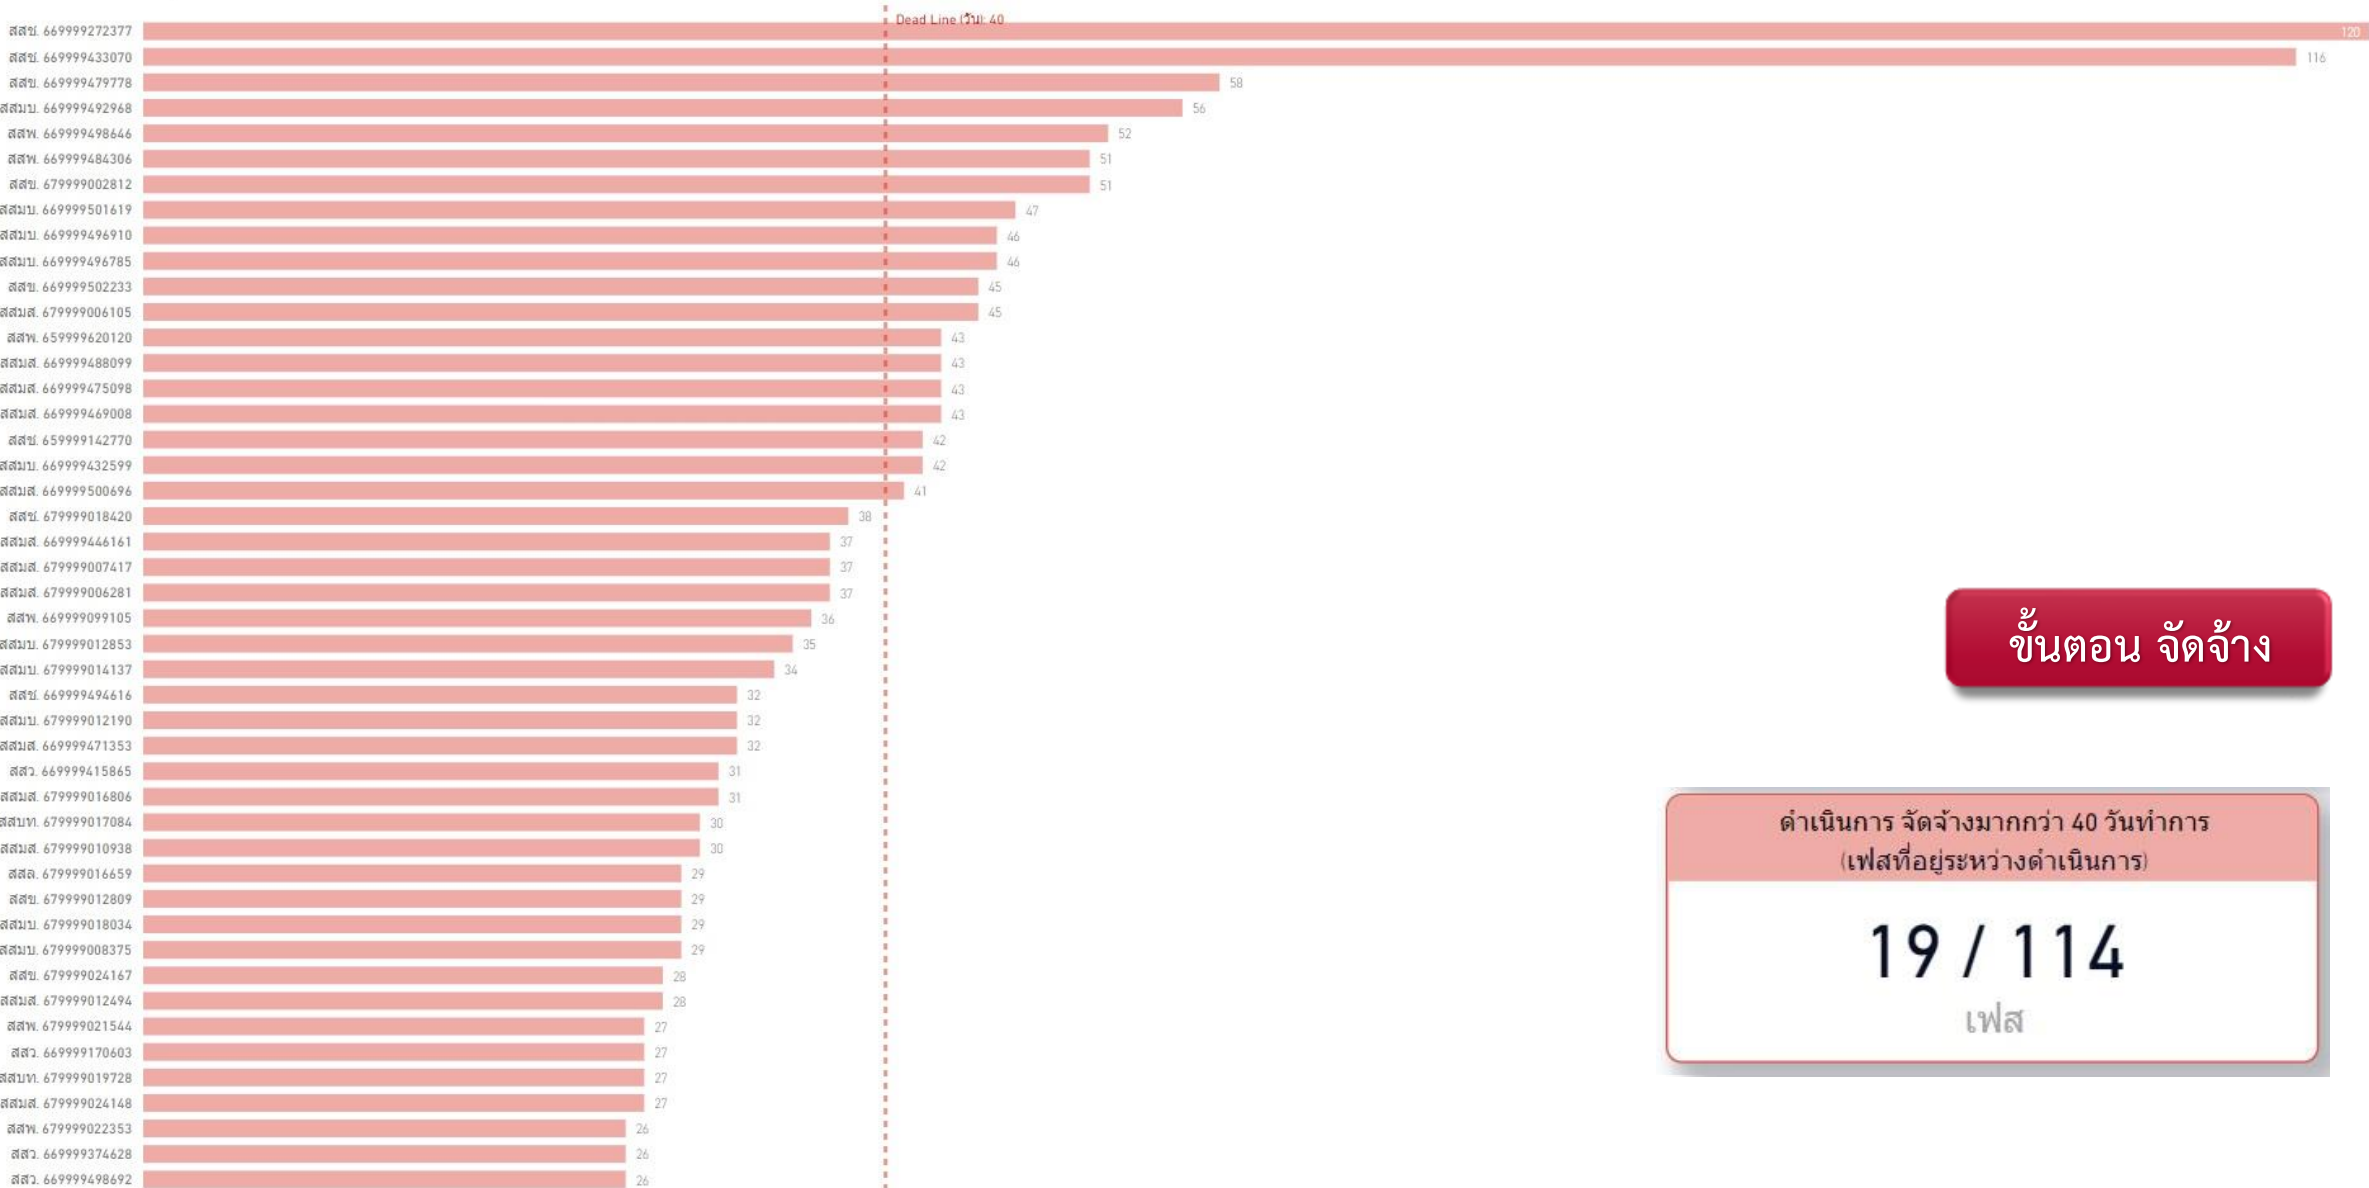

ขั้นตอน จัดจ้าง

ดำเนินการ จัดจ้างมากกว่า 40 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

19 / 114
เฟส

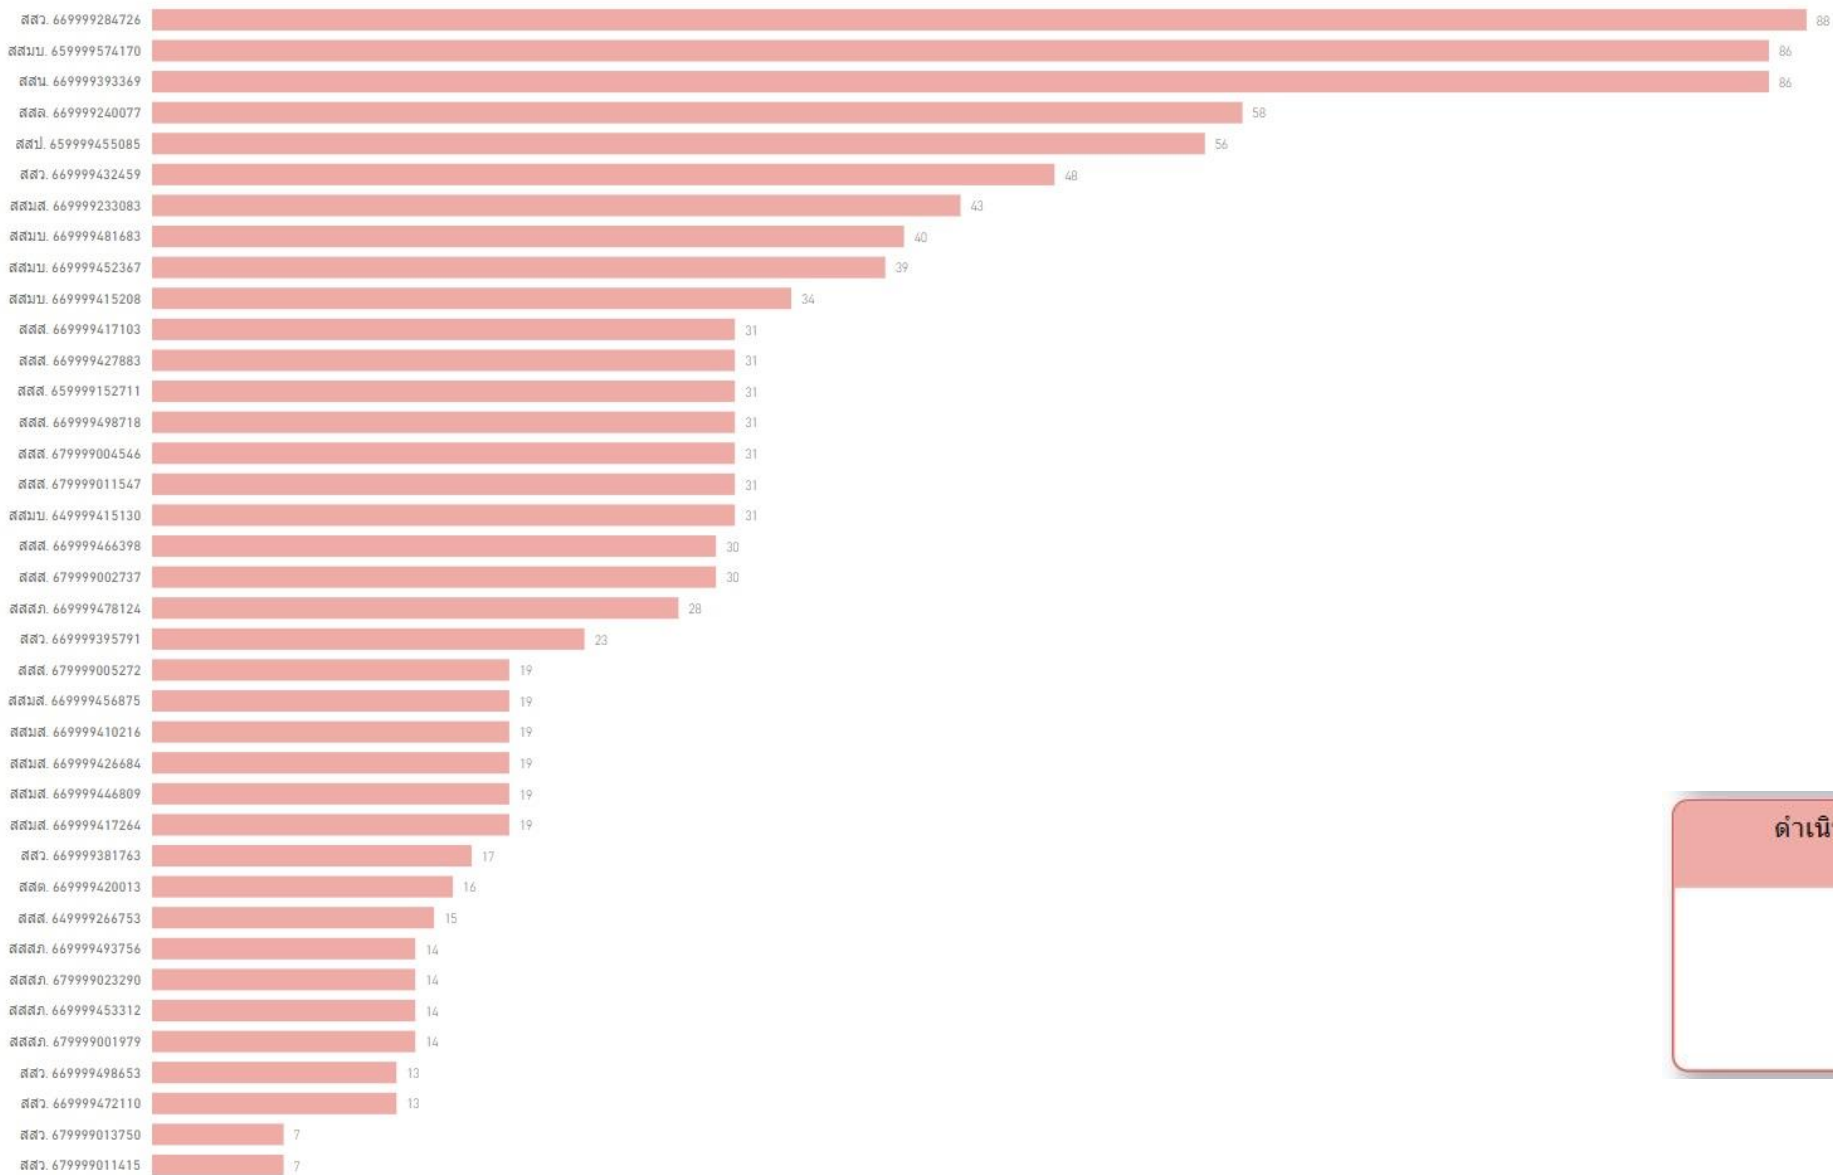

Dead Line (วัน): 120

ขั้นตอน ก่อสร้าง

ดำเนินการ ก่อสร้างมากกว่า 120 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

0 / 39

เฟส

สาขา

ทั้งหมด

ปี

2567

ระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอน

ข้อมูล ณ วันที่

9/4/2564

1 ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง



(2) มากกว่า 1 วันทำ... 32

รวม (เฟส)

536

2 สำรวจ ออกแบบ ประเมินการ



(2) มากกว่า 10 วันทำ... 248

รวม (เฟส)

480

3 ขั้นตอน ชำระเงิน



(2) มากกว่า 20 วันทำ... 60

รวม (เฟส)

378

4 จัดจ้าง



รวม (เฟส)

218

5 ขั้นตอน ก่อสร้างวางท่อ



รวม (เฟส)

52

จบการนำเสนอ

