

# ระบบติดตามความก้าวหน้างานโครงการหมู่บ้านจัดสรร

---

การประชุมสายงานบริการด้านตะวันตกและบริการด้านตะวันออก  
ครั้งที่ 6/2567

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.



ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา

<https://davis.mwa.co.th>

- โดย คณะทำงานด้านบำรุงรักษาของสำนักงานประปาสาขา



# รายงานติดตามงานติดตั้งระบบโครงการหมู่บ้านจัดสรร

ข้อมูล ณ วันที่

6/12/2024

## โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

สะสมถึงเดือนนี้  
**0.23%**

สะสมถึงเดือนก่อน  
0.00%

ปี

All

สายงาน

All

ภาค

All

สาขา

All

### โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

หมายถึง

1 โครงการที่ **ไม่ UPLOAD**  
**MASTER PLAN FILE**

ในระบบ CIS

2 โครงการที่ **ไม่ UPLOAD**  
**PROGRESS FILE**

ในระบบ CIS

ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ



## ไฟล์ที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

สะสมถึงเดือนก่อน  
0.83%

สะสมถึงเดือนนี้  
**8.12%**



### ไฟล์ที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หมายถึง

1 ไฟล์ที่ **ไม่ UPLOAD** แบบแปลนงาน  
วางท่อรายไฟล์

ในระบบ CIS

2 ไฟล์ที่ **ไม่ป้อนแผนงาน**

ในระบบ CIS

ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ

DateTH

10/1/2559

3/31/2567

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประจำ <https://davis.mwa.co.th>

# รายเฟส

เจ้าของโครงการ (ราย)

666

จำนวนเฟสทั้งสิ้น

6,139

ระหว่างดำเนินการ

751

ข้อมูลไม่ครบ

61

ไม่ครบถ้วน (%)

8.12%

ปี  
All

สายงาน  
All

ภาค  
All

สาขา  
All

จำนวนเฟสแยกสายงาน

รวม(กอ)

3,541


รวม(กค)

2,598

ชื่อเฟส

เลขที่สำรอง	เฟส	แผนงาน	แบบวางท่อ
679999130462	The Pavilion-เฟส 2.0	✗	✗
679999130453	ฉิรินทร์ ทาวน์ ราชพฤกษ์-พระราม5-เฟส 3.0	✗	✗
679999129603	PS99 Palatia Pattanakarn -เฟส 2.0	✗	✗
679999129435	บ้านพฤกษา สุขุมวิท-บางปู (2) พ.165-เฟส 11.0	✗	✗
679999129381	ซีดีเฮาส์ บางนา ก.ม.26 ถ.ปิ่นเกล้า-เฟส 4.0	✗	✗
679999129174	โครงการ พาร์ค เซอร์เทจ-เฟส 4.0	✗	✗
679999128824	โครงการสุริยวงศ-อูริทยา-เฟส 1.0	✗	✗
679999128446	พนาลี พระราม5 เวสต์เอนด์-เฟส 3.0	✓	✗
679999126878	The City บางนา 2 เฟส 2.1-	✗	✗

จำนวนเฟสที่ข้อมูลไม่ครบ

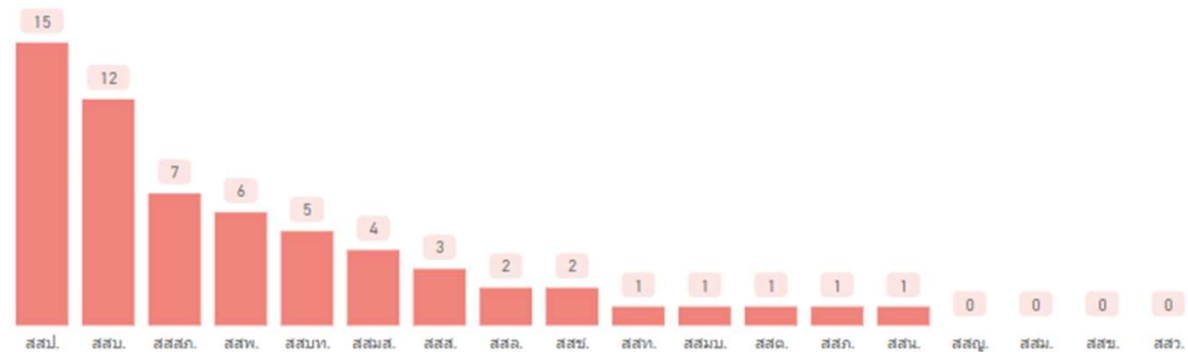

ไม่ป้อนแผนงาน (รายเฟส)



ไม่มีไฟล์แบบวางท่อในระบบ CIS (รายเฟส)



ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา <https://davis.mwa.co.th>

ข้อมูล ณ วันที่

6/12/2024

สาขา

All

ปี

All

เลือก ปี-เดือน

All

จำนวนเฟสแยกปีงบประมาณ



## จำนวนเฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการ แยกตามขั้นตอน

ดำเนินการ ยื่นเรื่องวางท่อมากกว่า 1 วันทำการ  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

0 / 0

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนยื่นเรื่องวางท่อ (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead line (วัน):

ระยะเวลา ยื่นเรื่องวางท่อ มากที่สุด  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

0

วันทำการ

ดำเนินการ สำรวจ ออกแบบ แฉ่งราคามากกว่า 10 วันทำ...  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

17 / 46

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอน สำรวจ ออกแบบ แฉ่งราคา (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

สสป. 679999070411

Dead Line (วัน): 10

43

สสป. 679999072848

40

สสป. 679999076577

37

ระยะเวลา สำรวจ ออกแบบ แฉ่งราคา มากที่สุด  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

43

วันทำการ

ดำเนินการ ข้าราชการมากกว่า 20 วันทำการ  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

68 / 119

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนข้าราชการ (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead Line (วัน): 20

734

สสว. 649999098508

สสว. 649999583258

สสส. 659999387178

584

421

ระยะเวลา ข้าราชการ มากที่สุด  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

734

วัน

ดำเนินการ จัดจ้างมากกว่า 40 วันทำการ  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

12 / 81

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนจัดจ้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead Line (วัน): 40

66

สสนท. 679999019728

สสนท. 679999023036

สสนท. 679999028140

65

61

ระยะเวลา จัดจ้าง มากที่สุด  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

66

วันทำการ

ดำเนินการ ก่อสร้างมากกว่า 120 วันทำการ  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

0 / 71

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนก่อสร้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead Line (วัน): 120

97

สสล. 669999240077

สสว. 669999432459

สสมส. 669999233083

87

82

ระยะเวลา ก่อสร้าง มากที่สุด  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)


97

วัน

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา <https://davis.mwa.co.th>

< Back to report

ระยะเวลาของขั้นตอน สํารวจ ออกแบบ แจ้จราคา (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

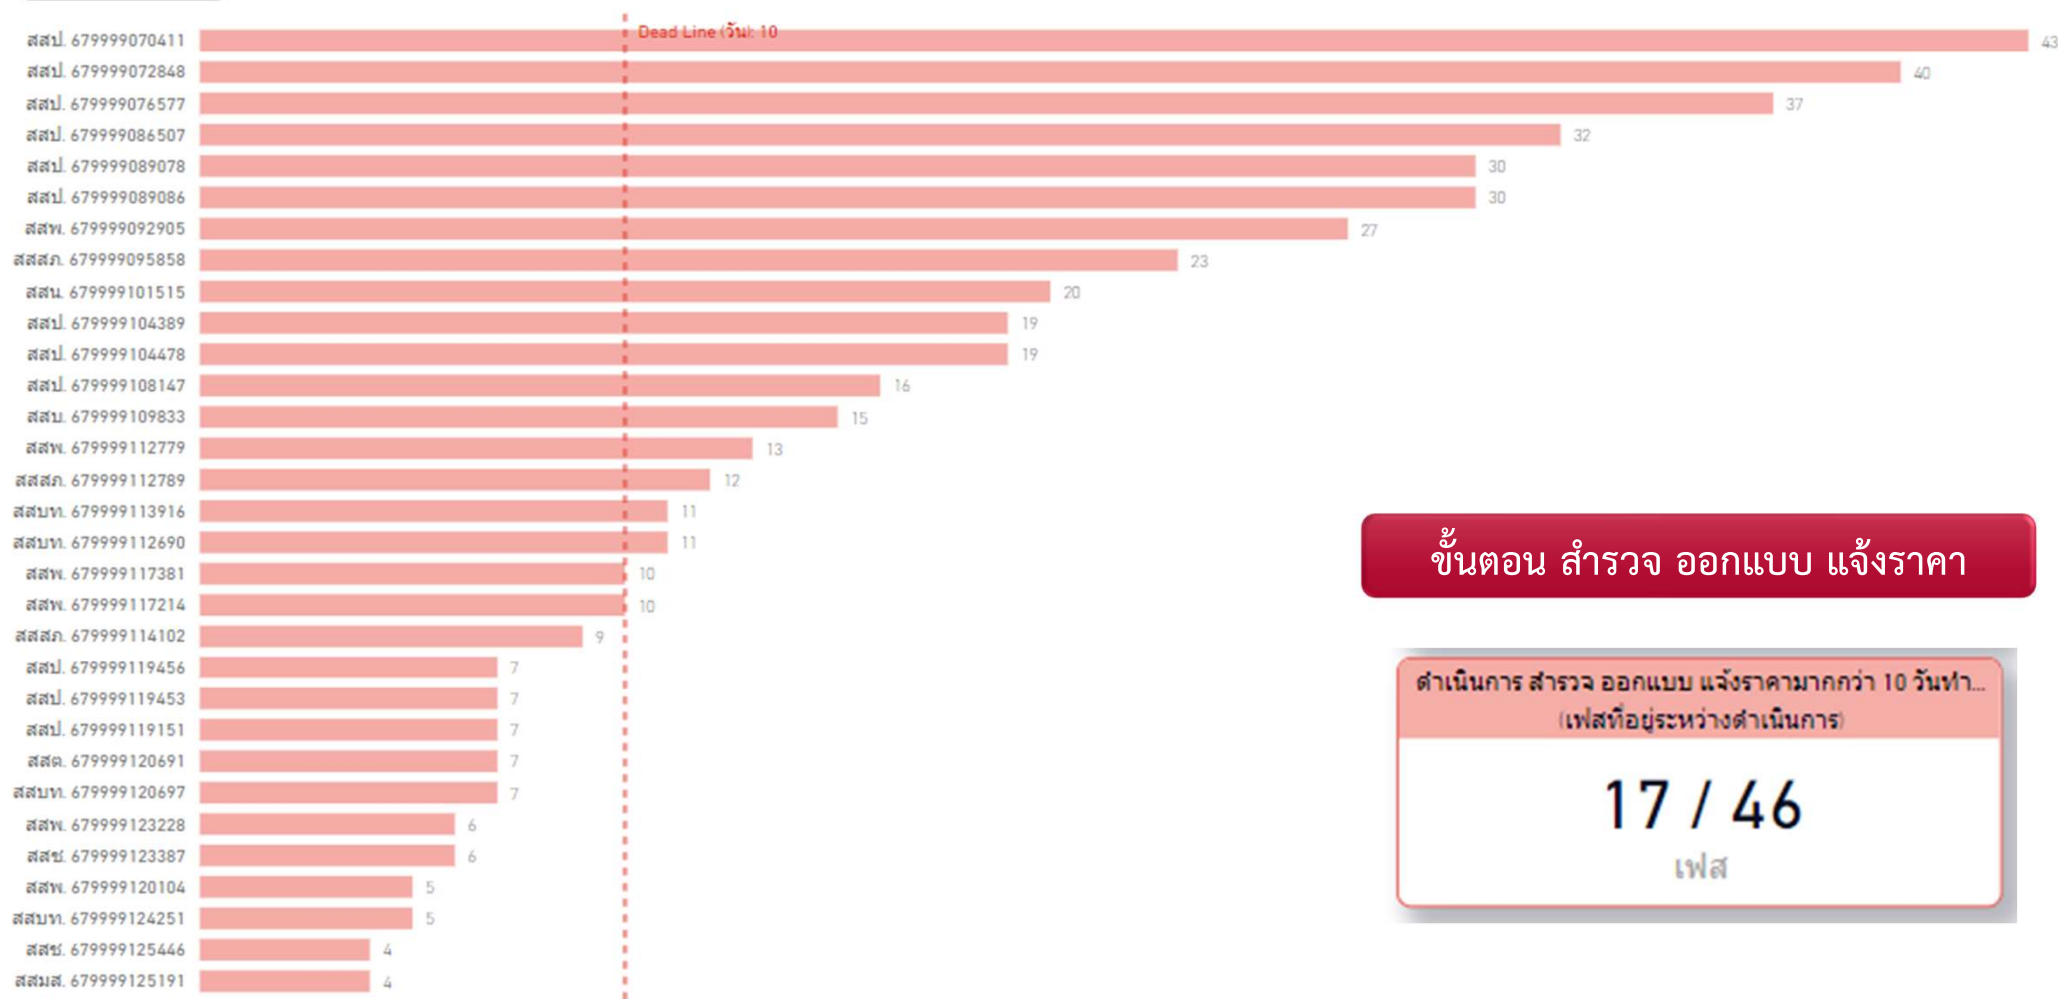

ขั้นตอน สํารวจ ออกแบบ แจ้จราคา


ดำเนินการ สํารวจ ออกแบบ แจ้จราคามากกว่า 10 วันท่า...  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

17 / 46

เฟส

< Back to report

ระยะเวลาของขั้นตอนจัดจ้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

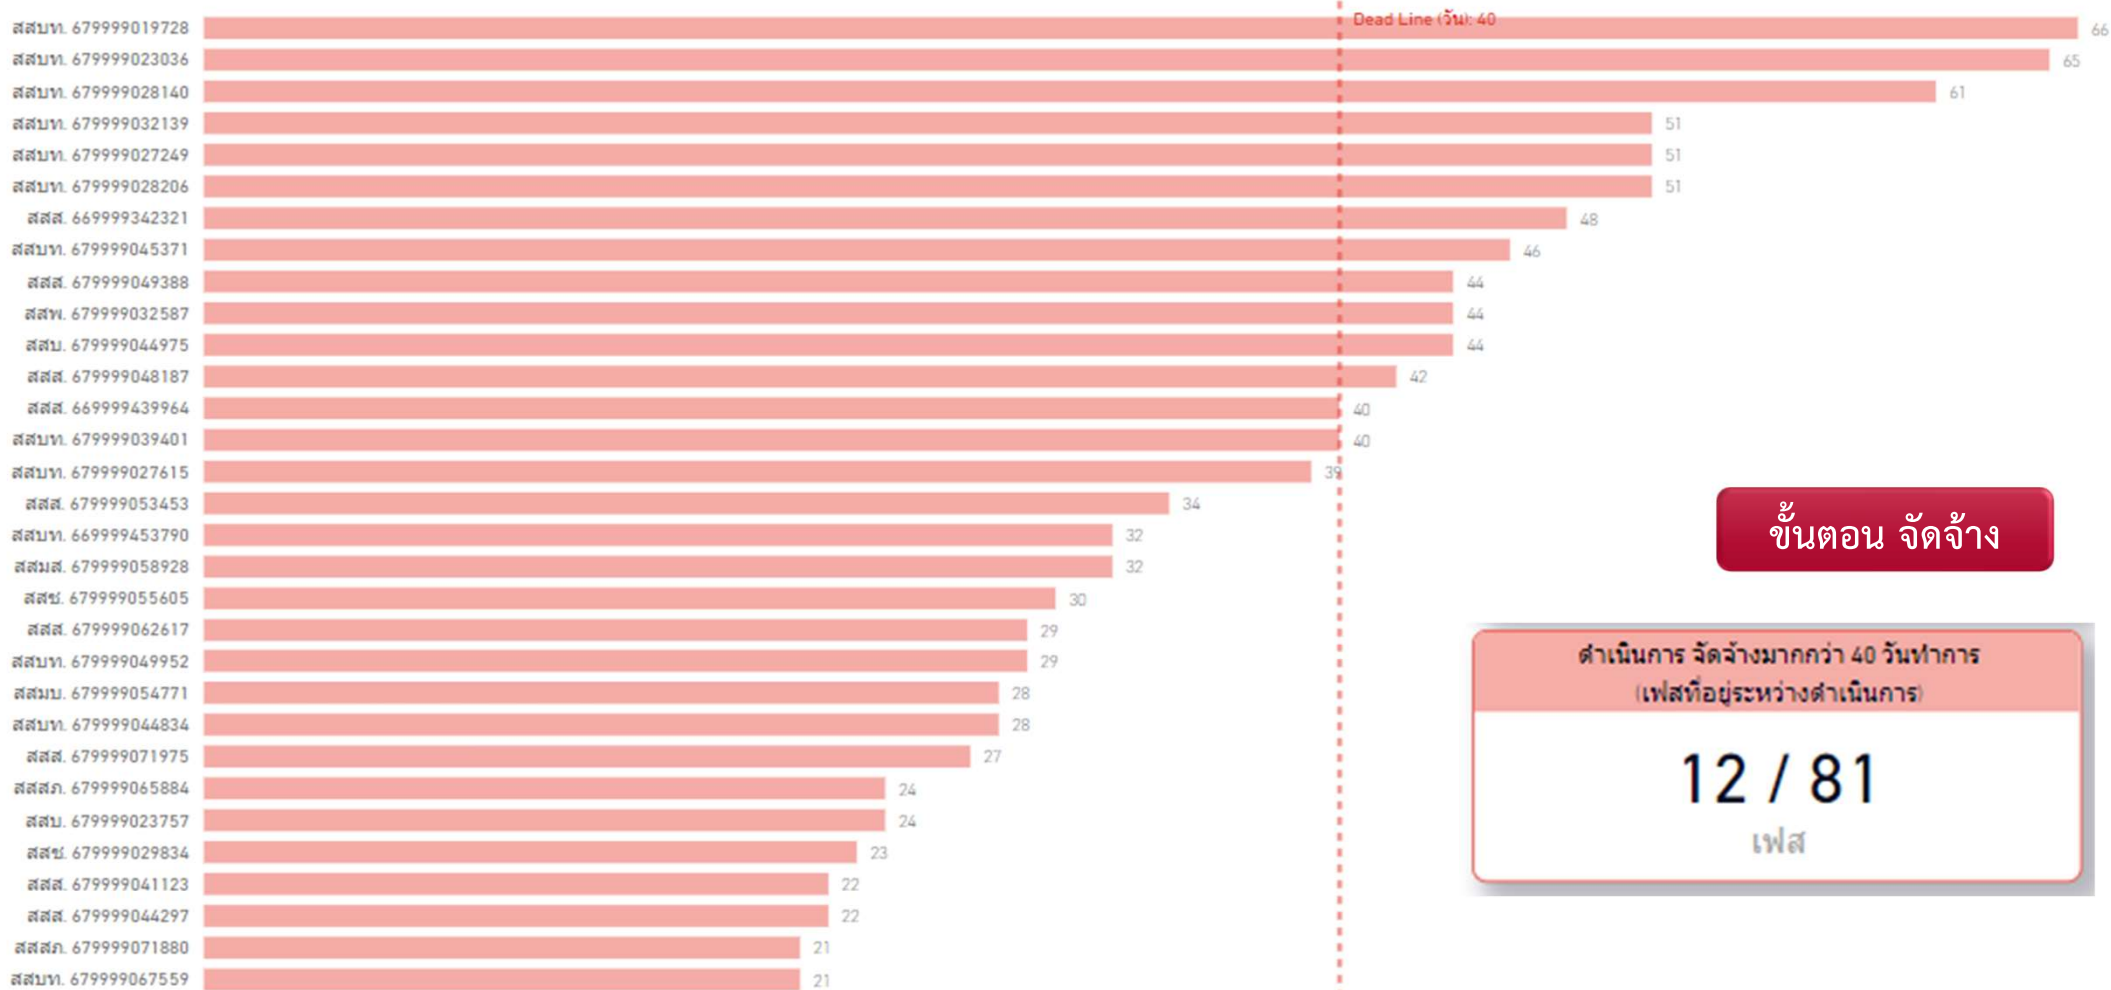

ขั้นตอน จัดจ้าง


ดำเนินการ จัดจ้างมากกว่า 40 วันทำการ  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

12 / 81

เฟส

< Back to report

ระยะเวลาของขั้นตอนก่อสร้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

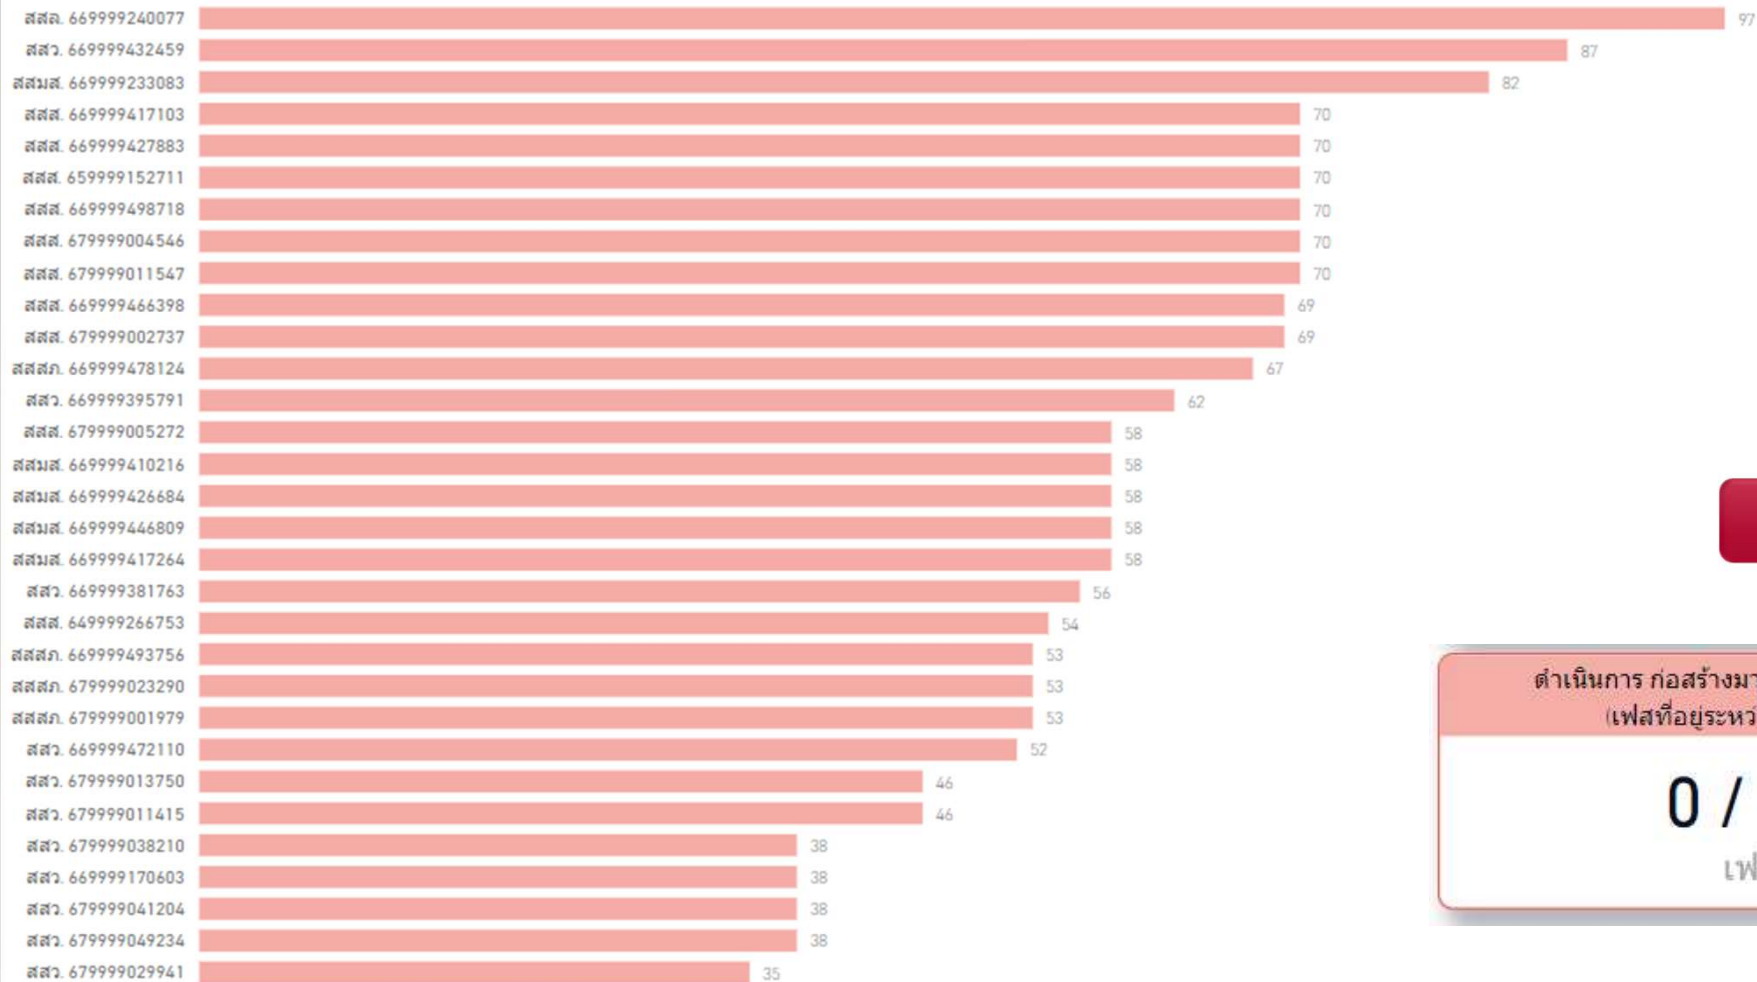

Dead Line (วัน): 120

ขั้นตอน ก่อสร้าง

ดำเนินการ ก่อสร้างมากกว่า 120 วันทำการ  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

0 / 71  
เฟส

สาขา

All

ปี

2567

## ระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอน

ข้อมูล ณ วันที่

6/12/2024

## 1 ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง

(1) ภายใน 1 วันทำการ

639

(2) มากกว่า 1 วันทำ...

49

รวม (เฟส)

688

## 2 สำรวจ ออกแบบ ประมาณการ

(2) มากกว่า 10 วันท...

307

(1) ภายใน 10 วันทำ...

313

รวม (เฟส)

620

## 3 ขั้นตอน ชำระเงิน

(1) ภายใน 20 วันทำ...

414

(2) มากกว่า 20 วันทำ...

109

รวม (เฟส)

523

## 4 จัดจ้าง

(1) ภายใน 5 วันทำก...

111

(2) 6 - 20 วันทำการ

102

(3) 21 - 40 วันทำการ

110

(4) มากกว่า 40 วันทำ...

51

รวม (เฟส)

374

## 5 ขั้นตอน ก่อสร้างวางท่อ

(1) ภายใน 1 วันทำการ

23

(2) 2 - 20 วันทำการ

25

(3) 21 - 120 วันทำการ

38

(4) มากกว่า 120 วันท...

1

รวม (เฟส)

87



การผลิตและสูบน้ำ

วิศวกรรม

การบริการ

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

การเงิน

บุคลากร

แผนและพัฒนา

## ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา



อุณหภูมิ  
35 °C



ปริมาณน้ำฝน  
30 มม.



ความชื้น  
60 %



ลม  
5 กม./ชม.

ไอโกล :

การผลิตและสูบน้ำ

1.0  
0.8  
0.6  
0.4  
0.2  
0

รายการที่ชื่นชอบ








ชื่อ

แอดมิน

ไฟล์

แอดมินที่ออกมาใหม่











































-  การผลิตและสูบน้ำ
-  วิศวกรรม
-  การบริการ
-  ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
-  การเงิน
-  บุคลากร
-  แผนและพัฒนา

## ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา

00083364  
User

แดชบอร์ดสำหรับการบริการ



★ ชื่อแดชบอร์ด	แดชบอร์ด	สารบัญข้อมูล	ดาวน์โหลด
★ รายงานติดตามงานติดตั้งประปาโครงการหมู่บ้านจัดสรร			 
★ รายงาน VOC สอบถาม แจ้งเหตุ ร้องเรียน เสนอแนะ			 
★ รายงานพยากรณ์ปริมาณน้ำ (Sell unit)			 
★ รายงานติดตามบริหารจัดการข้อร้องเรียน			 
★ รายงานสรุปการใช้งานกล้อง CIA			 
★ รายงาน Service Level Agreement : SLA มาตรฐานการให้บริการ			 
★ รายงานแรงดันน้ำ			 
★ รายงานซ่อมท่อแตก ท่อรั่ว			 
★ รายงานน้ำขายขายขอบ			 
★ รายงานภาพรวมความพึงพอใจ			 

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา <https://davis.mwa.co.th>

---

# จบการนำเสนอ

