

ผลการดำเนินงาน  
ณ วันที่ 31 พ.ค. 67

หน่วยงาน ฝ่ายสถานีสูบน้ำ

## สถานะเครื่องสูบน้ำในสถานี


| สถานีสูบน้ำ | จำนวนเครื่องสูบน้ำ | สถานะพร้อมใช้ |
|-------------|--------------------|---------------|
| KT          | 5                  | 100%          |
| SR          | 5                  | 100%          |
| LK          | 4                  | 100%          |
| MB          | 5                  | 100%          |
| BP          | 6                  | 100%          |
| LA          | 4                  | 100%          |
| LP          | 4                  | 100%          |
| PK          | 5                  | 100%          |
| TP          | 5                  | 100%          |
| RB          | 5                  | 100%          |




รายงาน

การใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละสถานีสืบจ่ายน้ำ

## ค่าพลังงาน รวม 12 สถานี (kWh)

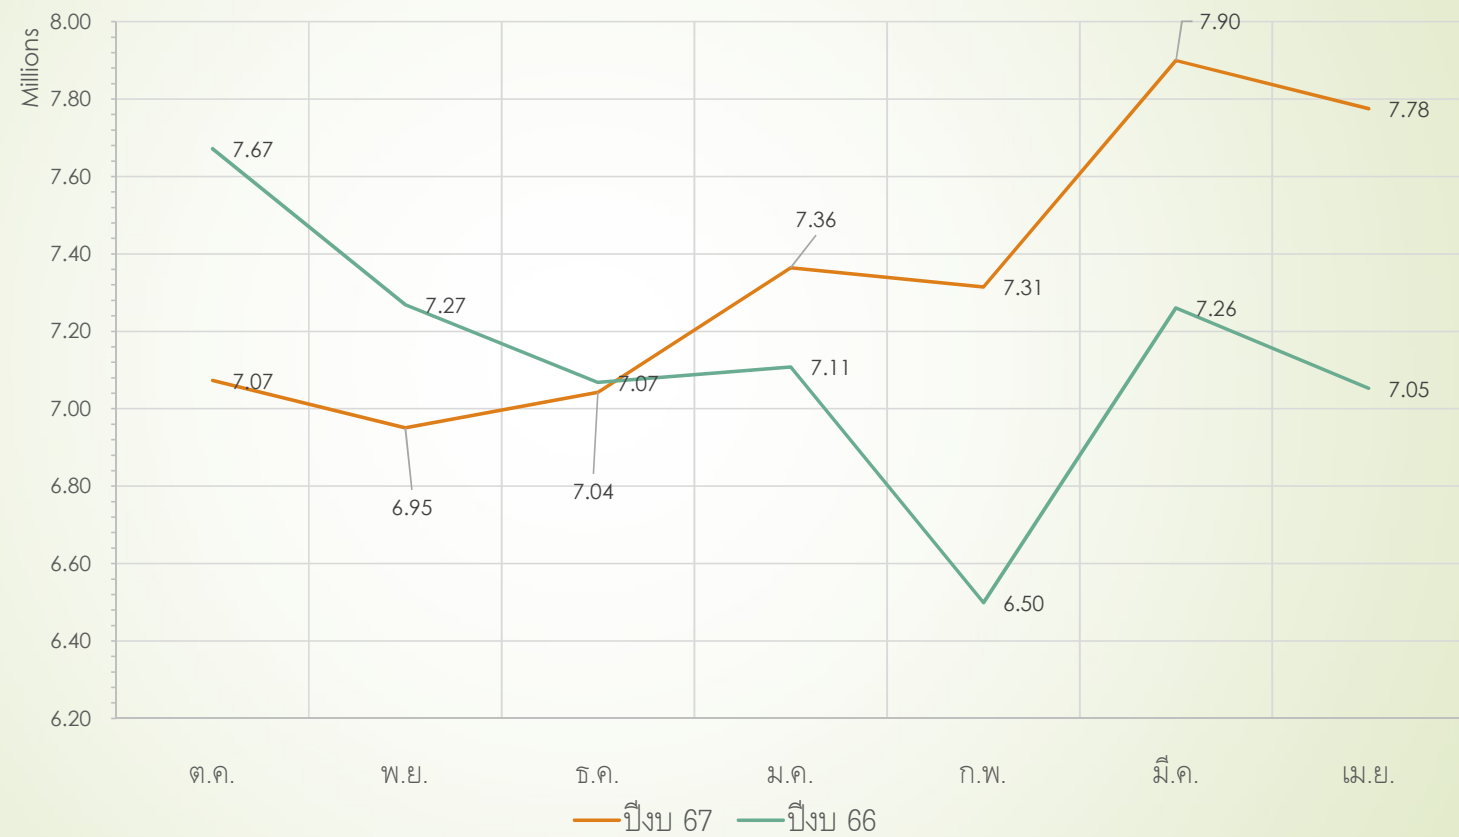

## ปริมาณน้ำส่งจ่ายรวม 12 สถานี

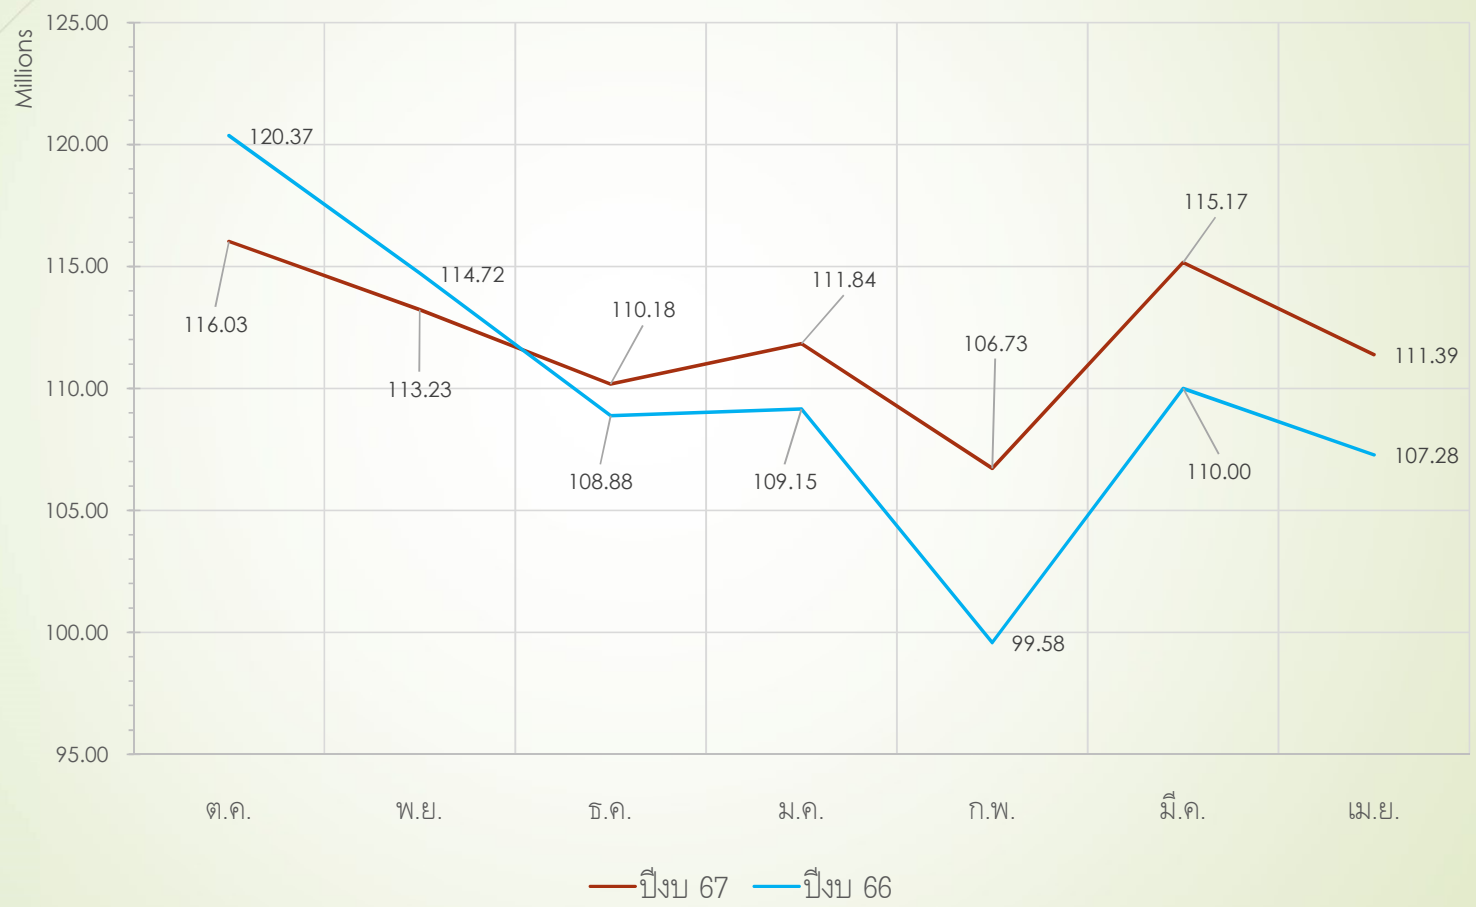

## สรุปปริมาณเครื่องปรับอากาศในสถานีสูบน้ำ

บริษัท คুমแอร์  
เข้าติดตั้ง 2 สจ.

| ที่ | สถานีสูบน้ำ | จำนวนเครื่องปรับอากาศ (ชุด) |                   | รวม |
|-----|-------------|-----------------------------|-------------------|-----|
|     |             | BTU น้อยกว่า 30,000         | 30,000 BTU ขึ้นไป |     |
| 1   | บางพลี      | 5                           | 27                | 32  |
| 2   | มีนบุรี     | 1                           | 40                | 41  |
| 3   | ลำโพง       | 3                           | 20                | 23  |
| 4   | คลองเตย     | 3                           | 14                | 17  |
| 5   | ลาดกระบัง   | 1                           | 30                | 31  |
| 6   | ลุมพินี     | 2                           | 27                | 29  |
| 7   | ลาดพร้าว    | 8                           | 24                | 32  |
| 8   | ท่าพระ      | 6                           | 18                | 24  |
| 9   | ราษฎร์บูรณะ | 3                           | 20                | 23  |
| 10  | เพชรเกษม    | 13                          | 16                | 29  |
|     |             | 45                          | 236               | 281 |

## งานสัญญาที่ยังไม่ลงนาม

| ชื่องาน  | วงเงิน<br>(ล้านบาท) | TOR | ราคากลาง | ความก้าวหน้า (%) | แผน<br>(M6) | สถานะ                     |
|--|---------------------|-----|----------|------------------|-------------|---------------------------|
| งานจ้าง Overhaul Supply Fan  | 0.8                 | ●   | ●        | 100              | ก.พ. 67     | ประกาศผู้ชนะ<br>11 มิย 67 |
| งานติดตั้ง Electric Actuator พร้อมเกียร์ทด ๓<br>สจ.ลาดพร้าว                        | 3.5                 | ●   | ●        | 100              | ก.พ. 67     | ขั้นตอนพิจารณาผล          |
| งานจ้าง Overhaul เครื่องปรับความเร็วรอบ<br>มอเตอร์ไฟฟ้า ที่ สจ.ลาดพร้าว และ ลำโพง  | 6                   | ●   |          | 100              | ก.พ. 67     | TOR แล้วเสร็จ             |
| งานจ้าง Overhaul เครื่องปรับความเร็วรอบ<br>มอเตอร์ไฟฟ้า ที่ สจ.เพชรเกษม และ บางพลี | 13.5                | ●   |          | 80               | ธ.ค. 66     | ขั้นตอน TOR               |
| งานซื้อพร้อมติดตั้งคลอรีนปลายสาย   | 24                  |     | ●        | 8                | ก.พ. 67     | ราคากลาง ครั้งที่ 2       |



# จบการนำเสนอ
