



วาระที่ 3.1.1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 28 เม.ย.2564





Agenda

- 01 แผน - ผลเบิกจ่ายงบประมาณ
- 02 คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ
- 03 มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ
- 04 งบจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ
(Commitment) ณ 23 เม.ย.64
- 05 ค่าล่วงเวลาที่ขอเพิ่มเติม กรณีท่อขนาด 1,200 มม. แตกรั่ว



01 แผน - ผลเบิกจ่ายงบประมาณ

สรุปแผนผลเบิกจ่ายงบลงทุน

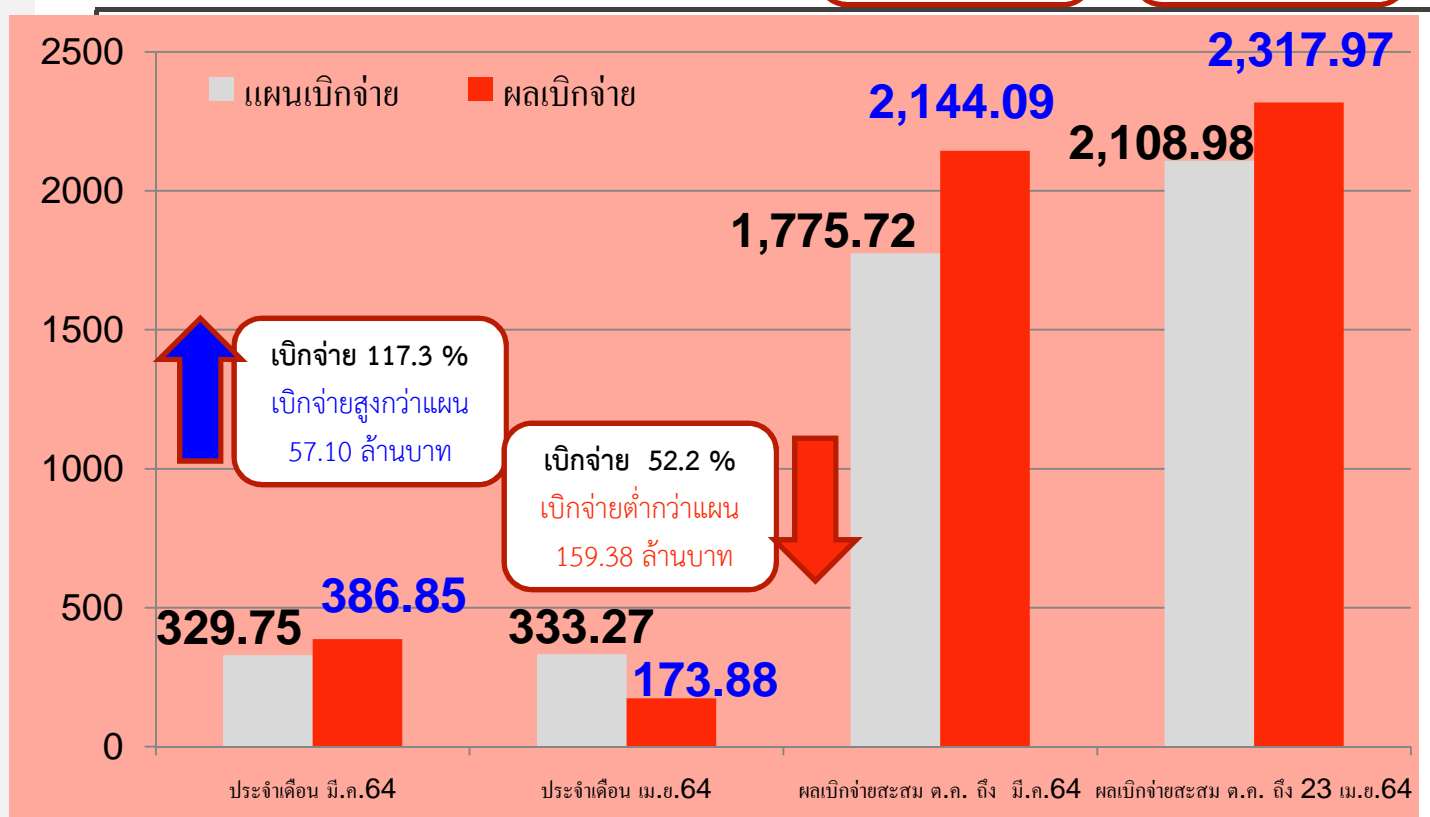

1.1 แผน - ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน มี.ค.64 และประจำเดือน เม.ย.64

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน มี.ค.64				ประจำเดือน เม.ย.64 (ณ 23 เม.ย.64)			
	แผน มี.ค.64	ผล มี.ค.64	ผลต่าง	%	แผน เม.ย.64	ผล เม.ย.64	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	42.50	55.16	12.66	129.8 %	42.97	25.30	(17.67)	58.9 %
ลดน้ำสูญเสีย	169.64	205.79	36.15	121.3 %	187.95	86.23	(101.72)	45.9 %
มาตรวัดน้ำ	37.87	25.59	(12.28)	67.6 %	33.28	21.05	(12.23)	63.3 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	5.47	5.63	0.16	102.9 %	6.24	2.82	(3.42)	45.2 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	6.70	5.49	(1.21)	82.0 %	5.16	0.95	(4.21)	18.4 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	1.13	9.47	8.34	839.6 %	4.89	0.32	(4.57)	6.5 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	4.50	0.46	(4.04)	10.3 %	-	-	-	-
ปรับปรุงระบบ DMA	1.50	5.64	4.14	375.8 %	-	2.38	2.38	-
งานรับจ้างงาน	43.00	45.80	2.80	106.5 %	34.86	26.76	(8.10)	76.8 %
งานติดตั้งประปาใหม่	17.44	27.83	10.39	159.6 %	17.92	8.08	(9.84)	45.1 %
รวมทั้งสิ้น	329.75	386.85	57.10	117.3 %	333.27	173.81	(159.38)	52.2 %

1.2 แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 – มี.ค.64 และ แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 – 23 เม.ย.64


ประเภทงบประมาณ	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 – มี.ค.64				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 – 23 เม.ย.64			
	แผน มี.ค.64	ผล มี.ค.64	ผลต่าง	%	แผน เม.ย.64	ผล เม.ย.64	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	224.44	241.62	17.18	107.7 %	267.41	266.92	(0.49)	99.8 %
ลดน้ำสูญเสีย	958.66	1,220.58	261.92	127.3 %	1,146.61	1,306.80	160.20	114.0 %
มาตรวัดน้ำ	150.02	149.70	(0.32)	99.8 %	183.29	170.75	(12.54)	93.2 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	27.12	32.42	5.29	119.5 %	33.37	35.24	1.87	105.6 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	44.91	53.52	8.61	119.2 %	50.08	54.47	4.39	108.8 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	29.80	39.87	10.06	133.8 %	34.69	40.18	5.49	115.8 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	17.73	13.20	(4.53)	74.5 %	17.73	13.20	(4.53)	74.5 %
ปรับปรุงระบบ DMA	5.97	5.64	(0.33)	94.4 %	5.97	8.02	2.05	134.2 %
งานรับจ้างงาน	208.53	263.80	55.28	126.5 %	243.39	290.56	47.17	119.4 %
งานติดตั้งประปาใหม่	108.54	123.74	15.21	114.0 %	126.46	131.83	5.37	104.2 %
รวมทั้งสิ้น	1,775.72	2,144.09	368.37	120.7 %	2,108.98	2,317.97	208.98	109.9 %

แผน-ผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสมถึง ณ 23 เมษายน 2564 แยกตามหน่วยงาน

สายงาน รวก.(กอ)				
สาขา	แผน	ผล	ผลต่าง	%
สสส.	111.82	114.92	3.10	102.8%
สสพ.	125.18	165.97	40.79	132.6%
สสป.	164.87	191.39	26.52	116.1%
สสม.	42.18	35.51	(6.67)	84.2%
สสท.	38.05	44.30	6.26	116.4%
สสญ.	93.65	76.26	(17.39)	81.4%
สสล.	110.86	54.38	(56.48)	49.1%
สสช.	90.32	91.17	0.85	100.9%
สสข.	108.17	119.42	11.25	110.4%
สสมบ.	121.57	110.06	(11.51)	90.5%
สสสภ.	125.92	135.81	9.89	107.9%
รวก.(กอ)	1,132.61	1,139.22	6.61	100.6%


สายงาน รวก.(กต)				
สาขา	แผน	ผล	ผลต่าง	%
สสบ.	108.89	132.81	23.93	122.0%
สสต.	103.38	101.34	(2.05)	98.0%
สสภ.	138.20	209.17	70.97	151.4%
สสว.	121.04	162.91	41.86	134.6%
สสน.	54.23	87.44	33.20	161.2%
สสบท.	158.29	156.09	(2.21)	98.6%
สสมส.	127.57	136.20	8.63	106.8%
ฝสบ.	0.22	0.17	(0.06)	74.9%
ฝมน.	1.28	1.18	(0.11)	91.6%
ฝจส.	20.76	22.80	2.04	109.8%
Agenda	142.50	168.66	26.16	118.4%
รวก.(กต)	817.31	1,178.78	202.38	120.7%
รวม	2,108.98	2,317.97	208.98	109.9%

ทำสัญญาช้ากว่าแผน 23 เม.ย.64 – รวก.(กอ)



ลำดับที่	หน่วยงาน	วงเงิน/WBS	รายการ	ประเด็นปัญหา	ความคืบหน้า / แนวทางแก้ไข
1	สสส.	1,343,700 บาท C-64.1.05.01.0437	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งสสส.	อยู่ระหว่างทบทวน spec	ติดตามการทบทวน spec
2	สสพ.	1,143,500 บาท C-64.1.05.01.0435	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งสสพ.	อยู่ระหว่างทบทวนและขอ อนุมัติเปลี่ยนแปลง spec	ติดตามการขอเปลี่ยนแปลง spec
3	สสท.	2,400,000 บาท C-64.1.05.06.0501	มาตรวัดน้ำขนาด1/2นิ้วถึง12นิ้ว (ค่าแรง)	ปัจจุบันยังไม่เปิดสัญญามาตร ครบวาระ คาดการณ์เริ่มงาน เปลี่ยนมาตร มิ.ย. 64	bidding แล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา ผล
4	สสส.	1,320,000 บาท C-64.1.02.02.0012	งานปรับปรุงห้องน้ำชั้น2และชั้น3 อาคารสำนักงานประปาสาขา ลาดพร้าว	อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียด เพิ่มเติมใน TOR	คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือน พ.ค.64 / ประสานงานและเร่งรัดกับ สอบ.กรร.สสส. เรียบร้อยแล้ว
5	สสช.	670,000 บาท C-64.1.06.02.0014	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน อาคาร1ของ สสช.	งบสำรองเร่งด่วนต้องเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 2564	อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะลง นามสัญญาได้ในเดือน พ.ค. 64

ทำสัญญาต่ำกว่าแผน 23 เม.ย.64 – รวก.(กต)



ลำดับที่	หน่วยงาน	วงเงิน/WBS	รายการ	ประเด็นปัญหา	ความคืบหน้า / แนวทางแก้ไข
1	ฝมน.	1.00 ล้านบาท C-64.1.03.01.0043	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำและระบายน้ำสำหรับเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำ	- ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติการประกวดราคาจ้าง โดยยื่นรายละเอียดแค็ตตาล็อกไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตงาน TOR	ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว วันที่ 16 เม.ย. 64
2	ฝจส.	80.00 ล้านบาท C-64.1.05.06.0025	งานเปลี่ยนทดแทนเครื่องวัดDMAที่เสื่อมสภาพ	- ชล.31/2564 (วงเงิน 40 ล้านบาท) - ชล.32/2564 (วงเงิน 40 ล้านบาท)	คาดการณ์ประกาศผลผู้ชนะในเดือน พ.ค.64 และลงนามสัญญาได้ใน มิ.ย.64
3	สสพ.	10.00 ล้านบาท C-63.2.24.02.0001	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย	ทำสัญญาล่าช้า เนื่องจาก มีการปรับแก้ TOR บางส่วน	ปัจจุบัน TOR และราคากลางได้รับการอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างโดย ฝจพ.
6	สสภ.	80,562.62 บาท C-64.1.06.02.0024	งานปรับปรุงห้องน้ำผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4) สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญและงานที่เกี่ยวข้อง	- ตกลงราคากับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คาดการณ์ว่าจะสามารถทำสัญญาได้ในเดือน เมษายน 2564 ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถเป็นผลเบิกจ่ายได้ในเดือน พฤษภาคม 2564	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง
9	สสว.	753,000 บาท C-64.1.02.01.0007	หลังคาพร้อมโครงสร้างและแนวรั้ว	-	อยู่ระหว่างการช่วยประมาณราคากลาง โดยส่วนออกแบบงานโยธา คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งข้อมูลให้ สสว.ภายใน เม.ย.64 นี้

แผนเบิกจ่าย – ผลเบิกจ่ายสะสม 23 เม.ย.64
สาขาที่เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน - งบประมาณกำลังน้ำ

งบประมาณกำลังน้ำ (หน่วย : ล้านบาท)					
สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน เม.ย.64	%	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน มี.ค.64
สสม.	7.10	5.51	(1.59)	77.7	(1.44)
สสด.	44.42	17.36	(27.06)	39.1	(24.62)
สสสภ.	14.38	13.86	(0.53)	96.3	(0.20)
สสบ.	13.30	13.90	(0.21)	98.7	(3.39)
สสภ.	17.79	13.86	(3.93)	77.9	สูงกว่าแผน
สสบท	28.82	22.91	(5.91)	79.5	(5.10)
รวม	125.81	86.59	(39.22)	-	



แผนเบิกจ่าย – ผลเบิกจ่ายสะสม 23 เม.ย.64
สาขาที่เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน - งบลดน้ำสูญเสีย


งบลดน้ำสูญเสีย (หน่วย : ล้านบาท)					
สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน เม.ย.64	%	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน มี.ค. 64
สสญ.	66.03	48.21	(17.82)	73.0	(15.26)
สสล.	48.32	21.62	(26.71)	44.7	(13.60)
สสมบ.	53.71	37.59	(16.12)	70.0	(10.55)
สสสภ.	51.37	51.27	(0.10)	99.8	สูงกว่าแผน
สสต.	71.29	63.94	(7.35)	89.7	สูงกว่าแผน
รวม	290.72	222.62	(68.10)	-	

แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม 23 เม.ย.64
สาขาที่เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน - งบประมาณครบวาระ

งบเปลี่ยนมาตรฐาน (หน่วย : ล้านบาท)					
สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม เม.ย.64	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน เม.ย.64	%	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน มี.ค.64
สสม.	15.52	5.73	(9.79)	36.9	(7.84)
สสท.	2.00	0.24	(1.76)	12.0	(0.60)
สสล.	11.86	7.45	(4.41)	62.8	(3.90)
สสช.	6.90	5.26	(1.64)	76.5	(0.33)
สสข.	11.27	10.88	(0.39)	96.5	สูงกว่าแผน
สสสภ.	6.56	6.14	(0.42)	93.6	(0.15)
สสค.	14.43	12.83	(1.61)	88.9	(1.12)
สสว.	9.84	8.54	(1.30)	86.8	(0.56)
สสน.	8.72	7.43	(1.28)	85.3	(0.21)
สสบท.	5.88	5.17	(0.71)	87.8	(0.16)
สสมส.	8.94	8.21	(0.73)	91.9	(0.33)
รวม	101.93	77.88	(24.04)	-	-

แผนเบิกจ่าย – ผลเบิกจ่ายสะสม 23 เม.ย.64 - งบร้อยละ

สาขา	แผนเบิกจ่าย สะสม	ผลเบิกจ่าย สะสม	ผลต่าง	%	ประเด็นปัญหา	แนวทางแก้ไข
สสป.	12.00	8.10	(3.90)	67.5	ขอขยายสัญญาเป็นสิ้นสุด 21 มิ.ย.64 ประกอบกับอยู่ระหว่างโอนค่าของมาสมทบค่าแรง 2 ล้านบาท	คาดเบิก ส.ก.64 จำนวนเงิน 4.36 ล้านบาท
สสข.	2.03	1.32	(0.70)	65.4	- สัญญา สสข.ป.12/2562 มีการคืนพัสดุที่เหลือจากการใช้งานจำนวน 0.205 ล้านบาท เนื่องจากยกเลิกเส้นทางบางส่วน เพราะสำนักการโยธา กทม. มีหนังสือตอบไม่อนุญาตให้ กปน. เข้าดำเนินงานก่อสร้าง - สัญญา รย.1/2563 เพราะยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานในพื้นที่ได้ ปัจจุบันรอความชัดเจนเรื่องตำแหน่งบ่อบนทางเท้าจากกรมทางหลวง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแปลนงานคันท้อตลอดช่วงถนนแจ้งวัฒนะ	- อยู่ระหว่างกรมทางหลวง และ กปน. ปรับแบบก่อสร้างและประเมินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมร่วมกัน
สสมบ.	0.40	0.41	0.01	102.3	จล.71/2564 มีการคืนของและอุปกรณ์ จำนวน 2,634.37 บาท Gr. 5 ม.ค. 64 จำนวน 411,803.74 บาท	เบิกจ่ายต่ำกว่าสัญญา 17,762.62 บาท Gr. ครอบคลุมสัญญาแล้ว
สสว.	3.30	3.36	0.06	101.9	-	-
รวมทั้งสิ้น	17.73	13.20	(4.53)	74.5		




02 คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ

2.2 คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณสะสม ถึง มี.ค.64 + คาดการณ์ 6 เดือน

ประเภทงบประมาณ	แผนทั้งปี 2564	ผลสะสม ถึง มี.ค.64	คาดการณ์ 6 เดือน	จริง +คาดการณ์	สูงต่ำกว่าแผนทั้งปี	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	508.23	241.62	281.91	523.53	15.30	103.0 %
ลดน้ำสูญเสีย	2,450.68	1,220.58	1,369.04	2,589.62	138.94	105.7 %
มาตรวัดน้ำ	341.16	149.70	163.80	313.50	(27.66)	91.9 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	64.73	32.42	30.61	63.02	(1.71)	97.4 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	163.41	53.52	34.07	87.59	(75.81)	53.6 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	54.69	39.87	14.35	54.21	(0.48)	99.1 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	24.91	13.20	14.06	27.26	2.35	109.5 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	70.99	5.64	60.03	65.66	(5.33)	92.5 %
งานรับจ้างงาน	464.90	263.80	168.65	432.45	(32.45)	93.0 %
งานติดตั้งประปาใหม่	221.97	123.74	99.05	222.79	0.83	100.4 %
งานก่อสร้างอาคาร สสพ.	10.00	-		10.00	-	100.0 %
รวมทั้งสิ้น	4,375.66	2,144.44	2,235.56	4,389.63	13.98	100.3 %



2.2 คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ถึง 23 เม.ย.64 + คาดการณ์ 5 เดือน

ประเภทงบประมาณ	แผนทั้งปี 2564	ผลสะสม ถึง เม.ย.64	คาดการณ์ 5 เดือน	จริง +คาดการณ์	สูงต่ำกว่าแผนทั้งปี	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	508.23	266.92	231.47	498.39	(9.84)	98.1 %
ลดน้ำสูญเสีย	2,450.68	1,306.80	1,237.80	2,544.60	93.92	103.8 %
มาตรวัดน้ำ	341.16	170.75	142.48	313.23	(27.93)	91.8 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	64.73	35.24	29.79	65.02	0.29	100.5 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	163.41	54.47	100.71	155.18	(8.22)	95.0 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	54.69	40.18	19.16	59.35	4.66	108.5 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	24.91	13.20	8.46	21.66	(3.25)	87.0 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	70.99	8.02	60.03	68.04	(2.95)	95.8 %
งานรับจ้างงาน	464.90	290.56	156.77	447.33	(17.57)	96.2 %
งานติดตั้งประปาใหม่	221.97	131.83	85.67	217.50	(4.47)	98.0 %
งานก่อสร้างอาคาร สสب.	10.00	-	-	-	(10.00)	-
รวมทั้งสิ้น	4,375.66	2,317.97	2,072.34	4,390.30	14.64	100.3 %



03 มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ



01

เนื่องจากคาดการณ์งาน-ขยายเขต MOU ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้แทนฯ จึงชี้แจงว่า งาน MOU เป็นงานร่วมกับหน่วยงาน-รัฐ รวก.(ง) สอบถามว่าได้ติดตามเรื่องนี้หรือไม่

02


งานก่อสร้างอาคาร สสب. คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าได้หรือไม่ (วงเงิน 10 ล้านบาท) ในปีงบประมาณ 2564

03

ขอให้ทุกสายงานคาดการณ์เบิกจ่ายให้ครบทุกรายการในระบบ CMS บางหน่วยงานยังไม่บันทึก



04

รายการที่วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท ขอให้เบิกจ่ายโดยเร็ว และปิด PR/PO ให้เรียบร้อยด้วย (Delivery Completed)



04 งบจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ
(Commitment) ณ 23 เม.ย.64


4. งบ PBC ที่คงเหลือที่ ฝจส. ณ 23 เม.ย. 64

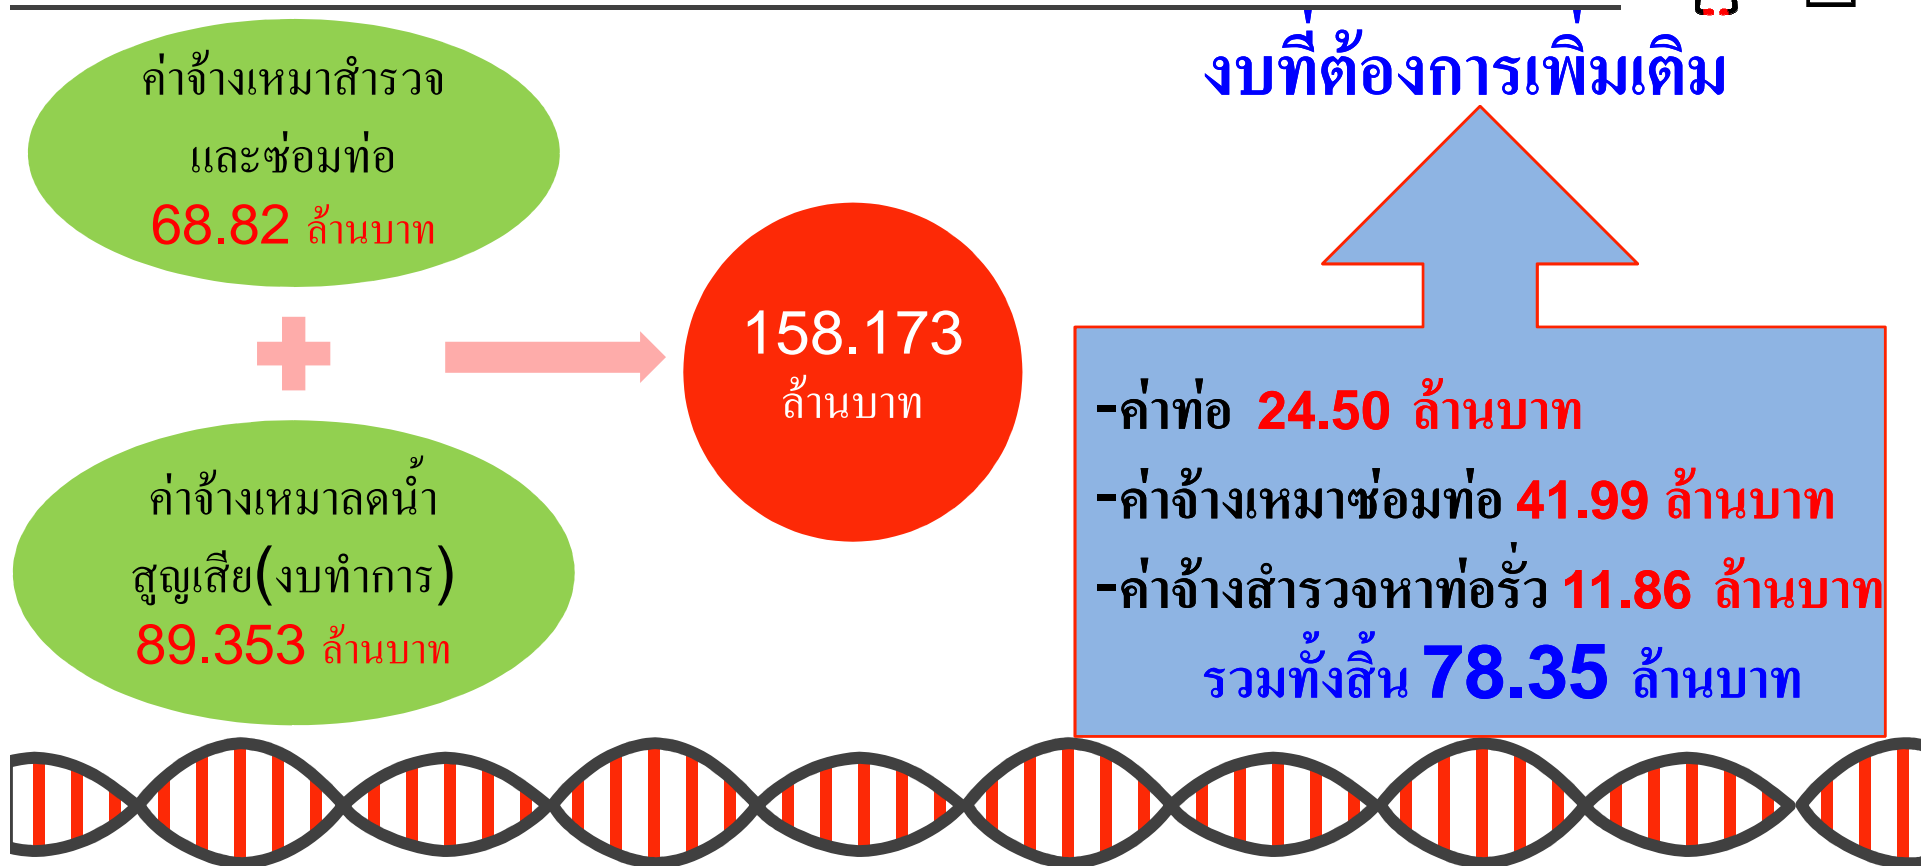


ข้อสังเกต ของ ผงป.

➤ การขอเปิดสัญญางานจ้างเหมาซ่อมท่อ งานสำรวจหาท่อรั่ว หรือสัญญาอื่น เพิ่มเติม ขอให้พิจารณาเร่งรัดสัญญาที่งานแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายด้วย

➤ ข้อมูลงานจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อที่ยังไม่เบิกจ่าย ณ วันที่ 23 เม.ย.64 จำนวน 261.67 ล้านบาท




ข้อมูลงานจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อที่ยังไม่เบิกจ่าย ณ วันที่ 23 เม.ย.64



รวก.(กอ)

สาขา	งานจ้างเหมาซ่อมท่อ		งานสำรวจหาท่อรั่ว		งานจ้างอื่นๆ			รวมทั้งสิ้น	
	สัญญา	วงเงิน	สัญญา	วงเงิน	สัญญา	วงเงิน	รายละเอียด	สัญญา	วงเงิน
สสส.	2	12,309,289.72	1	2,817,757.01	1	98,767.29	งานจ้างเพิ่มแรงดันน้ำ	4	15,225,814.02
สสพ.	1	7,067,228.88	1	4,600,000.00	0	-	-	2	11,667,228.88
สสป.	4	19,777,756.07	4	7,500,076.49	0	-	-	8	27,277,832.56
สสม.	1	3,921,136.02	1	1,477,751.25	0	-	-	2	5,398,887.27
สสท.	2	5,831,496.24	1	1,641,819.00	1	295,409.35	งานจ้างอุดท่อเพื่อยกเลิกท่อประปาเดิม	4	7,768,724.59
สสญ.	1	13,994,485.98	2	4,697,722.74	0	-	-	3	18,692,208.72
สสธ.	1	7,240,933.61	1	2,349,527.00	0	-	-	2	9,590,460.61
สสช.	1	4,756,982.09	1	2,001,617.66	0	-	-	2	6,758,599.75
สสข.	2	8,436,366.98	1	1,052,766.00	0	-	-	3	9,489,132.98
สสมบ.	2	10,131,627.68	1	803,595.00	0	-	-	3	10,935,222.68
สสสภ.	1	7,685,680.77	1	1,598,533.25	0	-	-	2	9,284,214.02

ข้อมูลงานจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อที่ยังไม่เบิกจ่าย ณ วันที่ 23 เม.ย.64




รวม.(กต)

สาขา	งานจ้างเหมาซ่อมท่อ		งานสำรวจหาท่อรั่ว		งานจ้างอื่นๆ			รวมทั้งสิ้น	
	สัญญา	วงเงิน	สัญญา	วงเงิน	สัญญา	วงเงิน	รายละเอียด	สัญญา	วงเงิน
สสบ.	2	16,793,685.04	2	3,118,320.26	1	449,837.00	งานเตรียมการขุดติดตั้งเครื่องมือวัดอัตรา	5	20,361,842.30
สสค.	2	12,590,879.62	2	4,600,249.00	0	-	จ้างเพิ่มแรงดันน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	4	17,191,128.62
สสภ.	3	11,622,383.86	2	3,289,019.85	1	459,095.00	-	6	15,370,498.71
สสว.	2	13,906,763.42	3	2,790,305.00	2	912,533.00	งานจ้างวัดอัตราการไหล,งานจ้างเพิ่มแรงดันน้ำ	7	17,609,601.42
สสน.	2	11,636,816.09	2	2,737,590.00	0	-	-	4	14,374,406.09
สสบท.	3	12,388,878.75	2	1,379,727.00	0	-	-	5	13,768,605.75
สสมส.	2	25,542,056.07	3	1,762,496.90	0	-	-	5	27,304,552.97
ฝจส.	0	-	1	3,604,000.00	0	-	-	1	3,604,000.00
รวมทั้งสิ้น	34	205,634,446.89	32	53,822,873.41	6	2,215,641.64	-	72	261,672,961.94

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม






05 ค่าล่วงเวลาที่ขอเพิ่มเติม
กรณีท่อขนาด 1,200 มม. แตกรั่ว


5. ค่าล่วงเวลาที่ขอเพิ่มเติม กรณีท่อขนาด 1,200 มม. แตกรั่ว

➤ สสว. สรุปค่าล่วงเวลาที่ใช้ในกรณีท่อขนาด ศก.1,200 มม. แตกรั่วฉุกเฉิน จำนวน 1.294 ล้านบาท (OT พนักงาน + OT ลูกจ้าง) นำเรียน ผวก. ในการขอรับค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม ตามบันทึก กธบสสว 381/2564 ลงวันที่ 5 เม.ย.64

➤ ผวก. มอบนโยบายว่า เห็นชอบในหลักการ ให้ ผงป. จัดสรรค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม จำนวน 1.294 ล้านบาท **โดยให้ ผงป. สามารถโอนงบตามจำนวนที่แต่ละสาขาใช้ไปในการดำเนินการดังกล่าว เฉพาะเมืองงบประมาณของสาขาหมดเท่านั้น**



ค่าล่วงเวลาที่
ขอเพิ่มเติม
กรณีท่อขนาด
1,200 มม.
แตกรั่ว



ฝสพ.
รับที่ 1356
วันที่ 23 เม.ย. 2564
เวลา 13:13

รวม (กต)
1943 19.13
9/4/64

ค.ค. (ก4)
รับที่ 1943 เวลา 10.
รับที่ - 8 เม.ย. 2564

สำนักงานประปาสาขาสุพรรณบุรี
รับที่ 3963
รับที่ - 7 เม.ย. 2564
เวลา 8.41

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองธุรกิจบริการ สำนักงานประปาสาขาสุพรรณบุรี

ที่ กธบสสว ๓๘๑/๒๕๖๔

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปล่วงเวลาที่ใช้ในกรณีท่อขนาด ศก. ๑,๒๐๐ มม.แตกรั่วฉุกเฉิน บริเวณ ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนใต้) พื้นที่ สสว. ดำเนินการโดย สำนักงานประปาสาขาในสายงานบริการ

๔.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดนำเรียน ผวก. เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๔.๑ รับทราบวงเงินค่าล่วงเวลาของ พนักงาน และลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในสายงานบริการที่ใช้ในกรณีเหตุการณ์ท่อ ศก.๑,๒๐๐ มม.แตกรั่วฉุกเฉินในพื้นที่ สสว. เป็นจำนวนเงินรวม ๑,๒๙๔,๖๗๙.๖๒ บาท

๔.๒ แจ้ง ฝงป.จัดสรรงบประมาณค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม จำนวนเงินรวม ๑,๒๙๔,๖๗๙.๖๒ บาท (ค่าล่วงเวลาของพนักงานจำนวน ๘๔๒,๗๑๕.๖๓ บาท และค่าล่วงเวลาของลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน หมวดค่าจ้างเหมาบริการอื่น จำนวน ๔๕๑,๙๖๓.๙๙ บาท) ให้กับสายงานบริการ โดยให้ประสานงานกับ กปง.ฝสพ.ต่อไป

(นางสาวอาภาจรัส จรุงจิตต์)

ผอ.กธบ.สสว.

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. รับทราบวงเงินค่าล่วงเวลาของสายงานบริการ ที่ใช้ในกรณีเหตุการณ์ที่ขนาด ต.ก.๑,๒๐๐ มม. แต่กรั่วฉุกเฉินในพื้นที่ สสว.เป็นจำนวนเงินรวม ๑,๒๙๔,๖๗๙.๖๒ บาท

๒. แจ้ง ผงป.จัดสรรงบประมาณค่าล่วงเวลาเพิ่มเติมจำนวนเงินรวม ๑,๒๙๔,๖๗๙.๖๒ บาท (เป็นค่าล่วงเวลา

ของพนักงาน จำนวน ๘๔๒,๗๑๕.๖๓ บาท และค่าล่วงเวลาของลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน หมาดค่าจ้างเหมาบริการอื่น จำนวน ๔๕๑,๙๖๓.๙๙ บาท) ให้กับสายงานบริการ โดยให้ประสานงานกับ กปง.ผลสบ.ต่อไป


(นายประสิทธิ์ สุขประสงค์)
รวก.(กต)

- ทราบ ทม.๖ 4.1


- เน้นข้อบัญญัติกรม ๓๓๖ 4.2

โดยให้ ผงป. สามารถโอนงบ ตามจำนวน ที่แต่ละสาขาใช้ไป
จนกระทั่งการดัดแปลง ๖๓๖๖ เนื่องมาจากความจำเป็น
โดยให้ กปง.ผลสบ. เป็นผู้ประสานงาน

- เรียน รวก.(กต) รวก.(กต)

ผอ.ผงป. ผอ.ผลสบ.

เพื่อดำเนินการต่อไป



(นายกรี อารัก)

ผู้อำนวยการปราบปราม

ค่าส่วนเวลาที่ใช้กรณีพร้อมประชาชนขนาด 1,200 มม. แดกรั่วฉุกเฉิน บริเวณ อ.กาญจนภิเษก(วงแหวนใต้)

สาขา	ผจ.สาขา		กรก		กรร		กรด.		รวม		รวมทั้งหมด
	พนักงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ลูกจ้าง	
01 สสป	0.00	0.00	0.00	5,107.05	36,213.03	18,799.20	0.00	0.00	36,213.03	23,906.25	60,119.28
02 สสด	8,587.45	0.00	0.00	16,566.55	67,478.75	21,028.00	0.00	0.00	76,066.20	37,594.55	113,660.75
03 สสญ	0.00	0.00	0.00	6,678.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,678.45	6,678.45
04 สสน	0.00	0.00	0.00	14,712.23	47,613.20	7,094.37	0.00	0.00	47,613.20	21,806.60	69,419.80
05 สสท	0.00	0.00	8,914.62	7,472.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8,914.62	7,472.63	16,387.25
06 สสนบ	0.00	0.00	0.00	12,414.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,414.49	12,414.49
07 สสส	0.00	0.00	7,647.08	16,552.08	4,610.91	4,776.06	0.00	0.00	12,257.99	21,328.14	33,586.13
11 สสภ	0.00	0.00	16,600.82	3,542.68	50,315.26	21,277.84	0.00	0.00	66,916.08	24,820.52	91,736.60
12 สสส	0.00	0.00	0.00	9,245.07	7,486.65	0.00	0.00	0.00	7,486.65	9,245.07	16,731.72
13 สสพ	0.00	0.00	1,886.40	19,026.32	4,211.99	3,342.69	0.00	0.00	6,098.39	22,369.01	28,467.40
14 สสว	7,516.95	2,121.39	98,436.70	23,250.39	371,948.23	127,110.28	3,914.77	0.00	481,816.65	152,482.06	634,298.71
15 สสช	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 สสข	0.00	0.00	0.00	4,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.89	4,999.89
17 สสป	0.00	0.00	9,654.84	12,869.08	11,442.12	8,540.28	0.00	0.00	21,096.96	21,409.36	42,506.32
53 สสนบ	0.00	0.00	0.00	9,278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.48	9,278.48
54 สสบท	0.00	0.00	0.00	5,080.87	33,039.96	23,803.89	0.00	0.00	33,039.96	28,884.76	61,924.72
55 สสสภ	0.00	0.00	20,197.75	5,316.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20,197.75	5,316.57	25,514.32
56 สสนส	0.00	0.00	0.00	20,872.50	24,998.15	21,084.66	0.00	0.00	24,998.15	41,957.16	66,955.31
รวม	16,104.40	2,121.39	163,338.21	192,985.33	659,358.25	256,857.27	3,914.77	0.00	842,715.63	451,963.99	1,294,679.62
	ผจ.สาขา	18,225.79	กรก	356,323.54	กรร	916,215.52	กรด.	3,914.77			

หมายเหตุ : รายละเอียดประกอบข้อมูลตามแบบ จำนวน 148 หน้า

