




การประปานครหลวง

METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

ผลการดำเนินงานด้านลดน้ำสูญเสีย
ประจำเดือน ธันวาคม 2564

คาดการณ์ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสม ธันวาคม 2564 (กปน.)

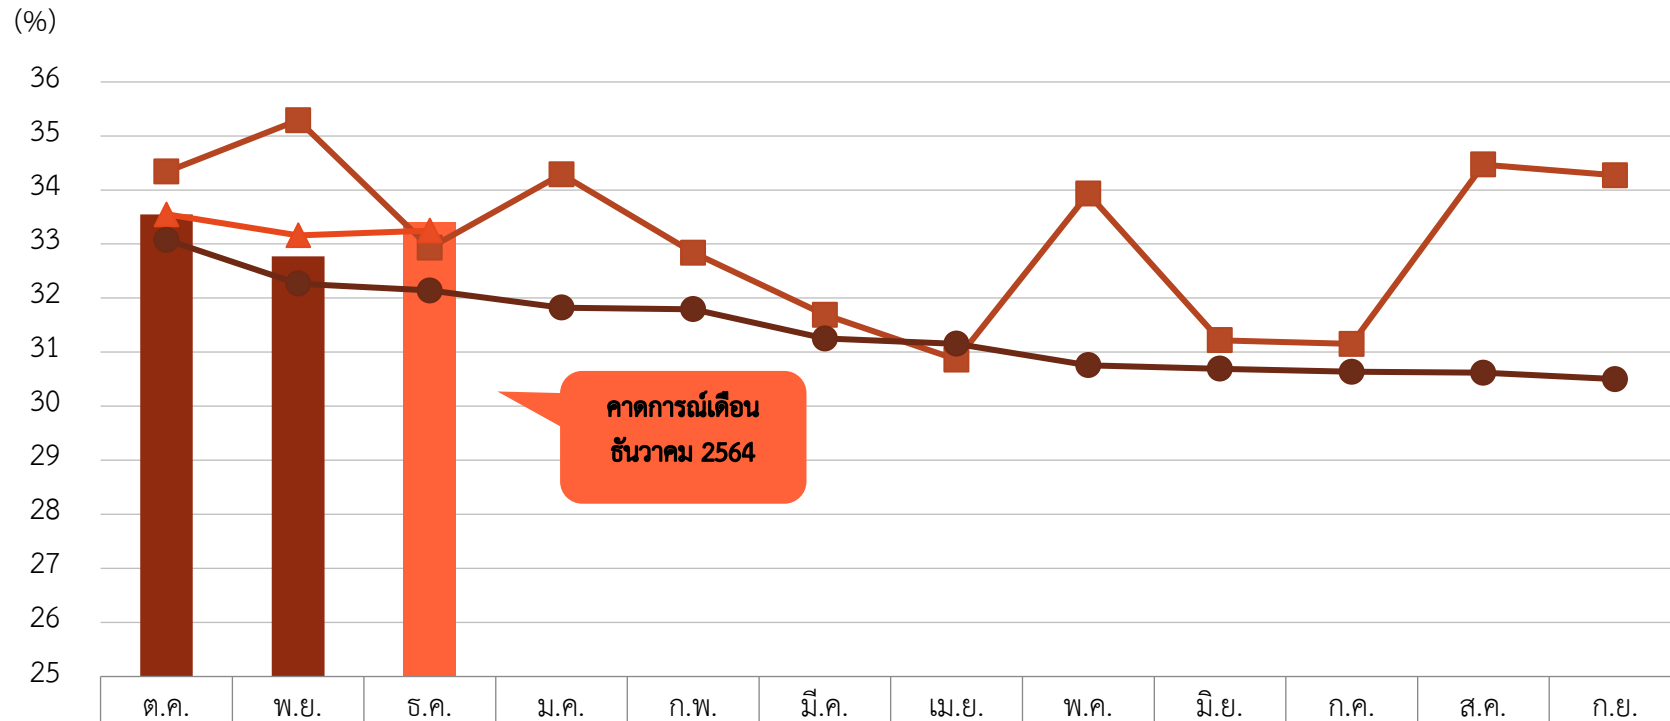

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายเดือน ปี 2565	33.55	32.77	33.41									
รายเดือน ปี 2564	34.34	35.29	32.93	34.29	32.84	31.69	30.86	33.93	31.22	31.15	34.47	34.27
สะสม ปี 2565	33.55	33.16	33.25									
เป้าสะสม ปี 2565	33.08	32.27	32.14	31.82	31.79	31.25	31.15	30.76	30.69	30.63	30.62	30.50

ตัวชี้วัด	E	D	C	B	A
อัตราน้ำสูญเสีย(ร้อยละ)	34.09	33.59	33.09	31.79	30.50

คาดการณ์ผลงานอัตราน้ำสูญเสียเดือนธันวาคม 2564

สาขา	ปริมาณน้ำเข้า (ลบ.ม./วัน)		ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม./วัน)		เป้าหมายน้ำ จำหน่าย ธ.ค. (ลบ.ม./วัน)	% น้ำจำหน่าย เทียบเป้าหมาย ธ.ค. (%)	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)		เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)	
	พ.ย.	ธ.ค. (1)	พ.ย.	ธ.ค. (1)			พ.ย.	ธ.ค. (1)	พ.ย.	ธ.ค. (1)
สสท.	229,213.00	231,239.80	138,619.52	140,914.55	140,258.06	0.47	90,593.48	90,325.25	39.52	39.06
สสส.	363,309.00	370,702.55	253,459.44	258,924.12	267,806.45	-3.32	109,849.56	111,778.43	30.24	30.15
สสพ.	396,094.00	396,362.85	285,175.33	281,911.23	284,967.74	-1.07	110,918.67	114,451.62	28	28.88
สสป.	547,427.00	531,414.10	391,737.08	384,343.65	386,451.61	-0.55	155,689.92	147,070.45	28.44	27.68
สสญ.	344,896.00	326,341.63	220,309.29	222,161.48	225,000.00	-1.26	124,586.71	104,180.14	36.12	31.92
สสม.	300,805.00	321,584.72	198,712.10	208,379.48	192,032.26	8.51	102,092.90	113,205.24	33.94	35.2
สสล.	300,261.00	316,354.33	215,756.38	216,904.61	225,806.45	-3.94	84,504.62	99,449.72	28.14	31.44
สสช.	234,188.00	236,150.70	168,312.48	168,100.06	171,161.29	-1.79	65,875.52	68,050.64	28.13	28.82
สสข.	204,520.00	204,512.97	151,314.91	153,463.13	150,903.23	1.7	53,205.09	51,049.84	26.01	24.96
สสมบ.	250,350.00	252,347.40	209,565.74	206,029.03	204,903.23	0.55	40,784.27	46,318.37	16.29	18.36
สสสภ.	324,271.00	326,272.90	266,490.22	254,299.16	262,322.58	-3.06	57,780.79	71,973.74	17.82	22.06
สสบ.	358,004.00	349,844.95	194,494.74	195,806.45	188,225.81	4.03	163,509.26	154,038.50	45.67	44.03
สสด.	375,919.00	380,166.75	209,638.38	214,000.00	216,032.26	-0.94	166,280.62	166,166.75	44.23	43.71
สสภ.	347,490.00	348,571.50	202,306.08	201,946.55	200,935.48	0.5	145,183.92	146,624.95	41.78	42.06
สสว.	361,205.00	364,857.30	213,701.90	191,479.30	196,451.61	-2.53	147,503.10	173,378.00	40.84	47.52
สสน.	256,991.00	259,390.50	180,397.77	183,225.81	187,419.35	-2.24	76,593.23	76,164.69	29.8	29.36
สสบท.	218,249.00	223,217.90	153,444.66	148,556.42	138,903.23	6.95	64,804.34	74,661.48	29.69	33.45
สสมส.	281,138.00	279,837.50	174,687.72	177,897.94	175,612.90	1.3	106,450.28	101,939.56	37.86	36.43
กปน.	5,694,330.00	5,719,170.35	3,828,123.74	3,808,342.97	3,815,193.55	-0.18	1,866,206.26	1,910,827.38	32.77	33.41

*ปรับลดน้ำอื่นๆ สสว. จำนวน 149,344.64 ลบ.ม. ตามบันทึกที่ สรขกลส 32/2564

(1) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

คาคการณ์ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสมเดือนธันวาคม 2564 (เทียบเป้าหมายรายเดือน)

สาขา	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)			เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)			ผลงานสะสม (%)	เป้าหมายเดือน ธ.ค. 64	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค. (1)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค. (1)		เป้าหมายสะสม (%)	เปรียบเทียบ
สสท.	80,721.48	90,593.48	90,325.25	37.49	39.52	39.06	38.71	35.62	✗
สสส.	117,424.39	109,849.56	111,778.43	32.49	30.24	30.15	30.96	32.40	✓
สสพ.	113,543.85	110,918.67	114,451.62	28.99	28.00	28.88	28.63	27.96	✗
สสป.	165,556.71	155,689.92	147,070.45	30.07	28.44	27.68	28.74	29.99	✓
ขวก.(ก1)	477,246.43	467,051.62	463,625.76	31.42	30.41	30.31	30.71	30.85	✓
สสญ.	127,966.89	124,586.71	104,180.14	37.45	36.12	31.92	35.21	37.00	✓
สสม.	109,964.26	102,092.90	113,205.24	37.78	33.94	35.20	35.63	38.16	✓
สสล.	66,239.72	84,504.62	99,449.72	24.13	28.14	31.44	28.07	25.14	✗
ขวก.(ก2)	304,170.88	311,184.24	316,835.10	33.53	32.90	32.86	33.09	33.70	✓
สสช.	51,882.85	65,875.52	68,050.64	24.08	28.13	28.82	27.08	31.18	✓
สสข.	55,333.31	53,205.09	51,049.84	26.90	26.01	24.96	25.96	23.76	✗
สสมบ.	49,701.70	40,784.27	46,318.37	19.96	16.29	18.36	18.22	12.50	✗
สสสภ.	48,379.25	57,780.79	71,973.74	15.60	17.82	22.06	18.55	17.09	✗
ขวก.(ก3)	205,297.11	217,645.65	237,392.58	20.94	21.48	23.29	21.92	20.84	✗

คาคการณ์ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสมเดือนพฤศจิกายน 2564 (เทียบเป้าหมายรายเดือน)

สาขา	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)			เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)			ผลงานสะสม (%)	เป้าหมายเดือน ธ.ค. 64	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค. (1)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค. (1)		เป้าหมายสะสม (%)	เปรียบเทียบ
สสบ.	156,606.80	163,509.26	154,038.50	43.68	45.67	44.03	44.45	45.77	✓
สสด.	166,236.00	166,280.62	166,166.75	44.13	44.23	43.71	44.02	36.46	✗
สสภ.	143,538.56	145,183.92	146,624.95	41.55	41.78	42.06	41.80	38.4	✗
สสว.	167,977.38	147,503.10	173,378.00	46.11	40.84	47.52	44.88	42.55	✗
ขวก.(ก4)	634,358.74	622,476.89	640,208.20	43.90	43.15	44.35	43.81	40.82	✗
สสน.	84,310.27	76,593.23	76,164.69	32.37	29.8	29.36	30.52	32.01	✓
สสบท.	75,629.10	64,804.34	74,661.48	33.38	29.69	33.45	32.23	28.82	✗
สสมส.	101,915.17	106,450.28	101,939.56	37.18	37.86	36.43	37.15	34.63	✗
ขวก.(ก5)	261,854.54	247,847.85	252,765.74	34.4	32.77	33.15	33.45	32.11	✗
กปน.	1,882,927.71	1,866,206.26	1,910,827.38	33.55	32.77	33.41	33.25	32.14	✗

รายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรมลดน้ำสูญเสียสะสมเดือน พฤศจิกายน 2564

สาขา	งานสำรวจท่อรั่ว						งานซ่อมท่อ (จุด)									
	Step Test (ครั้ง)		ระยะทางสำรวจท่อรั่ว (กม.)		จำนวนจุดรั่วที่พบ		Reported Burst				Unreported Burst				รวม	
							ท่อจ่าย		ท่อบริการ ⁽¹⁾		ท่อจ่าย		ท่อบริการ ⁽¹⁾			
	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾		
สสท.	5	4	465	426	195	165	7	5	219	338	14	15	156	126	396	484
สสส.	2	5	383	415	321	369	19	25	639	565	5	8	289	277	952	875
สสพ.	13	5	647	700	786	646	34	39	759	580	9	23	612	404	1,414	1,046
สสป.	9	4	1,370	925	694	1,197	65	56	728	764	9	36	590	831	1,392	1,687
ภาค 1	29	18	2,866	2,466	1,996	2,377	125	125	2,345	2,247	37	82	1,647	1,638	4,154	4,092
สสญ.	16	14	679	510	885	530	12	21	473	419	6	24	555	422	1,046	886
สสม.	17	12	292	248	277	648	17	19	442	365	4	15	271	615	734	1,014
สสล.	9	12	230	624	443	508	18	32	652	631	14	16	408	471	1,092	1,150
ภาค 2	42	38	1,201	1,382	1,605	1,686	47	72	1,567	1,415	24	55	1,234	1,508	2,872	3,050
สสข.	6	-	718	789	579	377	39	26	640	899	6	3	412	200	1,097	1,128
สสข.	5	5	476	240	236	208	20	13	493	702	9	6	186	164	708	885
สสมบ.	4	9	133	196	94	178	58	45	469	473	8	11	73	158	608	687
สสสภ.	6	11	527	707	437	626	47	32	367	369	8	12	350	460	772	873
ภาค 3	21	25	1,854	1,932	1,346	1,389	164	116	1,969	2,443	31	32	1,021	982	3,185	3,573
รวมก.กอ	92	81	5,921	5,780	4,947	5,452	336	313	5,881	6,105	92	169	3,902	4,128	10,211	10,715
สสบ.	8	19	327	473	605	968	28	17	1,124	869	14	5	533	454	1,699	1,345
สสด.	2	-	664	489	818	798	38	43	978	1,233	10	4	786	675	1,812	1,955
สสภ.	12	11	629	1,791	892	1,310	37	27	977	1,119	16	20	823	1,217	1,853	2,383
สสว.	11	8	583	938	457	1,323	35	21	656	725	14	7	408	1,333	1,113	2,086
ภาค 4	33	38	2,202	3,692	2,772	4,399	138	108	3,735	3,946	54	36	2,550	3,679	6,477	7,769
สสน.	1	6	238	362	389	408	20	14	571	501	11	11	289	358	891	884
สสบท.	-	6	361	322	483	421	25	31	726	795	9	11	451	355	1,211	1,192
สสมส.	4	3	504	650	481	834	51	31	989	936	6	26	424	665	1,470	1,658
ภาค 5	5	15	1,104	1,334	1,353	1,663	96	76	2,286	2,232	26	48	1,164	1,378	3,572	3,734
รวมก.กต	38	53	3,306	5,026	4,125	6,062	234	184	6,021	6,178	80	84	3,714	5,057	10,049	11,503
กปน.	130	134	9,227	10,806	9,072	11,514	570	497	11,902	12,283	172	253	7,616	9,185	20,260	22,218

หมายเหตุ : ข้อมูลผลงานจากระบบ WLMA ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 –30 พฤศจิกายน 2564 บันทึกโดยสำนักงานประปาสาขา

(1) จำนวนงานซ่อมท่อบริการ = ผลรวมของงานซ่อมท่อบริการ + อุปกรณ์ท่อจ่าย + อุปกรณ์ท่อบริการ + อุปกรณ์อื่น ๆ

(2) คือ จำนวนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบในช่วงเดือนเดียวกัน ระหว่างปีงบประมาณ 2565 และ ปีงบประมาณ 2564

ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย เดือน พฤศจิกายน 2564

ระดับข้อมูล	จำนวนงาน Step Test	จำนวนงาน สร.	ระยะทางที่เดิน	จำนวนจุดรั่วที่พบ	จำนวนงานซ่อมที่เปิด-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อจ่าย-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อบริการ-สปน.	งานซ่อมท่อจ่าย-สปน.	งานซ่อมท่อบริการ-สปน.	ไม่พบจุดรั่ว-สปน.	อื่นๆ-สปน.	ยกเลิกงาน-สปน.
กปน.	27	1,571	6,887	8,675	8,720	136	6,302	96	4,655	38	245	86
รวก.(กอ)	21	822	3,904	4,242	4,374	88	3,229	71	2,504	28	163	49
รวก.(กต)	6	749	2,983	4,433	4,346	48	3,073	25	2,151	10	82	37

ระดับข้อมูล	จำนวนงานซ่อมที่เปิด - รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนามท่อจ่าย - รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนามท่อบริการ - รับแจ้ง
กปน.	10,641	434	8,415
รวก.(กอ)	4,765	289	3,722
รวก.(กต)	5,876	145	4,693

SCAN หากต้องการดู
รายละเอียดงาน



หมายเหตุ: กรณีทุกตัว DM คาดว่าใช้งานได้หมด จะใช้น้ำเข้า DMA จริงจากอุปกรณ์เครื่องวัดภาคสนาม
กรณีคาดว่ามิบาง DM ใช้งานไม่ได้ จะใช้น้ำเข้า DMA จากข้อมูลคาดการณ์จากสาขาเดือนก่อนหน้า

***ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน กลส.ฟจส. ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564

เป้าเบิกจ้าง-ลงนามและเป้าส่งมอบงาน ปีงบประมาณ 2565

สาขา	เป้าจัดสรรเดิม ¹ (เบิกจ้าง/ลงนาม/ส่งมอบ)	เป้าเบิกจ้าง/ลงนาม ²	เป้าส่งมอบงาน
สสส.	63	63	63
สสพ.	69	69	69
สสป.	90	90	90
สสท.	26	26	26
รวม.(ก1)	248	248	248
สสญ.	66	48	48
สสม.	26	16	16
สสล.	58	45	45
รวม.(ก2)	150	109	109
สสช.	55	55	55
สสข.	53	53	53
สสมบ.	40	40	40
สสสภ.	55	55	55
รวม.(ก3)	203	203	203
รวม.(กอ)	601	560	560
สสบ.	91	101	91
สสต.	70	75	70
สสภ.	80	85	80
สสว.	72	82	81
รวม.(ก4)	313	343	322
สสน.	58	58	63
สสบท.	33	41	52
สสมส.	55	58	63
รวม.(ก5)	146	157	178
รวม.(กต)	459	500	500
Agenda base	140	140	140
กปน.	1,200	1,200	1,200

หมายเหตุ : ¹ เป้าจัดสรร ตามบันทึกที่ สจทกพท14/2564 ลงวันที่ 18 พ.ค.64

² เป้าเบิกจ้าง/ลงนาม ปรับปรุงตามมติที่ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 11/2564 ณ วันที่ 29 พ.ย.64

แผน-ผลงานจัดทำแบบและจ้าง (สาขาและ Agenda base) ปีงบประมาณ 2565

สาขา	แผน (1200 กม.)	เบิกจ้างแล้ว				ลงนามแล้ว			
		ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน	ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน
สสส.	63	0.000	55.141	55.141	87.53%	0.000	0.000	0.000	0.00%
สสพ.	69	0.000	45.161	45.161	65.45%	0.000	0.282	0.282	0.41%
สสป.	90	0.000	50.066	50.066	55.63%	0.000	32.554	32.554	36.17%
สสท.	26	0.000	16.799	16.799	64.61%	0.000	0.699	0.699	2.69%
ขวก.(ก1)	248	0.000	167.167	167.167	67.41%	0.000	33.535	33.535	13.52%
สสญ.	48	0.000	33.642	33.642	70.09%	0.000	3.228	3.228	6.73%
สสม.	16	0.000	8.189	8.189	51.18%	0.000	4.122	4.122	25.76%
สสส.	45	0.000	43.831	43.831	97.40%	0.000	1.006	1.006	2.24%
ขวก.(ก2)	109	0.000	85.662	85.662	78.59%	0.000	8.356	8.356	7.67%
สสช.	55	0.000	43.871	43.871	79.77%	0.000	0.000	0.000	0.00%
สสช.	53	0.000	45.051	45.051	85.00%	0.000	12.726	12.726	24.01%
สสมบ.	40	0.000	42.833	42.833	107.08%	0.000	0.000	0.000	0.00%
สสสภ.	55	0.000	59.775	59.775	108.68%	0.000	0.000	0.000	0.00%
ขวก.(ก3)	203	0.000	191.530	191.530	94.35%	0.000	12.726	12.726	6.27%
รวก.(กอ)	560	0.000	444.359	444.359	79.35%	0.000	54.617	54.617	9.75%
สสบ.	101	0.000	102.925	102.925	101.91%	0.000	19.079	19.079	18.89%
สสค.	75	0.000	77.233	77.233	102.98%	0.000	21.963	21.963	29.28%
สสภ.	85	0.000	83.303	83.303	98.00%	0.000	34.107	34.107	40.13%
สสว.	82	0.000	55.388	55.388	67.55%	0.000	0.000	0.000	0.00%
ขวก.(ก4)	343	0.000	318.849	318.849	92.96%	0.000	75.149	75.149	21.91%
สสน.	58	0.000	53.340	53.340	91.97%	0.000	7.947	7.947	13.70%
สสบท.	41	0.000	28.853	28.853	70.37%	0.000	8.003	8.003	19.52%
สสมส.	58	0.000	73.275	73.275	126.34%	0.000	0.000	0.000	0.00%
ขวก.(ก5)	157	0.000	155.468	155.468	99.02%	0.000	15.950	15.950	10.16%
รวก.(กต)	500	0.000	474.317	474.317	94.86%	0.000	91.099	91.099	18.22%
Agenda base	140	0.000	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.000	0.00%
กปน.	1,200	0.000	918.676	918.676	76.56%	0.000	145.716	145.716	12.14%

ผลงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2565

สาขา	เป้าหมาย ผลส่งมอบงาน	คาดการณ์ ผลส่งมอบงาน	ผลการลงนาม ปีงบฯ 65	ผลงานปรับปรุงท่อ						
				คาดการณ์ ถึงสิ้น ธ.ค.64	รายเดือน ธ.ค.64			สะสม ต.ค.64-ธ.ค.64		
					แผนงาน	ผลงาน	ผลต่าง +/-	แผนงาน	ผลงาน	ผลต่าง +/-
สสส.	63	63.000	0.000	0.000	3.000	4.957	1.957	9.000	9.892	0.892
สสพ.	69	69.000	0.282	6.302	4.000	6.302	2.302	12.000	19.490	7.490
สสป.	90	90.000	32.554	8.756	7.500	8.756	1.256	10.500	12.133	1.633
สสท.	26	26.000	0.699	0.408	0.996	0.000	(0.996)	1.548	1.417	(0.131)
รวม.(ก1)	248	248.000	33.535	15.466	15.496	20.015	4.519	33.048	42.932	9.884
สสญ.	48	48.000	3.228	3.800	3.800	0.000	(3.800)	7.200	4.390	(2.810)
สสม.	16	16.000	4.122	1.271	0.800	1.271	0.471	1.500	1.940	0.440
สสล.	45	45.000	1.006	7.400	2.100	0.000	(2.100)	4.400	3.799	(0.601)
รวม.(ก2)	109	109.000	8.356	12.471	6.700	1.271	(5.429)	13.100	10.129	(2.971)
สสช.	55	55.000	0.000	3.269	3.000	3.269	0.269	11.000	11.782	0.782
สสข.	53	53.000	12.726	8.200	5.000	8.200	3.200	9.000	13.240	4.240
สสมบ.	40	40.000	0.000	4.479	4.476	4.479	0.003	13.938	13.627	(0.311)
สสสภ.	55	55.000	0.000	4.074	2.000	4.074	2.074	4.500	8.517	4.017
รวม.(ก3)	203	203.000	12.726	20.022	14.476	20.022	5.546	38.438	47.166	8.728
รวม.(ก๔)	560	560.000	54.617	47.959	36.672	41.308	4.636	84.586	100.227	15.641
สสป.	91	91.000	19.079	2.440	1.928	2.440	0.512	6.928	7.828	0.900
สสด.	70	70.000	21.963	1.800	2.941	0.000	(2.941)	14.000	12.959	(1.041)
สสภ.	80	80.000	34.107	3.000	1.500	0.000	(1.500)	2.000	2.295	0.295
สสว.	81	81.000	0.000	3.296	3.200	3.296	0.096	4.200	4.254	0.054
รวม.(ก4)	322	322.000	75.149	10.536	9.569	5.736	(3.833)	27.128	27.336	0.208
สสน.	63	63.000	7.947	1.500	2.000	0.000	(2.000)	3.000	8.265	5.265
สสบท.	52	52.000	8.003	8.122	5.500	8.122	2.622	7.000	15.211	8.211
สสมส.	63	63.000	0.000	2.000	2.000	2.122	0.122	3.500	3.727	0.227
รวม.(ก5)	178	178.000	15.950	11.622	9.500	10.244	0.744	13.500	27.203	13.703
รวม.(ก๕)	500	500.000	91.099	22.158	19.069	15.980	(3.089)	40.628	54.539	13.911
Agenda base	140	140.000	0.000	7.000	5.000	11.505	6.505	11.000	27.232	16.232
กปน.	1200	1200.000	145.716	77.117	60.741	68.793	8.052	136.214	181.998	45.784

หมายเหตุ : 1. คาดการณ์ผลการส่งมอบงานจาก สกส. สำนักงานประชาสัมพันธ์และ ABS ณ วันที่ 20 ธ.ค. 64

2. ผลการลงนามปีงบฯ 65 จาก Google sheet ณ วันที่ 22 ธ.ค.64 และผลงานปรับปรุงท่อรายเดือน จาก Google sheet ณ วันที่ 23 ธ.ค.64

คาดการณ์ส่งมอบงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียปีงบประมาณ 2565

หน่วย : กิโลเมตร

สาขา/ Agenda Base	เป้าการส่งมอบงาน ปีงบฯ 65	คาดการณ์ส่งมอบงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียปีงบประมาณ 2565												รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
สสส.	63	3.000	3.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	63.000
สสพ.	69	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	8.000	8.000	5.000	69.000
สสป.	90	0.500	2.500	7.500	7.000	9.500	4.500	6.000	9.500	10.500	11.000	11.000	10.500	90.000
สสท.	26	-	0.552	0.996	1.786	2.150	1.192	1.716	1.608	2.500	4.000	4.500	5.000	26.000
ขวก.(ก1)	248	7.500	10.052	15.496	18.786	22.650	16.692	18.716	22.108	24.000	28.000	33.500	30.500	248.000
สสญ.	48	1.000	2.400	3.800	3.900	3.600	6.000	2.500	4.400	2.500	3.900	5.500	8.500	48.000
สสม.	16	-	0.700	0.800	1.000	1.000	1.200	1.000	1.200	1.500	2.000	2.400	3.200	16.000
สสล.	45	-	2.300	2.100	5.400	2.100	1.300	3.400	3.300	4.500	6.400	6.700	7.500	45.000
ขวก.(ก2)	109	1.000	5.400	6.700	10.300	6.700	8.500	6.900	8.900	8.500	12.300	14.600	19.200	109.000
สสข.	55	3.000	5.000	3.000	3.000	2.000	6.000	3.000	4.000	6.000	7.000	6.000	7.000	55.000
สสช.	53	1.000	3.000	5.000	2.000	3.000	6.000	3.000	5.000	5.000	7.000	6.000	7.000	53.000
สสมบ.	40	4.700	4.762	4.476	4.420	4.930	3.968	2.374	2.522	2.500	2.166	2.500	0.682	40.000
สสสภ.	55	1.000	1.500	2.000	1.500	1.200	2.000	3.500	4.000	5.000	8.800	12.000	12.500	55.000
ขวก.(ก3)	203	9.700	14.262	14.476	10.920	11.130	17.968	11.874	15.522	18.500	24.966	26.500	27.182	203.000
รวม.(กอ)	560	18.200	29.714	36.672	40.006	40.480	43.160	37.490	46.530	51.000	65.266	74.600	76.882	560.000
สสบ.	91	-	5.000	1.928	1.560	0.350	5.334	3.176	7.478	15.608	9.737	13.016	27.813	91.000
สสต.	70	5.375	5.684	2.941	5.000	5.000	4.000	4.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	70.000
สสภ.	80	-	0.500	1.500	3.000	5.000	6.000	6.500	7.500	10.000	12.000	13.000	15.000	80.000
สสว.	81	-	1.000	3.200	0.800	4.000	7.000	7.500	7.500	9.700	12.500	13.000	14.800	81.000
ขวก.(ก4)	322	5.375	12.184	9.569	10.360	14.350	22.334	21.176	28.478	43.308	42.237	47.016	65.613	322.000
สสน.	63	-	1.000	2.000	1.500	2.000	5.000	6.000	6.000	10.500	7.500	10.000	11.500	63.000
สสบท.	52	-	1.500	5.500	5.000	5.000	5.000	4.000	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	52.000
สสมส.	63	-	1.500	2.000	2.000	2.000	4.500	5.000	7.000	19.000	3.000	6.000	11.000	63.000
ขวก.(ก5)	178	0.000	4.000	9.500	8.500	9.000	14.500	15.000	18.000	35.500	15.500	21.000	27.500	178.000
รวม.(กต)	500	5.375	16.184	19.069	18.860	23.350	36.834	36.176	46.478	78.808	57.737	68.016	93.113	500.000
Agenda base	140	3.000	3.000	5.000	9.000	9.000	9.000	15.000	15.000	17.000	17.000	19.000	19.000	140.000
กปน.	1200	26.575	48.898	60.741	67.866	72.830	88.994	88.666	108.008	146.808	140.003	161.616	188.995	1200.000

สถานะสัญญาจ้างบริหารจัดการข้อมูลและ CMPM

[illegible]

ติดตั้ง DMA ใหม่

เป้าหมาย			ติดตั้ง DMA ใหม่ (จุดวัดอัตราการไหลและแรงดันน้ำ) สนับสนุนกิจกรรมการจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาสาขา																										
รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2563			2564												2565											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
งานจ้างติดตั้งเครื่องวัด DMA ใหม่ ปีงบฯ 2564	27 จุด	20 ล้านบาท				A			B	C	D		E	F															
										A	B	C	D	E	F														

ลงนามสัญญาวันที่ 19 มี.ค.64 / กจช.ฝจพ. มีการแก้ไขขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา
 รายละเอียดวันแจ้งเริ่มงาน-สิ้นสุด วันที่ 21 มิ.ย.64 /ประชุม precon วันที่ 19 ต.ค.64
 กำหนดให้เริ่มงานแล้ววันที่ 8 พ.ย. 2564 ระยะเวลาดำเนินงาน 480 วัน
 ตัดบรรจบติดตั้ง DM ใหม่ วันที่ 23 ธ.ค.64

หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฝจส.) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564



A

อนุมัติเอกสารประกวดราคา
(TOR + ราคากลาง)

B

ยื่นเอกสารประกวดราคา

C

ตรวจเอกสาร

D

ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)

E

ลงนามสัญญา

F

ดำเนินงานตามสัญญา



แผนการดำเนินงาน



เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน



ล่าช้ากว่าแผน

ติดตั้ง DMA ใหม่ (จุดวัดอัตราการไหลและแรงดันน้ำ) สนับสนุนกิจกรรมการจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนเตรียมบันทึกเบิกจ้าง /ตรวจสอบผู้ประกอบการ SMEs ตาม ว.845 แล้วเสร็จ /แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และราคากลางแล้วเสร็จวันที่ 15 ต.ค. 64 /ประชุม TOR วันที่ 28 ต.ค.64
ปัจจุบัน TOR แล้วเสร็จ และส่งให้คณะกรรมการราคากลางดำเนินการต่อไป

A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---

ระหว่างขั้นตอนจัดทำบันทึกเสนอของบประมาณเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2565 (ประมาณการงบ 80 ล้านบาท) ปัจจุบันบันทึกถึง ฝ่ายงบประมาณ (25 ต.ค.64) (รองบประมาณ)

หมายเหตุ

D	ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)
E	ลงนามสัญญา
F	ดำเนินงานตามสัญญา

แผนการดำเนินงาน	
เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน	
ล่าช้ากว่าแผน	

งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 2,3 และ 4,5 (ส่วนต่อขยาย)

เป้าหมาย

บริหารข้อมูลฯ ภาค 2,3,4,5 (ส่วนต่อขยาย)

รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2564						2565												2566											
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 2,3 (ส่วนต่อขยาย)	21 จุด	0.8 ล้านบาท			A	B	C	D	E																							
					A	B	C	D	E	F																						
งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 4,5 (ส่วนต่อขยาย)	20 จุด	0.8 ล้านบาท			A	B	C	D	E																							
					A	B	C	D	E	F																						

ได้ผู้รับจ้าง บ.เซนส์ อินโฟเทค จำกัด แจ้งเริ่มงานวันที่ 3 ธ.ค.64 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 2 ธ.ค. 65

ได้ผู้รับจ้าง บ.เซนส์ อินโฟเทค จำกัด แจ้งเริ่มงานวันที่ 3 ธ.ค.64 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 2 ธ.ค. 65

หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฝจส.) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

หมายเหตุ

A

อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคากลาง)/ตรวจ SMEs

B

ยื่นเอกสารประกวดราคา

C

ตรวจเอกสาร

D

ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)

E

ลงนามสัญญา

F

ดำเนินงานตามสัญญา

แผนการดำเนินงาน

เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน

ล่าช้ากว่าแผน

แผนงานจ้างสัญญาจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย (PBC) (ปรับปรุงแผน ตุลาคม 2563)

ลำดับ ที่	กิจกรรม	2564												2565											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	กลุ่ม 1 : 2 สัญญา ประกอบด้วย สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ และ ภาษีเจริญ																								
	ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดทำสัญญาฯ และลงนาม																								
	ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)																								
2	กลุ่ม 2 : 2 สัญญา ประกอบด้วย สำนักงานประปาบางกอกน้อย และตากสิน																								
	ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดทำสัญญาฯ และลงนาม																								
	ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)																								
3	กลุ่ม 3 : 9 สัญญา ประกอบด้วย สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท พระโขนง พญาไท ทุ่งมหาเมฆ แม้นศรี ประชาชื่น สุวรรณ สุขสวัสดิ์ และ มหาสวัสดิ์																								
	ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดทำสัญญาฯ และลงนาม																								
	ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)																								

แผนการดำเนินงานเดิมก่อนปรับปรุง แผนการดำเนินงาน เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน ล่าช้ากว่าแผน

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

เป้าหมาย		จ้างสำรวจหาท่อรั่วด้วยดาวเทียม และเทคโนโลยี Sensors												
รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปี 2564			ปี 2565								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สำรวจหาท่อรั่วด้วยดาวเทียม	8,000 กม.	10.5 ล้านบาท	A		B	C/D	E	F						
			A		B	จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ขั้นตอนนำร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น)								
งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยี Sensors	พื้นที่เป้าหมาย	20 ล้านบาท	B	C/D	E	F								
			A			อยู่ระหว่างการทดสอบความเหมาะสม ของเทคโนโลยี จำนวน 1 บริษัท คาดว่าจะแล้วเสร็จธันวาคม 2564								

หมายเหตุ

A

B

C

อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคากลาง)

ยื่นเอกสารประกวดราคา

ตรวจเอกสาร

D

E

F

ดำเนินการขออนุมัติจ้าง

ลงนามสัญญา

ดำเนินงานตามสัญญา

แผนการดำเนินงาน

เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน

ล่าช้ากว่าแผน

ผลการปฏิบัติงานสนับสนุน เดือนธันวาคม 2564

งานคำร้อง (Request)

งานสำรวจหาท่อรั่วภายใน โรงแรม D Varee Xpress มักกะสัน ถ.เพชรบุรี

การดำเนินการ :

- **Office Survey :** รวบรวมข้อมูลการทำงานเดิมจากทีมงาน กบบ.ฝพธ.
- **Site Survey :** ตรวจสอบพื้นที่โรงแรมทั้งอาคาร (5 คูหา 7 ชั้น) พบการรั่วไหลประมาณ 1.5-2 ลบ.ม./ชม. (การใช้น้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 1,000 ลบ.ม./เดือน) และได้ดำเนินการตรวจสอบเป็น 3 Section เบื้องต้น คาดว่ามีการรั่วไหลเกิดขึ้นที่บริเวณชั้น 1 – 4 ของอาคาร โดยเน้นที่บริเวณถังพักน้ำใต้ดินของอาคารเป็นสำคัญ
- **การดำเนินการต่อเนื่อง :** ให้คำปรึกษาให้กับลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของถังพักน้ำใต้ดิน และแนะนำการซ่อมบำรุงถังพักน้ำใต้ดินเบื้องต้นหลังมีการพบการรั่วไหล และแนะนำการดูแลถังพักน้ำภายในพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายลูกค้าให้ กปน. เพิ่มเติม



ขอบคุณครับ
