

วาระที่ 3.1.1

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 29 มีนาคม 2565

Agenda Style



01

ผลเบิกจ่ายประจำเดือน และผลเบิกจ่าย
งบลงทุนสะสม ต.ค.64 – 24 มี.ค.65

02

ครุภัณฑ์วงเงินต่ำกว่า 100,000 บาท ถึง
500,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย และ
ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ทำสัญญา

03

มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

04

การจัดสรรงบประมาณต่อกระทรวง สาธารณสุข
และค่าที่อุปกรณ์




1. ผลเบิกจ่ายประจำเดือน และ
ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม
ต.ค.64 – 24 มี.ค.65

สรุปแผนผลเบิกจ่ายงบลงทุน

เบิกจ่าย 120.4 %
เบิกจ่ายสูงกว่าแผน
251.34 ล้านบาท

เบิกจ่าย 111.9 %
เบิกจ่ายสูงกว่าแผน
189.30 ล้านบาท

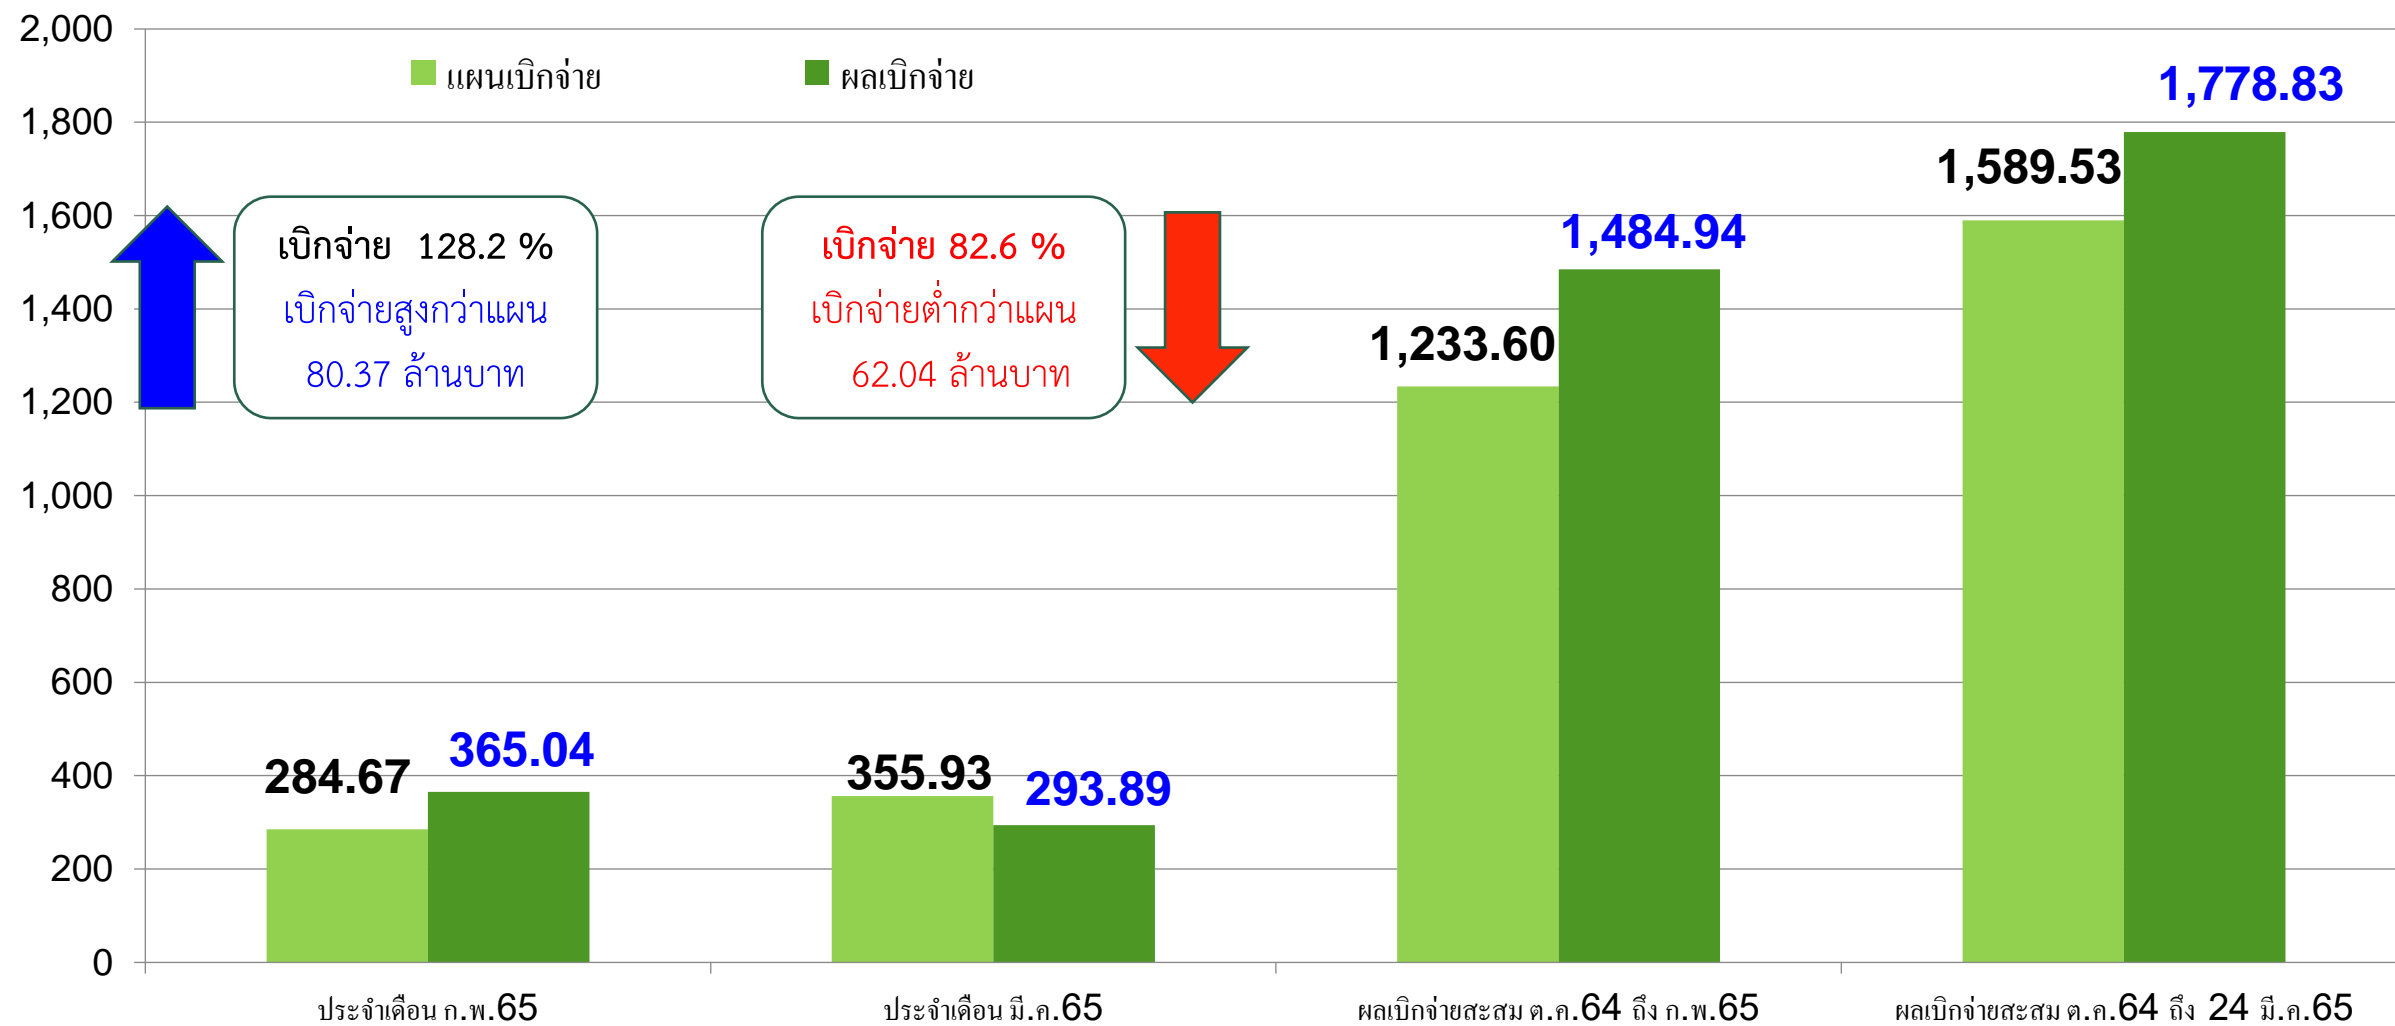

1.1 แผน - ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน ก.พ.65 และผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – ก.พ.65

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ก.พ.65				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – ก.พ.65			
	แผน ก.พ.65	ผล ก.พ.65	ผลต่าง	%	แผน ก.พ.65	ผล ก.พ.65	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	30.32	35.20	4.88	116.1 %	112.40	157.64	45.25	127.9 %
ลดน้ำสูญเสีย	159.17	214.24	55.07	134.6 %	746.66	807.39	60.73	108.1 %
มาตรวัดน้ำ	21.51	25.01	3.51	116.3 %	80.48	108.09	27.61	134.3 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	5.72	3.65	(2.08)	63.7 %	15.97	18.14	2.17	113.6 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	6.03	8.99	2.96	149.2 %	17.05	31.34	14.29	183.8 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	3.91	6.69	2.78	171.1 %	20.09	28.65	8.56	142.6 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	2.33	0.39	(1.94)	16.6 %	5.33	16.47	11.14	308.9 %
ปรับปรุงระบบ DMA	-	-	-	-	12.90	17.28	4.38	133.9 %
งานรับจ้างงาน	37.30	48.12	10.82	129.0 %	137.99	201.08	63.08	145.7 %
งานติดตั้งประปาใหม่	16.19	20.61	4.42	127.3 %	70.72	95.66	24.94	135.3 %
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	2.20	-	(2.20)	-	14.00	-	(14.00)	-
งานก่อสร้างอาคาร กชร.	-	2.15	2.15	-	-	3.19	3.19	-
รวมทั้งสิ้น	284.67	365.04	80.37	128.2 %	1,233.59	1,484.94	251.34	120.4 %

1.2 แผน - ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน มี.ค.65 และผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – 24 มี.ค.65

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน มี.ค.65				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – 24 มี.ค.65			
	แผน มี.ค.65	ผล มี.ค.65	ผลต่าง	%	แผน มี.ค.65	ผล มี.ค.65	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	30.68	33.91	3.22	110.5 %	143.08	191.55	48.47	133.9 %
ลดน้ำสูญเสีย	225.69	162.61	(63.08)	72.1 %	972.35	970.00	(2.35)	99.8 %
มาตรวัดน้ำ	26.95	24.71	(2.24)	91.7 %	107.44	132.80	25.37	123.6 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	7.51	2.23	(5.38)	28.4 %	23.47	20.27	(3.21)	86.3 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	7.61	2.47	(5.14)	32.4 %	24.66	33.81	9.15	137.1 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	3.52	0.97	(2.55)	27.4 %	23.61	29.62	6.00	125.4 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	3.74	3.74	-	5.33	20.21	14.88	379.1 %
ปรับปรุงระบบ DMA	-	-	-	-	12.90	17.28	6.00	133.9 %
งานรับจ้างงาน	36.25	40.56	4.31	111.9 %	174.25	241.64	67.39	138.7 %
งานติดตั้งประปาใหม่	15.52	22.01	6.49	141.8 %	86.24	117.67	31.43	136.4 %
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	2.20	0.79	(1.41)	36.0 %	16.20	0.79	(15.41)	4.9 %
งานก่อสร้างอาคาร กชร.	-	-	-	-	-	3.19		-
รวมทั้งสิ้น	355.93	293.89	(62.04)	82.6 %	1,589.53	1,778.83	189.30	111.9 %



2.ครุภัณฑ์วงเงินต่ำกว่า 100,000 บาท
ถึง 500,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย และ
ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ทำสัญญา

2.1 ครุภัณฑ์วงเงินต่ำกว่า 100,000 บาท – สายงานบริการเบิกจ่ายครบทุกรายการ

2.2 ครุภัณฑ์วงเงิน 100,000 บาท – 500,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย – 4 รายการ

หน่วยงา▼	WBS ▼	รายการ ▼	วงเงิน ▼	เหตุผลความก้าวหน้า
สสบ.	C-65.1.02.02.0002	งานจ้างปรับปรุงปั๊อมยามหน่วยบริการเจริญสุขนิทวงศ์ สำนักงานประปาสาขา บางกอกน้อย	500,000.00	- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่งานก่อสร้างอาคาร สสบ - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกค่างานได้ในเดือน มิ.ย.65
ฝสน.	C-65.1.03.03.0041	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำทิ้ง ภายในสถานีสูบน้ำจุ่มพินีและสถานีสูบน้ำจุ่มน้ำเพชรเกษม	340,000.00	ทำสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 3 ก.พ.65 วงเงิน 339,000 บาท
ฝสน.	C-65.1.05.01.0204	งานซื้อพร้อมติดตั้งโลโก้ตราสัญลักษณ์พระแม่ธรณี ที่สถานีสูบน้ำจุ่มน้ำประขานุกูล และสถานีสูบน้ำจุ่มพินี	500,000.00	ส่งรายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตฯ ให้คณะกรรมการราคากลาง เมื่อ 3 ก.พ. 2565
สสม.	C-65.1.05.02.0025	ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม ระบบ ดิจิตอล (Digital System) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	459,000.00	ล่าช้าเนื่องจากรอสินค้าส่งมาจากต่างประเทศ ผู้รับจ้างเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์บางส่วนแล้ว คาดว่าติดตั้งแล้วเสร็จประมาณ ต้นเม.ย.65
รวม			1,999,000.00	

2.3.1 ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ทำสัญญา – GECC (งบสำรองเร่งด่วน)

เอกสารแนบท้ายบันทึกที่ ผงป 78/2565

ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน ผอ.ผสบ.

ตามที่ ผวก. ได้อนุมัติเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2565 สำหรับงานปรับปรุงสำนักงานประปาสาขาให้สอดคล้องกับเกณฑ์ในการสมัครรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2565 แล้วนั้น กงล. ดำเนินการโอนเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2565 จำนวนเงิน 2,158,700.- บาท เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	สาขา	ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	สสส.	C-65.1.06.02.0035	งานก่อสร้างทางลาดคนพิการใหม่ พร้อมราวสแตนเลสกันตก	55,000.-
2	สสส.	C-65.1.06.02.0036	งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดทำที่จอดรถ บริเวณโรงไม้เก็บท่อ ห้องเก็บของ และห้องน้ำพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	690,000.-
3	สสส.	C-65.1.06.02.0037	งานก่อสร้างห้องน้ำคนพิการและงานที่เกี่ยวข้อง	230,700.-
4	สสส.	C-65.1.06.02.0038	งานติดตั้งจุดให้บริการรับชำระเงิน (ตู้จุดจ่ายจระ) และงานที่เกี่ยวข้อง	470,000.-
5	สสส.	C-65.1.06.02.0039	งานจัดทำพื้นที่สูบบุหรี่ บริเวณนอกอาคารสำนักงาน	110,000.-
6	สสส.	C-65.1.06.02.0040	งานจัดทำพื้นที่สูบบุหรี่ บริเวณนอกอาคารสำนักงาน	25,000.-
7	สสมส.	C-65.1.06.02.0041	งานจัดทำฉากหลัง (Backdrop) หลังเคาน์เตอร์ให้บริการลูกค้า	270,000.-
8	สสภ.	C-65.1.06.02.0042	งานจัดจ้างทำราวกันตกสแตนเลส สำหรับลูกค้าและผู้พิการ ติดตั้งบริเวณศูนย์บริการลูกค้า ตรงทางเดินคนพิการ	308,000.-
รวม				2,158,700.-

ผสบ.
รับที่ 688
วัน 23 ก.พ. 2565
เวลา 09.25

งบ GECC ที่ขอสำรองกรณี
จำเป็นเร่งด่วน

- ทุกรายการกันวนเงิน **PR** แล้ว
- รายการที่ **8** สสภ. ลงนาม
สัญญาแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค.65

2.3.2 ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ทำสัญญา – GECC งบสำรอง รวก.(กอ)

เอกสารแนบท้ายบันทึกที่ กปงฝสบ 43/2565
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน ผอ.ฝสบ.

ตามที่ รวก.(กอ) ได้อนุมัติงบครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับสายงานบริการด้านตะวันออก สำหรับงานปรับปรุงสำนักงานประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ในการสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2565 แล้วนั้น กงล. ดำเนินการโอนงบครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับสายงานบริการด้านตะวันออก จำนวนเงิน 117,700.- บาท เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	สาขา	WBS	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	สสส.	C-65.1.05.01.1003	ซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณขอความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ	11,200.00
2	สสส.	C-65.1.05.01.1004	รถเข็นสำหรับบริการผู้พิการ (1 คัน)	5,000.00
3	สสส.	C-65.1.05.01.1005	โต๊ะหินอ่อน (ประกอบด้วย โต๊ะกลางและที่นั่ง 4 ด้าน) 2 ชุด	24,000.00
4	สสส.	C-65.1.05.01.1006	ป้ายบอกทิศทางสำหรับผู้พิการ จำนวน 4 จุด	40,000.00
5	สสส.	C-65.1.05.01.1007	ป้ายแสดงแผนผังของ สสส. จำนวน 1 ชุด	25,000.00
6	สสส.	C-65.1.05.01.1008	ป้ายบอกทาง แผนที่ผังที่ตั้งตึกเกอร์สะท้อนแสงขนาด 60*120 ซม.	4,000.00
7	สสส.	C-65.1.05.01.1009	ป้ายจุดจอดรถจักรยานยนต์พนักงาน (แผนที่ผังที่ตั้งตึกเกอร์สะท้อนแสง ขนาด 40*120 ซม.)	2,500.00
8	สสส.	C-65.1.05.01.1010	ป้ายจุดจอดรถยนต์พนักงาน (แผนที่ผังที่ตั้งตึกเกอร์สะท้อนแสง ขนาด 30*120 ซม.)	2,000.00
9	สสส.	C-65.1.05.01.1011	ป้ายเตือนพื้นต่างระดับ (แผนที่ผังที่ตั้งตึกเกอร์สะท้อนแสง - พื้นต่างระดับ ขนาด 20*100 ซม. 4 จุด	4,000.00
รวม				117,700.-

กัณวเงิน PR ทุกรายการแล้ว
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค.65

2.3.3 ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ทำสัญญา – GECC (งบสำรอง รวก.(กต)

เอกสารแนบท้ายบันทึกที่ กปงฝสบ 40/2565
ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

เรียน ผอ.ฝสบ.

ตามที่ รวก.(กต) ได้อนุมัติงบครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับสายงานบริการด้านตะวันตก สำหรับงานปรับปรุงสำนักงานประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ในการสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2565 แล้วนั้น กงล. ดำเนินการโอนงบครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับสายงานบริการด้านตะวันตก จำนวนเงิน 426,163.- บาท เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	สาขา	WBS	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	สสส.	C-65.1.05.01.2003	ป้ายชื่อสำนักงานประชาสัมพันธ์ฯมหาสวัสดิ์ พร้อมโครงเหล็กกล่องขนาด 1.40*10 ม.(ติดตั้งด้านหน้าอาคารบริเวณชั้น 2)	32,500.-
2	สสส.	C-65.1.05.01.2004	จ้างทำป้ายแสดงเลขตั้งพื้นอะคริลิก สำหรับสโตนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.60 ม.	7,000.-
3	สสส.	C-65.1.05.01.2005	จ้างทำป้ายชื่อสำนักงานประชาสัมพันธ์ฯมหาสวัสดิ์ ขนาด 0.80*1.50 ม. (ติดตั้งบริเวณริมทางเข้า)	10,700.-
4	สสส.	C-65.1.05.01.2006	จ้างทำป้ายไฟชื่อสำนักงานประชาสัมพันธ์ฯมหาสวัสดิ์ ขนาด 0.50*3.80 ม. (ติดตั้งบริเวณทางเข้าจุดบริการลูกค้า)	58,000.-
5	สสส.	C-65.1.05.01.2007	เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อ (19 ตัว)	38,000.-
6	สสส.	C-65.1.05.01.2008	ตู้ข้อมูลข่าวสาร (1 ตู้)	5,400.-
7	สสส.	C-65.1.05.01.2009	รถเข็นวีลแชร์ (1 คัน)	5,000.-
8	สสส.	C-65.1.05.01.2010	จัดซื้อพร้อมติดตั้งโทรทัศน์ LED UHD 4K ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 ชุด (พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน) บริเวณศูนย์บริการลูกค้า	76,200.-
9	สสส.	C-65.1.05.01.2011	จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดระบบอินเตอร์คอมพิวเตอร์อะคริลิก (11 ชุด)	110,000.-
10	สสส.	C-65.1.05.01.2012	จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์พีซีแบบทูอินวัน Tablet PC จำนวน 2 เครื่อง สำหรับบริการลูกค้าบริเวณศูนย์บริการลูกค้า	83,363.-
รวม				426,163.-

สสส. — ลงนามสัญญา 3 รายการ (ครบ)
สสส. — รายการที่ 1-4 กัณ PR แล้ว ที่เหลือ
ยังไม่กัณวเงินสัญญา
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค.65

The background of the slide is a solid green color, overlaid with a pattern of green leaves. The leaves are arranged in a border-like fashion around the edges of the slide. In the center, there is a white rectangular box with a thin black border. Inside this box, the text "3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน" is written in a white, bold, sans-serif font.

3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

01

ในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ ยังสามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผนจ่ายรายเดือน ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ 2 มีแนวโน้มที่จะบรรลุตามเกณฑ์ วัดผลความสามารถในการบริหารแผนลงทุนรายไตรมาสที่ร้อยละ 100 ได้ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป แผนจ่ายรายเดือนเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หากไม่สามารถเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน หรือ การเร่งรัดให้สามารถเบิกจ่ายในงานที่มีความพร้อมขึ้นมามากทดแทนงานที่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จะส่งผลต่อตัวชี้วัดผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในช่วงไตรมาสที่ 3 และที่ 4 ได้

02

สำหรับการติดตามการทำสัญญาของงบลงทุนปกติที่มีแผนทำสัญญาในปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ทำสัญญา – ชวก.(สจ)

หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	แผนทำสัญญา
ฝคจ.	C-63.1.03.02.0008	รถบดอัดสันสะท้อนขนาดไม่ต่ำกว่า 3-5 ตัน	5,000,000.00	ส.ค.65 (ไม่มีแผนจ่าย)
ฝคจ.	C-63.1.05.01.0425	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง พื้นที่สามเสน2	1,082,900.00	มี.ค.65
ฝคจ.	C-64.1.03.01.0008	เข็มพืดเหล็ก(Steel Sheet Pile) ยาว 6 เมตร	600,000.00	พ.ค.65
ฝคจ.	C-64.1.03.01.0009	เข็มพืดเหล็ก(Steel Sheet Pile) ยาว 8 เมตร	900,000.00	พ.ค.65
ฝคจ.	C-64.1.03.01.0012	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 30 KVA พร้อมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	600,000.00	เม.ย.65
ฝคจ.	C-65.1.03.01.0022	งานจ้างปรับปรุงทดแทนอุปกรณ์ระบบควบคุมประตูน้ำระยะไกล (Remote Control Valve) ที่หมดสภาพการใช้งาน	33,000,000.00	ส.ค.65 (ไม่มีแผนจ่าย)
ฝคจ.	C-65.1.03.02.0001	เครื่องมือสำหรับตรวจวัดค่า Cathodic Protection ท่อประธารณ โดยใช้เทคโนโลยี Internet of things (IOT) พร้อมติดตั้งจำนวน 40 ชุด	2,500,000.00	ส.ค.65 (ไม่มีแผนจ่าย)
ฝคจ.	C-65.1.03.03.0031	งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ (PLC Module - Programmable Logic Controller Module:Remote Terminal Unit-RTU)	5,300,000.00	ส.ค.65
ฝคจ. ยังไม่ทำสัญญา รวมทั้งสิ้น			48,982,900.00	


วงเงินดำเนินการทั้งสิ้น ของ ฝคจ.	65,107,560.28 บาท
วงเงินเบิกจ่ายปี 65 ของ ฝคจ.	21,427,560.28 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 8,882,318.54 บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 12,545,241.74 บาท	

หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	แผนทำสัญญา
ฝสน.	C-60.1.06.02.0223	ก่อสร้างรั้วกำแพง ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำคลองเตย	1,546,728.97	ก.ค.65
ฝสน.	C-63.1.03.03.0028	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ 10 สถานี	30,000,000.00	ส.ค.65 (ไม่มีแผนจ่าย)
ฝสน.	C-64.1.03.03.0017	งานซื้อพร้อมติดตั้ง Suction Valve หมายเลข 1 พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำคลองเตย	1,000,000.00	ก.พ.65
ฝสน.	C-64.1.03.03.0030	งานซื้อพร้อมติดตั้งตู้เครื่องวัด (Instrument Panel) สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ และโรงงานผลิตน้ำสามเสน	6,000,000.00	ส.ค.65 (ไม่มีแผนจ่าย)
ฝสน.	C-64.1.06.02.0056	งานซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer) ขนาด 7.5 MVA และสวิตช์เกียร์แรงดัน 115 kV ชนิด Hybrid Compact Switchgear พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สจ.มินบุรี	30,000,000.00	ส.ค.65 (ไม่มีแผนจ่าย)
ฝสน.	C-65.1.02.02.0003	งานจ้างเปลี่ยนหลังคาที่ สจ.ท่าพระ สจ.คลองเตย และ สจ.บางพลี	3,000,000.00	ม.ค.65
ฝสน.	C-65.1.03.03.0032	ซื้อพร้อมติดตั้ง Bridge Crane ขนาด 25 ตัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำท่าพระ	5,000,000.00	ส.ค.65 (ไม่มีแผนจ่าย)
ฝสน.	C-65.1.03.03.0033	ซื้อพร้อมติดตั้ง Electric Actuator สำหรับ Discharge Valve No.4 , 5 และ Inlet Valve No.1, 2 สจ.เพชรเกษม, Discharge Valve No.4 สจ.ลาดพร้าว, Discharge Valve No.5 สจ.ลำโพง และ Discharge Valve No.4, 5 สจ.คลองเตย รวม 8 ชุด	5,360,000.00	ส.ค.65 (ไม่มีแผนจ่าย)
ฝสน.	C-65.1.03.03.0036	ซื้อพร้อมติดตั้ง Inlet Valve พร้อมหัวขับไฟฟ้า หมายเลข 1-3 ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำลาดพร้าว	6,000,000.00	ส.ค.65 (ไม่มีแผนจ่าย)
ฝสน.	C-65.1.03.03.0037	ซื้อพร้อมติดตั้ง MV vacuum circuit breaker ของตู้สวิตช์เกียร์หมายเลข 2 และ 5 จำนวน 2 ชุด สำหรับสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางพลี	1,100,000.00	ม.ค.65
ฝสน.	C-65.1.05.01.0204	งานซื้อพร้อมติดตั้งโลโก้ตราสัญลักษณ์พระแม่ธรณี ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำประชานุกุล และสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำลุมพินี	500,000.00	ธ.ค.64
ฝสน. ยังไม่ทำสัญญา รวมทั้งสิ้น			89,506,728.97	

วงเงินดำเนินการทั้งสิ้น ของ ฝสน.	98,903,098.22 บาท
วงเงินเบิกจ่ายปี 65 ของ ฝสน.	14,996,369.25 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 2,141,070.00 บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 12,855,299.25 บาท	

ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ทำสัญญา (งบขอเร่งด่วน/งบปกติ) – สาขา

หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	ได้รับจัดสรรงบ	แผนทำสัญญา	แผนเบิกจ่าย
สสท.	C-65.1.06.02.0044	สายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง	6,200.00	2-มี.ค.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65
สสท.	C-65.1.06.02.0045	สายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง	5,700.00	2-มี.ค.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65
สสท.	C-65.1.06.02.0046	สายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร พร้อมข้อต่อ สวมเร็วชนิดทองเหลือง	7,900.00	2-มี.ค.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65
สสสภ.	C-65.1.02.02.0006	งานปรับปรุงพื้นที่และหลังคาโรงจอดรถสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ	1,300,000.00	งบปกติ	พ.ค.65	ก.ย.65
สสมบ.	C-65.1.02.03.0004	งานปรับปรุงรั้วกำแพงคอนกรีตสำนักงานประปาสาขามีนบุรี	4,000,000.00	งบปกติ	มี.ค.65	ส.ค.65
สสบ.	C-65.1.02.02.0002	งานจ้างปรับปรุงปั๊มยามหน่วยบริการเจริญสหวงศ์ สสบ.	500,000.00	งบปกติ	-	ธ.ค.64
สสว.	C-65.1.06.02.0026	สายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 10 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง	2,850.00	29-ธ.ค.-64	มี.ค.-65	มี.ค.-65
สสว.	C-65.1.06.02.0027	สายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 10 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง	2,850.00	29-ธ.ค.-64	มี.ค.-65	มี.ค.-65
สสว.	C-65.1.06.02.0028	สายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง	4,470.00	29-ธ.ค.-64	มี.ค.-65	มี.ค.-65
สาขา ยังไม่ทำสัญญา รวมทั้งสิ้น			5,829,970.00			

The background of the slide is a solid green color, overlaid with a pattern of green leaves. The leaves are arranged in a border-like fashion around the central text box, with some leaves overlapping each other. The central text box is a white rectangle with a thin black border, containing the title text in Thai.

4.การจัดสรรงบประมาณต่อตัว งบสำรวจหาที่รู้ และค่าที่อุปกรณ์

แนวทางการจัดสรรและบริหารงบประมาณต่อแตกรั่ว งบสำรวจหาท่อรั่ว และค่าท่ออุปกรณ์

1. งานจ้างซ่อมท่อแตกรั่ว

- จัดสรรค่าจ้างซ่อมท่อแตกรั่วให้สาขา ตามความจำเป็นเร่งด่วน ตามระยะเวลา
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ใช้สำหรับเปิดสัญญาซ่อมท่อเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการเปิดสัญญา สร. ได้
- หากเปิดสัญญาแล้ว ต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จะพิจารณาถึงงบประมาณคืนเพื่อโอนให้กับสาขาอื่นๆ
- หากได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ยังไม่ดำเนินการเปิดสัญญาตามกำหนดระยะเวลา จะพิจารณาถึงงบประมาณคืนเพื่อโอนให้กับสาขาอื่นๆ
- ขอให้สาขาเร่งรัดการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินค่างานของสัญญาด้วย หากค้างเบิกหลายสัญญา หรือ วงเงินค้างเบิกสูง จะมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบ

2. งานสำรวจหาท่อรั่ว

- ผจส. เป็นผู้พิจารณาจัดสรรงบสำรวจหาท่อรั่วตามความเหมาะสม โดยมีวงเงินงบประมาณ 15 ล้านบาท

3. ค่าท่อและอุปกรณ์

- ไม่ให้โอน ค่าท่อและอุปกรณ์ออก เพื่อสมทบหมวดค่าใช้จ่ายอื่น เนื่องจากค่าท่ออุปกรณ์ไม่เพียงพอ
- ไม่ให้โอน ค่าท่อและอุปกรณ์ เพื่อเปิดงาน สร.
- กรณีค่าท่ออุปกรณ์ไม่เพียงพอ ขอให้บริหารจัดการค่าท่ออุปกรณ์ โอนระหว่างสาขาก่อน จึงขอจัดสรรเพิ่มเติมจาก ผงป. ได้

ข้อมูลการเปิดสัญญา ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค.2565)

ลำดับที่	สาขา	เลขที่หนังสืออ้างอิง	ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ				
			เดือน	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาดำเนินการ	วงเงินที่เปิดสัญญา	วงเงินที่ขอเพิ่ม
1	สสบ.	สวปกอบสสบ102/2565 ลว. 4 ก.พ.65	มี.ค.-65	สสบ(ซท)01-05/2565	มี.ค.65 - ก.ย.65	10,000,000.00	10,000,000.00
2	สสต.	สวปสสต 36/2565 ลว. 25 ก.พ.65	มี.ค.-65	สสต.(ซท)02-04/2565	มี.ค.65 - ก.ย.65	2,803,738.32	1,300,000.00
ความต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ เดือน มี.ค.65						12,803,738.32	11,300,000.00
3	สสต.	สวปสสต 16/2565 ลว. 21 ม.ค.65	เม.ย.-65	สสต.(ซท)02-03/2565	เม.ย.65 - ก.ย.65	14,018,691.59	14,000,000.00
4	สสบท.	สวปกอบสสบท 21/2565 ลว. 17 ก.พ.65	เม.ย.-65	สสบท.ซ.07/2565	21 เม.ย.65 - 20 ส.ค.65	9,300,000.00	5,300,000.00
5	สสว.	สวปสสว29/2565 ลว. 24 ก.พ.65	เม.ย.-65	สสว(ซท)14-04/2565	1 เม.ย.65 - 30 ก.ย.65	6,500,000.00	6,500,000.00
ความต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ เดือน เม.ย.65						29,818,691.59	25,800,000.00
6	สสช.	สวปกอบสสช /2565	พ.ค.-65	สสช.จท.2/2565	พ.ค.65 - ก.ย.65	6,000,000.00	4,100,000.00
7	สสพ.	สวปกอบสสพ 23/2565 ลว.28 ก.พ.65	พ.ค.-65	-	-	9,000,000.00	5,200,000.00
ความต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ เดือน พ.ค.65						15,000,000.00	9,300,000.00
8	สสน	สสน148/2565 ลว.14 ก.พ.65	มิ.ย.-65	-	มิ.ย.-65	-	5,500,000.00
9	สสมส.	สวปกอบสสมส34/2565 ลว 24 ก.พ.65	มิ.ย.-65	สสมสซท...../2565	5 มิ.ย.65 - 30 ก.ย.65	6,000,000.00	6,000,000.00
ความต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ เดือน มิ.ย.65						6,000,000.00	11,500,000.00
10	สสม.	สวปกอบสสม27/2565 ลว. 25 ก.พ.65	ก.ค.-65	สสม (ซท) 5/2565	มิ.ย.65 - ก.ย.65	2,000,000.00	1,000,000.00
ความต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ เดือน ก.ค.65						2,000,000.00	1,000,000.00
11	สสบท.	สวปกอบสสบท 21/2565 ลว. 17 ก.พ.65	ส.ค.-65	สสบท.ซ.08/2565	21 ส.ค.65 - 30 ก.ย.65	2,700,000.00	2,700,000.00
12	สสมบ.	สซทกรรสมบ 92/2565 ลว 25 ก.พ.65	ส.ค.-65	สซท.03/2565	ส.ค.65 - ก.ย.65	3,500,000.00	3,300,000.00
13	สสญ.	ไม่บอกรายละเอียดการเปิดสัญญา	ส.ค.-65		ส.ค.65 - ก.ย.65		3,100,000.00
ความต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ เดือน ส.ค.65						6,200,000.00	9,100,000.00
ต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ รวมทั้งสิ้น						71,822,429.91	68,000,000.00

ได้รับโอนเงิน
งบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างการจัดสรร
งบประมาณ

ข้อมูลการเปิดสัญญา ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค.2565)

ลำดับที่	สาขา	เลขที่หนังสืออ้างอิง	ค่าจ้างเหมาสำรวจหาท่อรั่ว				
			เดือน	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาดำเนินการ	วงเงินที่เปิดสัญญา	วงเงินที่ขอเพิ่ม
1	สสป.	timeline	ก.พ. 65	สร.17-5(65)	ก.พ.65 - ก.ย.65	3,084,112.15	3,000,000.00
2	สสป.	timeline	ก.พ. 65	สร.17-6(65)	ก.พ.65 - พ.ค.65	1,214,953.27	1,300,000.00
ความต้องการงบประมาณงานสำรวจหาท่อรั่ว เดือน ก.พ.65						4,299,065.42	4,300,000.00
3	สสน.	สสน148/2565 สว.14 ก.พ.65	มี.ค. 65	สสน(จท)12/2565	มี.ค. 65	1,300,000.00	1,300,000.00
4	สสว.	สวปสว29/2565 สว. 24 ก.พ.65	มี.ค. 65	สร.14-07(65)	1 เม.ย.65 - 30 ก.ย.65	2,000,000.00	2,000,000.00
5	สสบท.	สวปกรบสสบท 21/2565 สว. 17 ก.พ.65	มี.ค. 65	สสบท.สร.54-07(65)	17 มี.ค.65 - 30 ก.ย.65	934,570.00	1,000,000.00
ความต้องการงบประมาณงานสำรวจหาท่อรั่ว เดือน มี.ค.65						4,234,570.00	4,300,000.00
6	สสน.	กรบสสส69/2565 สว.14 ก.พ.65	เม.ย. 65	สร.55-03(65)	เม.ย.65 - ก.ย.65	2,000,000.00	2,000,000.00
7	สสว.	สวปสว29/2565 สว. 24 ก.พ.65	เม.ย. 65	สร.14-09(65)	1 มี.ค.65 - 30 ก.ย.65	3,500,000.00	3,500,000.00
8	สสน.	สวปกรบสสน34/2565 สว 24 ก.พ.65	เม.ย. 65	สร.56-03(65)	1 เม.ย.65 - 31 พ.ค.65	467,000.00	467,000.00
9	สสค.	สวปสค 36/2565 สว. 25 ก.พ.65	เม.ย. 65	สร.02-02(65)	เม.ย.65 - ก.ย.65	1,500,000.00	1,500,000.00
ความต้องการงบประมาณงานสำรวจหาท่อรั่ว เดือน เม.ย.65						7,467,000.00	7,467,000.00
10	สสป.	timeline	พ.ค. 65	สร.17-8(65)	พ.ค.65-ก.ย.65	700,934.58	700,000.00
ความต้องการงบประมาณงานสำรวจหาท่อรั่ว เดือน พ.ค.65						700,934.58	700,000.00
11	สสบท.	สวปกรบสสบท 21/2565 สว. 17 ก.พ.65	มี.ย. 65	สสบท.สร.54-06(65)	17 มี.ย.65 - 30 ก.ย.65	600,000.00	600,000.00
12	สสน.	สสน148/2565 สว.14 ก.พ.65	มี.ย. 65	-	มี.ย. 65	500,000.00	500,000.00
13	สสน.	สวปกรบสสน35/2565 สว 24 ก.พ.65	มี.ย. 65	สร.56-04(65)	1 มี.ย.65 - 31 ก.ค.65	467,000.00	467,000.00
ความต้องการงบประมาณงานสำรวจหาท่อรั่ว เดือน มี.ย.65						1,567,000.00	1,567,000.00
14	สสข.	สวปกรบสสข 40/2565 ส 3 มี.ค.65	ก.ค. 65	สร.16-01(65)	ก.ค.65 - ก.ย.65	600,000.00	600,000.00
ความต้องการงบประมาณงานสำรวจหาท่อรั่ว เดือน ก.ค.65						600,000.00	600,000.00
15	สสน.	สวปกรบสสน27/2565 สว. 25 ก.พ.65	ส.ค. 65	สร.06-25/2565	ส.ค. 65	1,000,000.00	500,000.00
16	สสน.	สวปกรบสสน35/2565 สว 24 ก.พ.65	ส.ค. 65	สร.56-05(65)	1 ส.ค.65 - 30 ก.ย.65	467,000.00	467,000.00
17	สสข.	สวปกรบสสข /2565	ส.ค. 65	สร.15-02(65)	ส.ค.65 - ก.ย.65	1,200,000.00	1,200,000.00
ความต้องการงบประมาณงานสำรวจหาท่อรั่ว เดือน ส.ค.65						2,667,000.00	2,167,000.00
18	สสพ.	สวปกรบสสพ 23/2565 สว.28 ก.พ.65	ก.ย. 65	-	ก.ย. 65	467,000.00	-
ความต้องการงบประมาณงานสำรวจหาท่อรั่ว เดือน ก.ย.65						467,000.00	-
ต้องการงบประมาณงานสำรวจหาท่อรั่ว รวมทั้งสิ้น						22,002,570.00	21,101,000.00

ข้อมูลการเบิกค่าท่ออุปกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค.2565)

สาขา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ใช้จริงถึง 25 มี.ค.65	งบประมาณคงเหลือ ณ 25 มี.ค.65 (A)	% การเบิกค่าท่อ อุปกรณ์	คาดการณ์เบิกท่อ เม.ย.65 – ก.ย.65 (B)	คำนวณงบคงเหลือกับ คาดการณ์เบิกท่อ (B) – (A)
สสส	8,846,000.00	2,341,087.29	6,504,912.71	26.46	3,290,000.00	3,214,912.71
สสพ	9,136,000.00	5,642,559.74	3,493,440.26	61.76	5,550,000.00	(2,056,559.74)
สสป	14,287,000.00	10,793,181.35	3,493,818.65	75.55	9,300,000.00	(5,806,181.35)
สสท	3,941,000.00	1,938,714.01	2,002,285.99	49.19	2,100,000.00	(97,714.01)
สสม	5,957,000.00	2,783,269.72	3,173,730.28	46.72	3,870,000.00	(696,269.72)
สสญ	9,250,000.00	5,396,364.52	3,853,635.48	58.34	6,000,000.00	(2,146,364.52)
สสล	8,460,000.00	5,216,435.99	3,243,564.01	61.66	6,000,000.00	(2,756,435.99)
สสช	8,154,000.00	3,363,853.18	4,790,146.82	41.25	4,445,000.00	345,146.82
สสข	7,292,000.00	5,607,501.46	1,684,498.54	76.90	6,000,000.00	(4,315,501.46)
สสมบ	12,745,000.00	5,897,756.46	6,847,243.54	46.28	6,250,000.00	597,243.54
สสสภ	10,734,000.00	5,462,178.52	5,271,821.48	50.89	5,700,000.00	(428,178.52)

ข้อมูลการเบิกค่าท่ออุปกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค.2565)

สาขา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ใช้จริงถึง 25 มี.ค.65	งบประมาณคงเหลือ ณ 25 มี.ค.65 (A)	% การเบิกค่าท่อ อุปกรณ์	คาดการณ์เบิกท่อ เม.ย.65 – ก.ย.65 (B)	คำนวณงบคงเหลือกับ คาดการณ์เบิกท่อ (B) – (A)
สสบ	13,353,000.00	10,199,036.37	3,153,963.63	76.38	15,600,000.00	(12,446,036.37)
สสด	16,844,000.00	12,964,860.19	3,879,139.81	76.97	12,600,000.00	(8,720,860.19)
สสภ	11,612,000.00	6,643,453.60	4,968,546.40	57.21	7,680,000.00	(2,711,453.60)
สสว	8,963,000.00	6,923,962.28	2,039,037.72	77.25	8,300,000.00	(6,260,962.28)
สสน	11,579,000.00	3,448,206.74	8,130,793.26	29.78	6,363,500.00	1,767,293.26
สสบท	10,700,000.00	7,061,341.66	3,638,658.34	65.99	6,900,000.00	(3,261,341.66)
สสมส	16,085,000.00	10,329,184.65	5,755,815.35	64.22	9,850,000.00	(4,094,184.65)
รวม	187,938,000.00	112,012,947.73	75,925,052.27	61.05	125,798,500.00	(49,873,447.73)



THANK YOU

1.2 งานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 – ฝคจ.

หน่วยงาน	รายละเอียดรายการ - เฉพาะรายการที่มีแผนเบิกจ่ายสูง	วงเงินดำเนินการ (บาท)	วงเงินเบิกจ่าย (บาท)
ฝคจ. ส่วนใหญ่มีแผน เบิกจ่ายในเดือน ก.ย.65	<ul style="list-style-type: none"> - รถบรรทุกหัวลากจูง (ปี61) แผนเบิกจ่าย <u>เดือน ก.ย.65</u> จำนวน 4.53 ล้านบาท - งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมประตูน้ำระยะไกล RCV (ปี62) แผนเบิกจ่าย <u>เดือน ก.ย.65</u> จำนวน 8.25 ล้านบาท - งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ PLC - RTU แผนเบิกจ่าย <u>เดือน ก.ย.65</u> จำนวน 2.12 ล้านบาท - งานจ้างปรับปรุงระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อประธาน (ปี62) แผนเบิกจ่าย <u>เดือน ก.ย.65</u> จำนวน 2.494 ล้านบาท - ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พื้นที่สามเสน 2 แผนเบิกจ่าย <u>เดือน ก.ย.65</u> จำนวน 1.082 ล้านบาท - วงเงินดำเนินการ 40.5 ล้านบาท แต่ไม่มีแผนเบิกจ่าย ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ❖ รถบดอัดสันสเทือนขนาดไม่ต่ำกว่า 3-5 ตัน (งบปี 63/ 5 ล้านบาท) ❖ งานจ้างปรับปรุงทดแทนอุปกรณ์ RCV ที่หมดสภาพการใช้งาน (33 ล้านบาท) ❖ เครื่องมือสำหรับตรวจวัดค่า Cathodic Protection ท่อประธาน (2.5 ล้านบาท) 	65,107,560.28	21,427,560.28 18.476 ล้านบาท

1.2 งานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 – ฝสน.

หน่วยงาน	รายละเอียดรายการ - เฉพาะรายการที่มีแผนเบิกจ่ายสูง	วงเงินดำเนินการ (บาท)	วงเงินเบิกจ่าย (บาท)
ฝสน.	<ul style="list-style-type: none"> - งานจ้างก่อสร้างห้องสุขาและห้องอาบน้ำตามสถานีสูบน้ำ และงานปรับปรุงห้องน้ำเดิมเป็นห้องเก็บของจำนวน 9 สถานี (ปี63) แผนเบิกจ่าย 4.58 ล้านบาท ในเดือน ก.พ.65 / มิ.ย.65 / ก.ย.65 - งานปรับปรุงฝาปิดช่อง STOP LOG และช่องเปิดต่าง ๆ ของสถานีสูบน้ำ 11 สถานี (ปี64) แผนเบิกจ่าย เดือน พ.ค.65 จำนวน 1.79 ล้านบาท - ซื้อพร้อมติดตั้ง MV vacuum circuit breaker ของตู้สวิตช์เกียร์หมายเลข 2 และ 5 จำนวน 2 ชุด สำหรับสถานีสูบน้ำบางพลี แผนเบิกจ่าย เดือน ก.ย.65 จำนวน 1.11 ล้านบาท - งานปรับปรุงอาคารสโมสร โรงงานผลิตน้ำสามเสน 2 แผนเบิกจ่าย เดือน ก.ย.65 จำนวน 2.30 ล้านบาท - งานซื้อพร้อมติดตั้ง Suction Valve หมายเลข 1 พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่สถานีสูบน้ำคลองเตย แผนเบิกจ่าย เดือน ก.ย.65 1.00 ล้านบาท - งานจ้างเปลี่ยนหลังคาที่ สจ.ท่าพระ สจ.คลองเตย และ สจ.บางพลี แผนเบิกจ่าย เดือน ก.ย.65 จำนวน 3.00 ล้านบาท - วงเงินดำเนินการ 82.36 ล้านบาท แต่ไม่มีแผนเบิกจ่าย ได้แก่ งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดที่สถานีสูบน้ำ 10 สถานี (งบปี 63/ 30 ล้านบาท) , งานซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง สจ.มีนบุรี (งบปี 64/ 30 ล้านบาท) , งานซื้อพร้อมติดตั้งตู้เครื่องวัด (Instrument Panel) สถานีสูบน้ำ และโรงผลิตน้ำสามเสน (งบปี 64/ 6 ล้านบาท) , ซื้อพร้อมติดตั้ง Bridge Crane สจ.ท่าพระ (5 ล้านบาท) , ซื้อพร้อมติดตั้ง Electric Actuator 8 ชุด (5.36 ล้านบาท) , ซื้อพร้อมติดตั้ง Inlet Valve พร้อมหัวขับไฟฟ้า (6 ล้านบาท) 	97,356,369.25	14,996,369.25
			9.69 ล้านบาท
	รวมงานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	224,964,383.93	96,327,783.93
