




**การประปานครหลวง**

**METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY**

ผลการดำเนินงานด้านลดน้ำสูญเสีย  
ประจำเดือน กันยายน 2565

# ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสม สิงหาคม 2565 (กปน.)

(%)

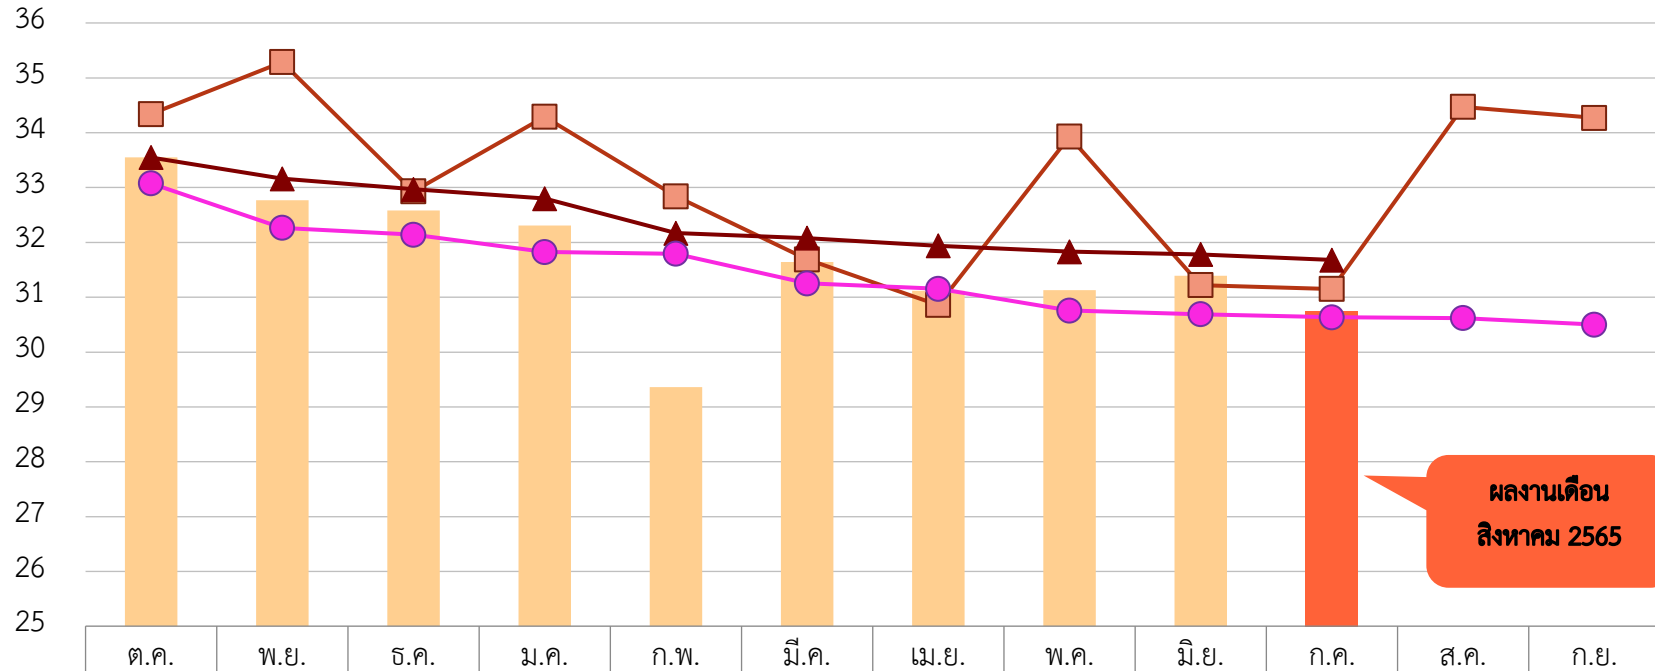

ผลงานเดือน  
สิงหาคม 2565

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายเดือน ปี 2565	33.55	32.77	32.58	32.31	29.36	31.64	31.12	31.13	31.39	30.75		
รายเดือน ปี 2564	34.34	35.29	32.93	34.29	32.84	31.69	30.86	33.93	31.22	31.15	34.47	34.27
สะสม ปี 2565	33.55	33.16	32.97	32.8	32.17	32.08	31.94	31.83	31.78	31.68		
เป้าสะสม ปี 2565	33.08	32.27	32.14	31.82	31.79	31.25	31.15	30.76	30.69	30.63	30.62	30.50

ตัวชี้วัด	E	D	C	B	A
อัตราน้ำสูญเสีย(ร้อยละ)	34.09	33.59	33.09	31.79	30.50

ผลงานอัตราน้ำสูญเสียเดือนสิงหาคม 2565										
สาขา	ปริมาณน้ำเข้า (ลบ.ม./วัน)		ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม./วัน)		เป้าหมายน้ำจำหน่าย รายเดือน (ลบ.ม./วัน)	% น้ำจำหน่ายเทียบ เป้าหมาย รายเดือน (%)	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)		เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)	
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ค.	ส.ค.
สสพ.	222,391.00	227,032.00	148,742.74	146,338.84	146,806.45	-0.32	73,648.26	80,693.16	33.12	35.54
สสส.	376,106.00	387,048.00	266,137.73	266,031.84	245,645.16	8.30	109,968.27	121,016.16	29.24	31.27
สสพ.	387,973.00	384,968.00	283,515.63	278,249.50	276,322.58	0.70	104,457.37	106,718.50	26.92	27.72
สสป.	532,607.00	528,900.00	393,882.38	379,462.34	381,419.35	-0.51	138,724.62	149,437.66	26.05	28.25
สสญ.	338,849.00	336,126.00	245,900.47	240,850.70	239,516.13	0.56	92,948.53	95,275.30	27.43	28.35
สสม.	295,975.00	298,357.00	202,537.17	202,954.11	203,548.39	-0.29	93,437.83	95,402.89	31.57	31.98
สสล.	290,828.00	288,605.00	215,975.05	210,751.23	207,516.13	1.56	74,852.95	77,853.77	25.74	26.98
สสช.	232,040.00	231,627.00	174,528.04	169,350.70	175,903.23	-3.73	57,511.96	62,276.30	24.79	26.89
สสข.	192,852.00	191,325.00	155,139.06	155,263.57	151,419.35	2.54	37,712.94	36,061.43	19.56	18.85
สสมบ.	256,307.00	258,785.00	206,162.66	208,613.24	201,709.68	3.42	50,144.34	50,171.76	19.56	19.39
สสสภ.	327,584.00	316,599.00	274,069.73	258,325.86	249,677.42	3.46	53,514.27	58,273.14	16.34	18.41
สสบ.	360,225.00	364,801.00	206,505.24	200,640.27	188,709.68	6.32	153,719.76	164,160.73	42.67	45.00
สสต.	391,806.00	390,077.00	224,513.86	218,805.08	216,225.81	1.19	167,292.14	171,271.92	42.70	43.91
สสภ.	352,373.00	342,425.00	214,519.04	210,093.94	201,580.65	4.22	137,853.96	132,331.06	39.12	38.65
สสว.	381,448.00	377,967.00	218,315.47	217,696.51	194,935.48	11.68	163,132.53	160,270.49	42.77	42.40
สสน.	254,949.00	251,551.00	183,746.86	178,270.41	177,741.94	0.30	71,202.14	73,280.59	27.93	29.13
สสบท.	226,299.00	226,618.00	155,033.93	154,799.20	140,612.90	10.09	71,265.07	71,818.80	31.49	31.69
สสมส.	277,074.00	282,254.00	176,559.67	173,347.30	175,645.16	-1.31	100,514.33	108,906.70	36.28	38.58
กปน.	5,697,686.00	5,685,065.00	3,945,784.74	3,869,844.64	3,774,935.48	2.51	1,751,901.26	1,815,220.36	30.75	31.93

ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสมเดือนสิงหาคม 2565 (เทียบเป้าหมายรายเดือน)

สาขา	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)			เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)			แนวโน้มน้ำสูญเสีย	ผลงานสะสม (%)	เป้าหมายเกณฑ์ A			
	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			เป้าหมายสะสม (%)	เปรียบเทียบรายเดือน	เป้าหมายปีงบประมาณ 65 (%)	เปรียบเทียบเป้าหมายปีงบประมาณ 65
สสท.	78,950.19	73,648.26	80,693.16	34.21	33.12	35.54		36.13	34.42	✗	34.04	✗
สสส.	116,789.69	109,968.27	121,016.16	30.55	29.24	31.27		29.84	29.60	✗	29.78	✗
สสพ.	104,145.35	104,457.37	106,718.50	26.70	26.92	27.72	เพิ่มขึ้น	26.47	27.50	✓	26.96	✓
สสป.	142,732.07	138,724.62	149,437.66	26.39	26.05	28.25		27.28	29.11	✓	29.02	✓
ชวก.(ก1)	442,617.29	426,798.52	457,865.48	28.67	28.10	29.97		29.00	29.58	✓	29.40	✓
สสญ.	104,280.05	92,948.53	95,275.30	30.28	27.43	28.35		32.08	34.27	✓	33.79	✓
สสม.	100,815.36	93,437.83	95,402.89	32.88	31.57	31.98		35.50	36.39	✓	36.17	✓
สสล.	81,014.91	74,852.95	77,853.77	27.30	25.74	26.98		27.47	24.06	✗	24.54	✗
ชวก.(ก2)	286,110.33	261,239.31	268,531.96	30.19	28.22	29.09		31.73	31.80	✓	31.70	✗
สสช.	60,333.30	57,511.96	62,276.30	25.64	24.79	26.89		26.22	29.99	✓	29.57	✓
สสข.	42,859.20	37,712.94	36,061.43	21.88	19.56	18.85	ลดลง	21.59	22.40	✓	21.86	✓
สสมบ.	47,421.87	50,144.34	50,171.76	18.14	19.56	19.39		17.40	11.57	✗	11.39	✗
สสสภ.	56,074.98	53,514.27	58,273.14	17.23	16.34	18.41		16.20	16.49	✓	16.68	✓
ชวก.(ก3)	206,689.35	198,883.51	206,782.64	20.30	19.72	20.71		19.88	19.86	✗	19.66	✗

ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสมเดือนสิงหาคม 2565 (เทียบเป้าหมายรายเดือน)

สาขา	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)			เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)			แนวโน้มน้ำสูญเสีย	ผลงานสะสม (%)	เป้าหมายเกณฑ์ A			
	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			เป้าหมายสะสม (%)	เปรียบเทียบรายเดือน	เป้าหมายปีงบประมาณ 65 (%)	เปรียบเทียบเป้าหมายปีงบประมาณ 65
สสบ.	155,524.46	153,719.76	164,160.73	43.02	42.67	45.00		43.32	44.24	✓	44.32	✓
สสต.	169,149.05	167,292.14	171,271.92	42.41	42.70	43.91	เพิ่มขึ้น	42.87	34.50	✗	34.70	✗
สสภ.	142,887.84	137,853.96	132,331.06	39.83	39.12	38.65	ลดลง	38.90	36.29	✗	35.95	✗
สสว.	161,168.12	163,132.53	160,270.49	41.64	42.77	42.40		44.25	41.13	✗	41.05	✗
ขวก.(ก4)	628,729.47	621,998.39	628,034.20	41.74	41.86	42.57	เพิ่มขึ้น	42.39	39.11	✗	39.08	✗
สสน.	74,313.70	71,202.14	73,280.59	28.51	27.93	29.13		28.63	30.20	✓	30.17	✓
สสบท.	77,361.35	71,265.07	71,818.80	33.04	31.49	31.69		31.26	26.49	✗	26.47	✗
สสมส.	102,579.14	100,514.33	108,906.70	36.39	36.28	38.58		35.53	33.35	✗	33.11	✗
ขวก.(ก5)	254,254.19	242,981.54	254,006.09	32.74	32.04	33.40		31.92	30.38	✗	30.27	✗
กปน.	1,818,400.63	1,751,901.26	1,815,220.36	31.39	30.75	31.93		31.70	30.62	✗	30.50	✗

# รายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรมลดน้ำสูญเสียเดือน สิงหาคม 2565

สาขา	งานสำรวจท่อรั่ว							งานซ่อมท่อ (จุด)									
	Step Test (ครั้ง)		ระยะทางสำรวจท่อรั่ว (กม.)		จำนวนจุดรั่วที่พบ		Reported Burst				Unreported Burst				รวม		
							ท่อจ่าย		ท่อบริการ <sup>(1)</sup>		ท่อจ่าย		ท่อบริการ <sup>(1)</sup>				
	ผลปีที่แล้ว <sup>(2)</sup>	ปีปัจจุบัน <sup>(2)</sup>	ผลปีที่แล้ว <sup>(2)</sup>	ปีปัจจุบัน <sup>(2)</sup>	ผลปีที่แล้ว <sup>(2)</sup>	ปีปัจจุบัน <sup>(2)</sup>	ผลปีที่แล้ว <sup>(2)</sup>	ปีปัจจุบัน <sup>(2)</sup>	ผลปีที่แล้ว <sup>(2)</sup>	ปีปัจจุบัน <sup>(2)</sup>	ผลปีที่แล้ว <sup>(2)</sup>	ปีปัจจุบัน <sup>(2)</sup>	ผลปีที่แล้ว <sup>(2)</sup>	ปีปัจจุบัน <sup>(2)</sup>			
สสท.	-	6	465	553	142	110	7	6	313	306	11	4	102	84	433	400	
สสส.	2	1	294	362	322	193	26	22	529	554	18	1	258	149	831	726	
สสพ.	-	3	608	727	512	581	20	41	559	624	8	19	351	483	938	1,167	
สสป.	9	8	1,380	495	1,072	1,122	100	63	764	664	63	34	585	775	1,512	1,536	
ภาค 1	11	18	2,747	2,137	2,048	2,006	153	132	2,165	2,148	100	58	1,296	1,491	3,714	3,829	
สสญ.	5	7	822	737	766	507	14	27	340	687	15	19	589	388	958	1,121	
สสม.	12	15	361	586	331	408	18	18	293	325	9	9	319	352	639	704	
สสล.	8	14	533	510	528	869	16	39	573	482	9	13	505	829	1,103	1,363	
ภาค 2	25	36	1,716	1,833	1,625	1,784	48	84	1,206	1,494	33	41	1,413	1,569	2,700	3,188	
สสข.	-	-	966	606	303	635	23	34	555	598	12	6	474	501	1,064	1,139	
สสช.	8	6	589	399	344	233	16	22	661	527	13	7	292	205	982	761	
สสมบ.	3	6	453	378	323	324	44	41	353	457	11	13	310	318	718	829	
สสสภ.	12	8	534	448	421	513	25	57	313	361	7	9	332	444	677	871	
ภาค 3	23	20	2,543	1,831	1,391	1,705	108	154	1,882	1,943	43	35	1,408	1,468	3,441	3,600	
รวม.(กอ)	59	74	7,006	5,802	5,064	5,495	309	370	5,253	5,585	176	134	4,117	4,528	9,855	10,617	
สสบ.	2	8	664	606	1,349	1,115	24	51	965	1,232	7	16	989	1,055	1,985	2,354	
สสด.	1	8	466	1,365	519	873	33	53	767	931	3	14	289	761	1,092	1,759	
สสภ.	11	7	584	1,355	1,144	1,570	31	30	1,114	1,091	10	9	1,095	1,472	2,250	2,602	
สสว.	-	11	1,069	1,864	1,309	1,930	15	53	613	815	12	31	1,285	1,967	1,925	2,866	
ภาค 4	14	34	2,783	5,190	4,321	5,488	103	187	3,459	4,069	32	70	3,658	5,255	7,252	9,581	
สสน.	-	-	578	355	537	324	11	3	324	346	20	-	422	256	777	605	
สสบท.	-	-	395	563	572	677	15	10	669	365	3	1	419	285	1,106	661	
สสมส.	1	3	410	2,391	617	2,020	33	41	947	829	18	17	551	1,710	1,549	2,597	
ภาค 5	1	3	1,383	3,309	1,726	3,021	59	54	1,940	1,540	41	18	1,392	2,251	3,432	3,863	
รวม.(กต)	15	37	4,166	8,499	6,047	8,509	162	241	5,399	5,609	73	88	5,050	7,506	10,684	13,444	
กปน.	74	111	11,172	14,300	11,111	14,004	471	611	10,652	11,194	249	222	9,167	12,034	20,539	24,061	

หมายเหตุ :

ข้อมูลผลงานจากระบบ WLMA ณ วันที่ 7 กันยายน 2565 ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2565 บันทึกโดยสำนักงานประปาสาขา

(1) จำนวนงานซ่อมท่อบริการ = ผลรวมของงานซ่อมท่อบริการ + อุปกรณ์ท่อจ่าย + อุปกรณ์ท่อบริการ + อุปกรณ์ท่ออื่นๆ

(2) คือ จำนวนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบในช่วงเดือนเดียวกัน ระหว่างปีงบประมาณ 2565 และ ปีงบประมาณ 2564

# ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย ณ เดือน กันยายน 2565

ระดับข้อมูล	จำนวนงาน Step Test	จำนวนงาน สร.	ระยะทางที่เดิน	จำนวนจุดรั่วที่พบ	จำนวนงานซ่อมที่เปิด-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อจ่าย-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อบริการ-สปน.	งานซ่อมท่อจ่าย-สปน.	งานซ่อมท่อบริการ-สปน.	ไม่พบจุดรั่ว-สปน.	อื่นๆ-สปน.	ยกเลิกงาน-สปน.
กปน.	8	492	2,867	2,933	2,902	29	1,274	18	830	9	46	10
รวก.(กอ)	5	216	1,075	1,031	1,172	16	553	11	421	5	28	2
รวก.(กต)	3	276	1,792	1,902	1,730	13	721	7	409	4	18	8

ระดับข้อมูล	จำนวนงานซ่อมที่เปิด - รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนามท่อจ่าย - รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนามท่อบริการ - รับแจ้ง
กปน.	2,272	70	1,781
รวก.(กอ)	1,122	39	887
รวก.(กต)	1,150	31	894

SCAN หากต้องการดู  
รายละเอียดงาน



หมายเหตุ: กรณีทุกตัว DM คาดว่าใช้งานได้หมด จะใช้น้ำเข้า DMA จริงจากอุปกรณ์เครื่องวัดภาคสนาม  
กรณีคาดว่ามิบาง DM ใช้งานไม่ได้ จะใช้น้ำเข้า DMA จากข้อมูลคาดการณ์จากสาขาเดือนก่อนหน้า

\*\*\*ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน กลส.ฝจส. ณ วันที่ 6 กันยายน 2565

# แผน-ผลงานจัดทำแบบและจ้าง (สาขาและ Agenda base) ปีงบประมาณ 2565

สาขา	แผน (1200 กม.)	เบิกจ้างแล้ว				ลงนามแล้ว			
		ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน	ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน
สสส.	63	0.000	86.946	86.946	138.01%	0.000	72.253	72.253	114.69%
สสพ.	69	0.000	70.968	70.968	102.85%	0.000	70.968	70.968	102.85%
สสป.	90	0.000	92.731	92.731	103.03%	0.000	92.731	92.731	103.03%
สสท.	26	0.000	27.035	27.035	103.98%	0.000	27.035	27.035	103.98%
ขวก.(ก1)	248	0.000	277.680	277.680	111.97%	0.000	262.987	262.987	106.04%
สสญ.	48	0.000	51.045	51.045	106.34%	0.000	51.045	51.045	106.34%
สสม.	16	0.000	16.268	16.268	101.68%	0.000	12.590	12.590	78.69%
สสส.	45	0.000	50.567	50.567	112.37%	0.000	50.567	50.567	112.37%
ขวก.(ก2)	109	0.000	117.880	117.880	108.15%	0.000	114.202	114.202	104.77%
สสช.	55	0.000	55.494	55.494	100.90%	0.000	55.494	55.494	100.90%
สสช.	53	0.000	53.101	53.101	100.19%	0.000	53.101	53.101	100.19%
สสมบ.	40	0.000	53.956	53.956	134.89%	0.000	42.833	42.833	107.08%
สสสภ.	55	0.000	60.375	60.375	109.77%	0.000	60.375	60.375	109.77%
ขวก.(ก3)	203	0.000	222.926	222.926	109.82%	0.000	211.803	211.803	104.34%
รวก.(กอ)	560	0.000	618.486	618.486	110.44%	0.000	588.992	588.992	105.18%
สสบ.	101	0.000	105.128	105.128	104.09%	0.000	105.128	105.128	104.09%
สสค.	75	0.000	77.506	77.506	103.34%	0.000	77.506	77.506	103.34%
สสภ.	85	0.000	95.431	95.431	112.27%	0.000	87.979	87.979	103.50%
สสว.	82	0.000	85.343	85.343	104.08%	0.000	82.001	82.001	100.00%
ขวก.(ก4)	343	0.000	363.408	363.408	105.95%	0.000	352.614	352.614	102.80%
สสน.	58	0.000	78.081	78.081	134.62%	0.000	63.192	63.192	108.95%
สสบท.	41	0.000	73.335	73.335	178.87%	0.000	54.528	54.528	133.00%
สสมส.	58	0.000	83.154	83.154	143.37%	0.000	76.051	76.051	131.12%
ขวก.(ก5)	157	0.000	234.570	234.570	149.41%	0.000	193.771	193.771	123.42%
รวก.(กค)	500	0.000	597.978	597.978	119.60%	0.000	546.385	546.385	109.28%
Agenda base	140	0.000	130.268	130.268	93.05%	0.000	108.468	108.468	77.48%
กปน.	1,200	0.000	1346.732	1346.732	112.23%	0.000	1243.845	1243.845	103.65%



# ผลงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2565

สาขา	เป้าหมาย ผลส่งมอบงาน	คาดการณ์ ผลส่งมอบงาน	ผลการลงนาม ปีงบฯ 65	ผลงานปรับปรุงท่อ					
				รายเดือน ส.ค.65			สะสม ต.ค.64-ส.ค.65		
				แผนงาน	ผลงาน	ผลต่าง +/-	แผนงาน	ผลงาน	ผลต่าง +/-
สสส.	63	63.000	72.253	10.000	11.452	1.452	53.000	50.175	(2.825)
สสพ.	69	69.000	70.968	8.000	7.149	(0.852)	64.000	67.008	3.008
สสป.	90	90.000	92.731	11.000	18.648	7.648	79.500	78.667	(0.833)
สสท.	26	18.551	27.035	5.500	4.580	(0.920)	20.000	19.223	(0.777)
ขวก.(ก1)	248	240.551	262.987	34.500	41.828	7.328	216.500	215.073	(1.427)
สสญ.	48	48.000	51.045	5.500	8.422	2.922	39.500	45.547	6.047
สสม.	16	16.000	12.590	2.400	1.310	(1.090)	12.800	14.972	2.172
สสล.	45	45.000	50.567	6.700	2.742	(3.958)	37.500	35.783	(1.717)
ขวก.(ก2)	109	109.000	114.202	14.600	12.474	(2.126)	89.800	96.302	6.502
สสช.	55	55.000	55.494	6.000	6.191	0.191	48.000	49.741	1.741
สสข.	53	51.002	53.101	6.000	6.469	0.469	46.000	40.376	(5.625)
สสมบ.	40	40.000	42.833	2.500	6.114	3.614	39.318	49.335	10.017
สสสภ.	55	55.000	60.375	12.000	8.200	(3.801)	42.500	54.133	11.633
ขวก.(ก3)	203	201.002	211.803	26.500	26.974	0.474	175.818	193.584	17.766
รวก.(กอ)	560	550.553	588.992	75.600	81.276	5.676	482.118	504.959	22.841
สสบ.	91	91.000	105.128	13.016	11.137	(1.879)	63.187	63.823	0.636
สสต.	70	70.000	77.506	8.000	7.400	(0.600)	62.000	64.446	2.446
สสภ.	80	80.000	87.979	13.000	13.686	0.686	65.000	64.777	(0.223)
สสว.	81	49.343	82.001	15.000	8.657	(6.343)	65.200	51.385	(13.815)
ขวก.(ก4)	322	290.343	352.614	49.016	40.880	(8.136)	255.387	244.431	(10.956)
สสน.	63	63.000	63.192	10.000	7.604	(2.396)	51.500	62.317	10.817
สสบท.	52	52.000	54.528	5.000	7.536	2.536	47.000	70.904	23.904
สสมส.	63	63.000	76.051	6.000	14.703	8.703	52.000	48.384	(3.616)
ขวก.(ก5)	178	178.000	193.771	21.000	29.843	8.843	150.500	181.605	31.105
รวก.(กต)	500	468.343	546.385	70.016	70.723	0.707	405.887	426.036	20.149
Agenda base	140	140.000	108.468	19.000	11.348	(7.652)	121.000	111.865	(9.136)
กปน.	1200	1158.896	1243.845	164.616	163.347	(1.269)	1009.005	1042.859	33.854

หมายเหตุ : 1. คาดการณ์ผลการส่งมอบงานจาก สกส. สำนักงานประชาสัมพันธ์และ ABS ทบพวนตามบันทึกที่ กปทผจ32/2565 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

2. ผลการลงนามปีงบฯ 65 จาก Google sheet ณ วันที่ ณ 31 ส.ค. 65 และผลงานปรับปรุงท่อรายเดือน จาก Google sheet ณ วันที่ ณ 2 ก.ย. 65

# แผน-ผลงานจัดทำแบบและจ้าง (สาขาและ Agenda base) ปีงบประมาณ 2566

สาขา	แผน (1200 กม.)	เบิกจ้างแล้ว				ลงนามแล้ว			
		ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน	ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน
สสส.	78	0	40.433	40.433	51.84%	0	0	0	0.00%
สสพ.	65	0	20.117	20.117	30.95%	0	0	0	0.00%
สสป.	97	0	37.848	37.848	39.02%	0	0	0	0.00%
สสท.	30	0	2.994	2.994	9.98%	0	0	0	0.00%
ขวก.(ก1)	270	0	101.392	101.392	37.55%	0	0	0	0.00%
สสญ.	53	0	17.727	17.727	33.45%	0	0	0	0.00%
สสม.	20	0	3.660	3.660	18.30%	0	0	0	0.00%
สสส.	51	0	13.913	13.913	27.28%	0	0	0	0.00%
ขวก.(ก2)	124	0	35.300	35.300	28.47%	0	0	0	0.00%
สสช.	55	0	7.232	7.232	13.15%	0	0	0	0.00%
สสช.	35	0	21.587	21.587	61.68%	0	0	0	0.00%
สสมบ.	40	0	12.599	12.599	31.50%	0	0	0	0.00%
สสสภ.	13	0	9.698	9.698	74.60%	0	0	0	0.00%
ขวก.(ก3)	143	0	51.116	51.116	35.75%	0	0	0	0.00%
รวก.(กอ)	537	0	187.808	187.808	34.97%	0	0	0	0.00%
สสب.	95	0	59.263	59.263	62.38%	0	0	0	0.00%
สสด.	74	0	52.551	52.551	71.01%	0	0	0	0.00%
สสภ.	90	0	33.931	33.931	37.70%	0	0	0	0.00%
สสว.	70	0	18.033	18.033	25.76%	0	0	0	0.00%
ขวก.(ก4)	329	0	163.778	163.778	49.78%	0	0	0	0.00%
สสน.	75	0	5.981	5.981	7.97%	0	0	0	0.00%
สสบท.	48	0	12.617	12.617	26.29%	0	0	0	0.00%
สสมส.	61	0	24.667	24.667	40.44%	0	0	0	0.00%
ขวก.(ก5)	184	0	43.265	43.265	23.51%	0	0	0	0.00%
รวก.(กต)	513	0	207.043	207.043	40.36%	0	0	0	0.00%
Agenda base	150	0	0.000	0.000	0.00%	0	0	0	0.00%
กปน.	1,200	0	394.851	394.851	32.90%	0	0	0	0.00%

หมายเหตุ : ข้อมูลเบิกจ้าง-ลงนาม จาก Google sheet ณ 8 ก.ย. 65 (10.00 น.)

# สถานะสัญญาจ้างบริหารจัดการข้อมูล

งาน	ขั้นตอน	ปีงบประมาณ 2564												ปีงบประมาณ 2565											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
จ้างบริหารจัดการข้อมูล ภาค 1	TOR																								
	ราคากลาง																								
	จัดจ้าง																								
	ดำเนินการ																								
จ้างบริหารจัดการข้อมูล ภาค 2, 3	TOR																								
	ราคากลาง																								
	จัดจ้าง																								
	ดำเนินการ																								
จ้างบริหารจัดการข้อมูล ภาค 2, 3 ส่วนต่อขยาย	TOR																								
	ราคากลาง																								
	จัดจ้าง																								
	ดำเนินการ																								
จ้างบริหารจัดการข้อมูล ภาค 4, 5	TOR																								
	ราคากลาง																								
	จัดจ้าง																								
	ดำเนินการ																								
จ้างบริหารจัดการข้อมูล ภาค 4, 5 ส่วนต่อขยาย	TOR																								
	ราคากลาง																								
	จัดจ้าง																								
	ดำเนินการ																								

คงเหลือตุ๋ยกเว้น 33 จุด

คงเหลือตุ๋ยกเว้น 28 จุด

คงเหลือตุ๋ยกเว้น 6 จุด

อยู่ระหว่างประสาน  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อแก้ไขปัญหา

คงเหลือตุ๋ยกเว้น 16 จุด

คงเหลือตุ๋ยกเว้น 5 จุด

## ติดตั้ง DMA ใหม่

เป้าหมาย

ติดตั้ง DMA ใหม่ (จุดวัดอัตราการไหลและแรงดันน้ำ) สนับสนุนกิจกรรมการจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาสาขา

รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2563			2564												2565											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
งานซื้องานติดตั้งเครื่องวัด DMA ใหม่ ปีงบประมาณ 2564	27 จุด	20 ล้านบาท																											

ลงนามสัญญาวันที่ 19 มี.ค.64 / กจช.ฝจพ. มีการแก้ไขขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา รายละเอียดวันจ้างเริ่มงาน-สิ้นสุด วันที่ 21 มิ.ย.64 /ประชุม precon วันที่ 19 ต.ค.64 กำหนดให้เริ่มงานแล้ววันที่ 8 พ.ย. 2564 ระยะเวลาดำเนินงาน 480 วัน  
 ตัดบรรจบติดตั้ง DM ใหม่ ได้จำนวน 17 จุด จากทั้งสิ้น 27 จุด  
 (สสพ.4 ,สสส. 2 สสสภ. 3 ,สสมส. 3 ,สสต. 1, สสข. 2 ,สสมบ. 1 และ สสข.1 )  
 ดำเนินการขอมิเตอร์ไฟฟ้าได้แล้วจำนวน 12 จุด เพื่อเชื่อมโยงระบบ WLMA ต่อไป

หมายเหตุ

A	อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคากลาง)/ตรวจ SMEs	D	ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)		แผนการดำเนินงาน
B	ยื่นเอกสารประกวดราคา	E	ลงนามสัญญา		เร็วกว่าที่เป็นไปตามแผน
C	ตรวจเอกสาร	F	ดำเนินงานตามสัญญา		ล่าช้ากว่าแผน



งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 2,3 และ 4,5 (ส่วนต่อขยาย)

เป้าหมาย	บริหารข้อมูลฯ ภาค 2,3,4,5 (ส่วนต่อขยาย)
----------	---

รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2564					2565										2566																			
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 2,3 (ส่วนต่อขยาย)	20 จุด	0.8 ล้านบาท			A	B	C	D	E	F																											
					A	B	C	D	E	F																											
<div>ได้รับจ้าง บ.เซ็นส์ อินโฟเทค จำกัด แจ้งเริ่มงานวันที่ 3 ธ.ค.64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 ธ.ค. 65 (ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาจากเดิม 21 จุด คงเหลือ 20 จุด) ส่งมอบงานงวดที่ 1 (วันที่ 23 ก.พ.65) ส่งมอบงานงวดที่ 2 (วันที่ 22 มิ.ย.65) (ลงนามแนบท้ายเปลี่ยนแปลงสัญญา ลดงาน ลดเงิน (จากเดิมดำเนินการ 20 จุด คงเหลือ 18 จุด ลดจุดงานที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขการติดเหตุได้ภายในสัญญา) คาดส่งมอบงานงวดที่ 3 ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม 2565</div>																																					
งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 4,5 (ส่วนต่อขยาย)	20 จุด	0.8 ล้านบาท			A	B	C	D	E	F																											
					A	B	C	D	E	F																											
<div>ได้รับจ้าง บ.เซ็นส์ อินโฟเทค จำกัด แจ้งเริ่มงานวันที่ 3 ธ.ค.64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 ธ.ค. 65 ส่งมอบงานงวดที่ 2 (วันที่ 22 มิ.ย.65) คาดส่งมอบงานงวดที่ 3 ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม 2565</div>																																					

หมายเหตุ

- A

อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคากลาง)/ตรวจ SMEs
- B

ยื่นเอกสารประกวดราคา
- C

ตรวจเอกสาร
- D

ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)
- E

ลงนามสัญญา
- F

ดำเนินงานตามสัญญา
- แผนการดำเนินงาน
- เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน
- ล่าช้ากว่าแผน

# งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่ (สำนักงานประปาสาขา และฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฝจส.))

ปีงบประมาณ 2565

## แผนงานจ้างสัญญาจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย (PBC) (ปรับปรุงแผน ตุลาคม 2563 )

ลำดับที่	กิจกรรม	2564			2565								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จำนวน 4 สัญญา ประกอบด้วย สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ภาษีเจริญ บางกอกน้อย และตากสิน												
	ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดทำสัญญาฯ และลงนาม												
	ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)												
2	จำนวน 8 สัญญา ประกอบด้วย สำนักงานประปาสาขาพระโขนง พญาไท ห้วยขวาง เมทรี ประชาชื่น สุวรรณภูมิ สุขสวัสดิ์ และ มหาสวัสดิ์												
	ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดทำสัญญาฯ และลงนาม	* ครั้งที่ 2											
	ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)												
3	จำนวน 1 สัญญา ประกอบด้วย สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท												
	ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดทำสัญญาฯ และลงนาม	* ครั้งที่ 2											
	ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)												

ดำเนินงานตามสัญญาทั้ง 4 สัญญา โดยจัดทำ Base Line แล้วเสร็จ 4 สัญญา (ภาษีเจริญ สมุทรปราการ บางกอกน้อย และ ตากสิน)

ดำเนินงานตามสัญญา 7 สัญญา (มหาสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ห้วยขวาง เมทรี ประชาชื่น และพระโขนง) อยู่ระหว่างจัดทำ Base Line 1 สัญญา (สุวรรณภูมิ แจ้งเริ่มงาน 22 ก.ค. 65)

แจ้งเริ่มงาน 1 ส.ค. 65 อยู่ระหว่างจัดทำ Base Line

หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงานฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฝจส.) ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2565

\*ได้ยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

แผนการดำเนินงานเดิมก่อนปรับปรุง      แผนการดำเนินงาน      เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน      ล่าช้ากว่าแผน

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (สำนักงานประปาสาขา และ ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฝจส.))

ปีงบ 2565

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

เป้าหมาย		จ้างสำรวจหาท่อรั่วด้วยดาวเทียม และเทคโนโลยี Sensors													
รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปี 2564			ปี 2565									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
สำรวจหาท่อรั่วด้วยดาวเทียม	8,000 กม.	10.5 ล้านบาท	A		B	C/D	E	F							
			A		B	C/D/E	F								
			อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาฯ (ลงนามสัญญา วันที่ 25 ม.ค. 65 และแจ้งเริ่มงานวันที่ 31 ม.ค. 65) ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจหาตำแหน่งจุดรั่วแล้วเสร็จ และส่งรายงานผลซ่อมจุดรั่วครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565												
งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยี Sensors	พื้นที่เป้าหมาย	20 ล้านบาท	และได้ถ่ายภาพดาวเทียมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 อยู่ระหว่างสำรวจหาตำแหน่งจุดรั่ว จากภาพถ่าย ครั้งที่ 2												
			B	C/D	E	F									
			A												
รวก.(กต) อนุมัติแต่งตั้ง คกก. TOR และราคากลางแล้วเมื่อ 23 มิ.ย.65 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง															

หมายเหตุ

- A

อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคากลาง)/ตรวจ SMEs
- B

ยื่นเอกสารประกวดราคา
- C

ตรวจเอกสาร
- D

ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)
- E

ลงนามสัญญา
- F

ดำเนินงานตามสัญญา
- แผนการดำเนินงาน
- เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน
- ล่าช้ากว่าแผน

หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (สวม.กทว.ฝจส.) ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2565



ขอบคุณครับ
