





ผลการดำเนินงานซ่อมท่อประธาน  
กองซ่อมระบบส่งและจ่ายน้ำ  
ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ




# สถิติการดำเนินงานซ่อมแล้วเสร็จรายเดือน




กรุงเทพมหานคร  
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

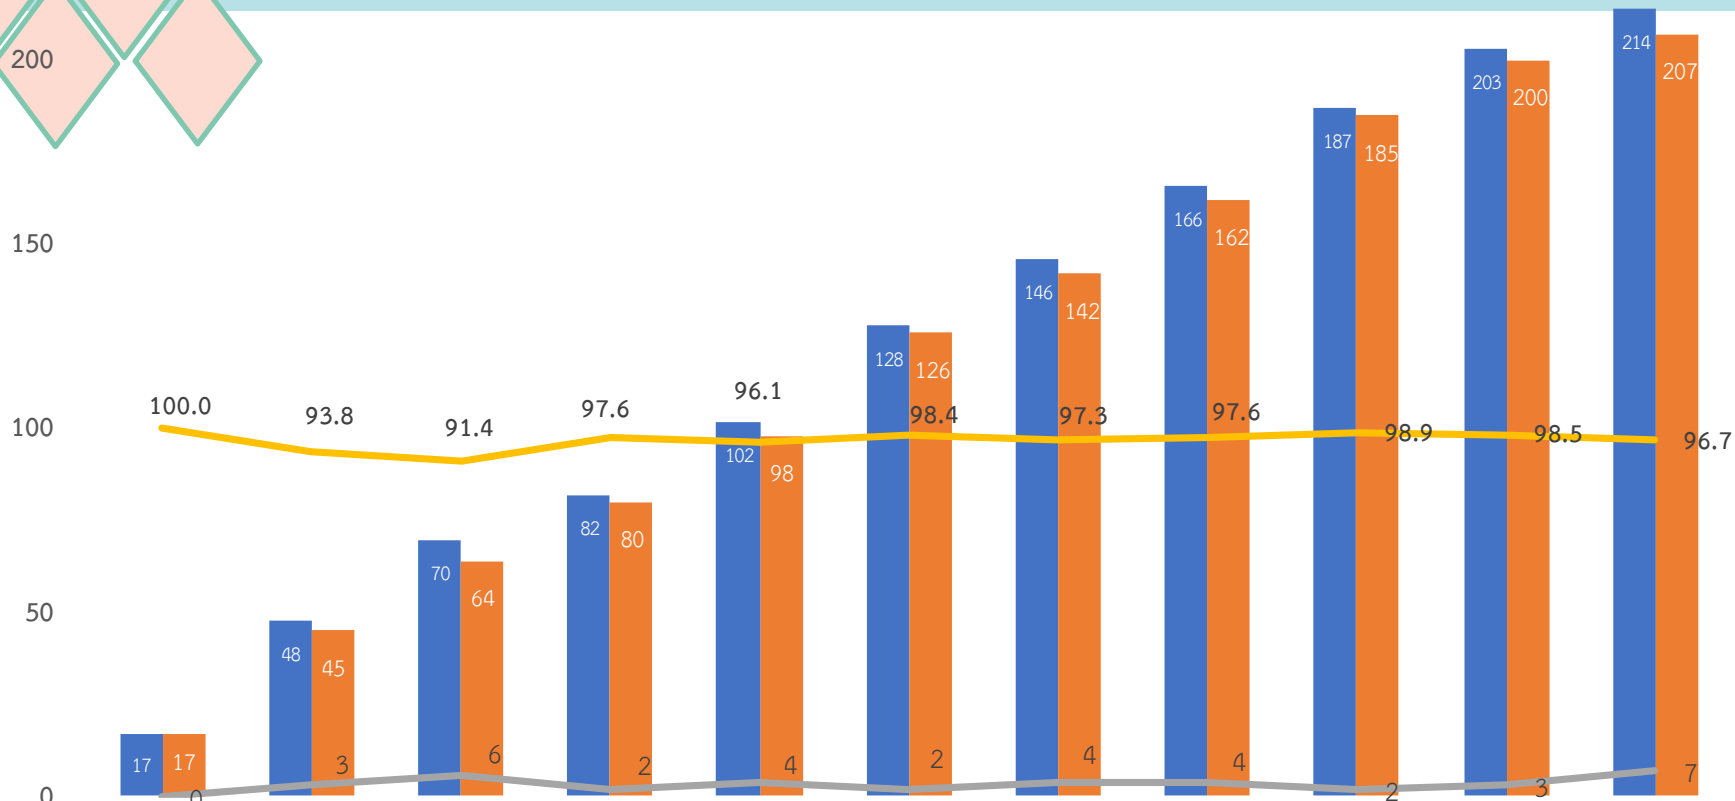

	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65
ซ่อมแล้วเสร็จตามกำหนด (จุด) งานที่เข้าดำเนินการสะสม	17	48	70	82	102	128	146	166	187	203	214
ซ่อมแล้วเสร็จล่าช้า (จุด) งานแล้วเสร็จสะสม	17	45	64	80	98	126	142	162	185	200	207
ซ่อมยังไม่แล้วเสร็จ (จุด) งานไม่แล้วเสร็จสะสม	0	3	6	2	4	2	4	4	2	3	7
ซ่อมแล้วเสร็จ (%) งานแล้วเสร็จสะสม	100.0	93.8	91.4	97.6	96.1	98.4	97.3	97.6	98.9	98.5	96.7



# สถิติตามประเภทงานซ่อมรายเดือน

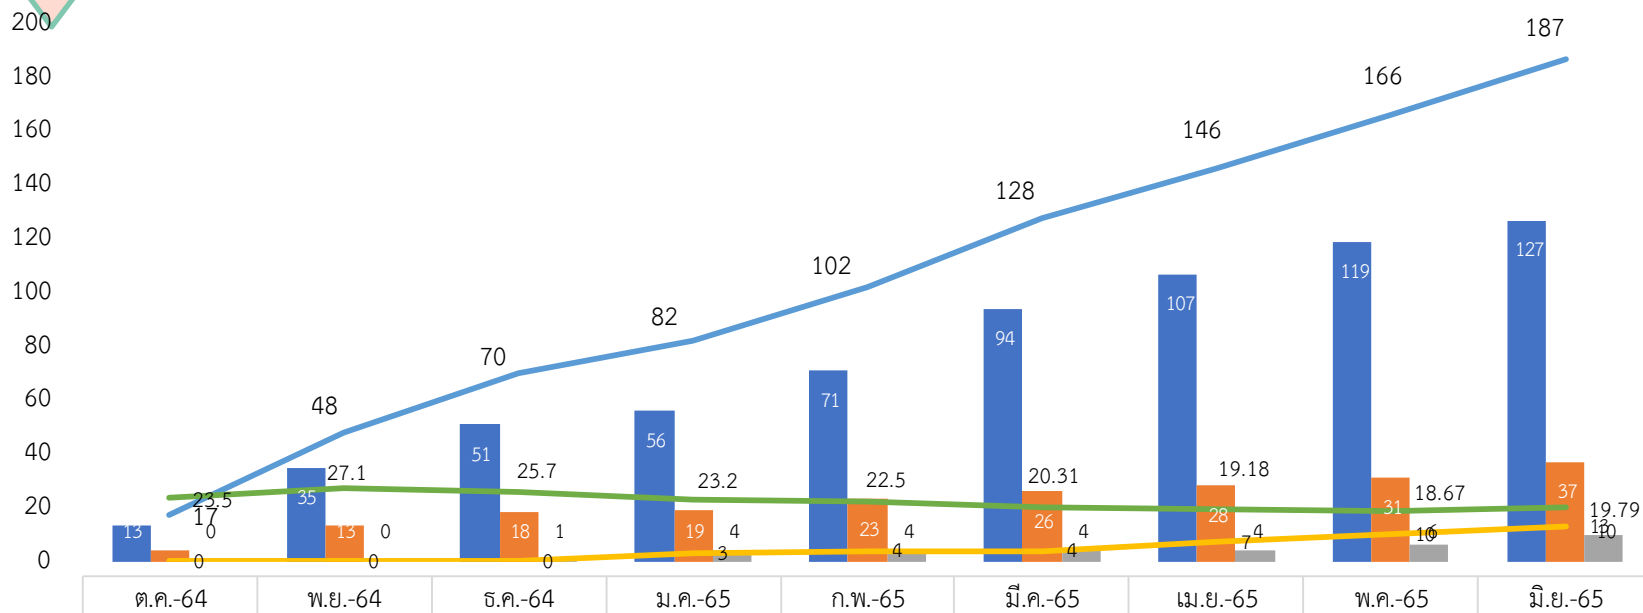

รับแจ้งจากสาขาสะสม	13	35	51	56	71	94	107	119	127
งาน ALC สะสม	4	13	18	19	23	26	28	31	37
งานละเมิด/ฉุกเงิน สะสม	0	0	1	4	4	4	4	6	10
งานสายงานผลิต/ฝสน.สะสม	0	0	0	3	4	4	7	10	13
รวมจำนวนงานสะสม	17	48	70	82	102	128	146	166	187
งานรับแจ้ง ALCสะสม (%)	23.5	27.1	25.7	23.2	22.5	20.31	19.18	18.67	19.79

# สรุปงานซ่อมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	ขนาดท่อ	ชนิด	สาขา	สถานที่	ลักษณะงาน	ประเภทงาน	สถานะงาน	วันที่รับแจ้ง	แผนเข้าซ่อม	หมายเหตุ/อุปสรรค
1	800	ST	สสว	ถ.สุขสวัสดิ์ คลองขุดเจ้าเมือง	ท่อรั่วใต้ดิน	C	ก่อสร้างทุ่มงานจมบ่อ	9/11/2564		ปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างติดท่อก๊าซและท่อร้อยสาย
2	500	CI	สสต	ถ.เจริญนคร หน้าเสนาเฟส	ท่อรั่วบนดิน	C	รออนุญาตเข้าพื้นที่	24/6/2565		สัญญาสร้างทุ่มงาน จท.54/2565
3	1200	ST	สสต	ถ.บางขุนเทียนชายทะเล คลองบางหญ้า	ท่อรั่วบนดิน	C	นัดหมายซ่อมแล้ว	6/7/2565	31/8/1900	นักประดาน้ำ BSL เข้าเชื่อมใน
4	1200	ST	สสต	ถ.บางขุนเทียนชายทะเล ข้ามคลองบางหญ้า	ท่อรั่วบนดิน	C	รอนัดหมายซ่อม (ปิดน้ำ)	6/7/2565		ซ่อมแล้วยังพบจุดรั่วอยู่
5	1000	ST	สสข	ถ.สุขาภิบาล 5 ตัด ถ.สายไหม	ท่อรั่วบนดิน	C	นัดหมายซ่อมแล้ว	8/7/2565	6/9/2565	นักประดาน้ำ PN เข้าเคล้มบีโน
6	1000	ST	สสข	ถ.แจ้งวัฒนะ ซอย 8	ท่อรั่วบนดิน	C	รออนุญาตเข้าพื้นที่	10/8/2565		สัญญาสร้างทุ่มงาน จท.54/2565
7	1200	ST	สสต	ถ.พระราม 2 คลองบางขุนเทียน	ท่อรั่วบนดิน	B	นัดหมายซ่อมแล้ว	25/8/2565	8/9/2565	ตัดบรรจบจุดรั่ว
8	800	ST	สสพ	ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง คลองกระทุ่มเสือปลา	ท่อรั่วใต้ดิน	B	นัดหมายซ่อมแล้ว	24/8/2565	31/8/2565	นักประดาน้ำ PN เข้าเคล้มบีโน alc

## การกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามลักษณะงาน

ประเภท	ลักษณะงาน	ระยะเวลา (วัน)						รวม (วัน)
		แจ้งขออนุญาต เข้าพื้นที่	ประชุมแผนงาน ซ่อม	กำหนดวันปิด น้ำ	ก่อสร้างบ่อ ชั่วคราว	สั่งทำ ชิ้นงาน	ซ่อมท่อ	
A	งานท่อแตกรั่วฉุกเฉินรุนแรง น้ำขึ้นฉิวจากรจร กระทบผู้ใช้ในวงกว้าง	1	1				1	3
B	งานท่อแตกรั่วเล็กน้อย ไม่กระทบการจ่ายน้ำ ไม่กระทบการจรรจร กพร.สร้างทุ่มงาน	1	3	5	1		5	15
C	งานท่อแตกรั่วเล็กน้อย ไม่กระทบการจ่ายน้ำ กระทบการจรรจร ผู้รับจ้างสร้างทุ่มงาน	5	3	5	7		5	25
D	งานท่อแตกรั่วเล็กน้อย ไม่กระทบการจ่ายน้ำ กระทบการจรรจร ผู้รับจ้างสร้างทุ่มงาน (สั่ง ทำชิ้นงาน)	5	3	5	7	15	5	40

