

## วาระที่ 3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 20 มกราคม 2566

# Agenda Style



- 01 ผลเบิกจ่ายงบประมาณเดือน ธ.ค.65 และสะสม  
ต.ค.65 - ธ.ค.65
- 02 การเบิกจ่ายแบบ Front Load  
วงเงินไม่เกิน 1 แสน & วงเงินที่เกิน 1 แสน ไม่เกิน 5 แสน
- 03 ขอจัดสรรงบทำการเพิ่มเติม
- 04 มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ



1. ผลเบิกจ่ายงบประมาณเดือน ธ.ค.65  
และสะสม ต.ค.65 - ธ.ค.65


แผน — ผลเบิกจ่าย ธ.ค.65 และ  
สะสม ต.ค.65 - ธ.ค.65



เบิกจ่ายสูงกว่าแผน  
261.26 ล้านบาท



เบิกจ่ายสูงกว่าแผน  
693.29 ล้านบาท

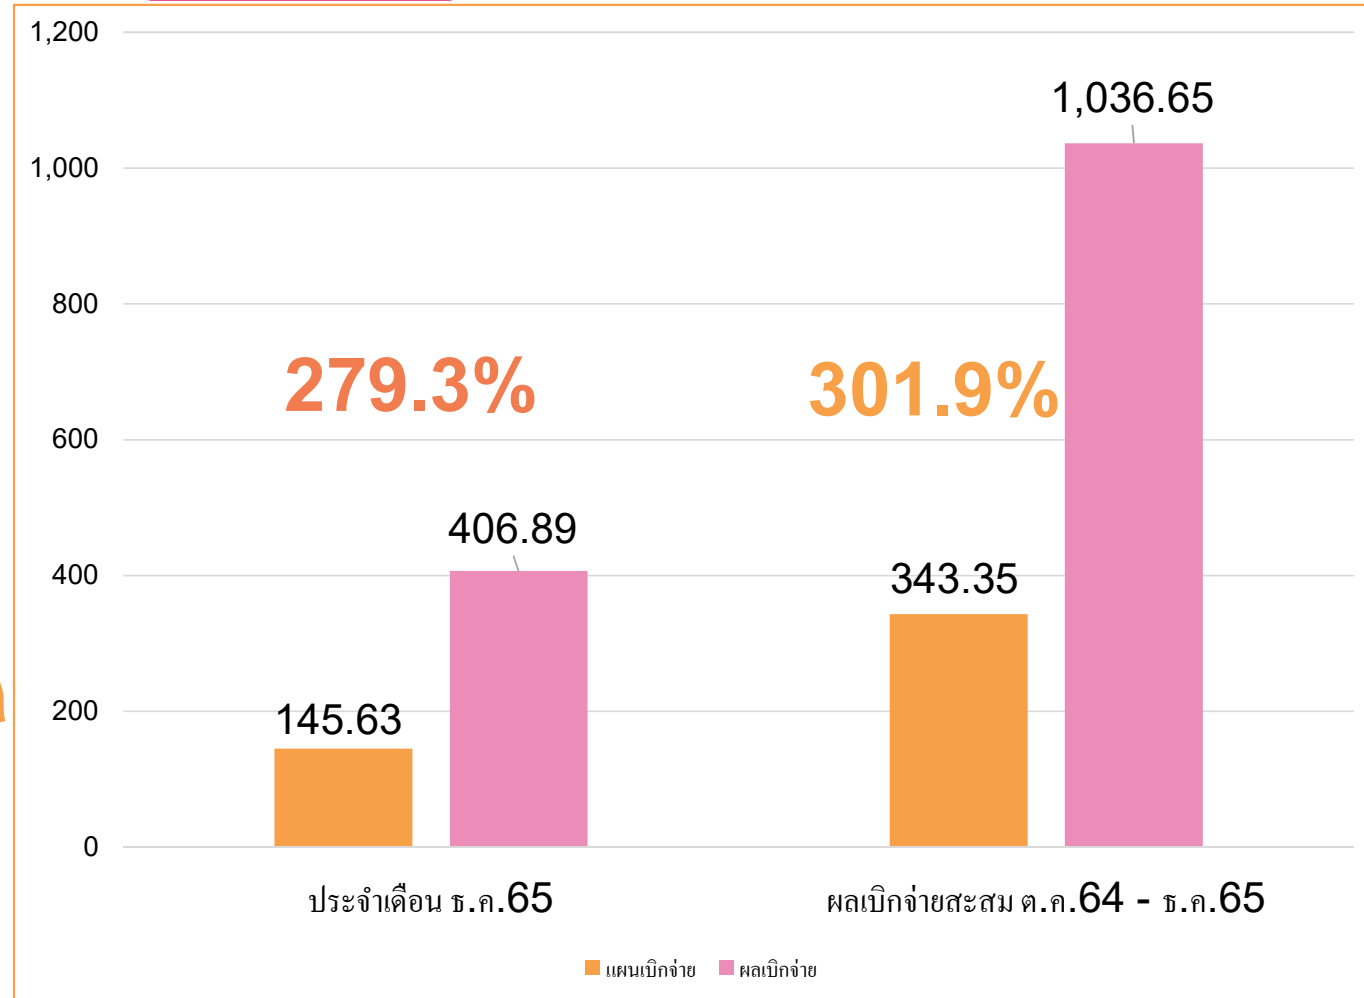

แผน — ผลเบิกจ่ายประจำเดือน ธ.ค.65 และสะสม ต.ค.65 — ธ.ค.65

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ธ.ค.65				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.65 — ธ.ค.65			
	แผน ธ.ค.65	ผล ธ.ค.65	ผลต่าง	%	แผน ธ.ค.65	ผล ธ.ค.65	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	7.86	31.79	23.94	404.7 %	24.41	85.02	60.62	348.4 %
ลดน้ำสูญเสีย	86.90	218.13	131.23	251.0 %	180.37	554.70	374.34	307.5 %
มาตรวัดน้ำ	24.24	29.62	5.38	122.2 %	48.28	96.00	47.71	198.8 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	1.78	5.12	3.34	287.3 %	6.90	11.89	4.99	172.4 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	-	5.97	(5.97)	-	9.00	14.29	5.29	158.8 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	4.31	28.14	23.83	652.8 %	10.22	33.89	23.67	331.5 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	6.06	(6.06)	-	-	13.50	13.50	-
งานรับจ้างงาน	9.98	40.73	30.75	408.1 %	31.27	150.48	119.21	481.3 %
งานติดตั้งประปาใหม่	10.57	26.44	15.87	250.2 %	32.92	62.00	29.08	188.3 %
งานทดแทนระบบเฝ้าระวัง DMA	-	10.92	10.92	-	-	10.92	10.92	-
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	-	3.96	3.96	-	-	3.96	3.96	-
รวมทั้งสิ้น	145.63	406.89	261.26	279.3 %	343.35	1,036.65	693.29	301.9 %





## 2. การเบิกจ่ายแบบ Front Load

วงเงินไม่เกิน 1 แสน & วงเงินที่เกิน 1 แสน  
ไม่เกิน 5 แสน



## 2.1 การเบิกจ่ายแบบ Front Load วงเงินไม่เกิน 1 แสน ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค.66

หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน
สสท.	C-65.1.05.01.1015	กล่องวัดความพึงพอใจ 8 ชุด (Satisfaction Pad)	49,400.00
สสป.	C-66.1.05.01.0098	เก้าอี้ประชุม	24,720.00
สสป.	C-66.1.05.01.0104	เก้าอี้ห้องประชุม (ประธาน)	4,900.00
สสส.	C-66.1.05.01.0379	พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว	4,500.00
สสม.	C-66.1.05.04.0004	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด3,500ANSILumens	29,000.00
สสม.	C-66.1.05.04.0016	จอร์ับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด180นิ้ว	32,900.00
รวม			145,420.00

หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน
สสน.	C-65.1.05.01.2028	SOFA พักคอย	67,600.00
สสน.	C-65.1.05.01.2029	เก้าอี้บริการลูกค้า หุ้มเบาะหนังเทียม	10,200.00
สสน.	C-65.1.05.01.2030	ชุดโต๊ะ เก้าอี้พักคอย บริเวณสวนแนวตั้ง	25,200.00
ฝมน.	C-66.1.03.01.0025	งานซื้อพร้อมติดตั้ง Pressure transmitter	55,000.00
ฝมน.	C-66.1.03.01.0026	งานซื้อพร้อมติดตั้ง Temperature sensor and Transmitter	55,000.00
รวม			213,000.00

สาขา	จำนวนรายการ	วงเงินเบิกจ่าย
สสส.	1	4,500.00
สสป.	2	29,620.00
สสท.	1	49,400.00
สสม.	2	61,900.00
รวม รวก.(กอ)	6	145,420.00
สสน.	3	103,000.00
ฝมน.	2	110,000.00
รวม รวก.(กต)	5	213,000.00
รวมทั้งสิ้น	11	358,420.00


## 2.2 การเบิกจ่ายแบบ Front Load วงเงินที่เกิน 1 แสน ไม่เกิน 5 แสน ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค.66

สาขา	จำนวนรายการ	วงเงินเบิกจ่าย
สสส.	1	464,830.00
สสป.	1	230,000.00
สสท.	5	1,705,732.00
สสม.	3	1,313,950.00
สสญ.	1	464,942.11
สสข.	1	491,612.00
สสช.	1	500,000.00
สสสภ.	1	190,000.00
รวม รวก.(กค)	14	5,361,066.11
สสบ.	1	433,864.26
สสบท.	1	208,000.00
ฝคจ.	2	474,727.10
ฝสน.	1	119,000.00
รวม รวก.(กค)	5	1,235,591.36
รวมทั้งสิ้น	19	6,596,657.47

หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน
สสส.	C-65.1.06.02.0038	งานติดตั้งจุดให้บริการรับชำระเงิน (ตู้จุดจ่ายจรรยา) และงานที่	464,830.00
สสท.	C-65.1.06.02.0083	งานก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สุขาบูหรี่/พักผ่อนหย่อนใจ	145,000.00
สสญ.	C-65.1.06.02.0067	งานสร้างห้องน้ำคนพิการ	464,942.11
สสท.	C-65.1.06.02.0084	งานปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ	450,000.00
สสท.	C-65.1.06.02.0085	งานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการนำอุปกรณ์บริโภคสำหรับประชาชนเนื่องจากภัยแล้ง	248,000.00
สสท.	C-65.1.06.02.0086	งานปรับปรุงหลังคาเมทัลชีส (สถานที่จอดรถจักรยานยนต์ทางเดินเชื่อมโรงอาหาร)	396,732.00
สสม.	C-65.1.06.02.0087	งานปรับปรุงกระเบื้องปูพื้นแกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม.	440,750.00
สสท.	C-65.1.06.02.0089	ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการชั้น 1 เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ เคาน์เตอร์รับคำร้อง/ติดตั้งประปาใหม่	466,000.00
สสข.	C-66.1.02.01.0001	งานติดตั้งตู้ จุด จ่าย จรรยา	491,612.00
สสม.	C-66.1.02.01.0003	งานสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ซ่อมท่อ	400,000.00
สสสภ.	C-66.1.02.01.0007	เสาธงชาติ	190,000.00
สสข.	C-66.1.02.04.0001	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (แนวรั้วโดยรอบสำนักงาน)	500,000.00
สสม.	C-66.1.05.01.0211	งานติดตั้งม่านกรองแสงอาคาร 4 ชั้น	473,200.00
สสบ.	C-66.1.05.02.0016	ชุดเครื่องขยายเสียงและกระจายเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง	230,000.00
รวม			5,361,066.11

หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน
ฝคจ.	C-64.1.03.01.0012	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 30 KVA พร้อมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	326,727.10
สสบ.	C-65.1.06.02.0073	งานติดตั้งหลังคาที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์และที่สุขาบูหรี่	433,864.26
สสบท.	C-66.1.02.02.0009	งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น 1	208,000.00
ฝสน.	C-66.1.05.01.0096	เก้าอี้นั่งประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม	119,000.00
ฝคจ.	C-66.2.02.03.0200	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่1	148,000.00
รวม			1,235,591.36





### 3. ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

## 4. ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

### 1. ค่าจ้างเหมา ซ่อมท่อ

- ต้องการงบเพิ่มเติม

**125,784,529.76** บาท

### 2. ค่าจ้างสำรวจ หาท่อรั่ว

- ต้องการงบเพิ่มเติม

**27,572,853.94** บาท

### 3.ค่าท่ออุปกรณ์

- ต้องการงบเพิ่มเติม **55,848,826.66** บาท

- ค่าท่ออุปกรณ์ที่ต้องการ แยกเป็นรายเดือน

เม.ย.-66	10,000,000.00	ก.ค.-66	14,091,751.33
พ.ค.-66	16,042,659.45	ส.ค.-66	2,239,620.32
มิ.ย.-66	13,474,795.56		

# คาดการณ์เปิดสัญญา ซ่อมท่อ – สร.

สาขา	วงเงินงบประมาณคงเหลือ (เฉพาะงบบปกติ)	คาดการณ์เปิดสัญญา ม.ค.66 - ก.ย.66			ต้องการงบประมาณเพิ่มเติม		
		ซ่อมท่อ	สร.	รวม	ซ่อมท่อ	สร.	รวม
สสส	343,596.95	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00
สสพ	2,893,362.62	8,500,000.00	1,100,000.00	9,600,000.00	6,906,637.38	-	6,906,637.38
สสป	2,003,144.69	8,500,000.00	3,930,000.00	12,430,000.00	7,500,000.00	3,000,000.00	10,500,000.00
สสท	16,695.48	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
สสม	1,491,301.25	1,100,000.00	500,000.00	1,600,000.00	1,100,000.00	500,000.00	1,600,000.00
สสญ	301,816.75	3,000,000.00	-	3,000,000.00	2,698,183.25	-	2,698,183.25
สสล	327,802.10	5,000,000.00	-	5,000,000.00	4,672,197.90	-	4,672,197.90
สสช	113,870.71	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00	1,200,000.00
สสข	1,411,471.95	4,400,000.00	470,000.00	4,870,000.00	3,458,528.05	-	3,458,528.05
สสมบ	2,367,303.39	10,000,000.00	1,683,000.00	11,683,000.00	7,681,000.00	1,635,200.00	9,316,200.00
สสสภ	46,209.02	3,300,000.00	2,000,000.00	5,300,000.00	3,300,000.00	2,000,000.00	5,300,000.00
สสบ	1,250,800.00	28,000,000.00	800,000.00	28,800,000.00	27,549,200.00	-	27,549,200.00
สสต	340,422.19	15,000,000.00	2,500,000.00	17,500,000.00	15,000,000.00	2,500,000.00	17,500,000.00
สสภ	4,451,846.43	22,897,196.26	3,343,457.94	26,240,654.20	22,897,196.26	3,343,457.94	26,240,654.20
สสว	193,571.52	18,691,586.92	7,300,000.00	25,991,586.92	18,691,586.92	7,300,000.00	25,991,586.92
สสน	12,099,250.31	12,300,000.00	3,419,366.00	15,719,366.00	-	3,419,366.00	3,419,366.00
สสบท	9,903,875.54	12,000,000.00	2,400,000.00	14,400,000.00	2,330,000.00	2,174,830.00	4,504,830.00
สสมส	5,662,854.26	4,720,000.00	934,000.00	5,654,000.00	-	-	-
รวม	45,219,195.16	159,408,783.18	32,079,823.94	191,488,607.12	125,784,529.76	27,572,853.94	153,357,383.70




# คาดการณ์เบิกจ่ายค่าท่ออุปกรณ์

ความต้องการค่าท่ออุปกรณ์ ม.ค.66 - ก.ย.66										
สาขา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ใช้จริงถึง 31 ธ.ค.65	งบประมาณคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.65	งบประมาณคงเหลือใช้ได้ถึงเดือน	ค่าท่อเฉลี่ยต่อเดือน	คาดการณ์ ม.ค.66 - ก.ย.66			งบประมาณขาด / คงเหลือ	งบประมาณที่ต้องการเพิ่มเติม
						งบปกติ	งบ PBC	รวมทั้งสิ้น		
สสส	6,264,000.00	1,278,795.56	4,985,204.44	มิ.ย.66	800,000.00	3,810,000.00	2,850,000.00	6,660,000.00	(1,674,795.56)	1,674,795.56
สสพ	10,257,000.00	2,910,378.82	7,346,621.18	พ.ค.-66	955,500.00	4,955,000.00	3,600,000.00	8,555,000.00	(1,208,378.82)	1,208,378.82
สสป	19,079,000.00	5,005,162.69	14,073,837.31	กลางเดือน ก.ค.66	1,780,000.00	16,730,000.00	2,950,000.00	19,680,000.00	(5,606,162.69)	5,606,162.69
สสท	4,017,000.00	1,026,995.15	2,990,004.85	ส.ค.-66	343,333.34	2,010,000.00	1,080,000.00	3,090,000.00	(99,995.15)	99,995.15
สสม	6,078,000.00	1,417,595.17	4,660,374.83	ส.ค.-66	568,132.93	4,320,000.00	1,080,000.00	5,400,000.00	(739,625.17)	739,625.17
สสนญ	12,743,000	3,463,649.84	9,279,350.16	ก.ค.-66	1,335,682.49	7,164,540.00	3,150,000.00	12,564,540.00	(3,285,189.84)	3,285,189.84
สสล	10,000,000.00	3,268,879.83	6,731,120.17	พ.ค.-66	1,089,626.61	10,800,000.00	-	10,800,000.00	(4,068,879.83)	4,068,879.83
สสข	12,743,000.00	3,047,637.18	5,129,362.82	พ.ค.-66	1,015,879.06	4,815,000.00	4,500,000.00	9,315,000.00	(4,185,637.18)	4,185,637.18
สสข	7,868,000.00	2,151,199.62	5,716,800.38	ก.ค.-66	741,111.11	6,670,000.00	-	6,670,000.00	(953,199.62)	950,000.00
สสมบ	11,379,000.00	3,560,868.43	7,818,131.57	มิ.ย.66	1,186,956.14	10,780,130.53	-	10,780,130.53	(2,961,998.96)	3,000,000.00
สสสภ	9,988,000.00	2,996,425.62	6,991,574.38	ก.ค.-66	1,060,000.00	6,480,000.00	3,150,000.00	9,630,000.00	(2,638,425.62)	2,700,000.00
สสบ	18,952,000.00	5,705,665.35	13,246,334.65	พ.ค.-66	2,127,646.97	15,641,098.27	4,185,000.00	19,826,098.27	(6,579,763.62)	6,579,763.62
สสด	19,572,000.00	5,722,470.87	13,849,529.13	มิ.ย.-66	2,120,000.00	10,080,000.00	9,000,000.00	19,080,000.00	(5,230,470.87)	5,300,000.00
สสภ	11,963,000.00	2,515,073.99	9,069,601.20	ก.ค.-66	1,180,000.00	7,470,000.00	3,150,000.00	10,620,000.00	(1,550,398.80)	1,550,398.80
สสว	11,054,000.00	3,889,906.23	7,164,093.77	เม.ย.-66	1,786,658.85	9,450,000.00	8,100,000.00	17,550,000.00	(10,385,906.23)	10,000,000.00
สสน	12,329,000.00	1,866,462.93	10,462,537.07	ก.ย.-66	622,154.31	9,555,945.00	-	9,555,945.00	906,592.07	-
สสบท	12,441,000.00	4,548,976.43	7,892,023.57	มิ.ย.-66	1,200,000.00	11,392,000.00	-	11,392,000.00	(3,499,976.43)	3,500,000.00
สสมส	15,937,000.00	3,892,582.69	12,044,417.31	ส.ค.-66	1,300,000.00	6,595,000.00	6,850,000.00	13,445,000.00	(1,400,582.69)	1,400,000.00
	212,664,000.00	58,268,726.40	149,450,918.79		21,212,681.81	148,718,713.80	53,645,000.00	204,613,713.80	55,162,795.01	55,848,826.66

Page 1





#### 4. มติคณะเร่ร่อนรื้อดเบิกจ่ายงบลงทุน

#### 4. มติคณะเร่ร่งร้ดเบ้กจ่ายงบลงทุนที่ เก้ยวข้องกับส่ายงานบริการ

ประเด็นที่ 1

รายงานการติดตามแผนทำสัญญา ไตรมาสที่ 1 ของ  
ส่ายงานบริการข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565

ประเด็นที่ 2

การติดตามการเบ้กจ่ายหลังจากมีกร GR

ประเด็นที่ 3

แนวปฏิบัติในการขออนุมัติยกเลิกรายการลงทุน

ประเด็นที่ 4

ร่าง แนวทางทางการกำหนด KPI ในการจัดทำ TOR / ราคากลาง

ประเด็นที่ 1  
รายงานการติดตามแผนทำสัญญาไตรมาสที่ 1  
ของสายงานบริการ



# ประเด็นที่ 1

## รายงานการติดตามแผน ทำสัญญา ไตรมาสที่ 1 ของ สายงานบริการ

### งานก่อสร้างอาคาร สสน.

- ผวก. สอบถามความก้าวหน้างานออกแบบและก่อสร้างอาคาร ของ สสน.
- การออกแบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อสืบราคาบางรายการไม่มีในท้องตลาด หรือ ค่าวัสดุมีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องปรับแก้ TOR และราคากลาง ทั้งนี้คณะกรรมการ TOR และราคากลางประชุมร่วมกัน เมื่อ ต.ค.65 แต่ข้อมูลจากที่ปรึกษายังไม่ครบถ้วน
- ผวก. ให้ความเห็นว่าควรยกเลิกงบประมาณก่อน หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอตั้งงบประมาณใหม่

### งานก่อสร้างโรงงานมาตรวัดน้ำ และอาคารสำนักงาน

- การออกแบบโรงงานและอาคารที่ดำเนินการแล้ว สอดคล้องกับ มาตรฐานการทดสอบมาตร ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปแล้ว หรือไม่
- ผวก. ให้ความเห็นว่าควรพิจารณาประเด็นดังกล่าวก่อน ควรยกเลิก และขอตั้งงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง





# 1.1 รายงานการติดตามแผนทำสัญญา ไตรมาสที่ 1 ของสายงานบริการ – รวก.(กอ)

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	สัญญา	รายการ	วงเงินดำเนินการ	แผนทำสัญญา ต.ค. 65 - ม.ค. 66		ทำสัญญา ต.ค. 65 - ธ.ค. 65	กันต่ำ ยกเลิก	ทำสัญญา สูง(ต่ำ) กว่าแผน	แผนจ่าย ต.ค. 65 - พ.ย. 65	
						เดือน	วงเงิน				เดือน	วงเงิน
1	สสส.	C-66.1.05.01.0379		พัฒนาระบบอากาศ ขนาด 12 นิ้ว	4,500.00	ต.ค. 65	4,500.00	-	-	(4,500.00)	ต.ค. 65	4,500.00
2	สสป.	C-66.1.05.01.0104		เก้าอี้ห้องประชุม (ประธาน)	4,900.00	ต.ค. 65	4,900.00	-	-	(4,900.00)	ต.ค. 65	4,900.00
3	สสป.	C-66.1.05.01.0098		เก้าอี้ประชุม	24,720.00	ต.ค. 65	24,720.00	-	-	(24,720.00)	ต.ค. 65	24,720.00
4	สสท.	C-66.1.05.06.0014		เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า (สูบน้ำได้1,130ลิตรต่อนาที)	33,400.00	ต.ค. 65	33,400.00	-	-	(33,400.00)	ต.ค. 65	33,400.00
5	สสม.	C-66.1.05.04.0016		จอร์บภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด180 นิ้ว	32,900.00	ม.ค. 66	32,900.00	-	-	(32,900.00)	มี.ค. 66	-
6	สสม.	C-66.1.05.04.0004		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGA ขนาด3,500ANSILumens	58,000.00	ม.ค. 66	58,000.00	-	-	(58,000.00)	มี.ค. 66	-
7	สสป.	C-66.1.05.06.0019		ปรับปรุงระบบปั้มน้ำ	275,000.00	ธ.ค. 65	275,000.00	-	-	(275,000.00)	ธ.ค. 65	275,000.00
8	สสข.	C-66.1.02.04.0001		งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (แนวรั้ว โดยรอบสำนักงาน)	500,000.00	พ.ย. 65	500,000.00	-	-	(500,000.00)	ธ.ค. 65	500,000.00
9	สสม.	C-66.1.02.01.0003		งานสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ซ่อมท่อ	400,000.00	ธ.ค. 65	400,000.00	-	-	(400,000.00)	ม.ค. 66	-
10	สสม.	C-66.1.05.01.0211		งานติดตั้งม่านกรองแสงอาคาร 4 ชั้น	473,200.00	ธ.ค. 65	473,200.00	-	-	(473,200.00)	มี.ค. 66	-
11	สสส.	C-66.1.02.02.0002		งานปรับปรุงทาดฟ้าและห้องเก็บของ อาคาร	1,000,000.00	ธ.ค. 65	1,000,000.00	-	-	(1,000,000.00)	ก.ย. 66	-
12	สสส.	C-66.1.02.02.0004		งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร	1,300,000.00	ธ.ค. 65	1,300,000.00	-	-	(1,300,000.00)	ก.ย. 66	-
13	สสส.	C-66.1.02.02.0003		งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำท่วม	2,500,000.00	ธ.ค. 65	2,500,000.00	-	-	(2,500,000.00)	ก.ย. 66	-
14	ผตส.	C-66.2.02.10.0001		โครงการปรับปรุงระบบCallCenter	33,298,015.00	-	33,298,015.00	-	-	(33,298,015.00)	จ่ายปี 67	-
รวมสายงานบริการด้านตะวันออก					39,904,635.00		39,904,635.00	-	-	(39,904,635.00)		842,520.00



## 1.2 รายงานการติดตามแผนทำสัญญา ไตรมาสที่ 1 ของสายงานบริการ — รวก.(กต)

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	สัญญา	รายการ	วงเงินดำเนินการ	แผนทำสัญญา ต.ค. 65 - ม.ค. 66		ทำสัญญา ต.ค. 65 - ธ.ค. 65	กันต่ำ ยกเลิก	ทำสัญญา สูง(ต่ำ) กว่าแผน	แผนจ่าย ต.ค. 65 - พ.ย. 65	
						เดือน	วงเงิน				เดือน	วงเงิน
1	สสน.	C-65.1.05.01.2029		เก้าอี้บริการลูกค้า หุ้มเบาะหนังเทียม	10,200.00	ต.ค. 65	10,200.00	-	-	(10,200.00)	ต.ค. 65	10,200.00
2	ชวท.(สจ)	C-66.1.05.05.0015		ตู้เย็นขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า13คิวิกฟุต	17,300.00	ต.ค. 65	17,300.00	-	-	(17,300.00)	พ.ย. 65	17,300.00
3	สสน.	C-65.1.05.01.2030		ชุดโต๊ะ เก้าอี้พักผ่อน บริเวณสวนแนวตั้ง	25,200.00	ต.ค. 65	25,200.00	-	-	(25,200.00)	ต.ค. 65	25,200.00
4	สสน.	C-65.1.05.01.2028		SOFA พักคอย	67,600.00	ต.ค. 65	67,600.00	-	-	(67,600.00)	ต.ค. 65	67,600.00
5	ฝสน.	C-66.1.05.01.0096		เก้าอี้นั่งประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม	119,000.00	ต.ค. 65	119,000.00	-	-	(119,000.00)	ธ.ค. 65	119,000.00
6	สสมส.	C-66.1.05.03.0011		เครื่องวัดความขุ่นในน้ำแบบพกพา	120,000.00	ต.ค. 65	120,000.00	-	-	(120,000.00)	ธ.ค. 65	120,000.00
7	สสบท.	C-66.1.02.02.0009		งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น 1	208,000.00	ม.ค. 66	208,000.00	-	-	(208,000.00)	ม.ค. 66	-
8	ฝจส.	C-66.1.05.06.0018		งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำระบบเผื่อระวัง น้ำสูญเสียที่ชำรุด	40,000,000.00	ธ.ค. 65	40,000,000.00	-	-	(40,000,000.00)	ม.ค. 66	-
9	ฝจส.	C-65.1.05.06.2000		งานปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการน้ำ สูญเสีย (ติดตั้งใหม่) (เพิ่มเติม)	80,000,000.00	ธ.ค. 65	80,000,000.00	-	-	(80,000,000.00)	ก.ค. 66	-
10	ฝมน.	C-66.1.03.01.0023		งานจ้างปรับปรุงระบบจ่ายลม	520,000.00	ม.ค. 66	520,000.00	-	-	(520,000.00)	ก.ค. 66	-
11	ฝมน.	C-66.1.03.01.0024		งานซื้อพร้อมติดตั้ง Density meter	600,000.00	ม.ค. 66	600,000.00	-	-	(600,000.00)	ส.ค. 66	-
12	สสน.	C-66.1.02.02.0005		งานปรับปรุงสภาพภายนอกอาคาร สำนักงาน 3 ชั้น	1,241,270.00	ม.ค. 66	1,241,270.00	-	-	(1,241,270.00)	มี.ย. 66	-
13	ฝมน.	C-66.1.03.03.0004		งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบ อินเวอร์เตอร์	3,300,000.00	ม.ค. 66	3,300,000.00	-	-	(3,300,000.00)	ส.ค. 66	-



## 1.2 รายงานการติดตามแผนทำสัญญา ไตรมาสที่ 1 ของสายงานบริการ — รวก.(กต)

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	สัญญา	รายการ	วงเงินดำเนินการ	แผนทำสัญญา ต.ค. 65 - ม.ค. 66		ทำสัญญา ต.ค. 65 - ธ.ค. 65	กันต่ำ ยกเลิก	ทำสัญญา สูง(ต่ำ) กว่าแผน	แผนจ่าย เดือน
						เดือน	วงเงิน				
14	ฝคจ.	C-66.2.02.03.0200		เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่1	148,000.00	-	148,000.00	-	-	(148,000.00)	จ่ายปี 67
15	ฝคจ.	C-66.2.02.03.0201		เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่2	708,000.00	-	708,000.00	-	-	(708,000.00)	จ่ายปี 67
16	ฝจส.	C-65.1.05.06.1000		งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำระบบเฝ้าระวัง น้ำสูญเสียที่ชำรุด	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-	(2,500,000.00)	-
17	ฝคจ.	C-63.1.03.02.0008		รถดูดอัดสันสะเทือนขนาดไม่ต่ำกว่า 3-5 ตัน	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	(5,000,000.00)	จ่ายปี 67
18	ฝจส.	C-65.1.05.06.0024		งานปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการน้ำ สูญเสีย (ติดตั้งใหม่)	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	(10,000,000.00)	-
19	ฝคจ.	C-65.1.03.01.0022		งานจ้างปรับปรุงทดแทนอุปกรณ์ระบบ ควบคุมประตูน้ำระยะไกล (Remote Control Valve) ที่หมดสภาพการใช้งาน	33,000,000.00	-	33,000,000.00	-	-	(33,000,000.00)	จ่ายปี 67
20	สสบ.	C-63.2.24.02.0001		งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประปา สาขาบางกอกน้อย	37,547,663.84	-	37,547,663.84	-	-	(37,547,663.84)	จ่ายปี 67
21	สสน.	C-64.2.09.02.0001		งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประปา สาขานนทบุรี	126,110,000.00	-	126,110,000.00	-	-	(126,110,000.00)	จ่ายปี 67
22	ฝมน.	C-64.2.21.01.0001		งานจ้างก่อสร้างโรงงานมาตรวัดน้ำ และ อาคารสำนักงาน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	161,000,000.00	-	161,000,000.00	-	-	(161,000,000.00)	จ่ายปี 67
23	ฝสน.	C-66.2.42.01.0001		งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำพหลโยธิน พร้อมงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	780,000,000.00	-	780,000,000.00	-	-	(780,000,000.00)	จ่ายปี 67
รวมสายงานบริการด้านตะวันตก					1,282,242,233.84		1,282,242,233.84	-	-	(1,282,242,233.84)	



## 1.2 รายงานการติดตามแผนทำสัญญา ไตรมาสที่ 1 ของสายงานบริการ - **ฝ.พ.จัดซื้อให้**

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	สัญญา	รายการ	วงเงินดำเนินการ	แผนทำสัญญา ต.ค. 65 - ม.ค. 66		ทำสัญญา ต.ค. 65 - ธ.ค. 65	กันต่ำ ยกเลิก	ทำสัญญา สูง(ต่ำ) กว่าแผน	แผนจ่าย ต.	
						เดือน	วงเงิน				เดือน	
1	หลายหน่วยงาน		ขล.19/2565	เครื่องปรับอากาศ	3,808,500.00	พ.ย. 65	3,808,500.00	-	-	(3,808,500.00)	เม.ย. 66	
2	หลายหน่วยงาน		ขล.15/2566	รถจักรยานยนต์	246,100.00	ม.ค. 66	246,100.00	-	-	(246,100.00)	พ.ค. 66	
3	หลายหน่วยงาน		ขล.19/2566	เก้าอี้คอมพิวเตอร์ , โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	299,100.00	ม.ค. 66	299,100.00	-	-	(299,100.00)	มิ.ย. 66	
4	หลายหน่วยงาน		ขล.9/2565	รถจักรยานยนต์	676,200.00	ม.ค. 66	676,200.00	-	-	(676,200.00)	มิ.ย. 66	
5	หลายหน่วยงาน		ขล.18/2565	เก้าอี้สำนักงาน , โต๊ะทำงานเหล็ก	1,117,100.00	ม.ค. 66	1,117,100.00	-	-	(1,117,100.00)	มิ.ย. 66	
6	ฝ.สน.	C-65.1.04.01.0012	ขล.13/2565	รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า	3,300,000.00	พ.ย. 65	3,300,000.00	-	-	(3,300,000.00)	มิ.ย. 66	
7	ฝ.คจ.	C-64.1.03.02.0012	ขล.15/2564	รถ excavator ล้อยางเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 170 แรงม้า	12,000,000.00	พ.ย. 65	12,000,000.00	-	-	(12,000,000.00)	มิ.ย. 66	
8	หลายหน่วยงาน		ขล.14/2565	รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ พร้อมหลังคา กระบะอลูมิเนียม	1,311,526.48	ธ.ค. 65	1,311,526.48	-	-	(1,311,526.48)	ก.ค. 66	
9	ฝ.คจ.	C-65.1.04.01.0010	ขล.11/2565	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ กระบะเท้าย	1,850,500.00	ธ.ค. 65	1,850,500.00	-	-	(1,850,500.00)	ส.ค. 66	
10	ฝ.คจ.	C-66.1.04.01.0008	ขล.18/2566	รถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน พร้อมติดตั้งเครนแขนยัด	5,000,000.00	ธ.ค. 65	5,000,000.00	-	-	(5,000,000.00)	ก.ค. 66	
11	ฝ.คจ.	C-66.1.04.01.0007	ขล.17/2566	รถยนต์บรรทุก ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ พร้อมหลังคากระบะอลูมิเนียม	1,200,000.00	ม.ค. 66	1,200,000.00	-	-	(1,200,000.00)	ส.ค. 66	
รวมงบลงทุนในความรับผิดชอบของฝ่ายจัดหาและพัสดุ					30,809,026.48		30,809,026.48	-	-	(30,809,026.48)		



## ประเด็นที่ 2

### การติดตามการเบิกจ่ายหลังจากมีการ GR



## 2.1

# การติดตามการเบิกจ่ายหลังจากมีการ GR (คำนวณปกติ)

	มี.ค.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ส.ค.65	ก.ย.65
งานจ้างซ่อมท่อรับน้ำดิบเข้าโรงสูบน้ำดิบที่ 6ฯ ผพส. (C-62.1.06.02.0043)	1,332,061.61			401,869.16	
งานเปลี่ยนท่อ (ปรับปรุงกำลังน้ำ) ค่าแรง สสต. (C-64.1.02.01.0201)		440,470.62			
งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (ค่าแรง) สสท. (C-65.2.01.01.1101)			610,322.62		2,121,542.99
งานคลองผันน้ำ (By Pass Canal) บริเวณโรงสูบน้ำดิบบางเลน (C-62.1.02.02.0002)				2,473,367.65	
งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย สสท. (C-62.2.01.01.0501)					1,930,106.54
งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย สสท. (C-64.2.01.01.0501)					104,775.65
งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย สสน. (C-64.2.01.01.0401)					9,097,710.19
งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย สสท. (C-64.2.01.01.5501)					9,607.81
งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย สสท. (C-65.2.01.01.5501)					56,449.25
รวม	1,332,061.61	440,470.62	610,322.62	2,875,236.81	13,320,192.43
รวมรายการที่ยังไม่การเบิกจ่ายทั้งสิ้น		18,578,284.09 บาท			

## 2.2

## การติดตามการเบิกจ่ายหลังจากมีการ GR (ค่า K)

	พ.ย.64	ก.พ.65	เม.ย.65	ก.ค.65	ก.ย.65
งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย สสน. (C-65.2.01.01.0401)	49,896.62				
งานรื้อย้ายท่อประปา		167,868.84	54,906.62	-46,798.38	98,129.07
รวม	49,896.62	167,868.84	54,906.62	-46,798.38	98,129.07
รวมรายการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น		324,002.77 บาท			

## 2.1 การติดตามการเบิกจ่ายหลังจากมีการ GR (คำนวณปกติ)

หน่วยงาน	WBS	รายการ	PO	วงเงิน	GR วันที่	วงเงิน	GR วันที่	สถานะงาน
สสท.	C-62.2.01.01.0501	งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (ค่าแรง)	3300036439	1,930,106.54	30.09.65			ส่วนจัดจ้าง เป็นผู้ดำเนินการ
สสท.	C-64.2.01.01.0501	งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (ค่าแรง)	3300044743	104,775.65	30.09.65			ส่วนจัดจ้าง เป็นผู้ดำเนินการ
สสสภ.	C-65.2.01.01.5501	งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (ค่าแรง)	3300044743	56,449.25	30.09.65			ส่วนจัดจ้าง เป็นผู้ดำเนินการ
สสสภ.	C-64.2.01.01.5501	งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (ค่าแรง)	3300044743	9,607.81	30.09.65			ส่วนจัดจ้าง เป็นผู้ดำเนินการ
สสท.	C-64.1.02.01.0201	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับปรุงกำลังน้ำ) ค่าแรง	3300047124	440,470.62	20.05.65			อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการคืนซากประตุน้ำ
สสภ.	C-65.2.01.01.1101	งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (ค่าแรง)	3300053020	610,322.62	30.06.65	2,121,542.99	21.09.65	รอแนบท้ายไม่เบิกล่วงหน้า 20/12/65 ผู้มีอำนาจเซ็นเรียบร้อยแล้ว จัดส่งเอกสารเบิกจ่าย 21/12/65
สสน.	C-64.2.01.01.0401	งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (ค่าแรง)	3300048824	2,860,109.35	21.09.65	2,860,109.35	21.09.65	อยู่ระหว่างทบทวนเอกสาร
สสน.	C-65.2.01.01.0401	งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (ค่าแรง)	3300052771	6,237,600.84	28.09.65	6,207,698.97	29.11.65	อยู่ระหว่างทบทวนเอกสารคาดว่าจะดำเนินการส่งเอกสารให้ กตล.ภายในวันที่ 23.12.65
				15,124,679.49		11,189,351.31		



# ประเด็นที่ 3

## แนวปฏิบัติในการขออนุมัติ ยกเลิกรายการลงทุน



### บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ฝ่ายงบประมาณ

ที่ ผังป 437 /2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565


เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบแนวปฏิบัติในการขออนุมัติยกเลิกรายการลงทุน

เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (นโยบายการเงิน)

ด้วย ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 137 ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ที่กำหนดแนวทางการยกเลิกรายการลงทุนที่หมดความจำเป็นต้องจัดหาให้อยู่ในอำนาจพิจารณาอนุมัติของผู้ว่าการ และเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ มีแนวปฏิบัติในการขออนุมัติยกเลิกรายการลงทุนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรในด้านต่าง ๆ จึงได้มีการออกแนวปฏิบัติในการขออนุมัติยกเลิกรายการลงทุนตามบันทึกที่ ผังป 216/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เพื่อให้หน่วยงานยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ต่อมาในปีงบประมาณ 2566 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารการประปานครหลวง ซึ่งส่งผลให้หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการขออนุมัติยกเลิกรายการลงทุนมีความถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ฝ่ายงบประมาณ จึงได้ทบทวนแนวปฏิบัติในการขออนุมัติยกเลิกรายการลงทุนโดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเรียน รองผู้ว่าการ (การเงิน) นำเรียน ผู้ว่าการ เพื่อให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการขออนุมัติยกเลิกรายการลงทุนต่อไป



## ประเด็นที่ 3

### แนวปฏิบัติในการขออนุมัติยกเลิกรายการลงทุน

ประเด็น	แนวปฏิบัติเดิม (ปี 2562)	แนวปฏิบัติครั้งนี้ (ปี 2565)
การพิจารณาผลกระทบ ต่อเป้าหมายองค์กร	หน่วยงานผู้รับผิดชอบเป้าหมายองค์กรด้าน ต่าง ๆ พิจารณาทุกกรณี	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณพิจารณา
กรณีที่มีการยกเลิก รายการลงทุนกระทบต่อ เป้าหมายองค์กร	ไม่ได้ระบุ	กำหนดขั้นตอนให้นำเสนอที่ประชุม Steering Committee พิจารณา
การพิจารณารายการ ลงทุนที่จะขอยกเลิก	ไม่มีการกล่าวถึงรายการลงทุนที่ผูกพัน มากกว่า 2 ปีขึ้นไป	กล่าวถึงแนวทางการยกเลิกรายการลงทุนที่ ผูกพันมากกว่า 2 ปีขึ้นไป
ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย องค์กร	เป็นผู้รับผิดชอบตาม โครงสร้างผังบริหารเดิม	ปรับให้สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ตาม โครงสร้างผังบริหาร ปี 2566



# ประเด็นที่ 4

## ร่าง แนวทางทางการกำหนด KPI ในการจัดทำ TOR / ราคากลาง



### บันทึกข้อความ


หน่วยงาน.....เลขานุการคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย  
ที่.....ชวก(สคก) 776 /2565.....วันที่.....14.....พฤศจิกายน 2565  
เรื่อง.....ยืนยันมติคณะกรรมการติดตามฯ เรื่อง การติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

2. รับทราบ ผลการติดตามงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2565 และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ นอกจากนี้ ขอให้ กปน. พิจารณาแนวทางในการประเมิน TOR รวมถึงการกำหนดราคากลาง ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการอุทธรณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

## ประเด็นที่ 4

### ร่าง แนวทางทางการกำหนด KPI ในการจัดทำ TOR / ราคากลาง

นโยบายในการบริหารงบประมาณ และเร่งรัดติดตาม  
การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมติอนุคณะกรรมการ  
ติดตาม ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566



1.

กระบวนการขอตั้งงบประมาณประจำปี

2.

กระบวนการภายหลังคณะกรรมการ  
กปน. ให้ความเห็นชอบงบประมาณ

3.

Timeline การทบทวน TOR /  
ราคากลาง


4.

ร่าง แนวทางทางการกำหนด KPI ใน  
การจัดทำ TOR / ราคากลาง



# การจัดทำ TOR และราคากลาง

## 1. กระบวนการขอตั้งงบประมาณประจำปี



- คำขอตั้งงบประมาณ
- ร่าง TOR/แบบรูป พร้อมข้อมูลประกอบ
- workflow

บันทึกข้อมูลลงระบบ CBS

หน่วยงานทบทวนแผนงานและความจำเป็นในการขอตั้งงบประมาณ

จัดทำร่าง TOR/แบบรูป ประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณ

ประธานคณะทำงาน/คณะกรรมการฯ เห็นชอบ

ผู้บริหารระดับ 9 ของสายงานให้ความเห็นชอบร่าง TOR/แบบรูป

รองผู้ว่าการ /ผู้ช่วยผู้ว่าการ เห็นชอบข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณ

ส่งข้อมูลให้ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายงบประมาณ นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะประชุมต่าง ๆ

A

คณะทำงาน/คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR/แบบรูป

B

คณะทำงาน/คณะกรรมการภายในของ กปน.

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร

คณะกรรมการ กปน.



## การจัดทำ TOR และราคากลาง

### 2. กระบวนการภายหลังคณะกรรมการ กปน. ให้ความเห็นชอบงบลงทุนประจำปี

คณะกรรมการ กปน. ให้ความเห็นชอบงบลงทุนประจำปี

ดำเนินการทบทวนร่าง TOR/แบบรูป และราคากลาง

แนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ จะต้องประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1. กรรมการ (ตั้งโดยชื่อ)

2. บุคคลกลุ่ม **A** และ **B**

โดยจะต้องแต่งตั้งภายใน 30 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการ กปน. เห็นชอบ

กำหนดระยะเวลาในการจัดทำ ดังนี้

#### ทบทวน TOR/แบบรูป

งานซื้อจ้าง	วงเงินไม่เกิน 5 ลบ.	ไม่เกิน 30 วัน
	วงเงินตั้งแต่ 5 ลบ.	ไม่เกิน 45 วัน
งานวางท่อและก่อสร้าง	งานวางท่อ	ไม่เกิน 30 วัน
	แบบรูป โดยการจ้าง	ไม่เกิน 45 วัน
	แบบรูป โดย กปน.	ไม่เกิน 60 วัน


#### ทบทวนราคากลาง

งานซื้อจ้าง	วงเงินไม่เกิน 5 ลบ.	ไม่เกิน 15 วัน
	วงเงินตั้งแต่ 5 ลบ.	ไม่เกิน 30 วัน
งานวางท่อและก่อสร้าง	งานวางท่อ	ไม่เกิน 30 วัน
	แบบรูป โดยการจ้าง	ไม่เกิน 30 วัน
	แบบรูป โดย กปน.	ไม่เกิน 45 วัน


กำหนดระยะเวลาในการจัดทำดังกล่าวสามารถขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วัน โดยต้องแสดงเหตุผลที่เหมาะสม

ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง

กรณีที่มีผู้พิจารณา TOR ให้ดำเนินการทบทวน TOR/ราคากลาง ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน



# Timeline การทบทวน TOR/ราคากลาง

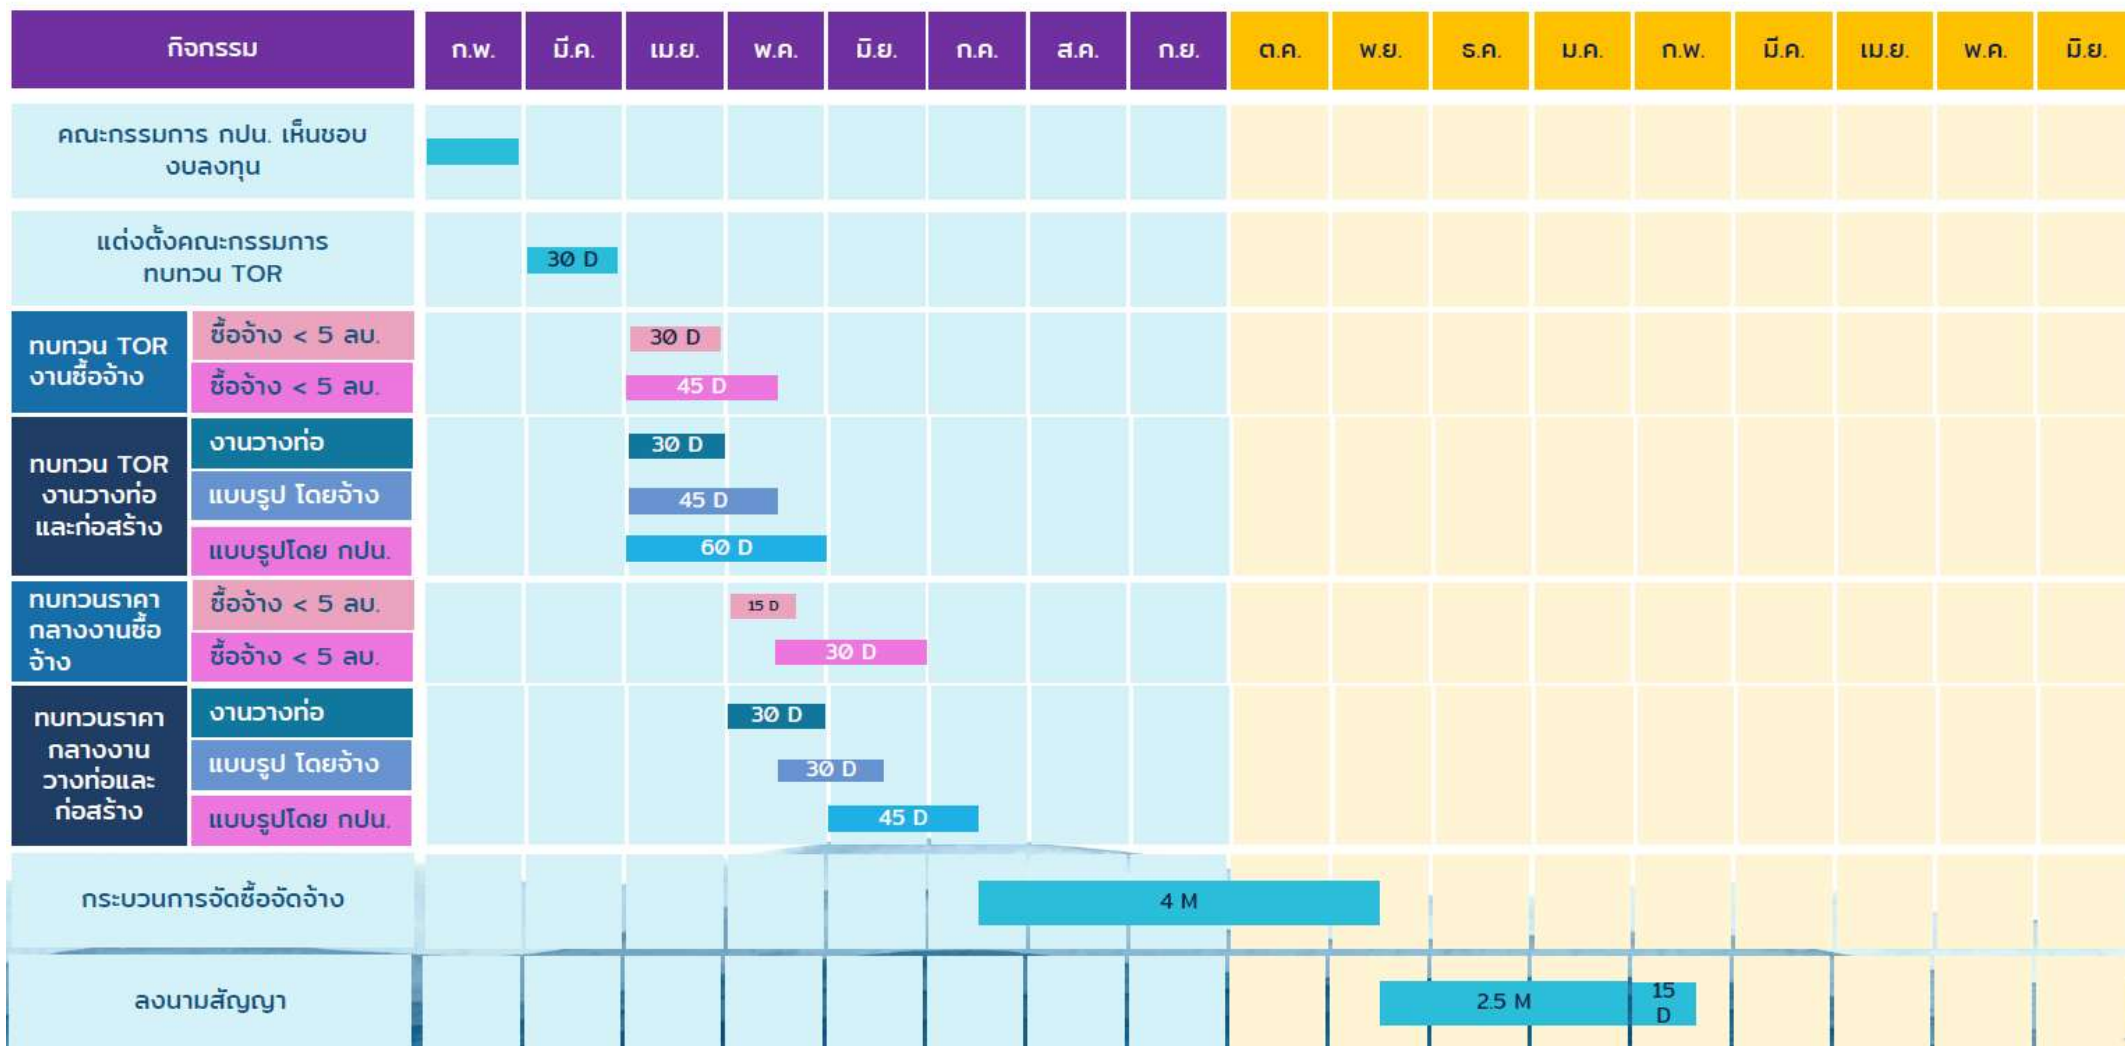




# ร่าง แนวทางการกำหนด KPI ในการจัดทำ TOR/ราคากลาง

ตัวชี้วัด	ผู้ถูกประเมิน	ระดับคะแนน				
		1	2	3	4	5
การจัดทำร่าง TOR ประกอบการขอตีงงบลงทุน	หัวหน้าหน่วยงาน ระดับฝ่ายขึ้นไป	ส่งภายหลังขอตีง	-	ส่งพร้อมขอตีงแต่มีแก้ไข	-	ส่งพร้อมขอตีงและไม่แก้ไข
ระยะเวลาในการทบทวน TOR เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง	- กรรมการจัดทำร่าง TOR - ผู้บริหารระดับ 9	หลังกำหนด ระยะเวลาเกินกว่า 15 วันขึ้นไป	หลังกำหนด ระยะเวลา 15 วัน	หลังกำหนด ระยะเวลา 10 วัน	หลังกำหนด ระยะเวลา 5 วัน	เสร็จก่อน กำหนด ระยะเวลา
ระยะเวลาในการทบทวนราคากลาง เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง	- กรรมการจัดทำร่าง TOR - ผู้บริหารระดับ 9	หลังกำหนด ระยะเวลาเกินกว่า 15 วันขึ้นไป	หลังกำหนด ระยะเวลา 15 วัน	หลังกำหนด ระยะเวลา 10 วัน	หลังกำหนด ระยะเวลา 5 วัน	เสร็จก่อน กำหนด ระยะเวลา
ประสิทธิภาพของทบทวนในการจัดซื้อจัดจ้าง	- กรรมการจัดทำร่าง TOR - กรรมการจัดทำราคากลาง - ผู้บริหารระดับ 9	ลงนามล่าช้ากว่า แพนที่กำหนดไว้ เกินกว่า 30 วัน		ลงนามได้ล่าช้ากว่าแพน แต่ไม่เกิน 30 วัน		สามารถลงนาม ได้ทันแพน M6

## หมายเหตุ:

- ตัวชี้วัดรายการที่ 1 ยกเว้น งานร่วมหน่วยงานภายนอกที่ไม่สามารถกำหนดขอบเขตที่จะดำเนินการได้ชัดเจน
- ตัวชี้วัดรายการที่ 2-3 นับจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแนวทางการดำเนินงาน







THANK YOU
