



### วาระที่ 3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 10 เมษายน 2566




## Title

1. ผลเบิกจ่ายงบลงทุนเดือน มี.ค.66 และสะสม ต.ค.65 - มี.ค. 66
2. การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566 และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน
3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน
  - 3.1 แนวทางการเตรียมจัดหาพัสดุก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  - 3.2 แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ CMS
  - 3.3 ขอให้ทุกหน่วยงานคาดการณ์เบิกจ่าย



1. ผลเบิกจ่ายงบประมาณเดือน มี.ค.66 และสะสม ต.ค.65 - มี.ค. 66

แผน — ผลเบิกจ่าย มี.ค.66 และสะสม ต.ค.65 - มี.ค.66

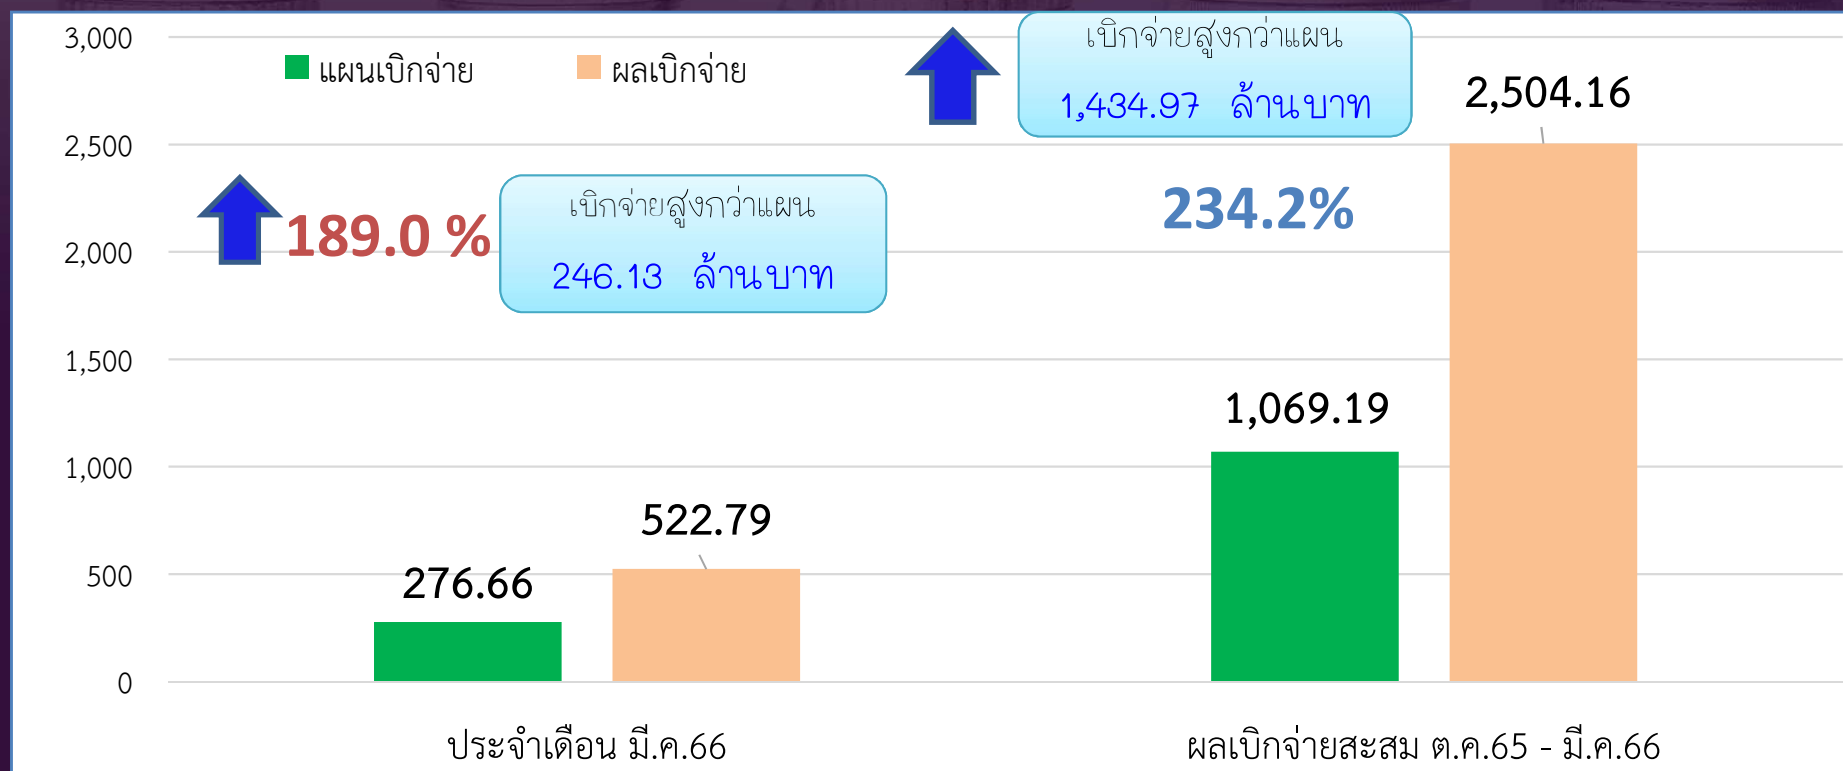

แผน - ผลเบิกจ่าย มี.ค.66 และสะสม ต.ค.65 - มี.ค.66

| ประเภทงบประมาณ             | ประจำเดือน มี.ค.66 |            |        |          | ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.65 - มี.ค.66 |            |          |          |
|----------------------------|--------------------|------------|--------|----------|---------------------------------|------------|----------|----------|
|                            | แผน มี.ค.66        | ผล มี.ค.66 | ผลต่าง | %        | แผน มี.ค.66                     | ผล มี.ค.66 | ผลต่าง   | %        |
| ปรับปรุงกำลังน้ำ           | 19.50              | 42.56      | 23.06  | 218.3%   | 74.11                           | 207.86     | 133.75   | 280.5%   |
| ลดน้ำสูญเสีย               | 175.99             | 318.47     | 142.49 | 181.0%   | 642.72                          | 1,440.77   | 798.05   | 224.2%   |
| มาตรวัดน้ำ                 | 25.00              | 28.43      | 3.43   | 113.7%   | 120.40                          | 188.56     | 68.16    | 156.6%   |
| ขยายเขตจำหน่ายน้ำ          | 2.25               | 2.50       | 0.26   | 111.4%   | 12.49                           | 24.10      | 11.62    | 193.1%   |
| ขยายเขตชุมชนเมือง          | 0.80               | 3.29       | 2.49   | 411.2%   | 10.60                           | 35.11      | 24.51    | 331.2%   |
| งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ | 2.79               | 15.42      | 12.64  | 553.5%   | 16.11                           | 88.80      | 72.69    | 551.4%   |
| งานรื้อย้ายท่อประปา        | 0.30               | 3.69       | 3.39   | 1,229.1% | 0.30                            | 28.10      | 27.80    | 9,366.7% |
| งานรับจ้างงาน              | 29.14              | 66.69      | 37.56  | 228.9%   | 100.34                          | 329.96     | 229.63   | 328.9%   |
| งานติดตั้งประปาใหม่        | 17.74              | 31.33      | 13.59  | 176.6%   | 80.03                           | 132.75     | 52.72    | 165.9%   |
| งานทดแทนระบบเฝ้าระวัง DMA  | -                  | 10.40      | 10.40  | -        | 1.20                            | 24.18      | 22.98    | 2,015.1% |
| งานก่อสร้างอาคาร สสบ.      | 3.17               | -          | (3.17) | 0.0%     | 10.91                           | 3.96       | (6.94)   | 36.3%    |
| รวมทั้งสิ้น                | 276.66             | 522.79     | 246.13 | 189.0%   | 1,069.19                        | 2,504.16   | 1,434.97 | 234.2%   |

| ประเภทงบประมาณ             | คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 6 เดือน + คาดการณ์ 6 เดือน |                       |                  |                 |               |                |
|----------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|
|                            | แผนเบิกจ่ายทั้งปี                                    | ผลเบิกจ่ายถึง มี.ค.66 | คาดการณ์ 6 เดือน | จริง + คาดการณ์ | ผลต่าง        | %              |
| ปรับปรุงกำลังน้ำ           | 437.46   | 207.86                | 291.21           | 499.07          | 61.61         | 114.08%        |
| ลดน้ำสูญเสีย               | 3,169.18   | 1,440.77              | 1,759.38         | 3,200.15        | 30.96         | 100.98%        |
| มาตรวัดน้ำ                 | 275.64   | 188.56                | 117.11           | 305.67          | 30.03         | 110.90%        |
| ขยายเขตจำหน่ายน้ำ          | 44.24  | 24.10                 | 24.06            | 48.16           | 3.92          | 108.86%        |
| ขยายเขตชุมชนเมือง          | 56.46  | 35.11                 | 29.66            | 64.76           | 8.31          | 114.72%        |
| งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ | 114.73   | 88.80                 | 81.04            | 169.84          | 55.11         | 148.03%        |
| งานรื้อย้ายท่อประปา        | 20.26  | 28.10                 | 13.19            | 41.29           | 21.03         | 203.79%        |
| ปรับปรุงระบบ DMA           | 429.61   | 329.96                | 206.40           | 536.37          | 106.76        | 124.85%        |
| งานรับจ้างงาน              | 199.49   | 132.75                | 100.95           | 233.70          | 34.20         | 117.15%        |
| งานติดตั้งประปาใหม่        | 95.09  | 24.18                 | 50.00            | 74.18           | (20.91)       | 78.01%         |
| งานก่อสร้างอาคาร สสบ.      | 41.41  | 3.96                  | 30.51            | 34.47           | (6.94)        | 83.24%         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>         | <b>4,883.58</b>                                      | <b>2,504.16</b>       | <b>2,703.50</b>  | <b>5,207.66</b> | <b>324.08</b> | <b>106.64%</b> |



**คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 6 เดือน + ค่าการณ 6 เดือน**

| หน่วยงาน | แผนจ่าย<br>ปี 2566 | เบิกจริง<br>6 เดือน | ค่าการณ<br>6 เดือน | จริง+ค่าการณ | %       |
|----------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------|
| สสส      | 231.30             | 65.31               | 166.31             | 231.62       | 100.14% |
| สสพ      | 234.17             | 93.03               | 161.16             | 254.20       | 108.55% |
| สสป      | 346.33             | 196.73              | 157.96             | 354.69       | 102.41% |
| สสท      | 95.67              | 52.00               | 43.79              | 95.79        | 100.12% |
| สสม      | 92.57              | 43.93               | 56.75              | 100.68       | 108.76% |
| สสญ      | 194.49             | 94.58               | 100.32             | 194.90       | 100.21% |
| สสล      | 269.86             | 124.19              | 141.25             | 265.44       | 98.36%  |
| ฝตส      | 0.05               | 0.04                | 0.00               | 0.04         | 99.33%  |
| สสช      | 150.94             | 53.01               | 89.27              | 142.27       | 94.26%  |
| สสช      | 209.70             | 155.09              | 78.34              | 233.44       | 111.32% |
| สสมบ     | 213.06             | 124.07              | 148.02             | 272.08       | 127.70% |
| สสสภ     | 236.86             | 146.34              | 129.65             | 276.00       | 116.52% |
| รวก.(กข) | 2,275.00           | 1,148.33            | 1,272.81           | 2,421.14     | 106.42% |

| หน่วยงาน | แผนจ่าย<br>ปี 2566 | เบิกจริง<br>6 เดือน | ค่าการณ<br>6 เดือน | จริง+ค่าการณ | %       |
|----------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------|
| สสب      | 313.19             | 176.95              | 171.19             | 348.14       | 111.16% |
| สสต      | 308.75             | 199.95              | 132.67             | 332.62       | 107.73% |
| สสภ      | 241.52             | 115.30              | 167.73             | 283.03       | 117.19% |
| สสว      | 320.53             | 187.27              | 126.15             | 313.42       | 97.78%  |
| สสน      | 207.61             | 99.25               | 119.20             | 218.44       | 105.22% |
| สสบท     | 351.90             | 172.39              | 164.89             | 337.28       | 95.85%  |
| สสมส     | 266.96             | 154.24              | 126.38             | 280.63       | 105.12% |
| ฝจส      | 98.07              | 27.16               | 50.00              | 77.16        | 78.68%  |
| ฝมน      | 17.39              | 12.79               | 13.90              | 26.69        | 153.42% |
| ฝสบ      | 0.05               | 0.03                | 0.00               | 0.03         | 75.54%  |
| Agenda   | 438.06             | 188.49              | 343.85             | 532.34       | 121.52% |
| ฝคจ      | 2.07               | 4.16                | 0.00               | 4.16         | 201.47% |
| ฝสน      | 42.44              | 17.81               | 14.74              | 32.54        | 76.68%  |
| รวก.(กต) | 2,608.55           | 1,355.79            | 1,430.69           | 2,786.48     | 106.82% |
| บริการ   | 4,883.55           | 2,504.12            | 2,703.50           | 5,207.62     | 106.64% |



## 2. การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566 และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน



## 2. การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566 และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน



1.งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำ  
พหลโยธิน พร้อมงานอื่นๆ  
เกี่ยวข้อง

- ชวก.(บร) เปรียบเทียบกับ กฟน. เรียบร้อยแล้ว จะประชุมหารืออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง โดยจะจัดทำราคากลางคู่ขนาน
- สำหรับอีกงานอยู่ระหว่าง กฟน. ประเมินราคาและของบประมาณ ตอนแรกจะจ้างบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง แต่ ฝ.จพ. แย้งว่าเป็นงานซื้อ จึงต้องพิจารณาว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงาน

## 2. การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566 และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน



2. รถ excavator ล้อยาง  
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า  
170 แรงม้า ของ ฝคจ.

- ผชช. 8 (นายศราวุฒิ อภิลักษณ์) รายงานว่า ทบพจนคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติการใช้งานเหมือนเดิม แต่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ (ยุโรป) ระยะเวลาการจัดส่ง 3 เดือน หลังจากทำสัญญา คาดการณ์เบิกจ่ายประมาณเดือน ธ.ค.66 เนื่องจากต้องทำ สีใหม่
- TOR มีการปรับเปลี่ยน โดยการปรับวัสดุที่ขาดแคลน เดิมมีขายในท้องตลาด วัสดุผลิตระดับมลพิษ tier 4 แต่ผู้ผลิตยกเลิก จึงต้องปรับระดับเป็น tier 2
- ล้อยางมีในประเทศ แท้ข้าง 4 แท้ ใช้ปิ่นท่อนบนฟุตบอล ยี่ห้อต่างระดับได้ เดิม ฝคจ. มี 1 คัน แต่ใช้มา 10 ปี แล้ว

## 2. การติดตามการทำสัญญา ปิงประมาณ 2566 และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน



### 3. การออกแบบก่อสร้างอาคาร สำนักงานประปาสาขา บางกอกน้อย

- ผู้รับจ้างติดปัญหาสภาพคลอง จึงโอนสิทธิ์รับเงินให้กับบริษัทใหม่
- ผวก. ขอให้พิจารณาแนวทางการวินิจฉัยของกรมบัญชีกลางว่าเป็นไปตาม ว.124 หรือไม่



ว124

แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติตามสัญญา และการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

2

แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน


#### 2.2 แนวทางการประเมินผลการทำงานและการบอกเลิกสัญญา

2.2.2 เมื่อระยะเวลาไม่เกิน 1 ใน 2 ของระยะเวลาตามแผน ปรากฏกรณีดังนี้

- (1) ผลงานประจำเดือนไม่เสร็จร้อยละ 50 ของแผนงานประจำเดือน และ
- (2) ผลงานสะสมไม่เสร็จร้อยละ 50 ของวงเงินค่าจ้างหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของผู้สัญญา



ระยะเวลา 1/2



2

แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน

#### 2.2 แนวทางการประเมินผลการทำงานและการบอกเลิกสัญญา

2.2.1 เมื่อระยะเวลาไม่เกิน 1 ใน 2 ของระยะเวลาตามแผน แต่ผู้สัญญาไม่ผลงานสะสมไม่เสร็จร้อยละ 25 ของวงเงินค่าจ้างหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของผู้สัญญา



ระยะเวลา 1/2



2

แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน

#### 2.2 แนวทางการประเมินผลการทำงานและการบอกเลิกสัญญา

2.2.3 เมื่อระยะเวลาไม่เกิน 3 ใน 4 ของระยะเวลาตามแผน แต่ผู้สัญญาไม่ผลงานสะสมไม่เสร็จร้อยละ 65 ของวงเงินค่าจ้างหรือค่าจ้างโดยความล่าช้าเป็นความผิดของผู้สัญญา



ระยะเวลา 3/4



## 2. การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566 และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน



### 4. โครงการปรับปรุงระบบ Call Center ของ ฝตส.

- ฝตส. เป็นเจ้าของงานในการจัดทำ **Draft TOR** แต่การจัดทำใช้เวลานาน เนื่องจากต้องพิจารณาสินค้าในท้องตลาด โดยให้บริษัท 3-4 รายเสนอข้อมูล เพื่อพิจารณาจัดทำ **TOR** ที่ไม่ลืดอกสเปค เสนอข้อมูลที่เป็นกลาง
- **TOR** ดังกล่าวต้องพิจารณาด้านเทคโนโลยี หรือ การติดตั้งระบบ **on cloud** ได้หรือไม่
- **TOR** แล้วเสร็จ 3 พ.ย.65 ระยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือน คาดว่าจะเบิกงวดแรกได้ เดือน ธันวาคม 2566


## 2. การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566 และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน



### 5. ปรับปรุงหลังคาอาคาร ดาตฟ้า ของ สสมบ.

- การออกแบบโครงหลังคา ออกแบบโดย ฝอผ. เนื่องจากต้องมีวิศวกร ระดับ สย. ลงนามแบบ ส่งข้อมูลรายละเอียดไปตั้งแต่ปี 2566 ปัจจุบันแบบยังไม่แล้วเสร็จ
- ผวก. ขอให้รายนายละเอียดการปรับปรุงหลังคาอาคารดาตฟ้า ของ สสมบ. มาประชุมหารือกับ ผวก. เพื่อสั่งการมอบหมายให้วิศวกร ช่วยออกแบบต่อไป





### 3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

3.1 แนวทางการเตรียมจัดหาพัสดุก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3.2 แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ **CMS**

3.3 ขอให้ทุกหน่วยงานคาดการณ์เบิกจ่าย





## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี (ฝ่ายงบประมาณ)

ที่ ผังป 133 /2566 วันที่ 23 มีนาคม 2566

เรื่อง แนวทางการเตรียมจัดหาพัสดุก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- |  |  |
|--|--|
| เรียน <input type="checkbox"/> ผู้ว่าการ                   | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (บริหาร)             |
| <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (การเงิน)            | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม)           |
| <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ)            | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)        |
| <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล)   |
| <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)  | <input type="checkbox"/> ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) |

ด้วยในการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ประธานคณะทำงานฯ ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยอ้างอิงจากข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางการดำเนินงานที่มีการแจ้งเวียนภายในองค์กร เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่จะส่งผลกระทบต่อวงเงินงบลงทุนที่อาจไม่บรรลุตามเป้าหมายองค์กร

ในการนี้ เลขานุการคณะทำงานฯ ขอแจ้งเวียนแนวทางการเตรียมจัดหาพัสดุก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากคณะกรรมการ กปน. ตามข้อเสนอแนะของประธานคณะทำงานฯ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ดุลพินิจประกอบการพิจารณาการดำเนินงานในการจัดหาพัสดุก่อนที่คณะกรรมการ กปน. จะให้ความเห็นชอบงบลงทุน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

### 3.1 แนวทางการเตรียมจัดหาพัสดุก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- ผวก. มีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
- ผงป. ขอแจ้งเวียนแนวทางการเตรียมจัดหาพัสดุก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากคณะกรรมการ กปน. เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ดุลพินิจประกอบการพิจารณาการดำเนินงานในการจัดหาพัสดุ

### 3.1 แนวทางการเตรียมจัดหาพัสดุก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ กค(กวจ) 0405.2/034489 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอรื้อหรือการเตรียมการจัดหาพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เอกสารแนบ 1)



2) บันทึกที่ ฝจพ143/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ 2)



3) สื่อบันทึกภาพและเสียงการบรรยาย หัวข้อ “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” โดยนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาราคากลางกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 (ตัดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำราคากลาง) โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านการสแกน QR Code ด้านล่างนี้



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี (ฝ่ายงบประมาณ)

ที่ ผังป 50 /2566

วันที่ 26 มกราคม 2566

เรื่อง แจ้งปรับปรุงระบบ CMS และแนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ

เรียน หน่วยงานต่างๆ

ตามที่ ผังป. ขอให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและความคืบหน้าสำหรับรายการที่ดำเนินการช้ากว่าแผนผ่านทางระบบ CMS เพื่อใช้เป็นข้อมูลในที่ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี นั้น

ในการนี้ ผังป. ขอแจ้งว่า ปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงระบบ CMS ให้สามารถติดตามรายการลงทุนได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานสามารถเลือกหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาให้สอดคล้องกับเหตุผล/คำชี้แจงที่ส่งผลให้รายการลงทุนทำสัญญา/เบิกจ่ายช้ากว่าแผน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการบันทึกข้อมูลโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ หากหน่วยงานดำเนินการดังกล่าวในระบบ CMS แล้วพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สคส.กส.ผ.ง.บ. โทรศัพท์ 02-504-0123 ต่อ 1952 1387 และ 1357 เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบ CMS ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางสาวขวัญ เชาวนะกิจ

(นางสาวขวัญ เชาวนะกิจ)  
ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ  
คณะทำงานและเลขานุการ

### 3.2 แนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ CMS

- ผังป. มีการปรับปรุงระบบ CMS ในรวบรวมกลุ่มประเด็นปัญหาเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดติดตามงบลงทุน จึงขอให้หน่วยงาน “เลือกหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาให้สอดคล้องกับเหตุผล / คำชี้แจงที่ส่งผลให้รายการลงทุนที่ทำสัญญา และเบิกจ่ายช้ากว่าแผน”
- หากมีประเด็นปัญหามากกว่า 1 ประเด็น ขอให้เลือกหมวดปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานมากที่สุด
- กรณีไม่มีประเด็นปัญหา หรือยังไม่ถึงแผนจ่าย ขอให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้า ทุกรายการ

### 3.2 แนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ CMS

## การปรับปรุง “หมวดหมู่ประเด็นปัญหา” ระบบ CMS

The screenshot displays the CMS system interface. At the top, there's a header bar with the text "CMS" and a date "13/03/2020". Below this is a table with columns for "ประเภทปัญหา" (Problem Type) and "จำนวน" (Count). The table lists various problem types (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9) and their corresponding counts. A red box highlights the "ประเภทปัญหา" column, and a green box highlights the "จำนวน" column. Below the table is a form for reporting. The form has two main sections: "ข้อมูลทั่วไป" (General Information) and "รายละเอียด" (Details). The "ข้อมูลทั่วไป" section contains a dropdown menu for "ประเภทปัญหา" (Problem Type) and a text input field for "รายละเอียด" (Details). The "รายละเอียด" section contains a text input field for "รายละเอียด" (Details). A red box highlights the "ประเภทปัญหา" dropdown menu, and a green box highlights the "รายละเอียด" text input field. At the bottom of the form, there are three buttons: "บันทึกข้อมูล" (Save Data), "ยกเลิก" (Cancel), and "ย้อนกลับ" (Back).

| ประเภทปัญหา | จำนวน |
|-------------|-------|
| M1          | 0.00  |
| M2          | 0.00  |
| M3          | 0.00  |
| M4          | 0.00  |
| M5          | 0.00  |
| M6          | 0.00  |
| M7          | 0.00  |
| M8          | 0.00  |
| M9          | 0.00  |
| รวม         | 0.00  |

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทปัญหา: ▼

รายละเอียด:

รายละเอียด:

บันทึกข้อมูล ยกเลิก ย้อนกลับ

1

ประเด็นปัญหา

2

ความคืบหน้า/  
แนวทางแก้ไข



## 3.2 แนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ CMS

### การปรับปรุง “หมวดหมู่ประเด็นปัญหา” ระบบ CMS

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| ปัญหาก่อนทำ PR                       | • รายการลงทุนนั้นอยู่ระหว่างขั้นตอนการทำ PR หรือเกิดความล่าช้าในขั้นตอนการทำ PR   |
| ปัญหาการจัดทำ TOR/ราคากลาง           | • รายการลงทุนที่อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR/ราคากลาง ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำครั้งแรก หรือการทบทวน TOR/ราคากลางในครั้งต่อมา                           |
| ปัญหาประกาศร่าง TOR/รายงานขอซื้อจ้าง | • รายการลงทุนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาพิจารณาร่าง TOR  |
| ปัญหาขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง        | • รายการลงทุนที่ติดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง การไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือ มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว |
| ขั้นตอนการอุทธรณ์                    | • รายการลงทุนที่อยู่ระหว่างระยะเวลาการอุทธรณ์ การส่งประเด็นการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างไปยังกรมบัญชีกลาง                                     |
| รอลงนาม                              | • รายการลงทุนที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามสัญญา   |
| การขออนุญาตเข้าพื้นที่               | • รายการลงทุนที่ติดปัญหาของการขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้าง การขออนุญาตกรรมสิทธิ์ที่ดิน   |
| การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ/สัญญา         | • รายการลงทุนที่ติดปัญหาจากสภาพหน้างานและจำเป็นต้องมีการแก้ไขแบบ หรือสัญญา  |
| การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ         | • กรณีที่ความล่าช้าเกิดจากการขนส่งครุภัณฑ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ  |
| อื่น ๆ                               | • เช่น อยู่ระหว่างการขอยกเลิกรายการลงทุน เป็นต้น  |



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี (ฝ่ายงบประมาณ)

ที่ ผงป 132 /2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566

เรื่อง ยินยอมติดตามการทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี เรื่อง การติดตามงบลงทุน ประจำปี 2566

- เรียน ☐ ผู้ว่าการ ☐ รองผู้ว่าการ (บริหาร)
- ☐ รองผู้ว่าการ (การเงิน) ☐ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม)
- ☐ รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ) ☐ รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
- ☐ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) ☐ รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล)
- ☐ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) ☐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)

ตามมติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ประธานได้สั่งการให้หน่วยงานคาดการณ์ผลเบิกจ่ายงบลงทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลแสดงแนวโน้มการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566 และกำหนดแนวทางการแก้ไขให้ทันเวลาที่หากคาดว่าผลเบิกจ่ายจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายงบประมาณ จึงขอให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลคาดการณ์ผลเบิกจ่าย รวมถึงประเด็นปัญหาและความคืบหน้าในการดำเนินงานผ่านระบบ CMS ให้ครบถ้วนทุกรายการ เป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2566 เป็นต้นไป และ ฝ่ายงบประมาณ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากระบบ CMS เพื่อใช้ในการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากหน้า Intranet ของ ฝ่ายงบประมาณ หรือสอบถามได้ที่ ส่วนควบคุมงบลงทุน กองบริหารงบลงทุน ฝ่ายงบประมาณ โทรศัพท์: 02-504-0123 ต่อ 1952 1357 และ 1387

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สายนะ ๒๕๖๕

(นางสาวขวัญ เชาวนกิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

คณะทำงานและเลขานุการ

### 3.3 ขอให้ทุกหน่วยงานคาดการณ์ผลเบิกจ่าย

- ผวก. สั่งการให้หน่วยงานคาดการณ์ผลเบิกจ่ายงบลงทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลแสดงแนวโน้มการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566 และกำหนดแนวทางแก้ไขให้ทันเวลาที่ หากคาดว่าผลเบิกจ่ายจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- ขอให้หน่วยงานบันทึกผลข้อมูลคาดการณ์ผลเบิกจ่าย รวมถึงประเด็นปัญหาและความคืบหน้าในการดำเนินงานผ่านระบบ CMS ให้ครบถ้วนทุกรายการ เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2566
- ผงป. จะรวบรวมข้อมูลจากระบบ CMS เพื่อใช้ในการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี
- อนุกรรมการติดตามฯ ขอให้ชี้แจงประเด็นปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเข้าพื้นที่



ขอบคุณค่ะ





### วาระที่ 3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 10 เมษายน 2566




## Title

1. ผลเบิกจ่ายงบลงทุนเดือน มี.ค.66 และสะสม ต.ค.65 - มี.ค. 66
2. การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566 และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน
3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน
  - 3.1 แนวทางการเตรียมจัดหาพัสดุก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  - 3.2 แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ CMS
  - 3.3 ขอให้ทุกหน่วยงานคาดการณ์เบิกจ่าย



1. ผลเบิกจ่ายงบประมาณเดือน มี.ค.66 และสะสม ต.ค.65 - มี.ค. 66

แผน — ผลเบิกจ่าย มี.ค.66 และสะสม ต.ค.65 - มี.ค.66

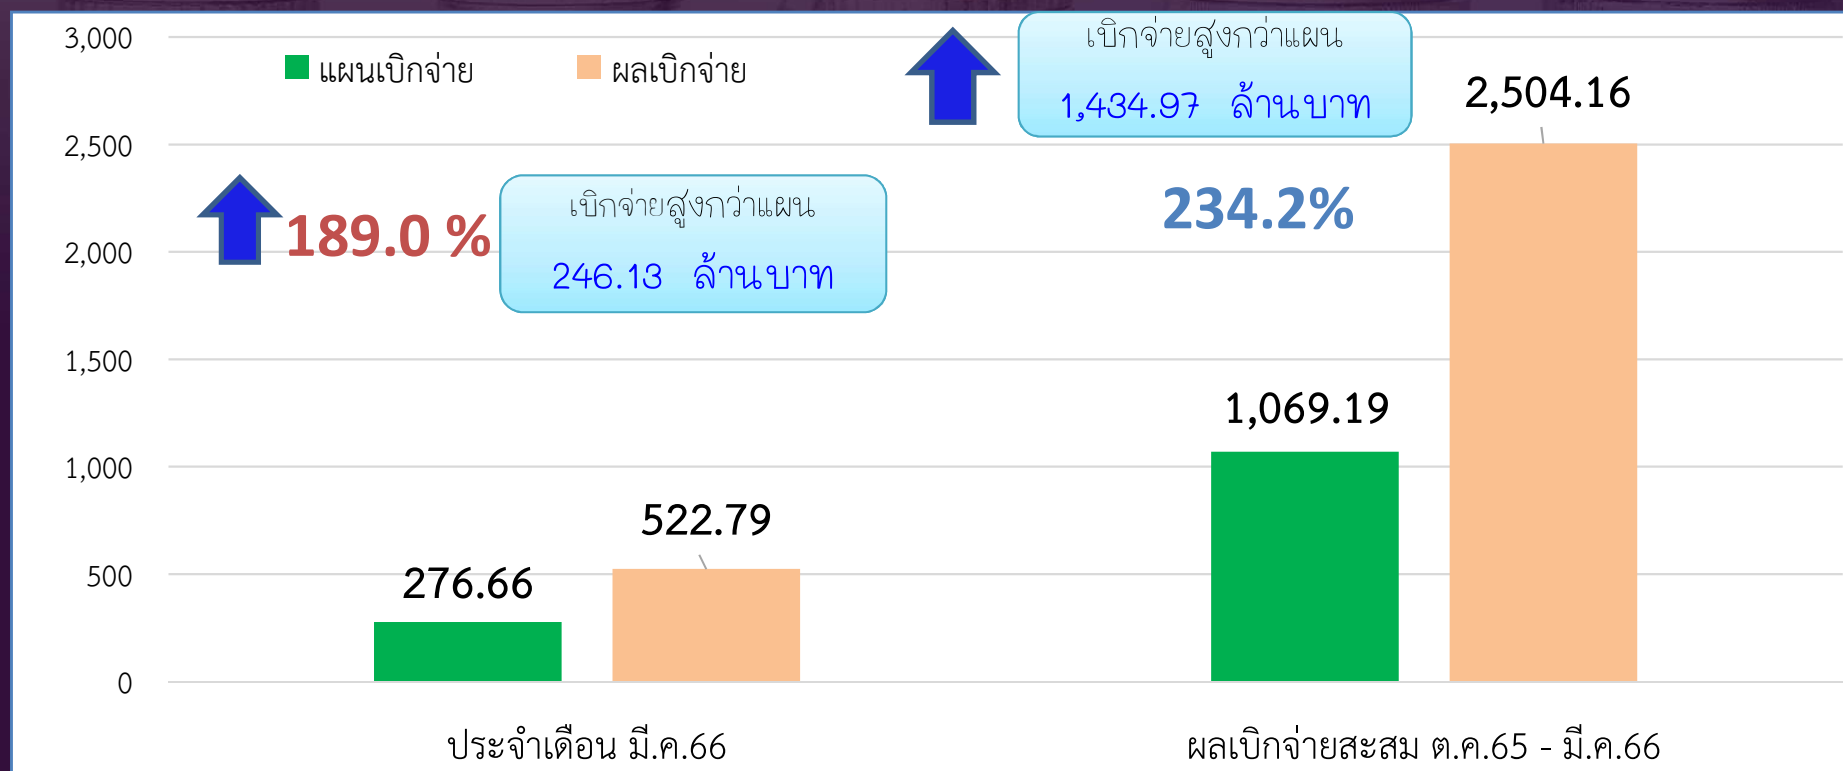



แผน - ผลเบิกจ่าย มี.ค.66 และสะสม ต.ค.65 - มี.ค.66

| ประเภทงบประมาณ             | ประจำเดือน มี.ค.66 |            |        |          | ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.65 - มี.ค.66 |            |          |          |
|----------------------------|--------------------|------------|--------|----------|---------------------------------|------------|----------|----------|
|                            | แผน มี.ค.66        | ผล มี.ค.66 | ผลต่าง | %        | แผน มี.ค.66                     | ผล มี.ค.66 | ผลต่าง   | %        |
| ปรับปรุงกำลังน้ำ           | 19.50              | 42.56      | 23.06  | 218.3%   | 74.11                           | 207.86     | 133.75   | 280.5%   |
| ลดน้ำสูญเสีย               | 175.99             | 318.47     | 142.49 | 181.0%   | 642.72                          | 1,440.77   | 798.05   | 224.2%   |
| มาตรวัดน้ำ                 | 25.00              | 28.43      | 3.43   | 113.7%   | 120.40                          | 188.56     | 68.16    | 156.6%   |
| ขยายเขตจำหน่ายน้ำ          | 2.25               | 2.50       | 0.26   | 111.4%   | 12.49                           | 24.10      | 11.62    | 193.1%   |
| ขยายเขตชุมชนเมือง          | 0.80               | 3.29       | 2.49   | 411.2%   | 10.60                           | 35.11      | 24.51    | 331.2%   |
| งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ | 2.79               | 15.42      | 12.64  | 553.5%   | 16.11                           | 88.80      | 72.69    | 551.4%   |
| งานรื้อย้ายท่อประปา        | 0.30               | 3.69       | 3.39   | 1,229.1% | 0.30                            | 28.10      | 27.80    | 9,366.7% |
| งานรับจ้างงาน              | 29.14              | 66.69      | 37.56  | 228.9%   | 100.34                          | 329.96     | 229.63   | 328.9%   |
| งานติดตั้งประปาใหม่        | 17.74              | 31.33      | 13.59  | 176.6%   | 80.03                           | 132.75     | 52.72    | 165.9%   |
| งานทดแทนระบบเฝ้าระวัง DMA  | -                  | 10.40      | 10.40  | -        | 1.20                            | 24.18      | 22.98    | 2,015.1% |
| งานก่อสร้างอาคาร สสบ.      | 3.17               | -          | (3.17) | 0.0%     | 10.91                           | 3.96       | (6.94)   | 36.3%    |
| รวมทั้งสิ้น                | 276.66             | 522.79     | 246.13 | 189.0%   | 1,069.19                        | 2,504.16   | 1,434.97 | 234.2%   |



| ประเภทงบประมาณ             | คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 6 เดือน + คาดการณ์ 6 เดือน |                       |                  |                 |               |                |
|----------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|
|                            | แผนเบิกจ่ายทั้งปี                                    | ผลเบิกจ่ายถึง มี.ค.66 | คาดการณ์ 6 เดือน | จริง + คาดการณ์ | ผลต่าง        | %              |
| ปรับปรุงกำลังน้ำ           | 437.46   | 207.86                | 291.21           | 499.07          | 61.61         | 114.08%        |
| ลดน้ำสูญเสีย               | 3,169.18   | 1,440.77              | 1,759.38         | 3,200.15        | 30.96         | 100.98%        |
| มาตรวัดน้ำ                 | 275.64   | 188.56                | 117.11           | 305.67          | 30.03         | 110.90%        |
| ขยายเขตจำหน่ายน้ำ          | 44.24  | 24.10                 | 24.06            | 48.16           | 3.92          | 108.86%        |
| ขยายเขตชุมชนเมือง          | 56.46  | 35.11                 | 29.66            | 64.76           | 8.31          | 114.72%        |
| งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ | 114.73   | 88.80                 | 81.04            | 169.84          | 55.11         | 148.03%        |
| งานรื้อย้ายท่อประปา        | 20.26  | 28.10                 | 13.19            | 41.29           | 21.03         | 203.79%        |
| ปรับปรุงระบบ DMA           | 429.61   | 329.96                | 206.40           | 536.37          | 106.76        | 124.85%        |
| งานรับจ้างงาน              | 199.49   | 132.75                | 100.95           | 233.70          | 34.20         | 117.15%        |
| งานติดตั้งประปาใหม่        | 95.09  | 24.18                 | 50.00            | 74.18           | (20.91)       | 78.01%         |
| งานก่อสร้างอาคาร สสบ.      | 41.41  | 3.96                  | 30.51            | 34.47           | (6.94)        | 83.24%         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>         | <b>4,883.58</b>                                      | <b>2,504.16</b>       | <b>2,703.50</b>  | <b>5,207.66</b> | <b>324.08</b> | <b>106.64%</b> |

**คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 6 เดือน + ค่าการณ 6 เดือน**

| หน่วยงาน | แผนจ่าย<br>ปี 2566 | เบิกจริง<br>6 เดือน | ค่าการณ<br>6 เดือน | จริง+ค่าการณ | %       |
|----------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------|
| สสส      | 231.30             | 65.31               | 166.31             | 231.62       | 100.14% |
| สสพ      | 234.17             | 93.03               | 161.16             | 254.20       | 108.55% |
| สสป      | 346.33             | 196.73              | 157.96             | 354.69       | 102.41% |
| สสท      | 95.67              | 52.00               | 43.79              | 95.79        | 100.12% |
| สสม      | 92.57              | 43.93               | 56.75              | 100.68       | 108.76% |
| สสญ      | 194.49             | 94.58               | 100.32             | 194.90       | 100.21% |
| สสล      | 269.86             | 124.19              | 141.25             | 265.44       | 98.36%  |
| ฝตส      | 0.05               | 0.04                | 0.00               | 0.04         | 99.33%  |
| สสช      | 150.94             | 53.01               | 89.27              | 142.27       | 94.26%  |
| สสช      | 209.70             | 155.09              | 78.34              | 233.44       | 111.32% |
| สสมบ     | 213.06             | 124.07              | 148.02             | 272.08       | 127.70% |
| สสสภ     | 236.86             | 146.34              | 129.65             | 276.00       | 116.52% |
| รวก.(กอ) | 2,275.00           | 1,148.33            | 1,272.81           | 2,421.14     | 106.42% |

| หน่วยงาน | แผนจ่าย<br>ปี 2566 | เบิกจริง<br>6 เดือน | ค่าการณ<br>6 เดือน | จริง+ค่าการณ | %       |
|----------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------|
| สสب      | 313.19             | 176.95              | 171.19             | 348.14       | 111.16% |
| สสต      | 308.75             | 199.95              | 132.67             | 332.62       | 107.73% |
| สสภ      | 241.52             | 115.30              | 167.73             | 283.03       | 117.19% |
| สสว      | 320.53             | 187.27              | 126.15             | 313.42       | 97.78%  |
| สสน      | 207.61             | 99.25               | 119.20             | 218.44       | 105.22% |
| สสบท     | 351.90             | 172.39              | 164.89             | 337.28       | 95.85%  |
| สสมส     | 266.96             | 154.24              | 126.38             | 280.63       | 105.12% |
| ฝจส      | 98.07              | 27.16               | 50.00              | 77.16        | 78.68%  |
| ฝมน      | 17.39              | 12.79               | 13.90              | 26.69        | 153.42% |
| ฝสบ      | 0.05               | 0.03                | 0.00               | 0.03         | 75.54%  |
| Agenda   | 438.06             | 188.49              | 343.85             | 532.34       | 121.52% |
| ฝคจ      | 2.07               | 4.16                | 0.00               | 4.16         | 201.47% |
| ฝสน      | 42.44              | 17.81               | 14.74              | 32.54        | 76.68%  |
| รวก.(กต) | 2,608.55           | 1,355.79            | 1,430.69           | 2,786.48     | 106.82% |
| บริการ   | 4,883.55           | 2,504.12            | 2,703.50           | 5,207.62     | 106.64% |



## 2. การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566 และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน

## 2. การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566 และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน



1.งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำ  
พหลโยธิน พร้อมงานอื่นที่  
เกี่ยวข้อง

- ชวก.(บร) เปรียบเทียบกับ กฟน. เรียบร้อยแล้ว จะประชุมหารืออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง โดยจะจัดทำราคากลางคู่ขนาน
- สำหรับอู่กงานอยู่ระหว่าง กฟน. ประเมินราคาและของบประมาณ ตอนแรกจะจ้างบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง แต่ ฝจพ. แย้งว่าเป็นงานซื้อ จึงต้องพิจารณาว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงาน

## 2. การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566 และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน



2. รถ excavator ล้อยาง  
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า  
170 แรงม้า ของ ฝคจ.

- ผชช. 8 (นายศราวุฒิ อภิลักษณ์) รายงานว่า ทบพจนคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติการใช้งานเหมือนเดิม แต่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ (ยุโรป) ระยะเวลาการจัดส่ง 3 เดือน หลังจากทำสัญญา คาดการณ์เบิกจ่ายประมาณเดือน ธ.ค.66 เนื่องจากต้องทำ สีใหม่
- TOR มีการปรับเปลี่ยน โดยการปรับวัสดุที่ขาดแคลน เดิมมีขายในท้องตลาด วัสดุผลิตระดับมลพิษ tier 4 แต่ผู้ผลิตยกเลิก จึงต้องปรับระดับเป็น tier 2
- ล้อยางมีในประเทศ แท้ข้าง 4 แท้ ใช้ปิ่นท่อนบนฟุตบอล ยี่ห้อต่างระดับได้ เดิม ฝคจ. มี 1 คัน แต่ใช้มา 10 ปี แล้ว



## 2. การติดตามการทำสัญญา ปิงประมาณ 2566 และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน



### 3. การออกแบบก่อสร้างอาคาร สำนักงานประปาสาขา บางกอกน้อย

- ผู้รับจ้างติดปัญหาสภาพคลอง จึงโอนสิทธิ์รับเงินให้กับบริษัทใหม่
- ผวก. ขอให้พิจารณาแนวทางการวินิจฉัยของกรมบัญชีกลางว่าเป็นไปตาม ว.124 หรือไม่



ว124

แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติตามสัญญา และการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

2

แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน


#### 2.2 แนวทางการประเมินผลการทำงานและการบอกเลิกสัญญา

2.2.2 เมื่อระยะเวลาไม่เกิน 1 ใน 2 ของระยะเวลาตามแผน ปรากฏกรณีดังนี้

- (1) ผลงานประจำเดือนไม่เสร็จร้อยละ 50 ของแผนงานประจำเดือน และ
- (2) ผลงานสะสมไม่เสร็จร้อยละ 50 ของวงเงินค่าจ้างหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของผู้สัญญา



ระยะเวลา 1/2



2

แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน

#### 2.2 แนวทางการประเมินผลการทำงานและการบอกเลิกสัญญา

2.2.1 เมื่อระยะเวลาไม่เกิน 1 ใน 2 ของระยะเวลาตามแผน แต่ผู้สัญญาไม่ผลงานสะสมไม่เสร็จร้อยละ 25 ของวงเงินค่าจ้างหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของผู้สัญญา



ระยะเวลา 1/2



2

แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน

#### 2.2 แนวทางการประเมินผลการทำงานและการบอกเลิกสัญญา

2.2.3 เมื่อระยะเวลาไม่เกิน 3 ใน 4 ของระยะเวลาตามแผน แต่ผู้สัญญาไม่ผลงานสะสมไม่เสร็จร้อยละ 65 ของวงเงินค่าจ้างหรือค่าจ้างโดยความล่าช้าเป็นความผิดของผู้สัญญา



ระยะเวลา 3/4





## 2. การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566 และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน



### 4. โครงการปรับปรุงระบบ Call Center ของ ฝตส.


- ฝตส. เป็นเจ้าของงานในการจัดทำ **Draft TOR** แต่การจัดทำใช้เวลานาน เนื่องจากต้องพิจารณาสินค้าในท้องตลาด โดยให้บริษัท 3-4 รายเสนอข้อมูล เพื่อพิจารณาจัดทำ **TOR** ที่ไม่ลืดอกสเปค เสนอข้อมูลที่เป็นกลาง
- **TOR** ดังกล่าวต้องพิจารณาด้านเทคโนโลยี หรือ การติดตั้งระบบ **on cloud** ได้หรือไม่
- **TOR** แล้วเสร็จ 3 พ.ย.65 ระยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือน คาดว่าจะเบิกงวดแรกได้ เดือน ธันวาคม 2566

## 2. การติดตามการทำสัญญา ปีงบประมาณ 2566 และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน



### 5. ปรับปรุงหลังคาอาคาร ดาตฟ้า ของ สสมบ.

- การออกแบบโครงหลังคา ออกแบบโดย ฝอผ. เนื่องจากต้องมีวิศวกร ระดับ สย. ลงนามแบบ ส่งข้อมูลรายละเอียดไปตั้งแต่ปี 2566 ปัจจุบันแบบยังไม่แล้วเสร็จ
- ผวก. ขอให้รายนายละเอียดการปรับปรุงหลังคาอาคารดาตฟ้า ของ สสมบ. มาประชุมหารือกับ ผวก. เพื่อสั่งการมอบหมายให้วิศวกร ช่วยออกแบบต่อไป



### 3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

3.1 แนวทางการเตรียมจัดหาพัสดุก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3.2 แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ **CMS**

3.3 ขอให้ทุกหน่วยงานคาดการณ์เบิกจ่าย



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี (ฝ่ายงบประมาณ)

ที่ ผังป 133 /2566 วันที่ 23 มีนาคม 2566

เรื่อง แนวทางการเตรียมจัดหาพัสดุก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- |  |  |
|--|--|
| เรียน <input type="checkbox"/> ผู้ว่าการ                   | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (บริหาร)             |
| <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (การเงิน)            | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม)           |
| <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ)            | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)        |
| <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล)   |
| <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)  | <input type="checkbox"/> ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) |

ด้วยในการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ประธานคณะทำงานฯ ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยอ้างอิงจากข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางการดำเนินงานที่มีการแจ้งเวียนภายในองค์กร เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่จะส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนที่อาจไม่บรรลุตามเป้าหมายองค์กร

ในการนี้ เลขานุการคณะทำงานฯ ขอแจ้งเวียนแนวทางการเตรียมจัดหาพัสดุก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากคณะกรรมการ กปน. ตามข้อเสนอแนะของประธานคณะทำงานฯ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ดุลพินิจประกอบการพิจารณาการดำเนินงานในการจัดหาพัสดุก่อนที่คณะกรรมการ กปน. จะให้ความเห็นชอบงบลงทุน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

### 3.1 แนวทางการเตรียมจัดหาพัสดุก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- ผวก. มีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
- ผงป. ขอแจ้งเวียนแนวทางการเตรียมจัดหาพัสดุก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากคณะกรรมการ กปน. เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ดุลพินิจประกอบการพิจารณาการดำเนินงานในการจัดหาพัสดุ

### 3.1 แนวทางการเตรียมจัดหาพัสดุก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ กค(กวจ) 0405.2/034489 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอรื้อหรือการเตรียมการจัดหาพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เอกสารแนบ 1)



2) บันทึกที่ ฝจพ143/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ 2)



3) สื่อบันทึกภาพและเสียงการบรรยาย หัวข้อ “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” โดยนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาราคากลางกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 (ตัดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำราคากลาง) โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านการสแกน QR Code ด้านล่างนี้





## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี (ฝ่ายงบประมาณ)

ที่ ผังป 50 /2566

วันที่ 26 มกราคม 2566

เรื่อง แจ้งปรับปรุงระบบ CMS และแนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ

เรียน หน่วยงานต่างๆ

ตามที่ ผังป. ขอให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและความคืบหน้าสำหรับรายการที่ดำเนินการช้ากว่าแผนผ่านทางระบบ CMS เพื่อใช้เป็นข้อมูลในที่ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี นั้น

ในการนี้ ผังป. ขอแจ้งว่า ปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงระบบ CMS ให้สามารถติดตามรายการลงทุนได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานสามารถเลือกหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาให้สอดคล้องกับเหตุผล/คำชี้แจงที่ส่งผลให้รายการลงทุนทำสัญญา/เบิกจ่ายช้ากว่าแผน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการบันทึกข้อมูลโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ หากหน่วยงานดำเนินการดังกล่าวในระบบ CMS แล้วพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สคส.กส.ผังป. โทรศัพท์ 02-504-0123 ต่อ 1952 1387 และ 1357 เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบ CMS ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางสาวขวัญ เชาวนะกิจ

(นางสาวขวัญ เชาวนะกิจ)  
ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ  
คณะทำงานและเลขานุการ

### 3.2 แนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ CMS

- ผังป. มีการปรับปรุงระบบ CMS ในรวบรวมกลุ่มประเด็นปัญหาเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดติดตามงบลงทุน จึงขอให้หน่วยงาน “เลือกหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาให้สอดคล้องกับเหตุผล / คำชี้แจงที่ส่งผลให้รายการลงทุนที่ทำสัญญา และเบิกจ่ายช้ากว่าแผน”
- หากมีประเด็นปัญหามากกว่า 1 ประเด็น ขอให้เลือกหมวดปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานมากที่สุด
- กรณีไม่มีประเด็นปัญหา หรือยังไม่ถึงแผนจ่าย ขอให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้า ทุกรายการ

### 3.2 แนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ CMS

# การปรับปรุง “หมวดหมู่ประเด็นปัญหา” ระบบ CMS

| สถานะการเงิน |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  | สถานะการดำเนินงาน |  |  |  | สถานะการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
|--------------|----------|----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| สถานะการเงิน |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  | สถานะการดำเนินงาน |  |  |  | สถานะการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| M1           |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| M2           |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| M3           |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| M4           |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| M5           |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| M6           |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| M7           |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| M8           |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| M9           |          |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| รวมเงิน      | 8,407.85 | 4,529.17 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |

สถานะการเงิน

สถานะการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน

สถานะการเงิน

สถานะการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน

สถานะการเงิน

สถานะการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน

สถานะการเงิน

สถานะการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน

## ประเด็นปัญหา

ความคืบหน้า/  
แนวทางแก้ไข

## 3.2 แนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ CMS

### การปรับปรุง “หมวดหมู่ประเด็นปัญหา” ระบบ CMS

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| ปัญหาก่อนทำ PR                       | • รายการลงทุนนั้นอยู่ระหว่างขั้นตอนการทำ PR หรือเกิดความล่าช้าในขั้นตอนการทำ PR   |
| ปัญหาการจัดทำ TOR/ราคากลาง           | • รายการลงทุนที่อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR/ราคากลาง ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำครั้งแรก หรือการทบทวน TOR/ราคากลางในครั้งต่อมา                           |
| ปัญหาประกาศร่าง TOR/รายงานขอซื้อจ้าง | • รายการลงทุนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาพิจารณาร่าง TOR  |
| ปัญหาขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง        | • รายการลงทุนที่ติดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง การไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือ มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว |
| ขั้นตอนการอุทธรณ์                    | • รายการลงทุนที่อยู่ระหว่างระยะเวลาการอุทธรณ์ การส่งประเด็นการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างไปยังกรมบัญชีกลาง                                     |
| รอลงนาม                              | • รายการลงทุนที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามสัญญา   |
| การขออนุญาตเข้าพื้นที่               | • รายการลงทุนที่ติดปัญหาของการขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้าง การขออนุญาตกรรมสิทธิ์ที่ดิน   |
| การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ/สัญญา         | • รายการลงทุนที่ติดปัญหาจากสภาพหน้างานและจำเป็นต้องมีการแก้ไขแบบ หรือสัญญา  |
| การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ         | • กรณีที่ความล่าช้าเกิดจากการขนส่งครุภัณฑ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ  |
| อื่น ๆ                               | • เช่น อยู่ระหว่างการขอยกเลิกรายการลงทุน เป็นต้น  |



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี (ฝ่ายงบประมาณ)

ที่ ผงป 132 /2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566

เรื่อง ยินยอมติดตามการทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี เรื่อง การติดตามงบลงทุน ประจำปี 2566

- |  |  |
|--|--|
| เรียน <input type="checkbox"/> ผู้ว่าการ                   | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (บริหาร)             |
| <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (การเงิน)            | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม)           |
| <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ)            | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)        |
| <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล)   |
| <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)  | <input type="checkbox"/> ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) |

ตามมติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ประธานได้สั่งการให้หน่วยงานคาดการณ์ผลเบิกจ่ายงบลงทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลแสดงแนวโน้มการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566 และกำหนดแนวทางการแก้ไขให้ทันท่วงที หากคาดว่าจะผลเบิกจ่ายจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายงบประมาณ จึงขอให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลคาดการณ์ผลเบิกจ่าย รวมถึงประเด็นปัญหาและความคืบหน้าในการดำเนินงานผ่านระบบ CMS ให้ครบถ้วนทุกรายการ เป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2566 เป็นต้นไป และ ฝ่ายงบประมาณ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากระบบ CMS เพื่อใช้ในการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากหน้า Intranet ของ ฝ่ายงบประมาณ หรือสอบถามได้ที่ ส่วนควบคุมงบลงทุน กองบริหารงบลงทุน ฝ่ายงบประมาณ โทรศัพท์: 02-504-0123 ต่อ 1952 1357 และ 1387

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สายนะ ช่างหล่อ

(นางสาวขวัญ เชาวนกิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

คณะทำงานและเลขานุการ

### 3.3 ขอให้ทุกหน่วยงานคาดการณ์ผลเบิกจ่าย

- ผวก. สั่งการให้หน่วยงานคาดการณ์ผลเบิกจ่ายงบลงทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลแสดงแนวโน้มการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566 และกำหนดแนวทางแก้ไขให้ทันท่วงที หากคาดว่าจะผลเบิกจ่ายจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- ขอให้หน่วยงานบันทึกผลข้อมูลคาดการณ์ผลเบิกจ่าย รวมถึงประเด็นปัญหาและความคืบหน้าในการดำเนินงานผ่านระบบ CMS ให้ครบถ้วนทุกรายการ เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2566
- ผงป. จะรวบรวมข้อมูลจากระบบ CMS เพื่อใช้ในการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี
- อนุกรรมการติดตามฯ ขอให้ชี้แจงประเด็นปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเข้าพื้นที่



ขอบคุณค่ะ

