


A top-down view of a desk with various office supplies. On the left is a silver laptop. In the center is an open white notebook with a silver pen resting on it. To the right is a green ruler with yellow markings, a red folder, and a set of keys. A silver paperclip is also visible.

รายงานติดตามงานโครงการหมู่บ้านจัดสรร

โดย : คณะทำงานย่อยตรวจสอบและติดตามการขอใช้น้ำประปาโครงการหมู่บ้านจัดสรร

โครงการ ฯ และเฟส ที่ข้อมูล / เอกสารในระบบ CIS ไม่ครบถ้วน สะสมถึง ก.ค. 66

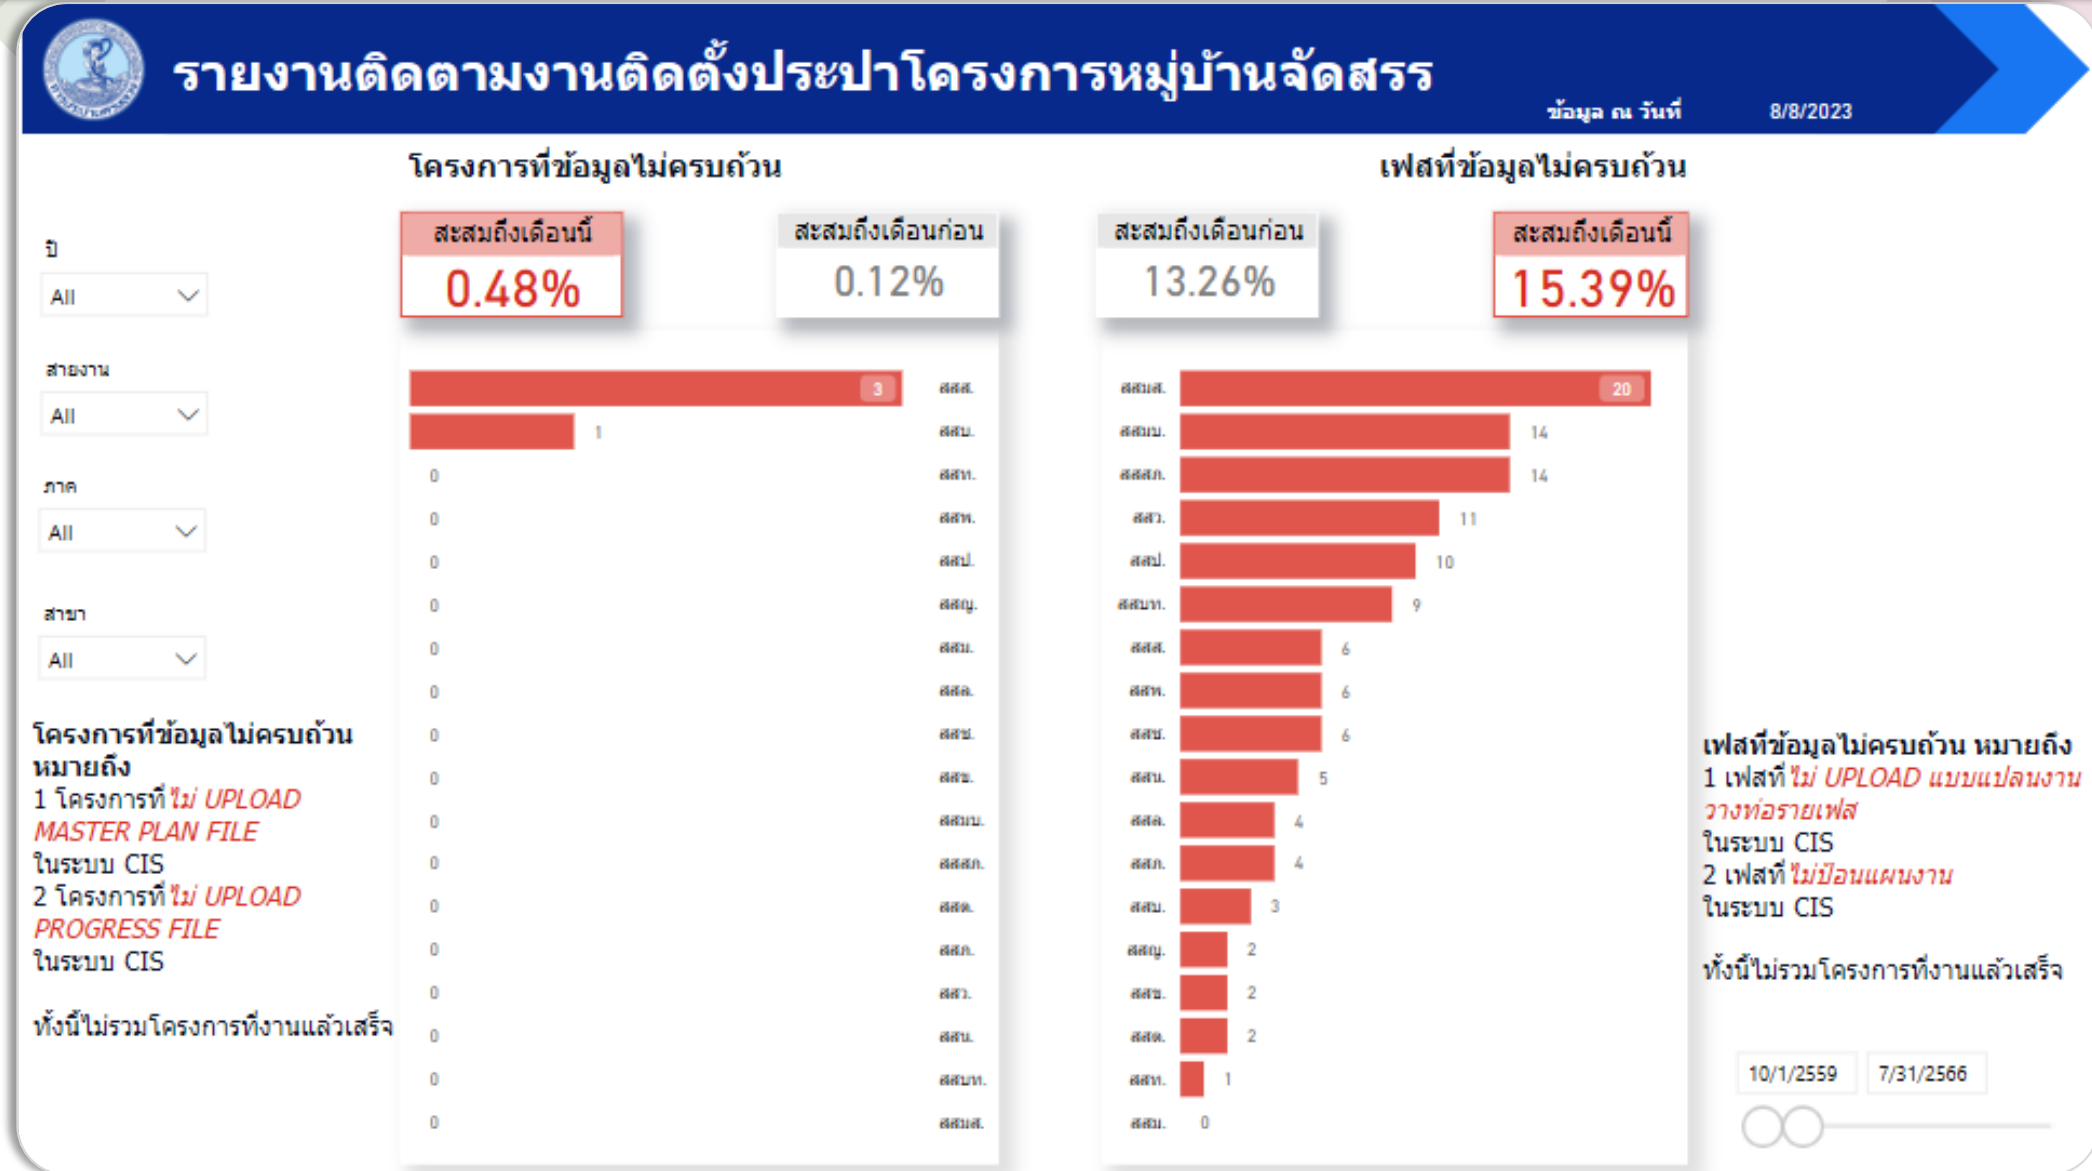


จำนวนโครงการ ฯ ใหม่ เดือน ก.ค. 66


7 โครงการ

โครงการหมู่บ้านจัดสรร ระหว่างดำเนินการ 100.00%

● โครงการ ● โครงการ (รวม)

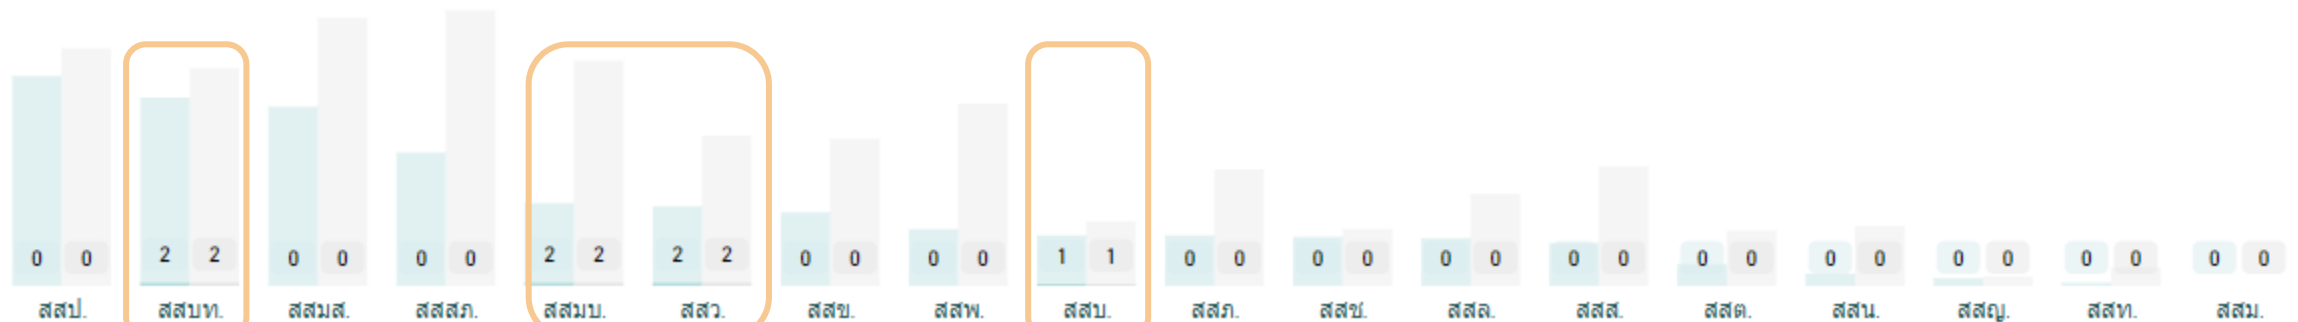

โครงการใหม่ (รายเดือน)

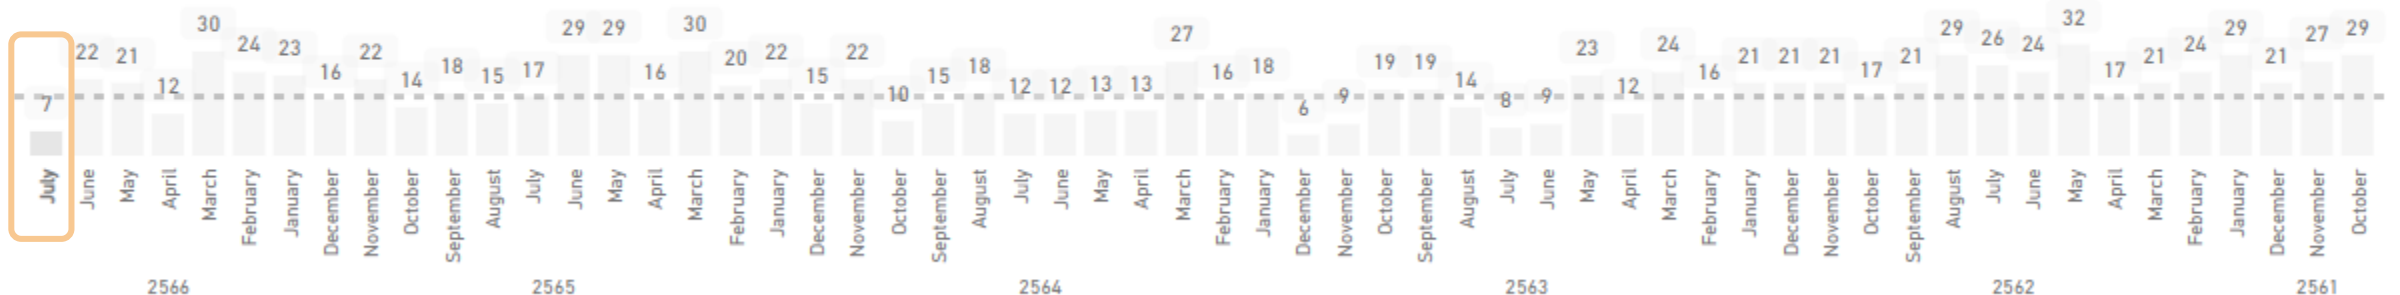

โครงการ ฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
สะสมถึง ก.ค. 66 มีจำนวน 841 โครงการ



รายงานติดตามงานโครงการหมู่บ้านจัดสรร สำหรับผู้บริหาร

ข้อมูล ณ วันที่

8/8/2023

รายชื่อลูกค้า

All

ปี

All

แล้วเสร็จ

ระหว่างดำเนินการ

จำนวนรวม

1,497

โครงการ

ระหว่างดำเนินการ


841

โครงการ


โครงการหมู่บ้านจัดสรร

ระหว่างดำเนินการ 56.18%


โครงการ (รวม)

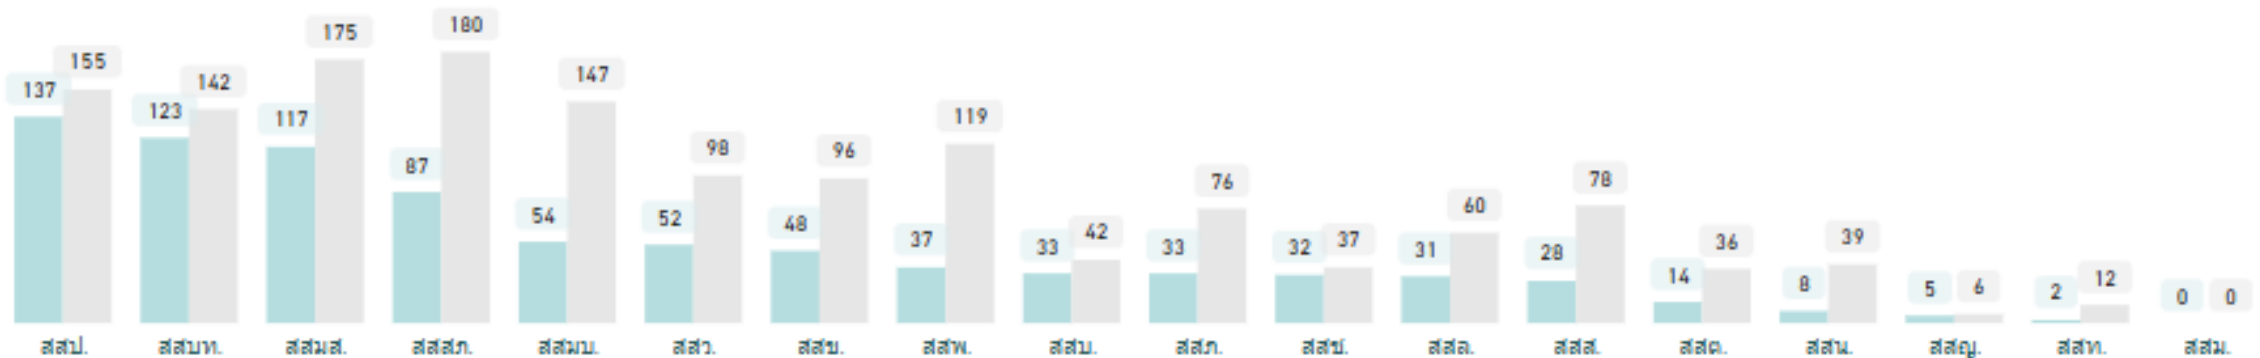

เฟส ที่ยื่นขอวางท่อ (เฟสใหม่) เดือน ก.ค. 66
จำนวน 100 เฟส

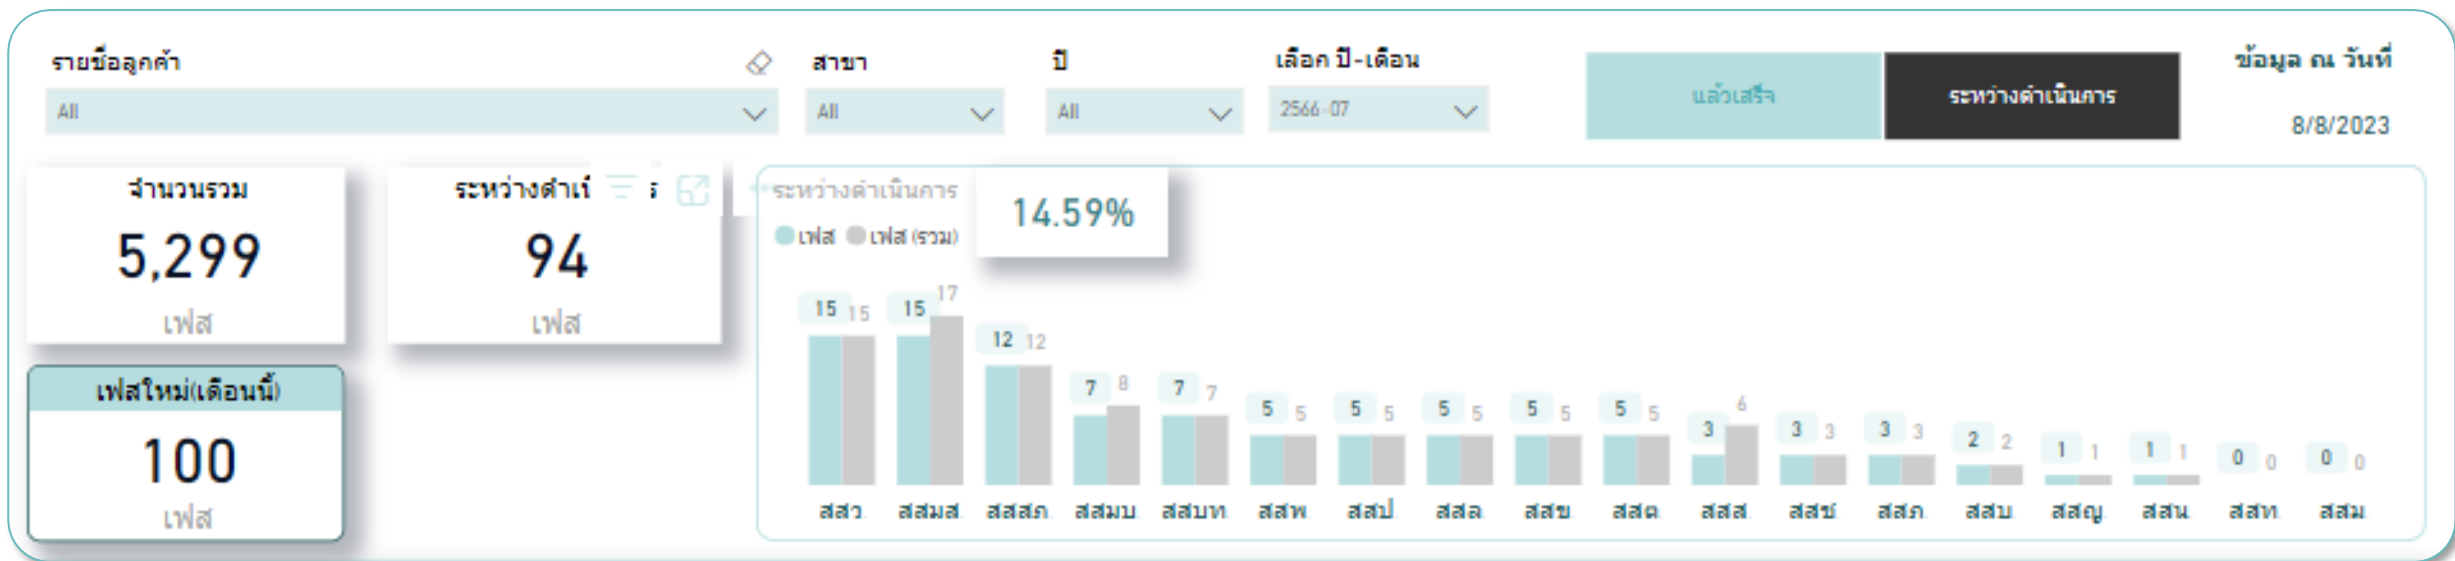

เพลส ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สะสมถึง ก.ค.66 มีจำนวน 773 เพลส
ลดลง 18 เพลส เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 66

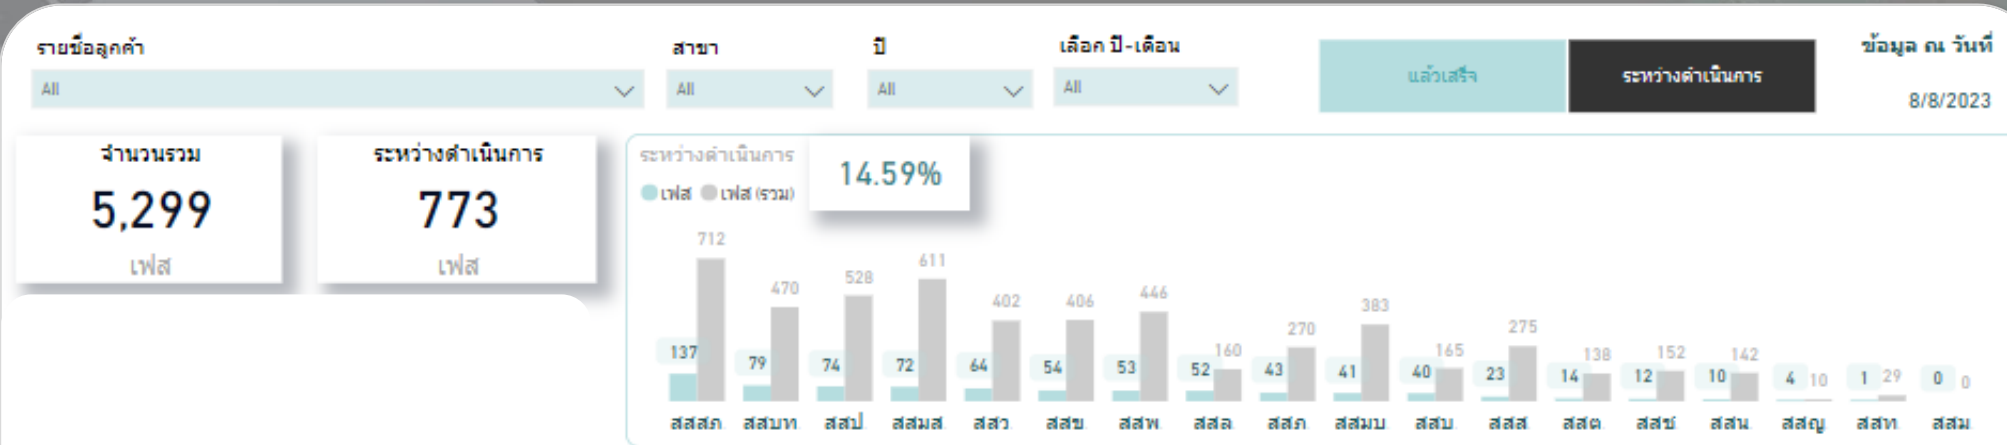

ระหวางดำเนินการ										
PROJECT_ID	ชื่อโครงการ	% ความก้าวหน้าโครงการ	ชื่อเฟส	% ความก้าวหน้าเฟส	ขั้นตอนดำเนินการ	แผนงาน	วันเริ่มขึ้นตอน	วันทันแล้วเสร็จ	ตามแผนหรือช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
660725000001	พรรณนา (ทวีวัฒนา)	10	พรรณนา (ทวีวัฒนา)-เฟส 1.0	0	ยื่นเรื่องวางทอและออกคำร้องดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	03/08/2566	03/08/2566		
660720000002	มาเบล ประชาอุทิศ 90	0	มาเบล ประชาอุทิศ 90-เฟส 0.1	0	ยื่นเรื่องวางทอและออกคำร้องดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	25/07/2566	26/07/2566	✗	
660720000001	ภูริ ไพรหม วงแหวนกาญจนาฯ	7	ภูริ ไพรหม วงแหวนกาญจนาฯ-เฟส 1.0	0	ยื่นเรื่องวางทอและออกคำร้องดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	20/07/2566	21/07/2566	✗	
660717000002	อลิษา เคียงบงแหวน-ประชาอุทิศ	13	ทางเข้า อลิษา เคียงบงแหวน-ประชาอุทิศ ระยะ 0.1	0	ยื่นเรื่องวางทอและออกคำร้องดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	21/07/2566	21/07/2566		
			อลิษา เคียงบงแหวน-ประชาอุทิศ-เฟส 0.1	0	ยื่นเรื่องวางทอและออกคำร้องดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	21/07/2566	21/07/2566		
			อลิษา เคียงบงแหวน-ประชาอุทิศ-เฟส 0.2	0	ยื่นเรื่องวางทอและออกคำร้องดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	21/07/2566	21/07/2566		
660713000001	จีโอ เวสต์เกต	7	จีโอ เวสต์เกต-เฟส 1.0	0	ยื่นเรื่องวางทอและออกคำร้องดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	03/08/2566	03/08/2566		
660709000001	เดอะ ริคโค เรสซิเดนซ์ งามอินทรา-จตุโชติ	1	เดอะ ริคโค เรสซิเดนซ์ งามอินทรา-จตุโชติ-เฟส 1.0	0	ยื่นเรื่องวางทอและออกคำร้องดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	26/07/2566	26/07/2566		
660705000001	แอลโฆส โฟล์ว มินบุรี	50	แอลโฆส โฟล์ว มินบุรี-เฟส 1.0	0	ยื่นเรื่องวางทอและออกคำร้องดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	21/07/2566	21/07/2566		
660629000001	อนาสีร์ ปิ่นเกล้า-กาญจนา	10	อนาสีร์ ปิ่นเกล้า-กาญจนา-เฟส 1.0	20	ยื่นเรื่องวางทอและออกคำร้องดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	1	03/07/2566	03/07/2566		
					ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	10	03/07/2566	16/07/2566	✗	

