

วาระที่ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 1/2567

19 มกราคม 2567



หัวข้อเรื่อง

01

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำเดือน ธ.ค.66


และสะสม ต.ค.66 – ธ.ค.66

02

การเบิกจ่ายแบบ Front Load
(วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท
และความก้าวหน้าการทำสัญญา)


03

มติคณะเร่งรัดเบิกจ่าย
งบประมาณ




01

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำเดือน ธ.ค.66
และสะสม ต.ค.66 – ธ.ค.66



แผน – ผลเบิกจ่าย ฐ.ค.66 และสะสม ต.ค.66 – ฐ.ค.66

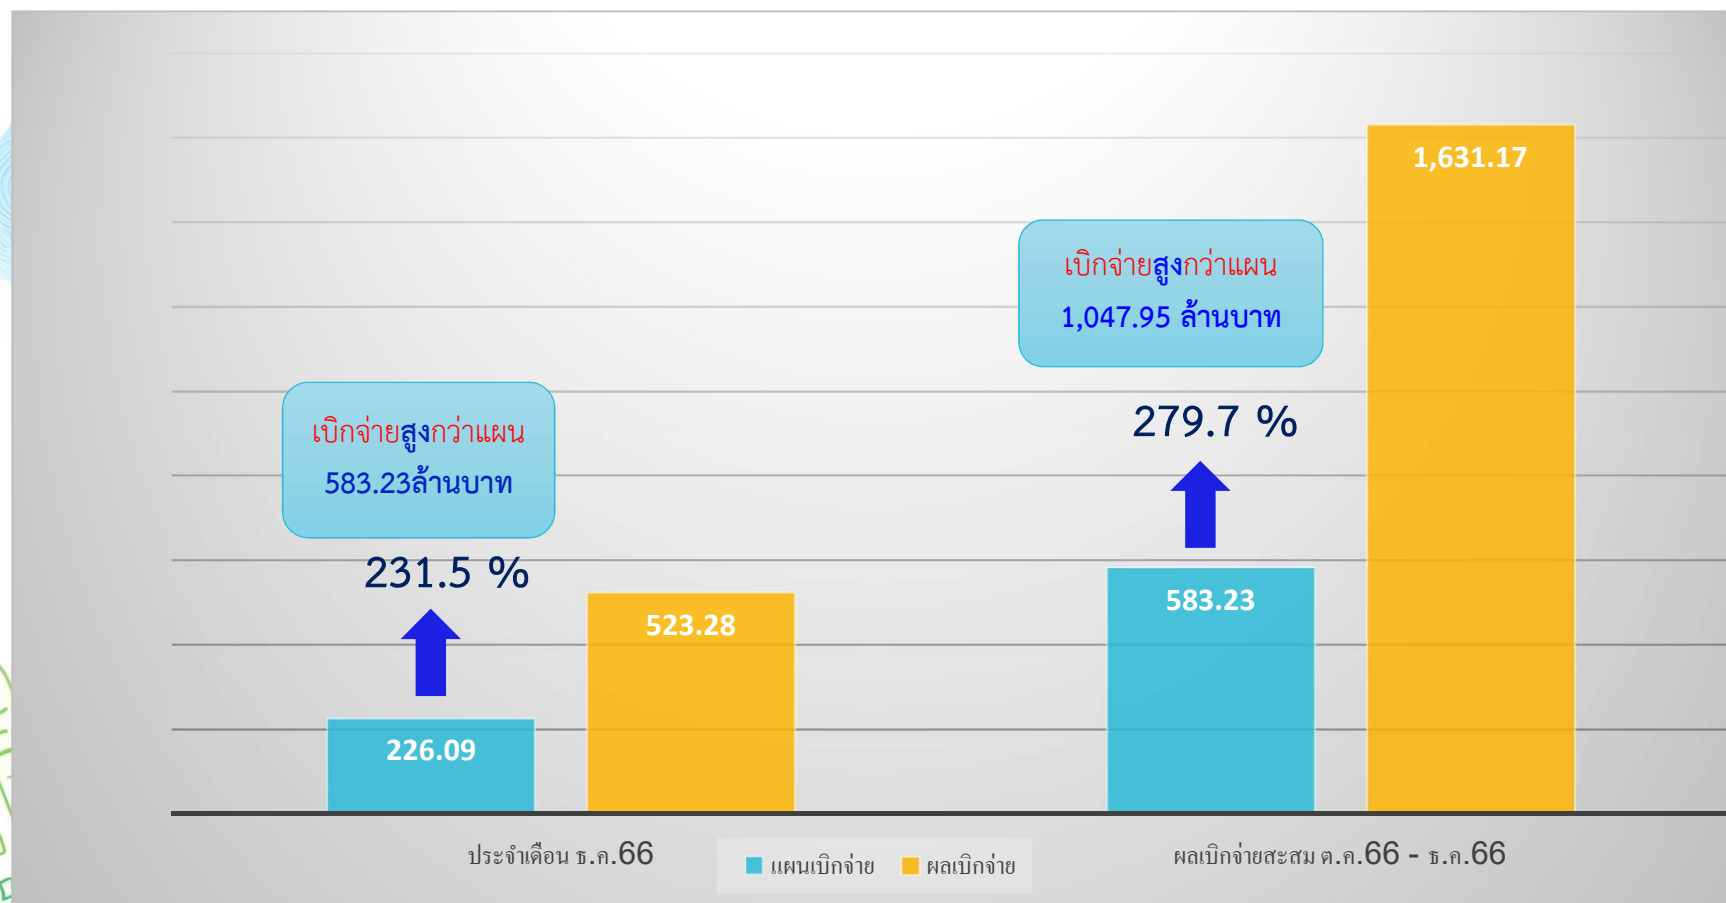

แผน – ผลเบิกจ่าย ฐ.ค.66 และสะสม ต.ค.66 – ฐ.ค.66

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ฐ.ค.66				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.66 – ฐ.ค.66			
	แผน ฐ.ค.66	ผล ฐ.ค.66	ผลต่าง	%	แผนสะสม	ผลสะสม	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	18.48	19.15	0.66	103.6%	45.05	58.41	13.36	129.7%
ลดน้ำสูญเสีย	109.04	320.44	211.40	293.9%	313.63	1,016.89	703.26	324.2%
มาตรวัดน้ำ	19.70	33.62	13.92	170.7%	35.00	70.15	35.15	200.4%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	2.16	3.16	1.01	146.7%	6.44	10.16	3.72	157.8%
ขยายเขตชุมชนเมือง	3.12	16.99	13.87	544.6%	8.07	39.23	31.17	486.3%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	18.01	38.63	20.62	214.5%	24.67	98.55	73.87	399.4%
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.96	9.77	8.82	1,022.7%	1.71	15.30	13.60	896.5%
งานรับจ้างงาน	35.11	43.91	8.81	125.1%	77.90	211.18	133.28	271.1%
งานติดตั้งประปาใหม่	17.35	22.22	4.88	128.1%	45.38	67.39	22.01	148.5%
งานทดแทนระบบเฝ้าระวัง DMA	2.16	8.41	6.25	388.7%	25.38	24.18	(1.21)	95.2%
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	0.00	6.97	6.97	-	0.00	19.73	19.73	-
รวมทั้งสิ้น	226.09	523.28	297.20	231.5%	583.23	1,631.17	1,047.95	279.7%

02

การเบิกจ่ายแบบ Front Load
(วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
และความก้าวหน้าการทำสัญญา)



นโยบาย Front Loaded

วงเงินดำเนินการ
ไม่เกิน 100,000 บาท
จัดทำสัญญาและเบิกจ่าย
ภายในเดือนตุลาคม

วงเงินดำเนินการระหว่าง
100,001-500,000 บาท
จัดทำสัญญาและเบิกจ่าย
ภายในเดือนธันวาคม (ไตรมาสที่ 1)

วงเงินดำเนินการ
มากกว่า 500,000 บาทขึ้นไป
จัดทำสัญญาภายในไตรมาสที่ 2
และเบิกจ่ายตามงวดงาน (ส่น้ำเสมอ)



วงเงินดำเนินการ
ไม่เกิน 100,000 บาท

จัดทำสัญญาและเบิกจ่าย
ภายในเดือนตุลาคม

สายงานบริการ (ด้านตะวันออก)

รายการที่มีวงเงินดำเนินการไม่เกิน 100,000 บาท

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2566)

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	ทำสัญญา		เบิกจ่าย	
					แผนทำสัญญา	ทำสัญญา	แผนจ่าย	จ่ายจริง
1	สสส.	C-67.1.04.01.0001	เครื่องขยายเสียงติดรถประกาศ(กำลังขยายไม่น้อยกว่า80วัตต์)พร้อมวิทยุเครื่อง	17,500.00	ต.ค.-66	ต.ค.-66	ต.ค.-66	ยกเลิก
2	สสส.บ.	C-67.1.05.02.0035	ไมโครโฟนประชุมแบบประธาน	20,000.00	ต.ค.-66	ธ.ค.-66	ต.ค.-66	26-ธ.ค.-66
3	สสส.	C-67.1.05.01.0261	ชุดโต๊ะสนาม	30,000.00	ต.ค.-66		ต.ค.-66	29-ธ.ค.-66
4	สสส.	C-67.2.02.03.0472	เครื่องอ่านบาร์โค้ด	75,000.00	มี.ค.-67	ธ.ค.-66	ส.ค.-67	
5	สสส.บ.	C-67.1.05.05.0027	ถังเก็บน้ำประปาขนาด2,000ลิตร	84,000.00	ต.ค.-66		ต.ค.-66	
6	สสส.บ.	C-67.1.02.02.0004	งานติดตั้งโครงหลังคาจุดบริการเครื่องดื่มอาร์โอ	100,000.00	ต.ค.-66	พ.ย.-66	ต.ค.-66	
รวม				326,500.00	-		-	

สายงานบริการ (ด้านตะวันตก)

รายการที่มีวงเงินดำเนินการไม่เกิน 100,000 บาท

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2566)

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	ทำสัญญา		เบิกจ่าย	
					แผนทำสัญญา	ทำสัญญา	แผนจ่าย	จ่ายจริง
1	สสส.	C-67.1.05.01.0374	โต๊ะบาร์สำหรับบริการลูกค้า	5,800.00	มี.ย.-67		มี.ย.-67	
2	ผจส.	C-67.1.05.01.0163	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษA4ส่งเอกสารได้ครั้งละ20แผ่น	30,000.00	ต.ค.-66		ต.ค.-66	ยกเลิก
3	ผมน.	C-67.1.03.01.0026	เครื่องวัดอัตราการไหลขนาด1นิ้ว	30,000.00	ต.ค.-66	ต.ค.-66	ธ.ค.-66	
4	สสส.	C-67.1.05.01.0375	โต๊ะบาร์ขนาดใหญ่(สี่เหลี่ยม)	39,000.00	มี.ย.-67		มี.ย.-67	
5	ผมน.	C-67.1.03.01.0027	เครื่องวัดอัตราการไหลขนาด2นิ้ว	40,000.00	ต.ค.-66	ต.ค.-66	ธ.ค.-66	
6	สสส.	C-67.1.05.01.0119	เก้าอี้สตูลบาร์ไม้สำหรับบริการลูกค้า	49,000.00	มี.ย.-67		มี.ย.-67	
7	สสส.	C-67.1.05.01.0120	เก้าอี้สำนักงาน	73,630.00	พ.ค.-67		มี.ย.-67	
รวม				267,430.00				

วงเงินดำเนินการระหว่าง
100,001-500,000 บาท

จัดทำสัญญาและเบิกจ่าย
ภายในเดือนธันวาคม (ไตรมาสที่ 1)

สายงานบริการ (ด้านตะวันออก)								
รายการที่มีวงเงินดำเนินการอยู่ระหว่าง 100,001 - 500,000 บาท								
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2566)								
ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	ทำสัญญา		เบิกจ่าย	
					แผนทำสัญญา	ทำสัญญา	แผนจ่าย	จ่ายจริง
21	สสข.	C-67.1.02.02.0007	งานปรับปรุงป้ายสำนักงานประชาสัมพันธ์	251,500.00	ต.ค.-66		ธ.ค.-66	
22	สสป.	C-67.1.02.02.0016	งานปรับปรุงห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	279,800.00	พ.ย.-66		ธ.ค.-66	
24	สสนบ.	C-67.1.02.02.0022	งานปรับปรุงห้องส่วนซ่อมบำรุงระบบโยธาของบำรุงรักษาสนบ.	301,200.00	พ.ย.-66		ธ.ค.-66	
25	สสข.	C-67.1.02.02.0015	งานปรับปรุงหลังคาอาคาร2	355,300.00	ต.ค.-66		ธ.ค.-66	
27	สสน.	C-67.1.02.02.0002	งานจ้างปรับปรุงประตูด่านไฟ	400,000.00	ต.ค.-66		ธ.ค.-66	
28	สสข.	C-67.1.02.02.0014	งานปรับปรุงหลังคาอาคาร1	410,100.00	ต.ค.-66		ธ.ค.-66	
30	สสนบ.	C-67.1.02.01.0001	งานก่อสร้างห้องนำอาคาร2ชั้น1สสนบ.	460,000.00	พ.ย.-66		ธ.ค.-66	
31	สสข.	C-67.1.02.02.0020	งานปรับปรุงห้องประชุมอาคาร1	465,500.00	ต.ค.-66		ธ.ค.-66	
33	สสล.	C-67.1.05.02.0041	ระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งสสล.	160,000.00	ม.ค.-67		ก.ย.-67	
รวม				5,243,500.00				
สายงานบริการ (ด้านตะวันตก)								
รายการที่มีวงเงินดำเนินการอยู่ระหว่าง 100,001 - 500,000 บาท								
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2566)								
ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	ทำสัญญา		เบิกจ่าย	
					แผนทำสัญญา	ทำสัญญา	แผนจ่าย	จ่ายจริง
15	สสค.	C-67.1.05.01.0376	โต๊ะประชุม	100,020.00	พ.ค.-67		มิ.ย.-67	
16	ฝคจ.	C-67.1.05.06.0011	เครื่องสูบน้ำดูดโคลนขนาด3นิ้ว	110,000.00	ต.ค.-66	ธ.ค.-66	ธ.ค.-66	20-ธ.ค.-66
17	สสพท.	C-67.1.02.02.0018	งานปรับปรุงห้องน้ำผู้จัดการสาขา	176,800.00	ต.ค.-66		ธ.ค.-66	
18	สสค.	C-66.1.05.01.2024	เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู (4เครื่อง)	191,200.00	-		ม.ค.-67	
19	ฝคจ.	C-67.1.03.01.0022	เครื่องมือวัดแก๊สแบบพกพา	220,000.00	ต.ค.-66		ธ.ค.-66	
21	สสค.	C-67.1.05.04.0012	โทรทัศน์ขนาดไม่ต่ำกว่า75นิ้วสมาร์ทีวี(สามารถคัดลอกการแสดงผลหน้าจอจากมือถือไปยังโทรทัศน์ได้แบบไร้สาย)	252,600.00	เม.ย.-67		มิ.ย.-67	
22	ฝสน.	C-67.1.03.03.0030	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในPumpFloorที่สถานีสูบน้ำลาดพร้าวและสถานีสูบน้ำลาดกระบัง	340,000.00	ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	
23	สสพท.	C-67.1.02.02.0019	งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร1ชั้น2	348,000.00	ต.ค.-66		ธ.ค.-66	
24	ฝสน.	C-66.1.06.02.0051	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำ	348,250.00	-		ม.ค.-67	
25	ฝสน.	C-67.1.03.01.0064	อุปกรณ์HARTFieldCommunicator	400,000.00	ต.ค.-66	ต.ค.-66	เม.ย.-67	
26	สสน.	C-67.1.05.02.0030	ชุดโมล์และเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง	457,800.00	พ.ย.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	
27	สสนส.	C-67.1.02.02.0013	งานปรับปรุงโรงอาหารสำนักงานประชาสัมพันธ์	496,800.00	ม.ค.-67		มิ.ค.-67	
รวม				3,441,470.00				

งบสำรอง รวก.(กอ)

รายละเอียดการขออนุมัติวงเงินลงทุนครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานสายงานบริการ ด้านตะวันออก ปีงบประมาณ 2567				
หน่วยงาน	วันที่ได้รับงบประมาณ	WBS	รายการ	วงเงินดำเนินการ
รายการที่ยังไม่ทำสัญญา				
ลสภ.	29 พ.ย. 66	C-67.1.05.01.1001	ปรับปรุงประตูอัตโนมัติทางเข้าด้านหน้า อาคารสำนักงาน ชั้น 1	36,500.00
			รวม	36,500.00
รายการที่ทำสัญญาแล้ว				
			รวม	-
รายการที่เบิกจ่ายแล้ว				
ลสภ.	8 ธ.ค. 66	C-67.1.05.01.1002	งานซื้อเครื่องปรับอากาศไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	60,000.00
วงเงินลงทุนครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานสายงานบริการด้านตะวันออกที่ได้รับอนุมัติแล้ว				36,500.00
วงเงินลงทุนครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานสายงานบริการด้านตะวันออก ปีงบประมาณ 2567				1,000,000.00
วงเงินคงเหลือ				963,500.00

งบสำรอง รวก.(กต)

รายละเอียดการขออนุมัติวงเงินลงทุนครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานสายงานบริการ ด้านตะวันตก ปีงบประมาณ 2567				
หน่วยงาน	วันที่ได้รับงบประมาณ	WBS	รายการ	วงเงินดำเนินการ
รายการที่ยังไม่ทำสัญญา				
ลสภ.	3 พ.ย. 66	C-67.1.05.01.2001	ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับเก็บเอกสาร	110,500.00
ลสภ.	3 พ.ย. 66	C-67.1.05.01.2002	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบวางนอน	140,500.00
ลสภ.	14 พ.ย. 66	C-67.1.05.01.2004	ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับเก็บเอกสาร	110,500.00
ลสภ.	14 พ.ย. 66	C-67.1.05.01.2005	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบวางนอน	140,500.00
			รวม	502,000.00
รายการที่ทำสัญญาแล้ว				
			รวม	-
รายการที่เบิกจ่ายแล้ว				
ลสภ.	10 พ.ย. 66	C-67.1.05.01.2003	Box เหล็กกันน้ำ 50 ลิตร (UL7061) พร้อมอุปกรณ์ "Link"	3,070.00
			รวม	3,070.00
วงเงินลงทุนครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานสายงานบริการด้านตะวันตกที่ได้รับอนุมัติแล้ว				502,000.00
วงเงินลงทุนครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานสายงานบริการด้านตะวันตก ปีงบประมาณ 2567				1,000,000.00
วงเงินคงเหลือ				498,000.00

งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน

สรุปรายการที่ได้รับอนุมัติใช้เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2567				
หน่วยงาน	วันที่ได้รับงบประมาณ	WBS	รายการ	วงเงินดำเนินการ
รายการที่ยังไม่ทำสัญญา				
สสพ.	17 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0003	งานปรับปรุงกำแพงรั้วตั้งแต่หลังป้อมยามถึงคลังพัสดุ สสพ.	1,068,781.18
สสภ.	3 พ.ย. 66	C-67.1.06.02.0023	งานติดตั้งประตูและบันไดหนีไฟอาคาร 2 สสภ.	370,409.00
สสภ.	18 ธ.ค. 66	C-67.1.06.02.0028	งานก่อสร้างรั้วตาข่ายและปรับพื้นที่สำนักงานชั่วคราว บริเวณ ช.วัดหลวงพ่อดำ สำนักงานประสานสาขาสหุระปราการ และงานที่เกี่ยวข้อง	356,967.00
สสภ.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0006	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	2,440,000.00
สสภ.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0007	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	1,834,000.00
สสภ.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0008	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	1,650,000.00
สสพ.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0009	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	1,567,200.00
สสภ.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0010	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	1,150,000.00
สสภ.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0011	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	1,230,000.00
สสภ.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0012	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	1,760,000.00
สสภ.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0013	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	1,981,300.00
สสพ.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0014	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	400,000.00
สสภ.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0015	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	965,000.00
สสภ.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0016	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	950,000.00
สสภ.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0017	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	680,000.00
สสภ.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0018	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	1,220,000.00
สสภ.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0019	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	2,763,632.00
			รวม	22,387,289.18
รายการที่ทำสัญญาแล้ว				
สสพ.	6 พ.ย. 66	C-67.1.06.02.0024	งานติดตั้งระบบส่งน้ำดับเพลิง สสพ.	268,500.00
สสภ.	29 พ.ย. 66	C-67.1.06.02.0027	งานซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ สสภ.	8,000.00
			รวม	327,500.00
จำนวนเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ได้รับอนุมัติแล้ว				22,714,789.18

03

มติดัณะเร่งรัดเบิกจ่าย


งบลงทุน



มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

นโยบาย สตช.

ตามบันทึกถั่ว่นที่ลุดที่ นร.1124/ว7189 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566



ด้วยการลงทุนของรัฐวิสาหกิจมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างรอประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สตช. จึงขอให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดกระบวนการลงทุนเพื่อให้สามารถลงนามสัญญาและเบิกจ่ายลงทุนได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ 2567

ในกรณีที่การลงทุนที่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก่อนดำเนินการ และคณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามขั้นตอน

ขอให้รัฐวิสาหกิจเตรียมการและเร่งนำเสนอเรื่องการลงทุนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในโอกาสแรกเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว

มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

បើកប្រព័ន្ធ CMS

The screenshot displays the Capital Monitoring System (CMS) interface. At the top, there is a navigation bar with the system name and several menu items. Below the navigation bar, there is a search bar and a filter section. The main content area shows a table with columns for Project ID, Project Name, Project Type, Project Status, Project Budget, Project Actual, Project Variance, Project Risk, and Project Comments. The table contains three rows of data, each representing a different project. The first row shows a project with a budget of 10,000,000 and an actual cost of 9,500,000, resulting in a variance of 500,000. The second row shows a project with a budget of 20,000,000 and an actual cost of 20,500,000, resulting in a variance of 500,000. The third row shows a project with a budget of 30,000,000 and an actual cost of 30,500,000, resulting in a variance of 500,000. The table also includes a 'Total' row at the bottom, which summarizes the overall budget, actual cost, and variance for all projects.

Project ID	Project Name	Project Type	Project Status	Project Budget	Project Actual	Project Variance	Project Risk	Project Comments
1	Project A	Construction	Completed	10,000,000	9,500,000	500,000	Low	Project completed successfully.
2	Project B	Construction	In Progress	20,000,000	20,500,000	500,000	Medium	Project is currently in progress.
3	Project C	Construction	Planned	30,000,000	30,500,000	500,000	High	Project is planned for future work.
Total				60,000,000	60,500,000	500,000		

ฟงป. เปิดให้หน่วยงาน
บันทึกข้อมูล
ในระบบ CMS

เริ่มตั้งแต่เดือน
มกราคม 2567

ส่งภายในวันที่ 25
ของทุกเดือน

ทั้งนี้หน่วยงานสามารถดูแลเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567 เบื้องต้น (ก่อนขอปรับกรอบงบลงทุนจาก สศช.) ในระบบ **CMS** รายงานเปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (คณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน) ซึ่งไม่รวมแผนงานจัดซื้อโดย ผจพ. แผนคอมพิวเตอร์ และสัญญาเช่า หลังจากได้รับอนุมัติการขอปรับกรอบงบลงทุนจาก สศช. ปีงบประมาณ 2567 เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


ผู้แทน รวก.(กอ)

น.ส.ภัทรศรณีย์ จันทรรุ่งสง่า
นักบัญชี 7 รวก.(กอ)

ผู้แทน รวก.(กต)

น.ส.วาฬิกา หวนสุริยา
นักบัญชี 6 กปง.ฝสบ.

ส่งข้อมูลในระบบ CMS ให้
ผู้แทนสายงานบริการภายใน
วันที่ 20 ของทุกเดือน



Several stylized blue clouds with concentric circular patterns are scattered across the upper half of the slide, framing the central text.

THANK YOU
DO YOU HAVE ANY QUESTIONS !

