




## ผลการดำเนินงาน

ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ

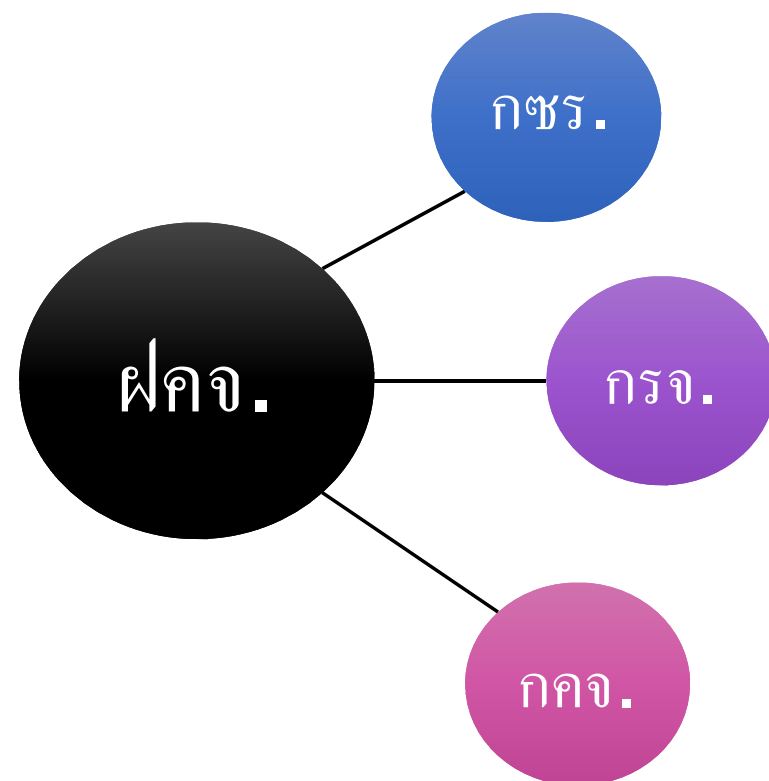


# 1. งานสำรวจหาท่อรั่วในท่อประธาน (ALC)



กรมประปา  
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

## แผนที่แสดงสมดุลน้ำ(Water Balance) ท่อประธาน

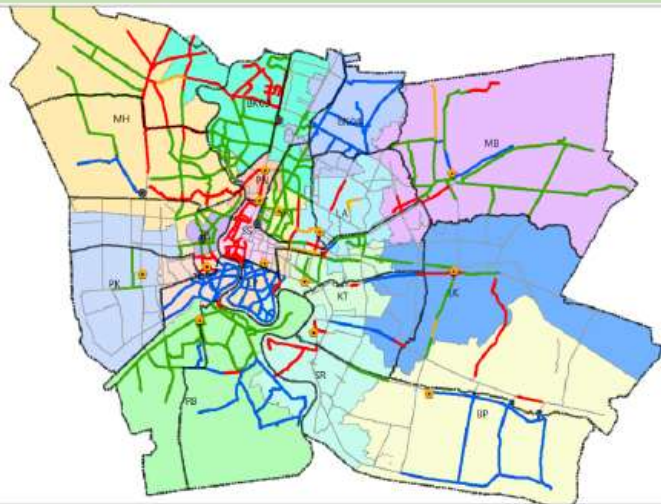

## ALC-MAIN PIPE LENGTH INSPECTION 2567 (KM.)



## ปริมาณน้ำสูญเสียสะสมในระบบท่อประธานที่ลดลงได้ประจำปีงบประมาณ 2567 (ลูกบาศก์เมตร)



ลดปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยสะสม  
ในเดือนมีนาคม 2567 ได้กว่า  
“1,815.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน”


จำนวนจุดรั่วท่อประธานที่ระบุได้ในเดือน  
มีนาคม 2567 “4 จุด” ความยาวท่อประธาน  
สำรวจได้ในเดือน “128.22 กิโลเมตร”

แผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6

รหัส - ชื่อโครงการ	แผนงาน	ปี 67		ปี 68		ปี 69		ปี 70	
SO1-T3-P1 โครงการปรับปรุงท่อประปา	แผนงานที่ 1 : งานสำรวจท่อประธานแตกรั่ว	540	20	540	20	540	20	540	20

เม.ย.67 พ.ค.67 มิ.ย.67

# ผลดำเนินการซ่อมท่อประธานประจำปีงบประมาณ 2567

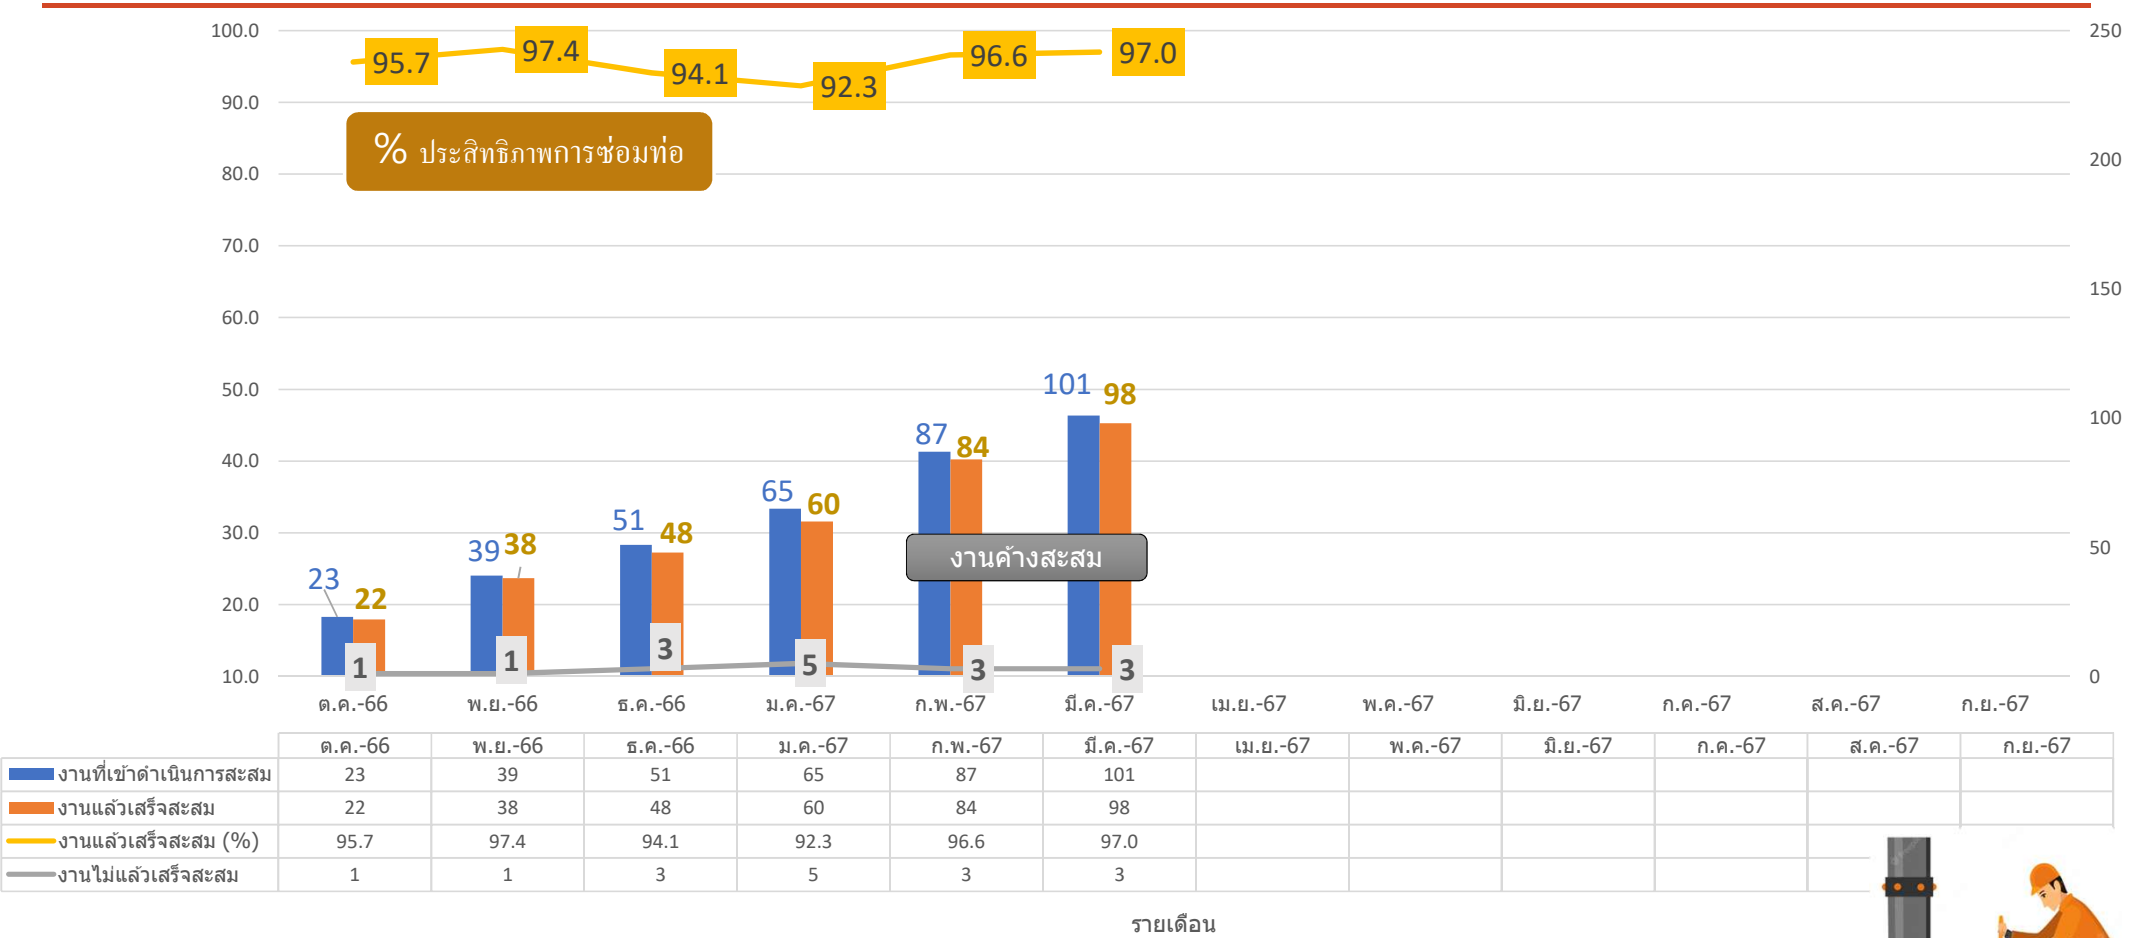

ข้อมูลล่าสุด 1 เมย. 67

งานที่เข้าดำเนินการสะสม    งานแล้วเสร็จสะสม    งานแล้วเสร็จสะสม (%)    งานไม่แล้วเสร็จสะสม





## สถิติตามประเภทงานซ่อมรายเดือน (งานที่คงค้างข้อมูล ณ 31 มี.ค. 67)



การประปาปทุมธานี  
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

เลขงาน	พิกัดจุดงาน	พื้นที่สาขา	วันที่เริ่มเข้าดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
Job 46/67	ท่อ600 ถนนวิภาวดีขาออก ตรงข้าม สรงประภา (แผนตัดจุด สามทางฝั่ง ขาเข้า)	สสข	14 ธ.ค. 66	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ท่อ600 cross (ยกเลิกการใช้งานแล้ว) รั่ว</li> <li>-เข้าชุด ตาม พิกัด กรจ.Mark ให้แต่ไม่พบ ท่อสามทางที่จะอุด เมื่อ <b>27/3/2567</b> พบแนวท่อตรง หลังท่อลึก2เมตร</li> <li>-วางแผน เข้าชุด Test pitch จุด Mark ใหม่ ตาม กรจ. แจ้งใหม่</li> <li>- กำหนด เข้า <b>ดำเนินการ ช่วง 22-25 /4/67</b> หลังหยุดยาวเทศกาล สงกรานต์</li> </ul>
Job 82/67	ท่อ1000st ถนนราชพฤกษ์ แยกบางแวก (จุดรั่วใหม่4จุด) พบเพิ่ม อีก 1 จุด	สสภ	21 ก.พ. 67	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ท่อรั่วรอยต่อท่อ(Coupling) 5 จุด</li> <li>-ซ่อมจุดรั่วด้วยการติดตั้งซีลยาง+เกล็ดมึบภายในท่อ โดยนักประดาน้ำ แล้ว 5 จุด (ยังพบน้ำซึมขึ้นกลางแยก)</li> <li>-กรจ. <b>นัดประชุม วางแผน เพื่อ สร้างหลุมงานตรงจุดรั่ว</b></li> </ul>
Job 89/67	ท่อ1500 ร้วคอ AV150 คู่งานน พระราม2 ขาเข้า กม 0+900	สสค	6 มี.ค. 67	<ul style="list-style-type: none"> <li>-เข้า ซ่อมแล้ว 1 ครั้ง คอ AV150 ผุกร่อนเป็นรู</li> <li>-แผนเปลี่ยนหน้างานพร้อมคอ AV ใหม่ (ปิดน้ำไม่อยู่)</li> <li>-เตรียมเข้าซ่อม #2 วันที่ 2/4/67 เพิ่ม พ.ท.ปิดน้ำ <b>(คาดว่าจะแล้วเสร็จ)</b></li> </ul>

ผลการดำเนินงานบริหารแรงดันน้ำ 162 จุด ปังบประมาณ 67

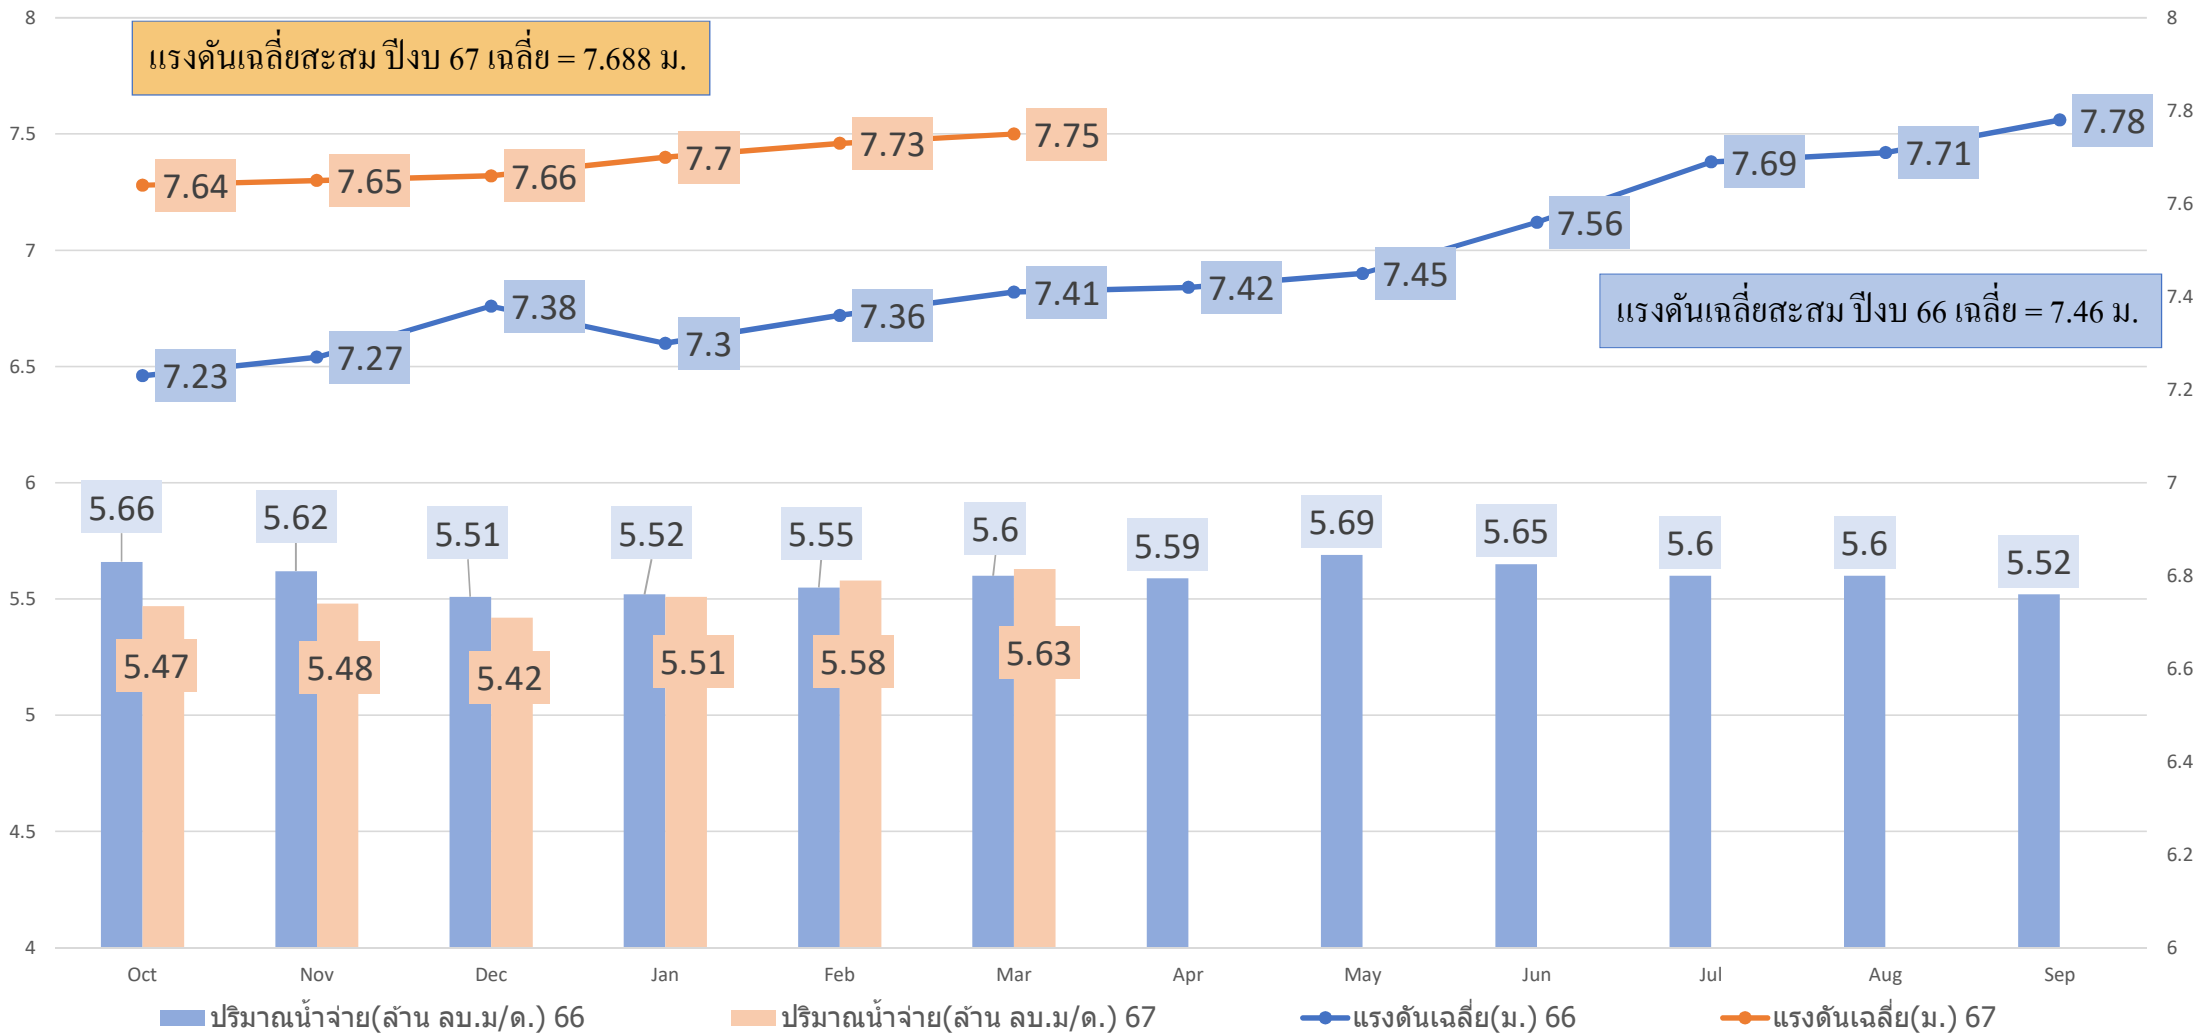

ข้อมูลล่าสุด 1 เมย. 67



# จบการนำเสนอ
