

ระบบติดตามความก้าวหน้างานโครงการหมู่บ้านจัดสรร

การประชุมสายงานบริการด้านตะวันตกและบริการด้านตะวันออก
ครั้งที่ 9/2567

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.



ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา

<https://davis.mwa.co.th>

- โดย คณะทำงานด้านบำรุงรักษาของสำนักงานประปาสาขา



รายงานติดตามงานติดตั้งประจำปีโครงการหมู่บ้านจัดสรร

ข้อมูล ณ วันที่

9/5/2024

โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

เฟสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

ปี
All

สายงาน
All

ภาค
All

สาขา
All

โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

หมายถึง

1 โครงการที่ไม่ **UPLOAD**
MASTER PLAN FILE

ในระบบ CIS

2 โครงการที่ไม่ **UPLOAD**
PROGRESS FILE

ในระบบ CIS

ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ

สะสมถึงเดือนนี้

0.00%

สะสมถึงเดือนก่อน

0.00%

สะสมถึงเดือนก่อน

0.20%

สะสมถึงเดือนนี้

3.58%

0	สสท.
0	สสส.
0	สสพ.
0	สสป.
0	สสญ.
0	สสน.
0	สสล.
0	สสข.
0	สสย.
0	สสนบ.
0	สสสภ.
0	สสน.
0	สสด.
0	สสภ.
0	สสว.
0	สสน.
0	สสท.
0	สสส.
0	สสญ.
0	สสน.
0	สสท.
0	สสส.

สสนบ.	3
สสสภ.	3
สสภ.	3
สสนท.	3
สสท.	2
สสน.	2
สสน.	2
สสป.	1
สสข.	1
สสย.	1
สสว.	1
สสนส.	1
สสท.	0
สสส.	0
สสญ.	0
สสน.	0
สสล.	0
สสท.	0

เฟสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หมายถึง

1 เฟสที่ไม่ **UPLOAD** แบบแปลนงาน
วางท่อระบายน้ำ

ในระบบ CIS

2 เฟสที่ไม่ **อัปเดต** แผนงาน

ในระบบ CIS

ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ

DateTH

10/1/2559

3/31/2567

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประจำปี <https://davis.mwa.co.th>

รายเฟส

เจ้าของโครงการ (ราย =

678

จำนวนเฟสทั้งสิ้น

6,295

ระหว่างดำเนินการ

782

ข้อมูลไม่ครบ

28

ไม่ครบถ้วน (%)

3.58%

ปี
All

สายงาน
All

ภาค
All

สาขา
All

จำนวนเฟสแยกสายงาน


รวก.(กอ)

3,626

รวก.(กต)

2,669


จำนวนเฟสที่ข้อมูลไม่ครบ

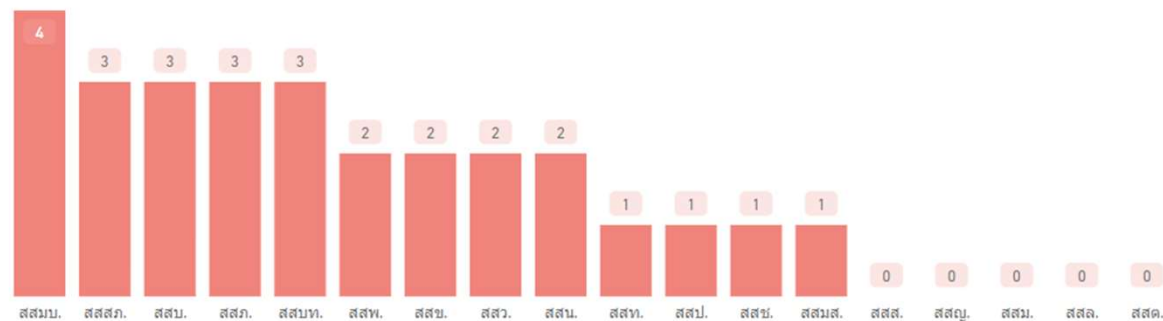

ไม่ป้อนแผนงาน (รายเฟส)



ไม่มีไฟล์แบบวางท่อในระบบ CIS (รายเฟส)



ชื่อเฟส

เลขที่สำรวจ	เฟส	แผนงาน	แบบวางท่อ
679999202667	สริน พรานนก - กาญจนา-เฟส 3.0	✗	✗
679999202435	Q District ราชพฤกษ์ - รัตนวิเศษ-เฟส 4.0	✗	✗
679999201400	โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด เพชรเกษม - กาญจนาภิเษก GBB-PKN-เฟส 2.0	✗	✗
679999200848	เศรษฐสิริ คอนมือง-เฟส 5.0	✗	✗
679999200634	เดอะแกรนด์ ไทยสมบูร์ก แอทประชาอุทิศ 90-เฟส 1.0	✗	✓
679999200410	ทิลลาส เออมี-รามอินทรา-เฟส 2.0	✗	✗
679999199405	เดอะ แพลนท์ จลลกรุง (PS103)-เฟส 5.0	✗	✗

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา <https://davis.mwa.co.th>

ข้อมูล ณ วันที่

9/12/2024

สาขา

All

ปี

All

เลือก ปี-เดือน

All

จำนวนเฟสแยกปีงบประมาณ

2567 277

2566 23

2565 4

2564 2

จำนวนเฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการ แยกตามขั้นตอน

ดำเนินการ ยื่นเรื่องวางท่อมากกว่า 1 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

0 / 0

เฟส

ดำเนินการ สำรวจ ออกแบบ แจกราคามากกว่า 10 วันทำ...
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

6 / 30

เฟส

ดำเนินการ ชำระเงินมากกว่า 20 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

80 / 114

เฟส

ดำเนินการ จัดจ้างมากกว่า 40 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

20 / 102

เฟส

ดำเนินการ ก่อสร้างมากกว่า 120 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

6 / 60

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนยื่นเรื่องวางท่อ (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead line (วัน): 1

ระยะเวลาของขั้นตอนสำรวจ ออกแบบ แจกราคา (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

สสว. 679999183632

Dead Line (วัน): 10

21

สสพ. 679999187131

18

สสมบ. 679999191597

15

ระยะเวลาของขั้นตอนชำระเงิน (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

สสว. 649999098508

Dead Line (วัน): 20

797

สสว. 649999583258

647

สสส. 659999387178

484

ระยะเวลาของขั้นตอนจัดจ้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

สสส. 669999439964

Dead Line (วัน): 40

103

สสสภ. 679999031912

82

สสส. 679999024139

75

ระยะเวลาของขั้นตอนก่อสร้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

สสว. 669999432459

Dead Line (วัน): 120

150

สสมส. 669999233083

145

สสส. 669999417103

133

ระยะเวลา ยื่นเรื่องวางท่อ มากที่สุด
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

0

วันทำการ

ระยะเวลา สำรวจ ออกแบบ แจกราคา มากที่สุด
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

21

วันทำการ

ระยะเวลา ชำระเงิน มากที่สุด
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

797

วัน

ระยะเวลา จัดจ้าง มากที่สุด
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

103

วันทำการ

ระยะเวลา ก่อสร้าง มากที่สุด
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)


150

วัน

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา <https://davis.mwa.co.th>

< Back to report

ระยะเวลาของขั้นตอน สํารวจ ออกแบบ แจ้จราคา (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

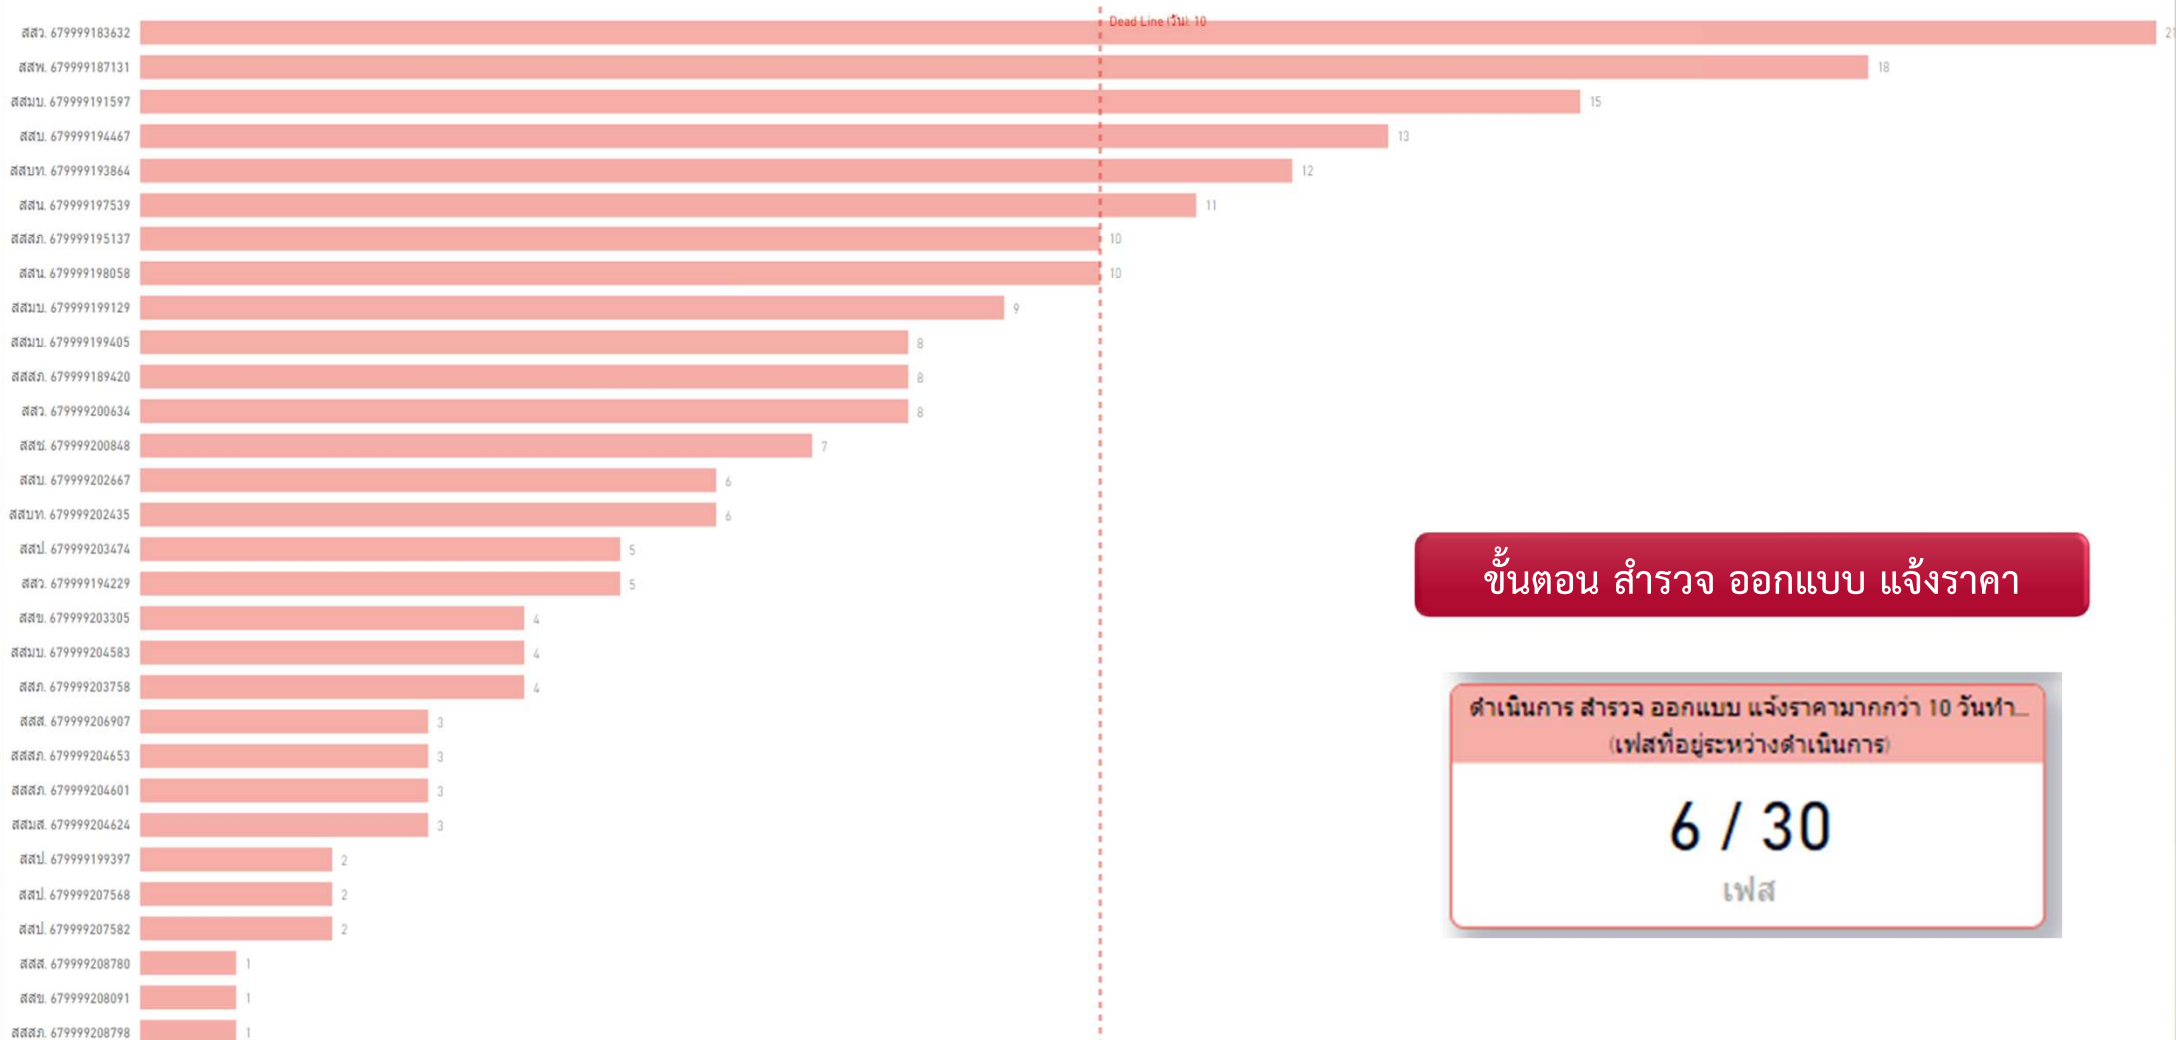

ขั้นตอน สํารวจ ออกแบบ แจ้จราคา

ดำเนินการ สํารวจ ออกแบบ แจ้จราคามากกว่า 10 วันท่า...
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)


6 / 30

เฟส

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา <https://davis.mwa.co.th>

< Back to report

ระยะเวลาของขั้นตอนจัดจ้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

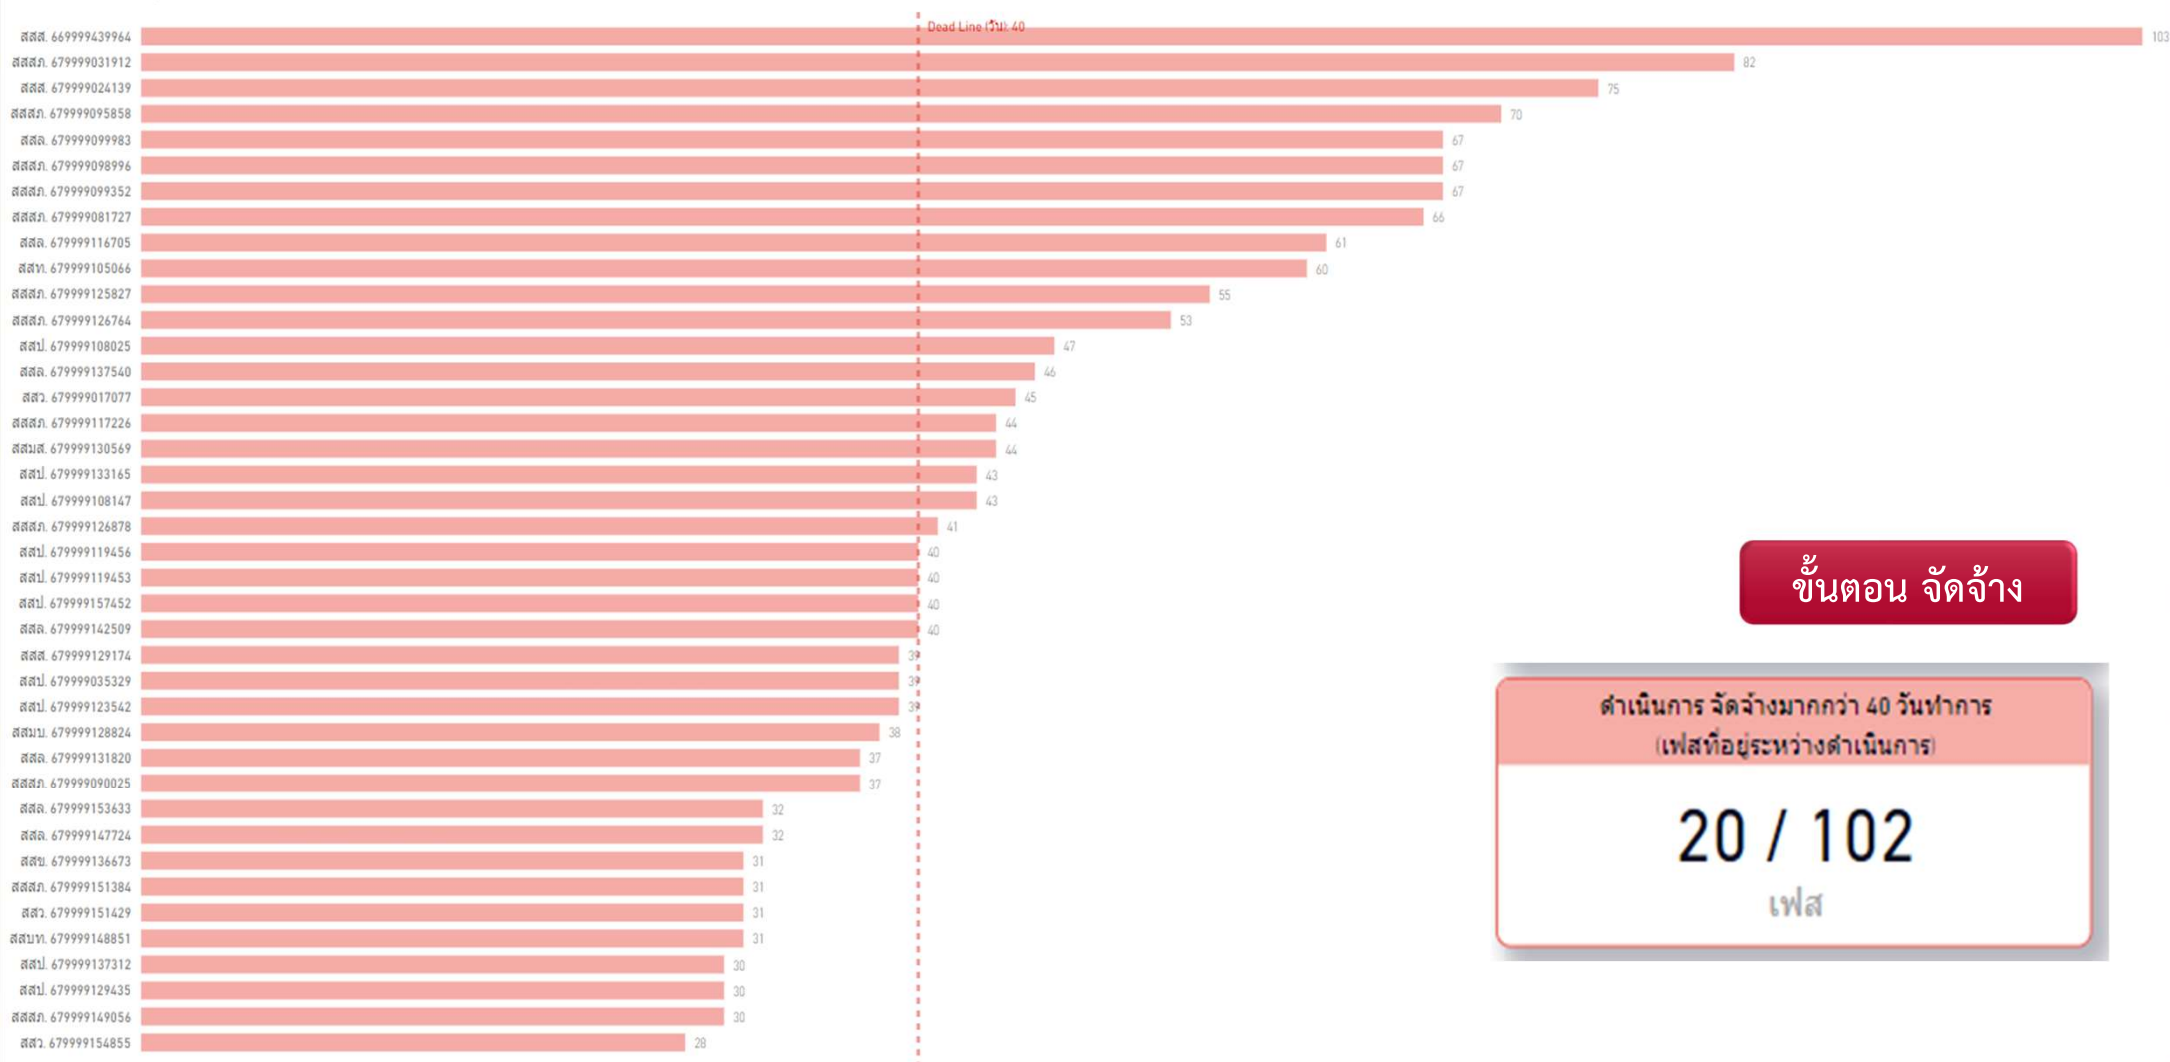

ขั้นตอน จัดจ้าง


ดำเนินการ จัดจ้างมากกว่า 40 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

20 / 102

เฟส

< Back to report

ระยะเวลาของขั้นตอนก่อสร้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

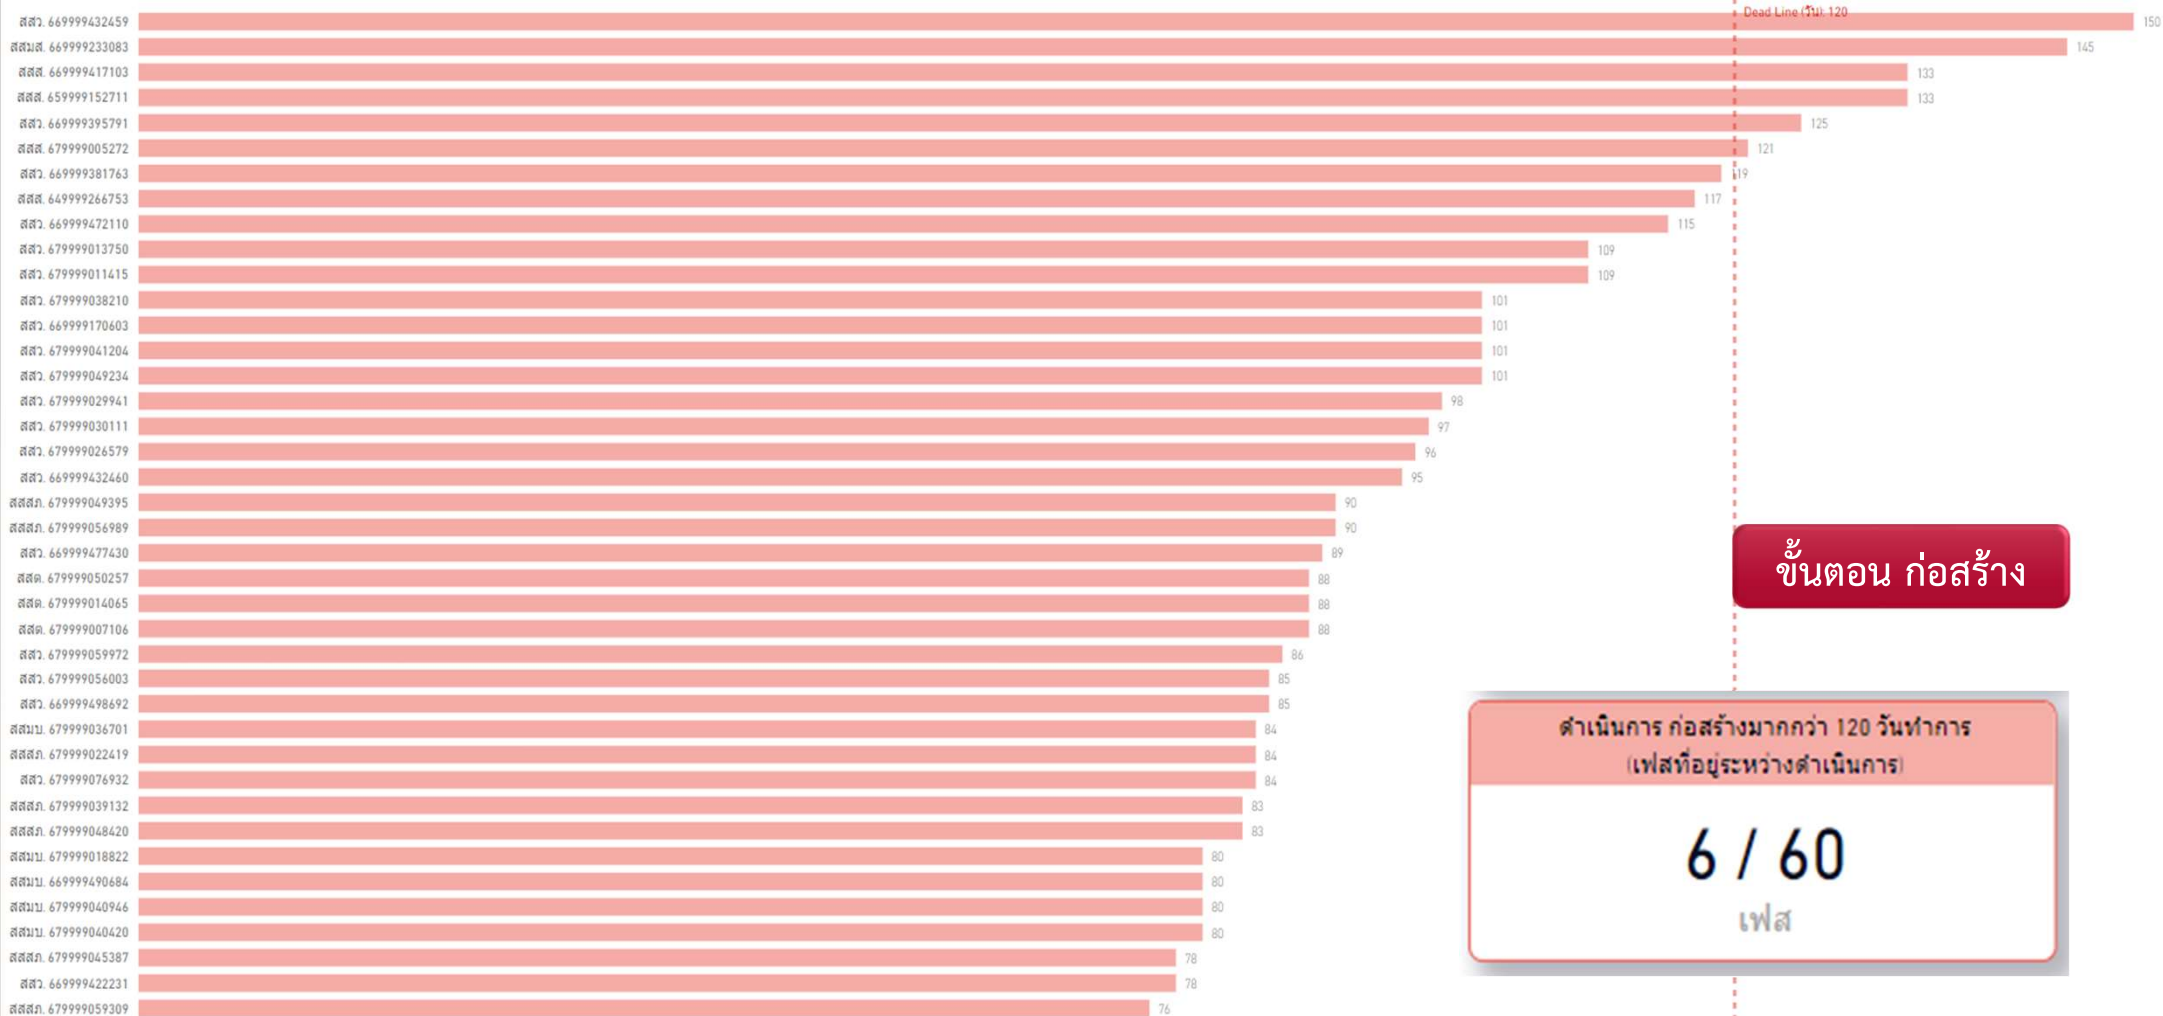

ขั้นตอน ก่อสร้าง

ดำเนินการ ก่อสร้างมากกว่า 120 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

6 / 60
เฟส

สาขา

All

ปี

2567

ระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอน

ข้อมูล ณ วันที่

9/12/2024

1 ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง

(1) ภายใน 1 วันทำการ

808

(2) มากกว่า 1 วันทำ...

55

รวม (เฟส)

863

2 สำรวจ ออกแบบ ประเมินการ

(2) มากกว่า 10 วันทำ...

392

(1) ภายใน 10 วันทำ...

417

รวม (เฟส)

809

3 ขั้นตอน ข้าราชการ

(1) ภายใน 20 วันทำ...

557

(2) มากกว่า 20 วันทำ...

160

รวม (เฟส)

717

4 จัดจ้าง

(1) ภายใน 5 วันทำ...

148

(2) 6 - 20 วันทำการ

167

(3) 21 - 40 วันทำการ

157

(4) มากกว่า 40 วันทำ...

59

รวม (เฟส)

531

5 ขั้นตอน ก่อสร้างวางท่อ

(1) ภายใน 1 วันทำการ

19

(2) 2 - 20 วันทำการ

46

(3) 21 - 120 วันทำการ

115

(4) มากกว่า 120 วันทำ...

7

รวม (เฟส)

187

สาขา	ID_Phase	ชื่อเฟส	ขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	วันเริ่มขั้นตอน	วันสิ้นสุดขั้นตอน	% ความก้าวหน้าเฟส
สสท	669999501489	Veritz Sathupradit 34 - เฟส 2.0 ติดต่อกับคุณวรรณพร ตรงครารวี 099-451-2646, 02-212-6001, kungbangmod28@gmail.com	ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง	0	25/12/2566	25/12/2566	10
สสท	669999501489	Veritz Sathupradit 34 - เฟส 2.0 ติดต่อกับคุณวรรณพร ตรงครารวี 099-451-2646, 02-212-6001, kungbangmod28@gmail.com	ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประเมินการ	21	25/12/2566	25/01/2567	10
สสท	669999501489	Veritz Sathupradit 34 - เฟส 2.0 ติดต่อกับคุณวรรณพร ตรงครารวี 099-451-2646, 02-212-6001, kungbangmod28@gmail.com	ข้าราชการค่าวางท่อ	9	25/01/2567	07/02/2567	10
สสท	669999484126	เบลวิเดียร์-โครงการเบลวิเดียร์ เฟส 1.1 ติดต่อกับคุณภัทริญามาต สหไพบุญยกิจ 061-416-7444 E-mail : orawan@uppa.co.th	ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง	4	03/12/2566	12/12/2566	100
สสท	669999484126	เบลวิเดียร์-โครงการเบลวิเดียร์ เฟส 1.1 ติดต่อกับคุณภัทริญามาต สหไพบุญยกิจ 061-416-7444 E-mail : orawan@uppa.co.th	ข้าราชการค่าวางท่อ	0	15/01/2567	15/01/2567	100
สสท	669999484126	เบลวิเดียร์-โครงการเบลวิเดียร์ เฟส 1.1 ติดต่อกับคุณภัทริญามาต สหไพบุญยกิจ 061-416-7444 E-mail : orawan@uppa.co.th	ดำเนินการจัดจ้าง	35	15/01/2567	05/03/2567	100

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา <https://davis.mwa.co.th>



การผลิตและสูบน้ำ

วิศวกรรม

การบริการ


ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

การเงิน

บุคลากร

แผนและพัฒนา

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา



อุณหภูมิ
35 °C



ปริมาณน้ำฝน
30 มม.



ความชื้น
60 %



ลม
5 กม./ชม.

ไทม์ไลน์ :

การผลิตและสูบน้ำ

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

รายการที่ชื่นชอบ

ชื่อ

แอดมิน

ไฟล์

แอดมินที่ออกมาใหม่





- การผลิตและสูบน้ำ
- วิศวกรรม
- การบริการ
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
- การเงิน
- บุคลากร
- แผนและพัฒนา

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา

00083364
User

แดชบอร์ดสำหรับการบริการ



★	ชื่อแดชบอร์ด	แดชบอร์ด	สารบัญข้อมูล	ดาวน์โหลด
★	รายงานติดตามงานติดตั้งประปาโครงการหมู่บ้านจัดสรร			
★	รายงาน VOC สอบถาม แจ้งเหตุ ร้องเรียน เสนอแนะ			
★	รายงานพยากรณ์ปริมาณน้ำ (Sell unit)			
★	รายงานติดตามบริหารจัดการข้อร้องเรียน			
★	รายงานสรุปการใช้งานกล้อง CIA			
★	รายงาน Service Level Agreement : SLA มาตรฐานการให้บริการ			
★	รายงานแรงดันน้ำ			
★	รายงานซ่อมท่อแตก ท่อรั่ว			
★	รายงานน้ำขายขายขอบ			
★	รายงานภาพรวมความพึงพอใจ			

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา <https://davis.mwa.co.th>



คำสั่งการประปานครหลวง

ที่ ๑๗๓๒/ ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำประปาสำหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรร

เพื่อให้การบริหารจัดการวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำสำหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรรของสายงานบริการด้านตะวันออก และสายงานบริการด้านตะวันตก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประปานครหลวง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ผู้ว่าการการประปานครหลวงจึงให้ยกเลิกคำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๗๗/๒๕๖๔ ลง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำประปาสำหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรรประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------|
| ๑. รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นายกิตติพัฒน์ อุตติสัมพันธ์ | คณะทำงาน |
| ๓. ประธานคณะทำงานผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาและเทียบเท่า | คณะทำงาน |
| ในสังกัดสายงานบริการด้านตะวันออกและสายงานบริการด้านตะวันตก | |
| ๔. ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาตากสิน | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ | คณะทำงาน |
| ๗. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย | คณะทำงาน |
| ๘. ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล | คณะทำงาน |
| ๙. ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูปร่าง | คณะทำงาน |
| ๑๐. ประธานคณะทำงานด้านบริการและด้านการตลาด | คณะทำงาน |
| ของสำนักงานประปาสาขา | |
| ๑๑. ประธานคณะทำงานด้านธุรกิจบริการของสำนักงานประปาสาขา | คณะทำงาน |
| ๑๒. ประธานคณะทำงานด้านบำรุงรักษาของสำนักงานประปาสาขา | คณะทำงานและ |
| | เลขานุการ |
| ๑๓. ประธานคณะทำงานย่อยด้านสำรวจและออกแบบ | คณะทำงานและ |
| ของสำนักงานประปาสาขา | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. ประธานคณะทำงานย่อยด้านก่อสร้าง | คณะทำงานและ |
| ของสำนักงานประปาสาขา | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะ...

-๒-

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. ปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง และทบทวนคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำสำหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรร
 ๒. จัดทำแบบสัญญา งานวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำสำหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรร ที่ลงนามร่วมระหว่างโครงการประปานครหลวง กับเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรร
 ๓. พัฒนาระบบงานในการขอใช้น้ำ การติดตามสถานะการขอใช้น้ำ วิธีการชำระเงิน และกระบวนการงานอื่นในระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำ (CIS) ผ่านช่องทางออนไลน์ ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร
 ๔. แต่งตั้งคณะทำงานย่อย ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเชิญบุคคลหรือหน่วยงานมาให้ข้อมูล หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ
 ๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้ว่าการทุก ๖ เดือน
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมานิต ปานเอม)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

รายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำประปาสำหรับโครงการจัดสร
ณ ห้องประชุม 613 ชั้น 6 อาคารสุทธิตาราก
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.

ผู้มาประชุม

1. นายสุเทพ เอื้อปกรณ์	รวก.(กอ)	ประธานคณะทำงาน
2. นายชัยพร รัตนธำรงพงศ์	ผอ.สสญ.	คณะทำงาน
3. นายเจตณรงค์ ยิ้มประดิษฐ์	หน.สอ.บ.กรร.สสส.	แทน ผอ.สสส.
4. นายวิมาน มาตจรัญ	ผอ.สส.	คณะทำงาน
5. นายสุรศักดิ์ ประเสริฐจัน	นักคอมพิวเตอร์ 7 ผดส.	แทน ผอ.สส.
6. น.ส.กมลสิริ เบญจมาศ	ผอ.กนก.ผกม.	แทน ผอ.ผกม.
7. น.ส.นิธิตี ภูมิวิชัย	ผอ.กช.ผพ.	แทน ผอ.ผพ.
8. นางเบญจวรรณ คำพลอย	ผอ.กรร.สส.	คณะทำงาน
9. นางศิริพร ไชยชนะ	ผอ.กช.สส.	คณะทำงาน
10. นายอรรถบูรณ์ เบญจบันลือกุล	ผอ.กรร.สส.	คณะทำงานและเลขานุการ
11. นายสันติ ภิรมย์เยี่ยม	หน.สอ.บ.กรร.สส.	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นายเกรียงศักดิ์ มานะจิตต์	หน.สส.กรร.สส.	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายกิตติพัฒน์ อุทัยพร	ผช.กปน.ระดับ 9 รวก.(กอ)	ติดภารกิจ
2. นายสุริยันต์ วงศ์เมืองแก่น	ผอ.กช.ผพ. รน.ผอ.ผพ.	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวขวัญ เขาวนกิจ	ผอ.ผง.
2. นางกรรณกาญจน์ แสงศรี	ผอ.กช.ผพ.
3. นายเสกสรรค์ ไปวันเสาร์	ผอ.กช.ผกม.
4. นายสรภพ กันบัวแก้ว	วิศวกร 7 ขว.(ก4)
5. นายจุจ ว่องพาณิชย์	หน.สอ.บ.กรร.สส.
6. นายปิยะศักดิ์ ศรีเรืองทอง	หน.สจ.กช.ผพ.
7. นางสาวนันทา เพชรดี	หน.สค.กช.ผง.
8. นางสาวอนิชา เกตุนาถ	พนักงานพัสดุ 3 สวส.

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำประปาสำหรับโครงการจัดสร
ครั้งที่ 2/2567

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 แนวทางการขับเคลื่อนให้ได้ตามเป้าหมายเงินรับธุรกิจบริการน้ำประปา งบประมาณ 2567

รวก.(กอ) แจ้งว่าจากการประชุมครั้งที่แล้ว มีการนำเสนอเรื่องการนำท่อ MT-PVC มาใช้งาน
ทดแทนท่อ PVC Class 8.5 และ Class 13.5 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย, การบริหาร
จัดการการใช้ท่อ รวมถึงรายได้จากธุรกิจบริการน้ำประปา งบประมาณ 2567 จึงได้ขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย
ผอ.กช.ผพ. แจ้งว่าการจัดเตรียมท่อได้ประสานงานกับ ปช.กลุ่ม สอ.บ. ไว้โดยจะทำการเบิกซื้อ
ท่อ PVC ไว้จนถึงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2568 ดังนั้นหากจะมีการนำท่อ MT-PVC ที่เตรียมไว้สำหรับงานลด
น้ำสูญเสียมาใช้กับงานรับจ้างงานโครงการหมู่บ้านจัดสรรก่อนได้ แต่จะเกิดปัญหา ท่อ PVC Class 8.5 ที่ได้เตรียมเบิก
ซื้อไว้แล้วในสัญญาที่ยังคงเหลืออยู่จะมีแนวทางในการนำมาใช้งานอย่างไร

ผอ.สสญ. ชี้แจงว่า สาขาคณะกรรมาธิการช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านท่อ PVC Class 8.5 ที่
ผพ. ได้สั่งซื้อไว้แล้ว คาดการณ์ว่าจะสามารถเบิกใช้ได้ถึงเมื่อใด เพื่อจะได้กำหนดกรอบเวลาของการเปลี่ยนผ่านได้
ชัดเจน

ผอ.กช.ผพ. แจ้งว่า ผพ.ได้มีการจัดเตรียมท่อ PVC Class 8.5 สำหรับให้สาขาเบิกใช้งานได้ถึง
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2568 และขอให้สาขาขึ้นชั้นความต้องการเบิกใช้งานท่อ PVC Class 8.5 ต่ออีก
หรือไม่

รวก.(กอ) แจ้งว่า แนวทางดำเนินการต่อไปจะเบิกใช้ท่อ MT- PVC ในงานวางท่อทุกประเภท
ผอ.กช.ผพ. แจ้งว่า ถ้าสายงานบริการอื่นยืนยันว่าจะไม่มีการเบิกใช้ท่อ PVC Class 8.5 แล้ว
ทาง ผพ. ก็จะไม่มีสิ่งซื้ออีกต่อไป และขอให้พิจารณาเรื่องงบประมาณที่เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากราคาค่าท่อ PVC
Class 8.5 หากเปลี่ยนเป็นท่อ MT-PVC ราคาปรับขึ้นประมาณ 40 % สำหรับท่อขนาด 100-150 มม. และปรับขึ้น
50-60 % สำหรับท่อขนาด 200-300 มม.

รวก.(กอ) คิดว่า กปน. ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดทุกงาน หากต้องใช้งบประมาณเพิ่ม
อาจจะเริ่มในปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 2 หรือไม่อย่างไร

ผอ.ผง. ขอเรียนว่า ด้วยการจัดทำงบประมาณประจำปี 2568 ได้ผ่านขั้นตอนการดำเนินงานไป
แล้วทั้งงบทำการและงบลงทุน ซึ่งในการพิจารณานั้นไม่ได้มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมาใช้ท่อ MT-PVC หากมีความ
จำเป็นต้องขอปรับงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 40 - 50 ต้องดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้งบลงทุนโดย
ระบุเหตุผลด้วย เนื่องจาก ผง. จะต้องดำเนินการขอปรับกรอบวงเงินงบประมาณเพิ่มจาก สคช. เพราะวงเงิน



คำสั่งการประปานครหลวง

ที่ ๑๔๙๗ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแก่โครงการหมู่บ้านจัดสรรใหม่

เพื่อให้การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแก่โครงการหมู่บ้านจัดสรรใหม่ในพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวง ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เทียบเคียงแนวทางในการให้บริการประปาแก่ลูกค้าอาคารชุดในมิติการบริหารจัดการมาตรฐานลูกค้า การจัดการแรงดันน้ำให้เพียงพอคุณภาพน้ำประปา และความปลอดภัยในการใช้น้ำประปา รวมถึงระบบสำรองน้ำและถังกักน้ำให้มีความเหมาะสม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ผู้ว่าการการประปานครหลวง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแก่โครงการหมู่บ้านจัดสรรใหม่ ดังนี้

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

๑. รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)
๒. รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
๓. รองผู้ว่าการ (การเงิน)
๔. รองผู้ว่าการ (บริหาร)

คณะทำงาน ประกอบด้วย

- | | |
|---|-----------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ) | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) | คณะทำงาน |
| ๓. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ธุรกิจ) | คณะทำงาน |
| ๔. ประธานคณะทำงานผู้จัดการสำนักงานประชาสัมพันธ์และเทียบเท่า | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย | คณะทำงาน |
| ๗. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย | คณะทำงาน |
| ๘. นายอรรถบูรณ์ เบญจบันลือกุล | คณะทำงาน |
| ๙. ประธานคณะทำงานด้านบำรุงรักษาของสำนักงานประชาสัมพันธ์ | คณะทำงาน |
| ๑๐. ประธานคณะทำงานด้านบริการของสำนักงานประชาสัมพันธ์ | คณะทำงาน |
| ๑๑. นายสรภพ ก้านบัวแก้ว | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๑๒. หัวหน้าส่วนวิเคราะห์ข้อมูล | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| กองวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีน้ำสูญเสีย | |
| ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย | |
| ๑๓. นางสาวลภาวี ดิวนันทน์ วิศวกร ๕ ส่วนวิเคราะห์ข้อมูล | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| กองวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีน้ำสูญเสีย | |
| ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย | |

๒. โดยให้คณะ...

- ๒ -

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้น้ำประปาโครงการหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุดของการประปานครหลวงในปัจจุบัน
 ๒. พิจารณาจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแก่โครงการหมู่บ้านจัดสรรใหม่ในลักษณะเดียวกับการให้บริการประปาแก่ลูกค้าอาคารชุด
 ๓. ประสานงาน และเชิญบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในการประปานครหลวง เพื่อให้ข้อมูล คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงาน
 ๔. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้ว่าทราบ ทุก ๓ เดือน
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลง ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายรัชศักดิ์ สุริยหาร)

รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

จบการนำเสนอ

