

ระบบติดตามความก้าวหน้างานโครงการหมู่บ้านจัดสรร

การประชุมสายงานบริการด้านตะวันตกและบริการด้านตะวันออก
ครั้งที่ 10/2567

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.



ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา

<https://davis.mwa.co.th>

- โดย คณะทำงานด้านบำรุงรักษาของสำนักงานประปาสาขา



รายงานติดตามงานติดตั้งระบบโครงการหมู่บ้านจัดสรร

ข้อมูล ณ วันที่

10/16/2024

โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

เฟสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

ปี

All

สายงาน

All

ภาค

All

สาขา

All

สะสมถึงเดือนนี้

0.11%

สะสมถึงเดือนก่อน

0.00%

สะสมถึงเดือนก่อน

0.00%

สะสมถึงเดือนนี้

3.04%

0	สสพ.
0	สสพ.
0	สสช.
0	สสพ.
0	สสพ.
0	สสญ.
0	สสม.
0	สสค.
0	สสช.
0	สสช.
0	สสช.
0	สสมบ.
0	สสสภ.
0	สสค.
0	สสภ.
0	สสว.
0	สสน.
0	สสบท.
0	สสมส.

สสพ.	3
สสพ.	2
สสช.	2
สสมบ.	2
สสบท.	2
สสมส.	2
สสภ.	1
สสพ.	0
สสช.	0
สสญ.	0
สสม.	0
สสค.	0
สสช.	0
สสภ.	0
สสพ.	0
สสค.	0
สสว.	0
สสน.	0

โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

หมายถึง

1 โครงการที่ **ไม่ UPLOAD**
MASTER PLAN FILE

ในระบบ CIS

2 โครงการที่ **ไม่ UPLOAD**
PROGRESS FILE

ในระบบ CIS

ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ

เฟสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หมายถึง

1 เฟสที่ **ไม่ UPLOAD** แบบแปลนงาน
วางท่อรายเฟส

ในระบบ CIS

2 เฟสที่ **ไม่ป้อนแผนงาน**

ในระบบ CIS

ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ

DateTH

10/1/2559

3/31/2567

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประจำ <https://davis.mwa.co.th>

รายเฟส

เจ้าของโครงการ (ราย)

683

จำนวนเฟสทั้งสิ้น

6,344

ระหว่างดำเนินการ

757

ข้อมูลไม่ครบ

23

ไม่ครบถ้วน (%)

3.04%

ปี

All

สาขางาน

All

ภาค

All

สาขา

All

จำนวนเฟสแยกสาขางาน

รวม(กอ)

3,657


รวม(กค)

2,687


ชื่อเฟส

เลขที่คำร้อง	เฟส	แผนงาน	แบบวางท่อ
679999236422	Pleno Town ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ-เฟส 6.0	✗	✗
679999233454	พริเมียมเพลส ทพลโยธิน-เทพารักษ์-เฟส 1.0	✓	✗
679999233230	ไทมมอนด์ เทเลส (ประชาสำราญ)-เฟส 3.0	✗	✗
679999232960	บ้านกลางเมืองรามคำแหง 174 สเตชั่น-เฟส 3.0	✗	✗
679999230838	นิรันดร์ วิลล์ เทพารักษ์-เฟส 2.0	✗	✓
679999230835	นาราโฮม บางบัวทอง-เฟส 5.0	✗	✗
679999230090	เอนอริน ทพลโยธิน-รัชพล-เฟส 3.0	✗	✗
679999229837	โครงการอนันยา-เฟส 1.0	✗	✗
679999229431	พนาดี พระราม5 เวสต์โคด-เฟส 4.0	✗	✗

จำนวนเฟสที่ข้อมูลไม่ครบ

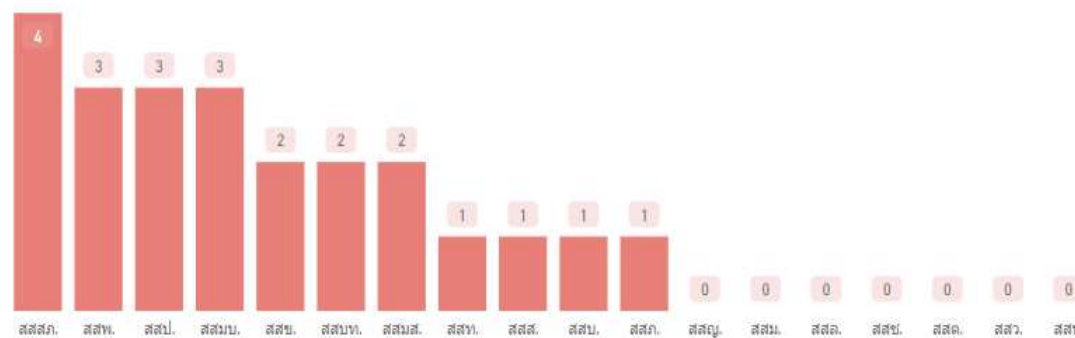

ไม่ป้อนแผนงาน (รายเฟส)



ไม่มีไฟล์แบบวางท่อในระบบ CIS (รายเฟส)



ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา <https://davis.mwa.co.th>

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประจำ

แดชบอร์ด : รายงานติดตามงานติดตั้งประจำโครงการหมู่บ้านจัดสรร

ข้อมูล ณ วันที่

10/16/2024

สาขา

All


ปี

All

เลือก ปี-เดือน

All

จำนวนเฟสแยกบิงประมาณ



จำนวนเฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการ แยกตามขั้นตอน

ดำเนินการ ยื่นเรื่องวางท่อมากกว่า 1 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

0 / 0

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนยื่นเรื่องวางท่อ (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead line (วัน): 1

ระยะเวลา ยื่นเรื่องวางท่อ มากที่สุด
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

0


วันทำการ

ดำเนินการ สำรอง ออกแบบ แจ้งราคามากกว่า 10 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

4 / 16

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอน สำรอง ออกแบบ แจ้งราคา (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)



ระยะเวลา สำรอง ออกแบบ แจ้งราคา มากที่สุด
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

18


วันทำการ

ดำเนินการ ชำระเงินมากกว่า 20 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

79 / 103

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนชำระเงิน (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)



ระยะเวลา ชำระเงิน มากที่สุด
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

820


วัน

ดำเนินการ จัดจ้างมากกว่า 40 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

36 / 98

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนจัดจ้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)



ระยะเวลา จัดจ้าง มากที่สุด
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

126

วันทำการ

ดำเนินการ ก่อสร้างมากกว่า 120 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

8 / 43

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนก่อสร้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)



ระยะเวลา ก่อสร้าง มากที่สุด
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)


168

วัน

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประจำ <https://davis.mwa.co.th>

[Back to report](#)

ระยะเวลาของขั้นตอน สํารวจ ออกแบบ แจ้จราคา (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

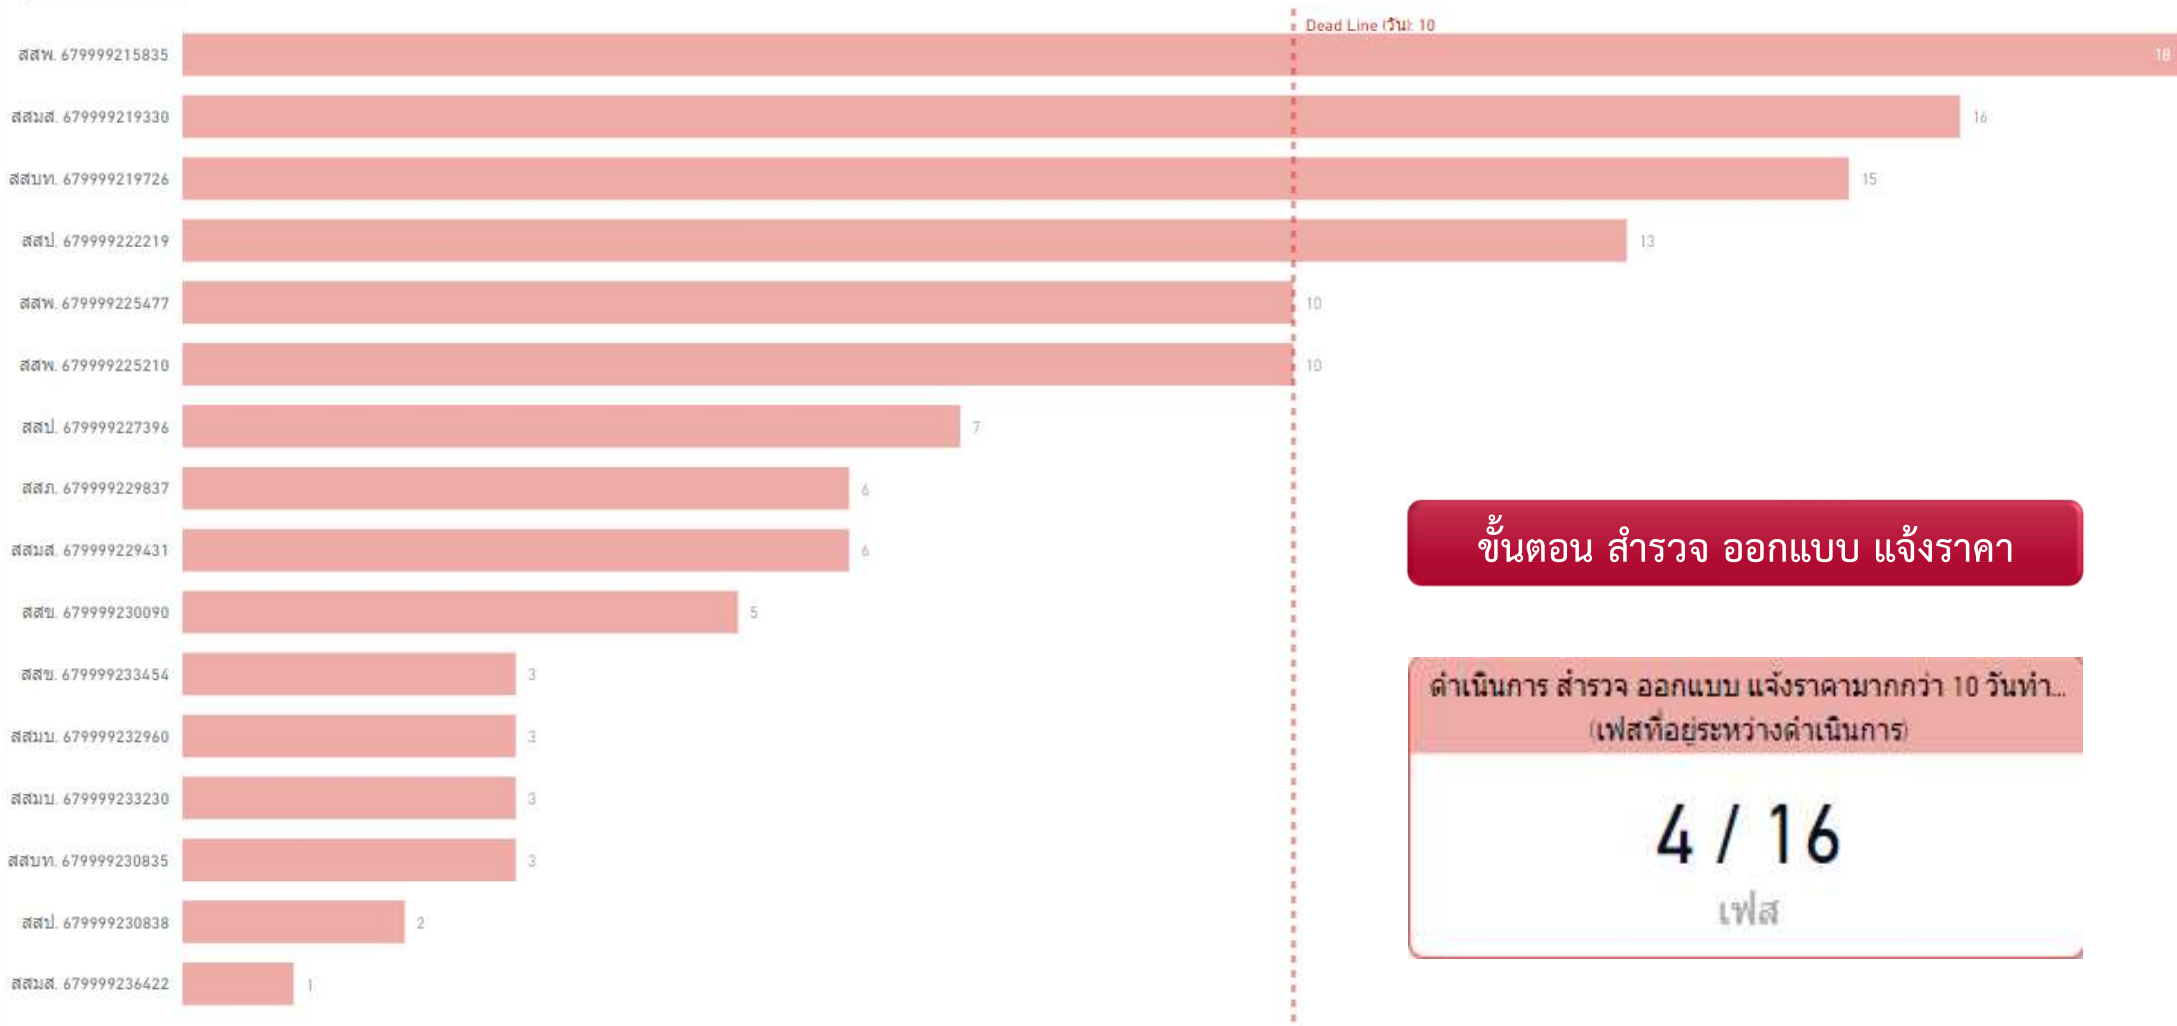


ขั้นตอน สํารวจ ออกแบบ แจ้จราคา

ดำเนินการ สํารวจ ออกแบบ แจ้จราคามากกว่า 10 วันทำ...
 (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

4 / 16
 เฟส

< Back to report

ระยะเวลาของขั้นตอนจัดจ้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

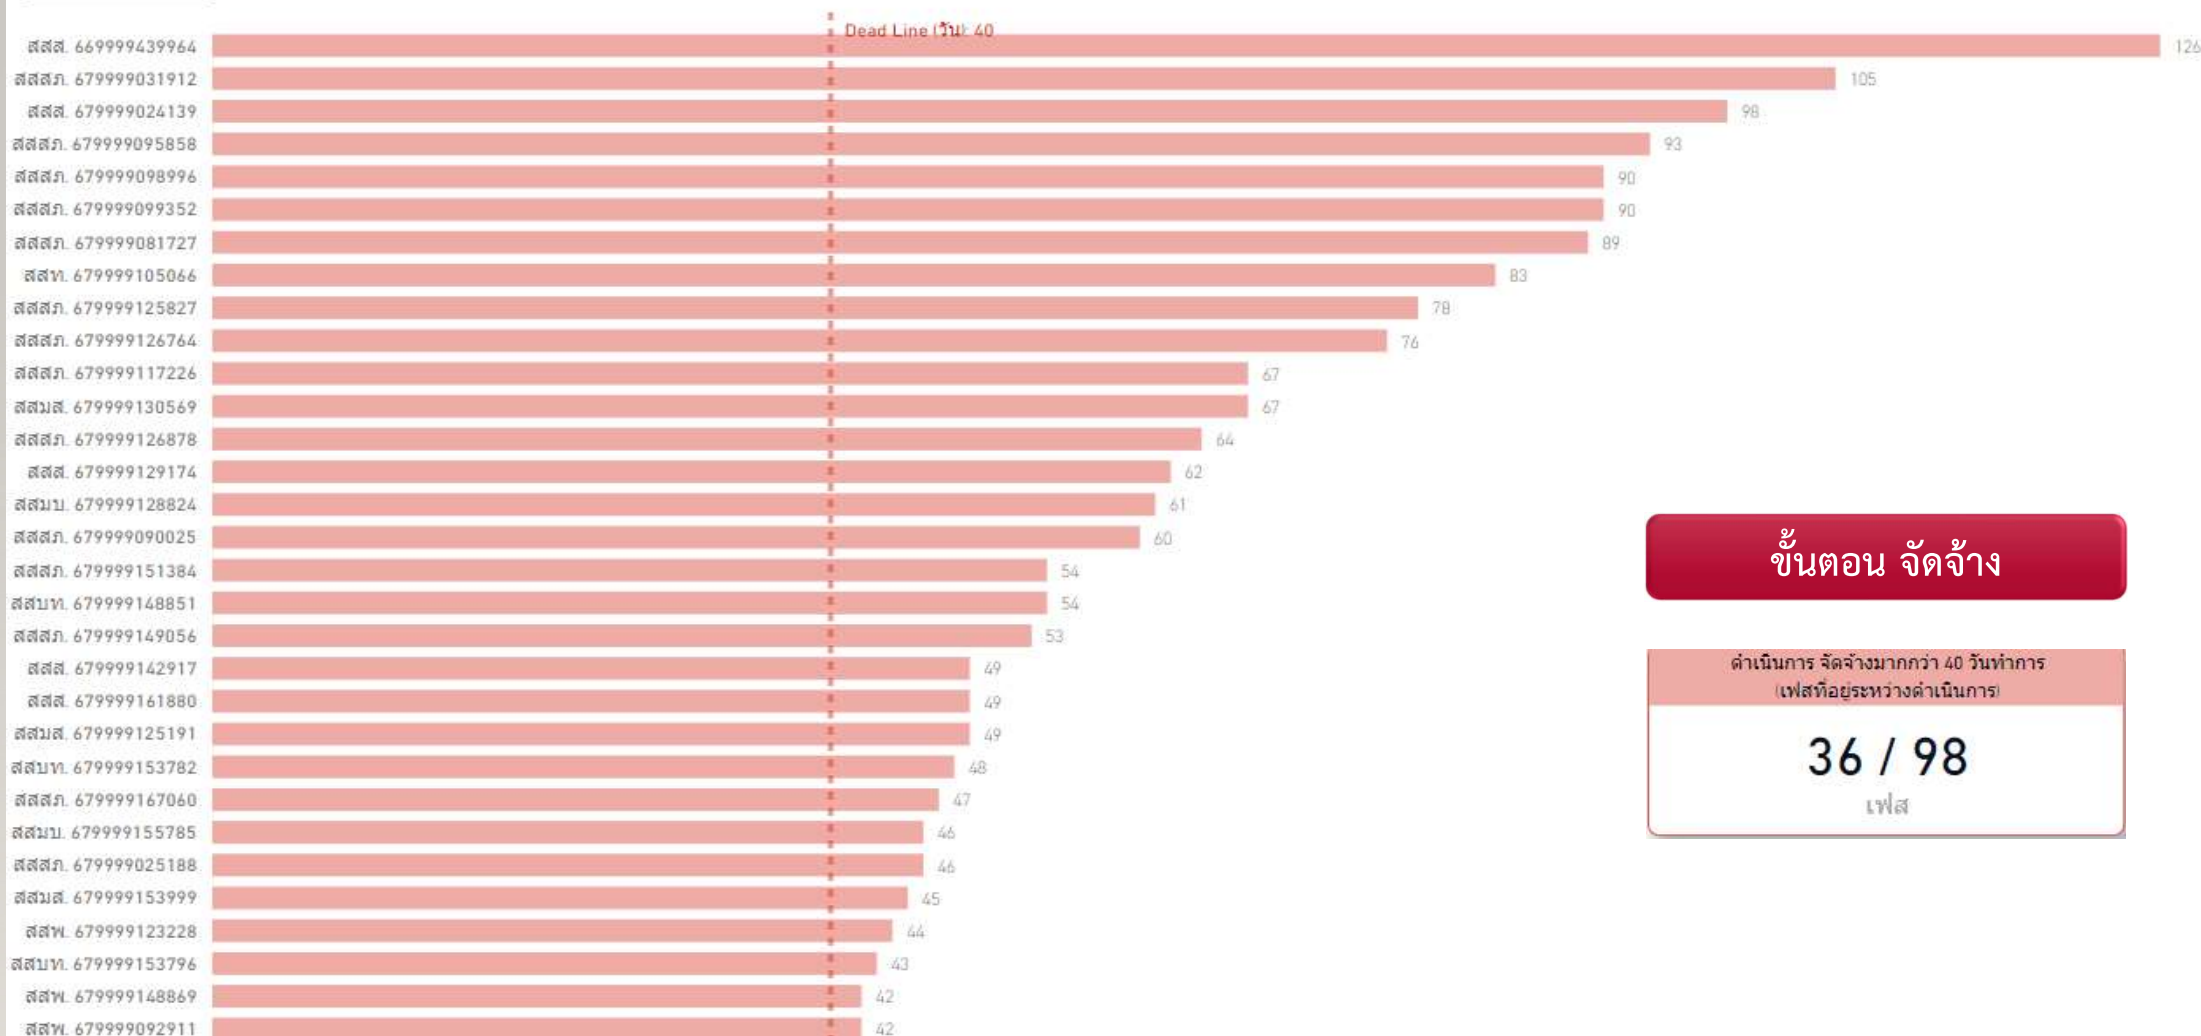

ขั้นตอน จัดจ้าง


ดำเนินการ จัดจ้างมากกว่า 40 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

36 / 98
เฟส

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประจำ <https://davis.mwa.co.th>

< Back to report

ระยะเวลาของขั้นตอนก่อสร้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

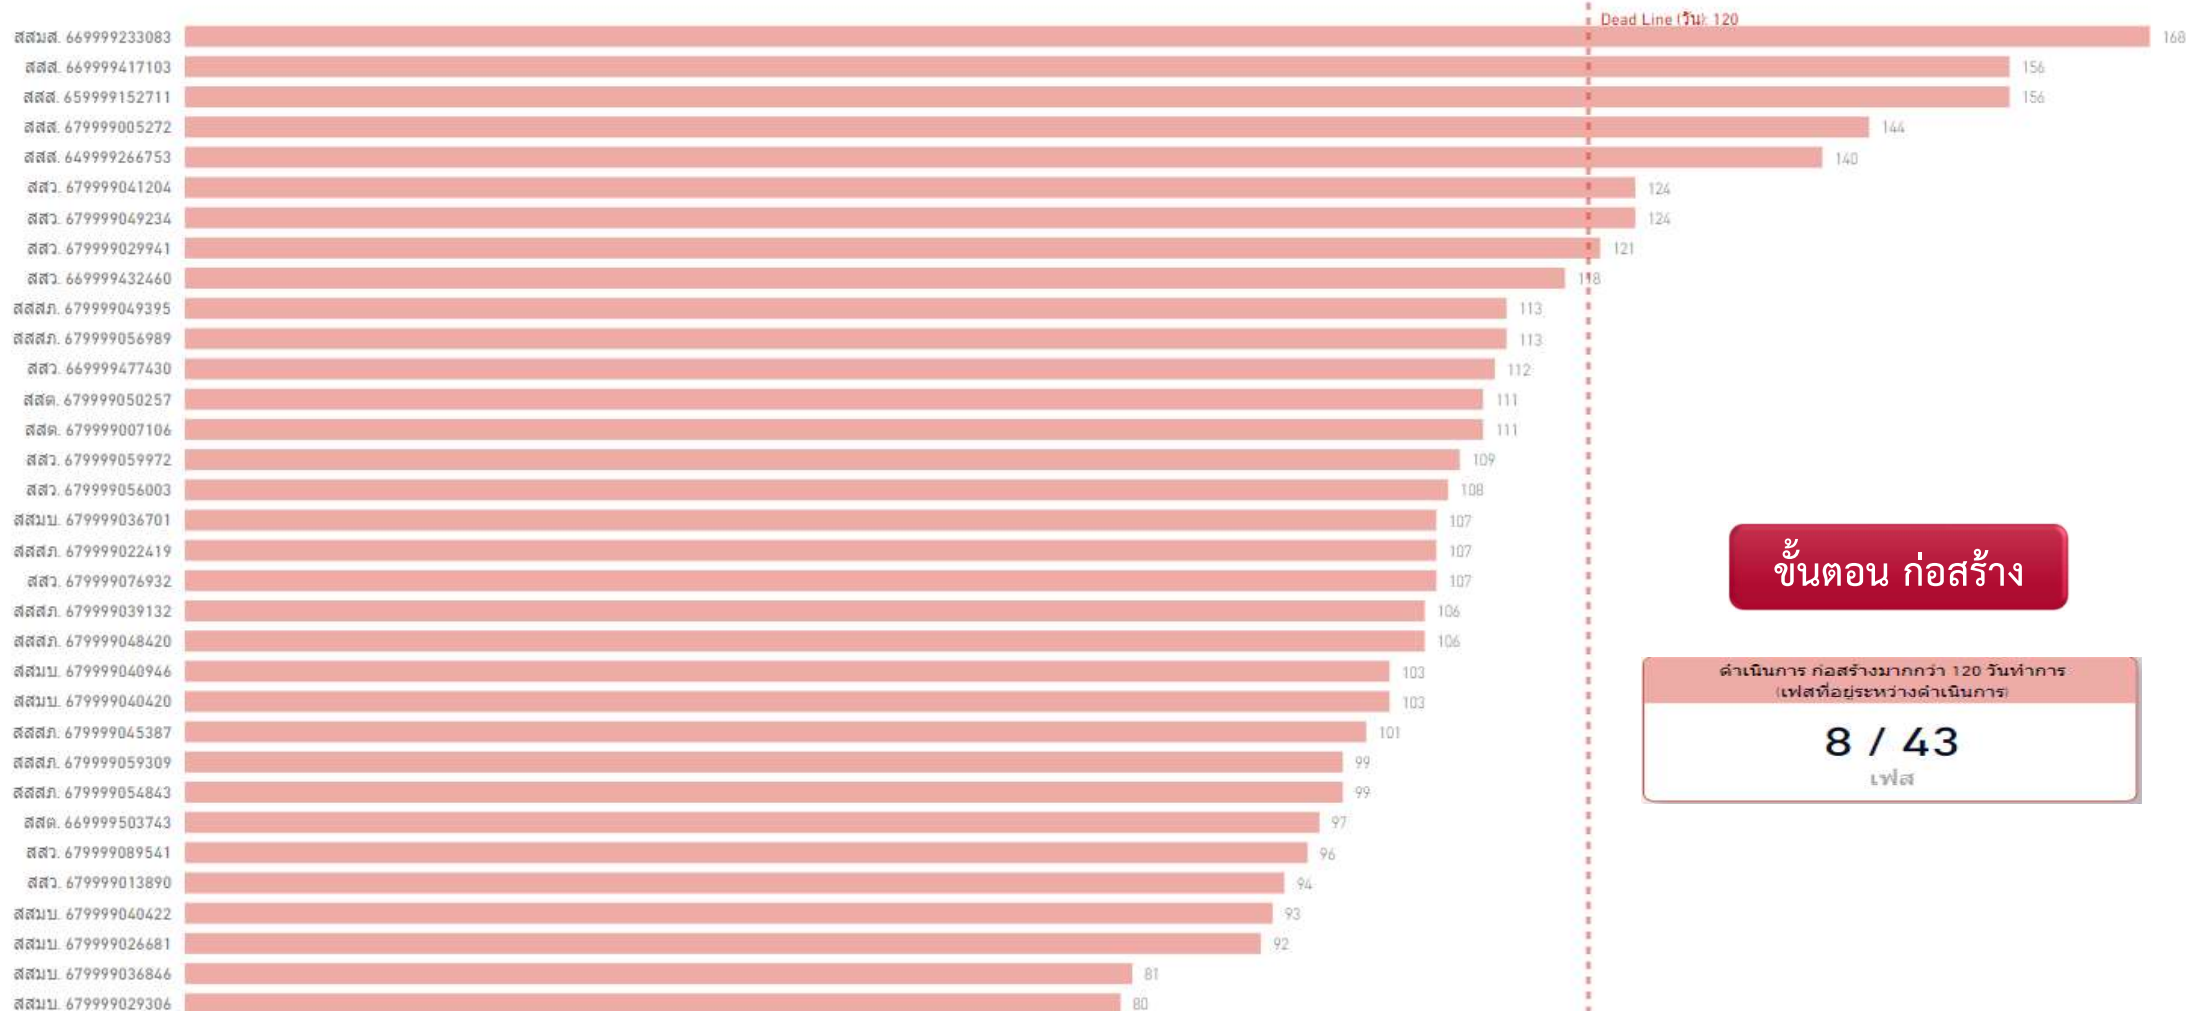

ขั้นตอน ก่อสร้าง

ดำเนินการ ก่อสร้างมากกว่า 120 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

8 / 43

เฟส

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประจำปี <https://davis.mwa.co.th>





การผลิตและสูบน้ำ

วิศวกรรม

การบริการ


ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

การเงิน

บุคลากร

แผนและพัฒนา

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา



อุณหภูมิ
35 °C



ปริมาณน้ำฝน
30 มม.



ความชื้น
60 %



ลม
5 กม./ชม.

ไทม์ไลน์ :

การผลิตและสูบน้ำ

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

รายการที่ชื่นชอบ

ชื่อ

แอดมิน

ไฟล์

แอดมินที่ออกมาใหม่





- การผลิตและสูบน้ำ
- วิศวกรรม
- การบริการ
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
- การเงิน
- บุคลากร
- แผนและพัฒนา

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา

00083364 User

แดชบอร์ดสำหรับการบริการ



★ ชื่อแดชบอร์ด	แดชบอร์ด	สารบัญข้อมูล	ดาวน์โหลด
★ รายงานติดตามงานติดตั้งประปาโครงการหมู่บ้านจัดสรร			
★ รายงาน VOC สอบถาม แจ้งเหตุ ร้องเรียน เสนอแนะ			
★ รายงานพยากรณ์ปริมาณน้ำ (Sell unit)			
★ รายงานติดตามบริหารจัดการข้อร้องเรียน			
★ รายงานสรุปการใช้งานกล้อง CIA			
★ รายงาน Service Level Agreement : SLA มาตรฐานการให้บริการ			
★ รายงานแรงดันน้ำ			
★ รายงานซ่อมท่อแตก ท่อรั่ว			
★ รายงานน้ำขายขายขอบ			
★ รายงานภาพรวมความพึงพอใจ			



คำสั่งการประปานครหลวง

ที่ ๑๗๓๒/ ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำประปาสำหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรร

เพื่อให้การบริหารจัดการวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำสำหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรรของสายงานบริการด้านตะวันออก และสายงานบริการด้านตะวันตก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประปานครหลวง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ผู้ว่าการการประปานครหลวงจึงให้ยกเลิกคำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๗๖/๒๕๖๔ ลง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำประปาสำหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรรประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------------------|
| ๑. รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นายกิตติพัฒน์ อุตติสัมพันธ์ | คณะทำงาน |
| ๓. ประธานคณะทำงานผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาและเทียบเท่า
ในสังกัดสายงานบริการด้านตะวันออกและสายงานบริการด้านตะวันตก | คณะทำงาน |
| ๔. ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาตากสิน | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ | คณะทำงาน |
| ๗. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย | คณะทำงาน |
| ๘. ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล | คณะทำงาน |
| ๙. ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูปร่าง | คณะทำงาน |
| ๑๐. ประธานคณะทำงานด้านบริการและด้านการตลาด
ของสำนักงานประปาสาขา | คณะทำงาน |
| ๑๑. ประธานคณะทำงานด้านธุรกิจบริการของสำนักงานประปาสาขา | คณะทำงาน |
| ๑๒. ประธานคณะทำงานด้านบำรุงรักษาของสำนักงานประปาสาขา | คณะทำงานและ
เลขานุการ |
| ๑๓. ประธานคณะทำงานย่อยด้านสำรวจและออกแบบ
ของสำนักงานประปาสาขา | คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. ประธานคณะทำงานย่อยด้านก่อสร้าง
ของสำนักงานประปาสาขา | คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะ...

-๒-

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. ปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง และทบทวนคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำสำหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรร
 ๒. จัดทำแบบสัญญา งานวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำสำหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ลงนามร่วมระหว่างโครงการประปานครหลวง กับเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรร
 ๓. พัฒนาระบบงานในการขอใช้น้ำ การติดตามสถานะการขอใช้น้ำ วิธีการชำระเงิน และกระบวนการงานอื่นในระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำ (CIS) ผ่านช่องทางออนไลน์ ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร
 ๔. แต่งตั้งคณะทำงานย่อย ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเชิญบุคคลหรือหน่วยงานมาให้ข้อมูล หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ
 ๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้ว่าการทุก ๖ เดือน
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมานิต ปานเอม)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

รายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำประปาสำหรับโครงการจัดสร
ณ ห้องประชุม 613 ชั้น 6 อาคารสุทธิตาราก
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.

ผู้มาประชุม

1. นายสุเทพ เอื้อปกรณ์	รวก.(กอ)	ประธานคณะทำงาน
2. นายชัยพร รัตนธำรงพงศ์	ผอ.สสญ.	คณะทำงาน
3. นายเจตณรงค์ ยิ้มประดิษฐ์	หน.สอ.บ.กรร.สสส.	แทน ผอ.สสส.
4. นายวิมาน มาตจรัญ	ผอ.สสส.	คณะทำงาน
5. นายสุรศักดิ์ ประเสริฐจัน	นักคอมพิวเตอร์ 7 ผดส.	แทน ผอ.สสส.
6. น.ส.กมลสิริ เบญจมาศ	ผอ.กนก.ฝกม.	แทน ผอ.ฝกม.
7. น.ส.นิธิตี ภูมิวิชัย	ผอ.กช.ฝพช.	แทน ผอ.ฝพช.
8. นางเบญจวรรณ คำพลอย	ผอ.กรร.สส.	คณะทำงาน
9. นางศิริพร ไชยชนะ	ผอ.กช.สส.	คณะทำงาน
10. นายอรรถบูรณ์ เบญจบันลือกุล	ผอ.กรร.สส.	คณะทำงานและเลขานุการ
11. นายสันติ ภิรมย์เยี่ยม	หน.สอ.บ.กรร.สส.	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นายเกรียงศักดิ์ มานะจิตต์	หน.สส.กรร.สส.	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายกิตติพัฒน์ อุทัยมิตร	ผชช.กปน.ระดับ 9 รวก.(กอ)	ติดภารกิจ
2. นายสุริยันต์ วงศ์เมืองแก่น	ผอ.กช.ฝพช. รน.ผอ.ฝพช.	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวขวัญ เขาวนกิจ	ผอ.ฝงป.
2. นางกรรณกาญจน์ แสงศรี	ผอ.กช.ฝพช.
3. นายเสกสรรค์ ไปวันเสาร์	ผอ.กพน.ฝกม.
4. นายสรภพ กันบัวแก้ว	วิศวกร 7 ขวก.(ก4)
5. นายจุฑา ว่องพาณิชย์	หน.สอ.บ.กรร.สส.
6. นายปิยะศักดิ์ ศรีเรืองทอง	หน.สจ.ส.กช.ฝพช.
7. นางสาวนันทา เพชรดี	หน.สค.กวล.ฝงป.
8. นางสาวอนิชา เกตุนาถ	พนักงานพัสดุ 3 สวส.

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำประปาสำหรับโครงการจัดสร
ครั้งที่ 2/2567

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 แนวทางการขับเคลื่อนให้ได้ตามเป้าหมายเงินรับธุรกิจบริการน้ำประปา 2567

รวก.(กอ) แจ้งว่าจากการประชุมครั้งที่แล้ว มีการนำเสนอเรื่องการนำท่อ MT-PVC มาใช้งาน
ทดแทนท่อ PVC Class 8.5 และ Class 13.5 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย, การบริหาร
จัดการการใช้ท่อ รวมถึงรายได้จากธุรกิจบริการน้ำประปา 2567 จึงได้ขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย
ผอ.กช.ฝพช. แจ้งว่าการจัดเตรียมท่อได้ประสานงานกับ ปช.กลุ่ม สอ.บ. ไว้โดยจะทำการเบิกซื้อ
ท่อ PVC ไว้จนถึงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2568 ดังนั้นหากจะมีการนำท่อ MT-PVC ที่เตรียมไว้สำหรับงานลด
น้ำสูญเสียมาใช้กับงานรับจ้างงานโครงการหมู่บ้านจัดสรรก่อนได้ แต่จะเกิดปัญหา ท่อ PVC Class 8.5 ที่ได้เตรียมเบิก
ซื้อไว้แล้วในสัญญาที่ยังคงเหลืออยู่จะมีแนวทางในการนำมาใช้งานอย่างไร

ผอ.สสญ. ชี้แจงว่า สาขาคณะกรรมาธิการช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านว่า ท่อ PVC Class 8.5 ที่
ฝพช. ได้สั่งซื้อไว้แล้ว คาดการณ์ว่าจะสามารถเบิกใช้ได้ถึงเมื่อใด เพื่อจะได้กำหนดกรอบเวลาของการเปลี่ยนผ่านได้
ชัดเจน

ผอ.กช.ฝพช. แจ้งว่า ฝพช.ได้มีการจัดเตรียมท่อ PVC Class 8.5 สำหรับให้สาขาเบิกใช้งานได้ถึง
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2568 และขอให้สาขายืนยันความต้องการเบิกใช้งานท่อ PVC Class 8.5 ต่ออีก
หรือไม่

รวก.(กอ) แจ้งว่า แนวทางดำเนินการต่อไปจะเบิกใช้ท่อ MT- PVC ในงานวางท่อทุกประเภท
ผอ.กช.ฝพช. แจ้งว่า ถ้าสายงานบริการยืนยันว่าจะไม่มีการเบิกใช้ท่อ PVC Class 8.5 แล้ว
ทาง ฝพช. ก็จะไม่สั่งซื้ออีกต่อไป และขอให้พิจารณาเรื่องงบประมาณที่เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากราคาค่าท่อ PVC
Class 8.5 หากเปลี่ยนเป็นท่อ MT-PVC ราคาปรับขึ้นประมาณ 40 % สำหรับท่อขนาด 100-150 มม. และปรับขึ้น
50-60 % สำหรับท่อขนาด 200-300 มม.

รวก.(กอ) คิดว่า กปน. ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดทุกงาน หากต้องใช้งบประมาณเพิ่ม
อาจจะเริ่มในปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 2 หรือไม่อย่างไร

ผอ.ฝงป. ขอเรียนว่า ด้วยการจัดทำงบประมาณประจำปี 2568 ได้ผ่านขั้นตอนการดำเนินงานไป
แล้วทั้งงบทำการและงบลงทุน ซึ่งในการพิจารณานั้นไม่ได้มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมาใช้ท่อ MT-PVC หากมีความ
จำเป็นต้องขอปรับงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 40 - 50 ต้องดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้งบลงทุนโดย
ระบุเหตุผลด้วย เนื่องจาก ฝงป. จะต้องดำเนินการขอปรับกรอบวงเงินงบประมาณเพิ่มจาก สคช. เพราะวงเงิน



คำสั่งการประปานครหลวง

ที่ ๑๔๙๗ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแก่โครงการหมู่บ้านจัดสรรใหม่

เพื่อให้การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแก่โครงการหมู่บ้านจัดสรรใหม่ในพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวง ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เทียบเคียงแนวทางในการให้บริการประปาแก่ลูกค้าอาคารชุดในมิติการบริหารจัดการมาตรฐานลูกค้า การจัดการแรงดันน้ำให้เพียงพอคุณภาพน้ำประปา และความปลอดภัยในการใช้น้ำประปา รวมถึงระบบสำรองน้ำและถังกักน้ำให้มีความเหมาะสม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ผู้ว่าการการประปานครหลวง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแก่โครงการหมู่บ้านจัดสรรใหม่ ดังนี้

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

๑. รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)
๒. รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
๓. รองผู้ว่าการ (การเงิน)
๔. รองผู้ว่าการ (บริหาร)

คณะทำงาน ประกอบด้วย

- | | |
|---|-----------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ) | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) | คณะทำงาน |
| ๓. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ธุรกิจ) | คณะทำงาน |
| ๔. ประธานคณะกรรมการผู้จัดการสำนักงานประชาสัมพันธ์และเทียบเท่า | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย | คณะทำงาน |
| ๗. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย | คณะทำงาน |
| ๘. นายอรรถบูรณ์ เบญจบันลือกุล | คณะทำงาน |
| ๙. ประธานคณะกรรมการด้านบำรุงรักษาของสำนักงานประชาสัมพันธ์ | คณะทำงาน |
| ๑๐. ประธานคณะกรรมการด้านบริการของสำนักงานประชาสัมพันธ์ | คณะทำงาน |
| ๑๑. นายสรภพ ก้านบัวแก้ว | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๑๒. หัวหน้าส่วนวิเคราะห์ข้อมูล | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| กองวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีน้ำสูญเสีย | |
| ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย | |
| ๑๓. นางสาวลภาวิน ติวานนท์ วิศวกร ๕ ส่วนวิเคราะห์ข้อมูล | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| กองวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีน้ำสูญเสีย | |
| ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย | |

๒. โดยให้คณะ...

- ๒ -

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้น้ำประปาโครงการหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุดของการประปานครหลวงในปัจจุบัน
 ๒. พิจารณาจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแก่โครงการหมู่บ้านจัดสรรใหม่ในลักษณะเดียวกับการให้บริการประปาแก่ลูกค้าอาคารชุด
 ๓. ประสานงาน และเชิญบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในการประปานครหลวง เพื่อให้ข้อมูล คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ
 ๔. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้ว่าทราบ ทุก ๓ เดือน
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายรัชศักดิ์ สุริยหาร)

รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

จบการนำเสนอ

