



การส่งมอบงานปรับปรุงท่อลดน้ำสูญเสีย ปีงบ 2562


26 กันยายน 2562

รวบรวมจาก Google sheets สกส.

ผลงานสะสม 765.496 กม.

—●— แผนสะสม —◆— ผลงานสะสม

เป้าหมาย 741 กม.

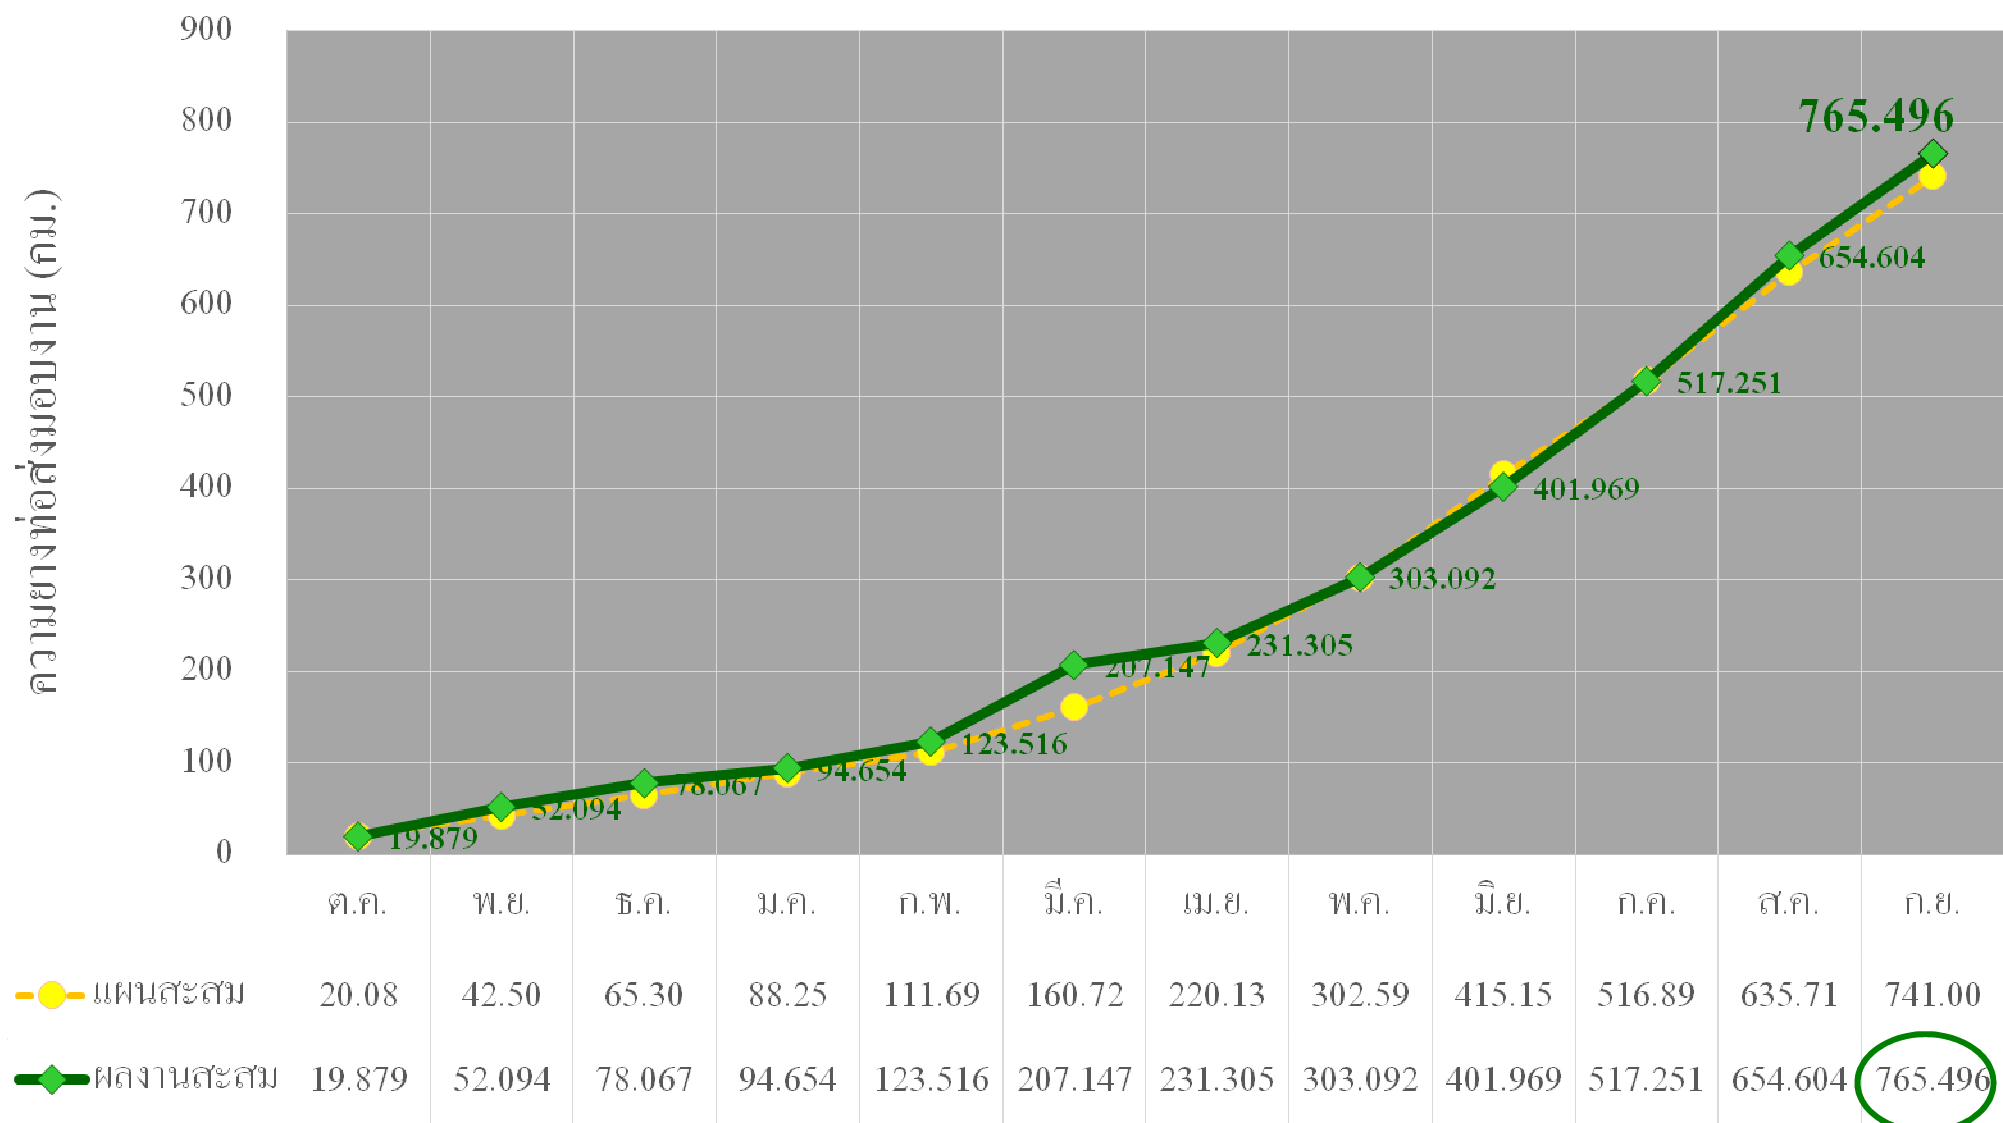

ผลงานส่งมอบงานปรับปรุงท่อฯ เปรียบเทียบกับ

เป้าหมายองค์กร (741กม.) Commit รวก.(กต) (777 กม.) ผลงานสะสม

% Commit รวก.(กต)



ข้อมูล ณ 26 ก.ย.62 ผลงานสะสม 765.496กม.

ดีกว่า เป้าหมายองค์กร = 24.496 กม.

น้อยกว่า Commit รวก.(กต) = 11.504 กม.

