


วาระที่ 3.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามKPIs
และแผนปฏิบัติงานองค์กร


1. ส่งมอบงานก่อสร้างวางท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย



2. จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้บริการใบกำกับภาษีและใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax & e-Receipt)

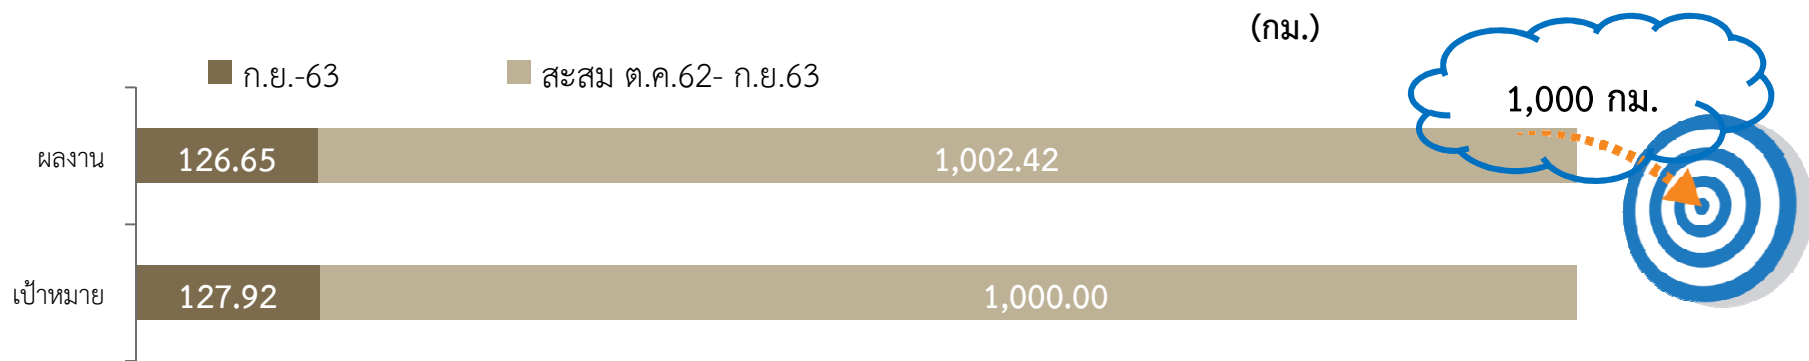


3. ร้อยละการชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ





4. การเบิกจ่ายงบประมาณ

(ล้านบาท)

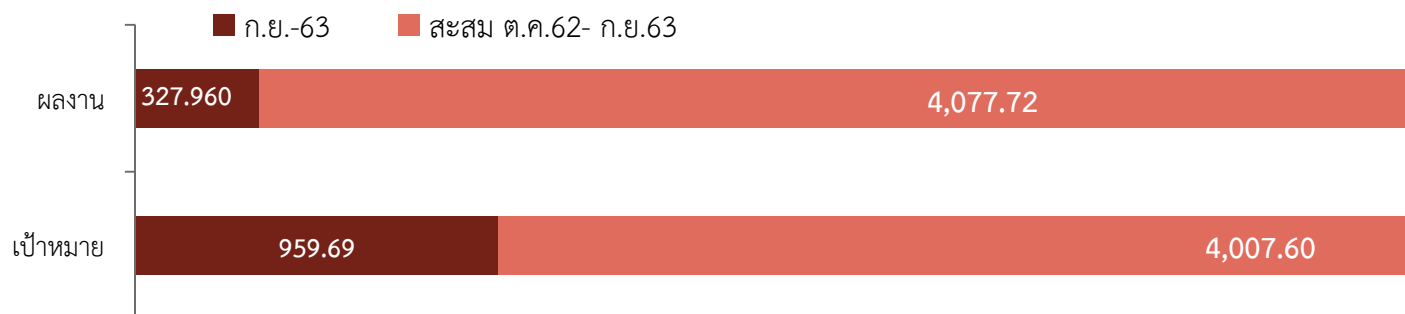

5. รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

(ล้านบาท)

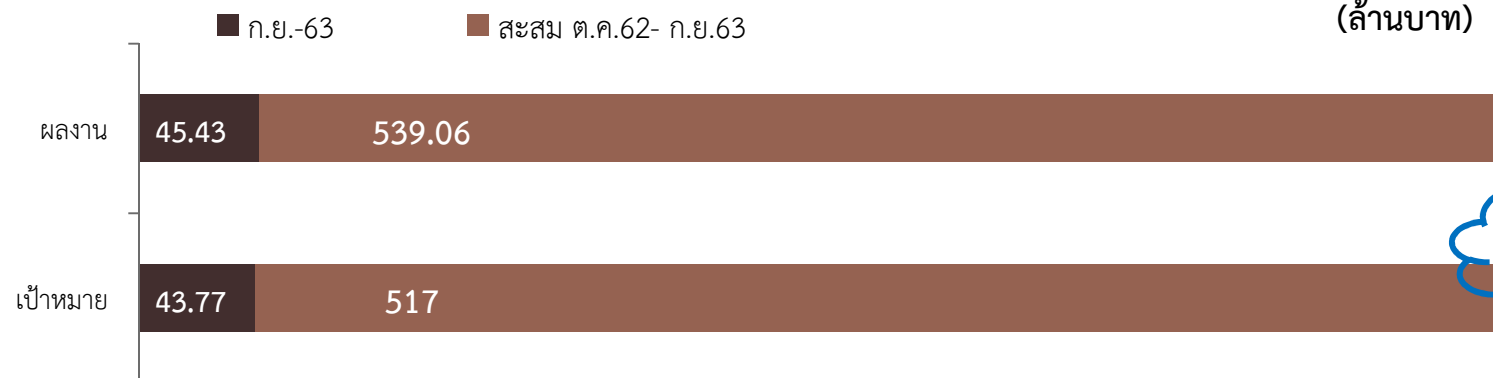

แผนงานน้ำประปาปลอดภัย ด้านบริการผู้ใช้น้ำ (สาขา ผู้รับผิดชอบ)

กิจกรรม	ผลงาน ก.ย. 63	ผลงานสะสม (ต.ค.62 – ก.ย.63)	หมายเหตุ
1 คณะทำงานฯ ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs) และความสอดคล้องกับ TOR คู่มือการควบคุมสุขอนามัยในการวางท่อและติดตั้งประปาใหม่ รายงานผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน เดือน ก.พ. 2563	-	100%	
2 ดำเนินการด้าน Water Safety Plan (WSP) ครอบคลุมทุกสาขา พร้อม ติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานตาม SOPs ของการซ่อมท่อ/ วางท่อ/ติดตั้งมิเตอร์/ การ Flushing (UDF)	-	100%	
3 ฝ้าระวังการเกิด Biofilm ในเส้นท่อจ่ายน้ำ	-	100%	
4 การดำเนินงานกรณีหลังมิเตอร์ในเชิงรุก	-	100%	
5 สร้างความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับ WSP		100%	
6 การดำเนินงานเพื่อลดจุดที่เป็น Dead End ปลายเส้นท่อจ่ายน้ำ เพิ่มเติม	-	100%	

แผนงานงานการขยายการให้บริการ พัฒนารูทกิจหลังมาตร และปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น้ำ

แผนงาน	ตัวชี้วัด	ผลงาน ก.ย. 63	ผลงานสะสม (ต.ค.62- ก.ย.63)	หมายเหตุ
1. การจัดทำแผนงานวางท่อประปา เพื่อขยายการให้บริการน้ำประปา ปีงบประมาณ 2563	ก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 40 กม.	-	43.26	
2 พัฒนารูทกิจสำหรับงานประปาหลังมาตรวัดน้ำ	รายได้จากรูทกิจเสริมหลังมาตร เป้าหมาย 27 ล้านบาท (ล้านบาท)	1.89	29.24	
	ระดับความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ปี 2562	4.84	4.95	
3. การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น้ำ	ร้อยละการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ ตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ร้อยละ)	80.79%	80.79%	

แผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฝจส. ผู้รับผิดชอบ)

แผนงาน	ตัวชี้วัด	ผลงาน ก.ย. 63	ผลงานสะสม (ต.ค.62 – ก.ย.63)	หมายเหตุ
1. งานปรับปรุงท่อลดน้ำสูญเสียประจำปี	ลงนามก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำได้ตามแผน 1,000 กม. ภายในเดือน ก.ย. 2563 (กม.)	90.215	1018.148	
2. งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายที่มีน้ำสูญเสียสูง	ดำเนินการตามสัญญาจ้างงาน ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานจ้างบริหารจัดการ น้ำสูญเสีย เป้าหมาย ร้อยละ 100 (ร้อยละ)	20%	100%	
3. จัดหาเทคโนโลยีงานลดน้ำสูญเสียที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนงานลดน้ำสูญเสียของสาขา	ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานจ้างบริหารจัดการ น้ำสูญเสีย เป้าหมาย ร้อยละ 100 (ร้อยละ)	2.75%	100%	
4. การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบฝักระวังน้ำสูญเสีย (DMA)	1..ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน เป้าหมาย ร้อยละ 100 (ร้อยละ) 2. ร้อยละของ RTU ที่ใช้งาน เป้าหมาย ร้อยละ 95 (ร้อยละ)	10.64% -	100% 99%	
5. การปรับปรุงท่อประปาที่เสื่อมสภาพร่วมกับงานวางท่อร้อยสายสื่อสารของ กทม.	ความยาวท่อที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับแผนงานวางท่อร้อยสายของ กทม.	-	-	กทม. อยู่ระหว่างการทำโครงการนำร่อง ยังไม่มีแผนงานร่วมกับ กปน.
