




การประปานครหลวง

METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

ผลการดำเนินงานด้านลดน้ำสูญเสีย
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

คาดการณ์ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสม กรกฎาคม 2564 (กปน.)

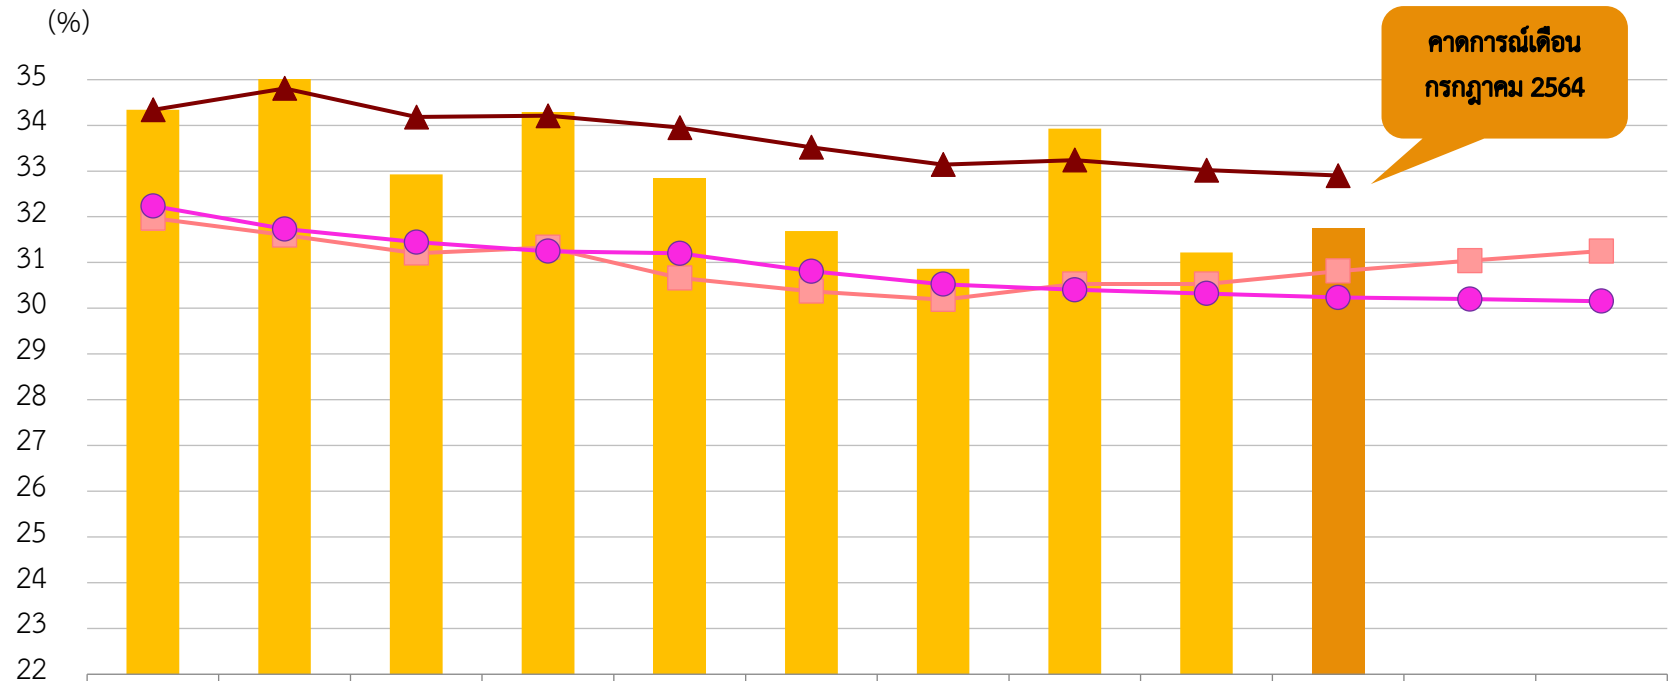

รายเดือน ปี 64	34.34	35.29	32.93	34.29	32.84	31.69	30.86	33.93	31.22	31.75		
สะสม ปี 2563	31.97	31.60	31.20	31.33	30.66	30.37	30.19	30.53	30.53	30.81	31.04	31.25
สะสม ปี 2564	34.34	34.81	34.18	34.21	33.95	33.52	33.14	33.24	33.02	32.90		
เป้าสะสม ปี 64	32.23	31.73	31.44	31.24	31.20	30.81	30.53	30.40	30.32	30.23	30.20	30.15

ตัวชี้วัด	E	D	C	B	A
อัตราน้ำสูญเสีย(ร้อยละ)	32.35	31.80	31.25	30.70	30.15

คาดการณ์ผลงานอัตรานำสูญเสียเดือนกรกฎาคม 2564

สาขา	ปริมาณน้ำเข้า (ลบ.ม./วัน)		ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม./วัน)		เป้าหมายน้ำ จำหน่าย ก.ค. (ลบ.ม./วัน)	% น้ำจำหน่าย เทียบเป้าหมาย ก.ค. (%)	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)		เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)	
	ม.ย.	ก.ค. (1)	ม.ย.	ก.ค. (1)			ม.ย.	ก.ค. (1)	ม.ย.	ก.ค. (1)
สสส.	388,497.00	380,848.30	261,050.48	257,112.74	275,322.58	-6.61	127,446.52	123,735.56	32.81	32.49
สสพ.	402,840.00	386,646.00	304,416.61	279,797.35	280,064.52	-0.1	98,423.40	106,848.65	24.43	27.63
สสป.	571,326.00	553,764.50	406,842.75	385,880.49	388,322.58	-0.63	164,483.25	167,884.01	28.79	30.32
สสญ.	357,856.00	345,293.90	233,897.58	252,711.18	256,290.32	-1.4	123,958.42	92,582.72	34.64	26.81
สสท.	228,631.00	225,470.85	145,325.90	139,681.90	158,096.77	-11.65	83,305.10	85,788.95	36.44	38.05
สสม.	330,941.00	318,007.20	192,018.53	195,552.87	228,709.68	-14.5	138,922.47	122,454.33	41.98	38.51
สสล.	303,567.00	281,330.83	224,903.32	220,517.97	230,064.52	-4.15	78,663.68	60,812.86	25.91	21.62
สสช.	260,827.00	252,250.05	177,327.94	172,577.81	185,387.10	-6.91	83,499.06	79,672.24	32.01	31.58
สสข.	200,014.00	193,686.02	159,368.81	148,487.90	148,064.52	0.29	40,645.19	45,198.12	20.32	23.34
สสมบ.	239,198.00	241,686.17	214,892.38	212,700.00	206,322.58	3.09	24,305.62	28,986.17	10.16	11.99
สสสภ.	313,397.00	304,617.48	268,676.48	253,621.19	276,032.26	-8.12	44,720.52	50,996.29	14.27	16.74
สสบ.	378,510.00	366,589.75	217,373.43	198,670.81	186,677.42	6.42	161,136.57	167,918.94	42.57	45.81
สสต.	372,664.00	360,860.05	237,591.96	221,967.74	228,258.06	-2.76	135,072.04	138,892.31	36.24	38.49
สสภ.	342,885.00	334,020.35	215,168.66	202,685.70	208,451.61	-2.77	127,716.34	131,334.65	37.25	39.32
สสว.	352,201.00	347,452.80	204,955.46	198,492.58	193,580.65	2.54	147,245.54	148,960.22	41.81	42.87
สสน.	277,525.00	264,162.35	192,590.83	187,096.77	185,483.87	0.87	84,934.17	77,065.58	30.6	29.17
สสบท.	216,774.00	213,386.70	159,137.54	153,275.35	143,129.03	7.09	57,636.46	60,111.35	26.59	28.17
สสมส.	277,006.00	273,324.75	184,068.10	170,619.16	156,387.10	9.1	92,937.90	102,705.59	33.55	37.58
กปน.	5,814,659.00	5,643,398.05	3,999,606.76	3,851,449.52	3,934,645.16	-2.11	1,815,052.24	1,791,948.53	31.22	31.75

กลุ่มเป้าหมายหลัก	กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูงมาก (>110,000 ลบ.ม./วัน) จำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไข
กลุ่มเป้าหมายรอง	กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูง (55,000 - 110,000 ลบ.ม./วัน) จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขรองลงมา
กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพ	กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพ

คาดการณ์ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสมเดือนกรกฎาคม 2564 (เทียบเป้าหมายรายเดือน)

สาขา	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)			เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)			ผลงานสะสม (%)	เป้าหมายเดือน ก.ค. 64	
	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค. (1)	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค. (1)		เป้าหมายสะสม (%)	เปรียบเทียบ
สสส.	131,227.64	127,446.52	123,735.56	34.36	32.81	32.49	32.05	25.85	×
สสพ.	125,910.48	98,423.40	106,848.65	30.85	24.43	27.63	29.34	28.98	×
สสป.	187,500.00	164,483.25	167,884.01	31.71	28.79	30.32	31.96	30.19	×
ขวก.(ก1)	444,638.13	390,353.16	398,468.22	32.19	28.65	30.16	31.2	28.63	×
สสญ.	126,734.01	123,958.42	92,582.72	34.01	34.64	26.81	34.99	36.30	✓
สสท.	88,653.69	83,305.10	85,788.95	38.57	36.44	38.05	36.02	29.66	×
สสม.	143,526.51	138,922.47	122,454.33	44.32	41.98	38.51	37.79	33.79	×
สสล.	88,803.66	78,663.68	60,812.86	29.34	25.91	21.62	25.71	20.79	×
ขวก.(ก2)	447,717.86	424,849.67	361,638.86	36.43	34.8	30.91	33.64	30.80	×
สสช.	89,342.33	83,499.06	79,672.24	35.02	32.01	31.58	32.77	32.41	×
สสข.	54,306.93	40,645.19	45,198.12	26.41	20.32	23.34	24.27	24.49	✓
สสมบ.	36,513.50	24,305.62	28,986.17	14.8	10.16	11.99	11.76	11.99	✓
สสสภ.	54,835.83	44,720.52	50,996.29	17.29	14.27	16.74	19	19.48	✓
ขวก.(ก3)	234,998.60	193,170.38	204,852.82	22.93	19.06	20.65	21.86	22.04	✓

กลุ่มเป้าหมายหลัก	กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูงมาก (>110,000 ลบ.ม./วัน) จำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไข
กลุ่มเป้าหมายรอง	กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูง (55,000 - 110,000 ลบ.ม./วัน) จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขรองลงมา
กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพ	กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพ

คาดการณ์ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสมเดือนกรกฎาคม 2564 (เทียบเป้าหมายรายเดือน)

สาขา	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)			เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)			ผลงานสะสม (%)	เป้าหมายเดือน ก.ค. 64	
	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค. (1)	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค. (1)		เป้าหมายสะสม (%)	เปรียบเทียบ
สสบ.	172,835.22	161,136.57	167,918.94	44.78	42.57	45.81	47.17	41.87	✗
สสด.	146,883.65	135,072.04	138,892.31	39.20	36.24	38.49	36.97	30.58	✗
สสภ.	134,428.48	127,716.34	131,334.65	38.90	37.25	39.32	38.28	38.29	✓
สสว.	159,650.36	147,245.54	148,960.22	44.82	41.81	42.87	44.57	38.46	✗
ชวก.(ก4)	613,797.71	571,170.49	587,106.12	41.97	39.49	41.67	41.86	37.31	✗
สสน.	96,933.02	84,934.17	77,065.58	34.64	30.6	29.17	32.98	31.18	✗
สสบท.	50,382.48	57,636.46	60,111.35	24.05	26.59	28.17	26.98	24.56	✗
สสมส.	100,161.90	92,937.90	102,705.59	36.45	33.55	37.58	37.62	36.18	✗
ชวก.(ก5)	247,477.41	235,508.53	239,882.51	32.39	30.53	31.95	33.00	31.16	✗
กปน.	1,988,629.71	1,815,052.24	1,791,948.53	33.93	31.22	31.75	32.90	30.23	✗

กลุ่มเป้าหมายหลัก	กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูงมาก (>110,000 ลบ.ม./วัน) จำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไข
กลุ่มเป้าหมายรอง	กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูง (55,000 - 110,000 ลบ.ม./วัน) จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขรองลงมา
กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพ	กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพ

รายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564

ลำดับ	สาขา	งานสำรวจท่อรั่ว						งานซ่อมท่อ (จุด)									
		Step Test (ครั้ง)		ระยะทางสำรวจท่อรั่ว (กม.)		จำนวนจุดรั่วที่พบ		Reported Burst				Unreported Burst				รวม	
								ท่อจ่าย		ท่อบริการ ⁽¹⁾		ท่อจ่าย		ท่อบริการ ⁽¹⁾			
								ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾		
1	สสส.	46	29	3,607	3,205	3,358	2,730	341	241	6,131	6,101	106	54	3,032	2,418	9,610	8,814
2	สสพ.	147	51	5,110	6,272	4,497	5,819	341	385	6,782	6,988	74	157	3,431	4,671	10,628	12,201
3	สสป.	61	88	6,079	10,061	4,921	7,122	493	553	7,006	8,400	184	181	2,161	5,329	9,844	14,463
	ภาค 1	254	168	14,797	19,539	12,776	15,671	1,175	1,179	19,919	21,489	364	392	8,624	12,418	30,082	35,478
4	สสญ.	38	116	5,401	4,989	4,917	5,409	221	198	4,466	4,431	132	114	3,819	4,586	8,638	9,329
5	สสท.	27	27	4,430	4,205	1,553	1,641	43	61	3,077	2,551	124	102	1,285	1,212	4,529	3,926
6	สสม.	71	153	3,309	3,580	1,997	2,689	204	195	3,789	3,845	60	61	1,651	2,484	5,704	6,585
7	สสล.	53	87	1,209	4,809	2,474	4,484	221	275	7,012	6,594	78	137	2,024	4,109	9,335	11,115
	ภาค 2	189	383	14,349	17,583	10,941	14,223	689	729	18,344	17,421	394	414	8,779	12,391	28,206	30,955
8	สสข.	25	36	2,529	5,230	2,725	2,940	383	348	6,534	6,867	34	54	1,664	4,015	8,615	11,284
9	สสข.	14	63	1,271	2,994	916	1,773	226	248	4,470	4,973	82	114	815	1,740	5,593	7,075
10	สสมบ.	34	44	1,837	1,800	868	1,002	646	529	5,198	4,713	67	79	671	809	6,582	6,130
11	สสสภ.	35	55	4,283	4,519	3,789	3,647	586	483	3,839	3,457	82	83	2,709	2,908	7,216	6,931
	ภาค 3	108	198	9,921	14,543	8,298	9,362	1,841	1,608	20,041	20,010	265	330	5,859	9,472	28,006	31,420
	รวก.(กอ)	551	749	39,066	51,665	32,015	39,256	3,705	3,516	58,304	58,920	1,023	1,136	23,262	34,281	86,294	97,853
12	สสป.	15	54	6,014	4,725	5,383	7,718	213	415	8,115	10,345	96	145	4,318	5,798	12,742	16,703
13	สสต.	35	9	5,798	5,696	4,767	6,123	322	430	8,363	9,869	88	96	4,371	5,390	13,144	15,785
14	สสภ.	60	112	4,704	5,071	6,336	7,788	382	284	7,922	9,854	103	127	5,432	7,231	13,839	17,496
15	สสว.	24	67	4,659	6,260	3,324	5,920	293	328	5,965	6,769	87	111	2,853	5,215	9,198	12,423
	ภาค 4	134	242	21,175	21,752	19,810	27,549	1,210	1,457	30,365	36,837	374	479	16,974	23,634	48,923	62,407
16	สสน.	58	13	2,344	2,941	2,793	3,313	222	199	5,288	4,830	91	123	2,327	2,174	7,928	7,326
17	สสบท.	23	15	1,465	2,458	1,968	3,093	311	316	5,769	7,255	75	63	1,605	2,861	7,760	10,495
18	สสมส.	53	32	5,838	3,972	4,575	4,768	445	402	7,276	8,420	99	181	3,842	4,015	11,662	13,018
	ภาค 5	134	60	9,647	9,370	9,336	11,174	978	917	18,333	20,505	265	367	7,774	9,050	27,350	30,839
	รวก.(กต)	268	302	30,822	31,123	29,146	38,723	2,188	2,374	48,698	57,342	639	846	24,748	32,684	76,273	93,246
	กปน.	819	1,051	69,888	82,787	61,161	77,979	5,893	5,890	107,002	116,262	1,662	1,982	48,010	66,965	162,567	191,099

หมายเหตุ :

ข้อมูลผลงานจากระบบ WLMA ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 บันทึกโดยสำนักงานประปาสาขา

(1) จำนวนงานซ่อมท่อบริการ = ผลรวมของงานซ่อมท่อบริการ + อุปกรณ์ท่อจ่าย + อุปกรณ์ท่อบริการ + อุปกรณ์ท่ออื่นๆ

(2) คือ จำนวนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบในช่วงเดือนเดียวกัน ระหว่างปีงบประมาณ 2564 และ ปีงบประมาณ 2563

แผนบริหารจัดการตู้ DM รวก.(กอ)

ระดับ	รายละเอียด	จำนวน DM	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
กปน.	คาดการณ์จำนวน <u>DM</u> พร้อมใช้	1718	892	938	1039	1085	1124	1170	1208	1240	1285	1329	1364	1392
	คาดการณ์เปอร์เซ็นต์ <u>DM</u> พร้อมใช้		52%	55%	60%	63%	65%	68%	70%	72%	75%	77%	79%	81%
	ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		892	858	869	887	930	957	968	983	992	1038		
	เปอร์เซ็นต์ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		52%	50%	51%	52%	54%	56%	56%	57%	58%	60%		

ระดับ	รายละเอียด	จำนวน DM	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
รวก.(กอ)	คาดการณ์จำนวน <u>DM</u> พร้อมใช้	1115	624	657	729	751	768	791	815	835	861	886	898	909
	คาดการณ์เปอร์เซ็นต์ <u>DM</u> พร้อมใช้		56%	59%	65%	67%	69%	71%	73%	75%	77%	79%	81%	82%
	ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		624	596	610	620	643	664	663	676	673	696		
	เปอร์เซ็นต์ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		56%	53%	55%	56%	58%	60%	59%	61%	60%	62%		

ระดับ	รายละเอียด	จำนวน DM	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
ชวก.(ก1)	คาดการณ์จำนวน <u>DM</u> พร้อมใช้	404	211	221	240	250	261	273	287	295	303	313	317	320
	คาดการณ์เปอร์เซ็นต์ <u>DM</u> พร้อมใช้		52%	55%	59%	62%	65%	68%	71%	73%	75%	77%	78%	79%
	ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		211	182	195	208	218	221	219	238	231	241		
	เปอร์เซ็นต์ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		52%	45%	48%	51%	54%	55%	54%	59%	57%	60%		

ระดับ	รายละเอียด	จำนวน DM	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
ชวก.(ก2)	คาดการณ์จำนวน <u>DM</u> พร้อมใช้	404	217	238	272	282	286	295	300	307	321	332	339	346
	คาดการณ์เปอร์เซ็นต์ <u>DM</u> พร้อมใช้		54%	59%	67%	70%	71%	73%	74%	76%	79%	82%	84%	86%
	ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		217	216	223	220	226	238	238	235	243	249		
	เปอร์เซ็นต์ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		54%	53%	55%	54%	56%	59%	59%	58%	60%	62%		

ระดับ	รายละเอียด	จำนวน DM	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
ชวก.(ก3)	คาดการณ์จำนวน <u>DM</u> พร้อมใช้	307	196	198	217	219	221	223	228	233	237	241	242	243
	คาดการณ์เปอร์เซ็นต์ <u>DM</u> พร้อมใช้		64%	64%	71%	71%	72%	73%	74%	76%	77%	79%	79%	79%
	ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		196	198	192	192	199	205	206	203	199	206		
	เปอร์เซ็นต์ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		64%	64%	63%	63%	65%	67%	67%	66%	65%	67%		

แผนบริหารจัดการตู้ DM รวก.(กต)

ระดับ	รายละเอียด	จำนวน DM	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
กปน.	คาดการณ์จำนวน <u>DM</u> พร้อมใช้	1718	892	938	1039	1085	1124	1170	1208	1240	1285	1329	1364	1392
	คาดการณ์เปอร์เซ็นต์ <u>DM</u> พร้อมใช้		52%	55%	60%	63%	65%	68%	70%	72%	75%	77%	79%	81%
	ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		892	858	869	887	930	957	968	983	992	1038		
	เปอร์เซ็นต์ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		52%	50%	51%	52%	54%	56%	56%	57%	58%	60%		

ระดับ	รายละเอียด	จำนวน DM	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
รวก.(กต)	คาดการณ์จำนวน <u>DM</u> พร้อมใช้	603	268	281	310	334	356	379	393	405	424	443	466	483
	คาดการณ์เปอร์เซ็นต์ <u>DM</u> พร้อมใช้		44%	47%	51%	55%	59%	63%	65%	67%	70%	73%	77%	80%
	ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		268	262	259	267	287	293	305	307	319	342		
	เปอร์เซ็นต์ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		44%	43%	43%	44%	48%	49%	51%	51%	53%	57%		

ระดับ	รายละเอียด	จำนวน DM	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
ชวก.(ก4)	คาดการณ์จำนวน <u>DM</u> พร้อมใช้	411	171	182	204	221	238	248	258	270	287	302	320	331
	คาดการณ์เปอร์เซ็นต์ <u>DM</u> พร้อมใช้		42%	44%	50%	54%	58%	60%	63%	66%	70%	73%	78%	81%
	ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		171	168	166	170	175	174	188	194	206	231		
	เปอร์เซ็นต์ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		42%	41%	40%	41%	43%	42%	46%	47%	50%	56%		

ระดับ	รายละเอียด	จำนวน DM	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
ชวก.(ก5)	คาดการณ์จำนวน <u>DM</u> พร้อมใช้	192	97	99	106	113	118	131	135	135	137	141	146	152
	คาดการณ์เปอร์เซ็นต์ <u>DM</u> พร้อมใช้		51%	52%	55%	59%	61%	68%	70%	70%	71%	73%	76%	79%
	ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		97	94	93	97	112	119	117	113	113	111		
	เปอร์เซ็นต์ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		51%	49%	48%	51%	58%	62%	61%	59%	59%	58%		

ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย เดือน กรกฎาคม 2564

ระดับข้อมูล	จำนวนงาน Step Test	จำนวนงาน สร.	ระยะทางที่เดิน	จำนวนจุดรั่วที่พบ	จำนวนงานซ่อมที่เปิด-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อจ่าย-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อบริการ-สปน.	งานซ่อมท่อจ่าย-สปน.	งานซ่อมท่อบริการ-สปน.	ไม่พบจุดรั่ว-สปน.	อื่นๆ-สปน.	ยกเลิกงาน-สปน.
กปน.	41	1,799	8,905	8,573	8,197	100	5,788	77	4,342	43	481	60
รวก.(กอ)	30	1,035	6,249	4,420	4,130	60	3,284	49	2,311	15	390	26
รวก.(กต)	11	757	2,656	4,128	4,067	40	2,504	28	2,031	28	91	34

ระดับข้อมูล	จำนวนงานซ่อมที่เปิด - รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนามท่อจ่าย - รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนามท่อบริการ - รับแจ้ง
กปน.	10,080	346	7,823
รวก.(กอ)	4,645	210	3,591
รวก.(กต)	5,435	136	4,232

SCAN หากต้องการดูรายละเอียด
งาน



หมายเหตุ: กรณีทุกตัว DM คาดว่าใช้งานได้หมด จะใช้น้ำเข้า DMA จริงจากอุปกรณ์เครื่องวัดภาคสนาม
กรณีคาดว่ามิบาง DM ใช้งานไม่ได้ จะใช้น้ำเข้า DMA จากข้อมูลคาดการณ์จากสาขาเดือนก่อนหน้า

ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย ภาค 1 เดือน กรกฎาคม 2564

พื้นที่	ข้อมูลปริมาณน้ำเข้า น้ำขาย น้ำสูญเสีย เดือนมิถุนายน 2564 สำหรับใช้ใน ในการวางแผนกิจกรรม				ข้อมูลสถานะ RTU/DMA ล่าสุด		ข้อมูลสรุปสถานะงาน ALC เดือน กรกฎาคม 2564									
	ปริมาณน้ำเข้า	ปริมาณน้ำขาย	ปริมาณน้ำสูญเสีย	%น้ำ สูญเสีย เดือนนี้	สัดส่วน ข้อมูลจาก ระบบ	DMA พร้อม ใช้	Step Test	งานเดิน สำรวจ	ระยะ ทางเดิน	จุดรั่วที่พบ	ปิดงาน ภาคสนาม สบน. - ท่อ จ่าย	ปิดงาน ภาคสนาม สบน. - ท่อ บริการ	ปิดงาน สมบูรณ์ สบน.	ปิดงาน ภาคสนาม รับแจ้ง. - ท่อจ่าย	ปิดงาน ภาคสนาม รับแจ้ง. - ท่อบริการ	ปิดงาน สมบูรณ์ รับ แจ้ง.
กปน.	166,405,224.85	116,645,857.00	49,759,367.85	29.90	'396/992	'486/992	41.00	1,799.00	8,905	8,573	100	5,788	4,362	346	7,823	6,002
รวก.(กอ)	104,781,850.87	75,185,993.00	29,595,857.87	28.25	'250/604	'317/604	30.00	1,035.00	6,249.02	4,420	60	3,284	2,354	210	3,591	2,812
ขวก.(ก1)	37,056,712.27	26,635,151.00	10,421,561.27	28.12	'56/191	'71/191	2.00	548.00	2,526.74	1,753	18	1,322	702	69	1,064	808

3 ลำดับแรกใน DMA Ranking ในแต่ละสาขา																
สสบ.	9,758,507.52	5,658,506.00	4,100,001.52	42.01	'15/51	'16/51	-	175.00	436.81	1,144	1	391	287	14	696	589
'07-01-11	389,113.52	252,138.00	136,975.52	35.20	จากระบบ	'2/2	0.00	1.00	0.19	1	-	-	-	2	10	11
'07-01-06	338,378.28	214,861.00	123,517.28	36.50	จากระบบ	'3/3	0.00	3.00	2.75	3	1	2	3	-	6	6
'07-05-08	151,501.34	56,709.00	94,792.34	62.57	จากระบบ	'1/1	0.00	1.00	2.12	1	-	-	-	1	2	3

สสด.	9,686,766.58	6,850,288.00	2,836,478.58	29.28	'13/58	'14/58	-	95.00	516.15	458	3	160	161	20	516	474
'13-04-07	255,229.89	107,043.00	148,186.89	58.06	จากระบบ	'3/3	0.00	-	-	-	-	-	-	-	7	7
'13-01-03	233,257.15	100,835.00	132,422.15	56.77	จากระบบ	'3/3	0.00	10.00	60.00	71	2	67	58	-	8	7
'13-04-02	193,083.63	103,111.00	89,972.63	46.60	จากระบบ	'2/2	0.00	-	-	-	-	-	-	-	7	6

สสูญ.	11,607,166.82	6,891,065.00	4,716,101.82	40.63	'29/64	'38/64	5.00	85.00	690.85	522	10	401	351	9	289	248
'17-06-02	347,039.64	164,015.00	183,024.64	52.74	จากระบบ	'2/2	0.00	15.00	87.39	43	-	45	24	3	7	6
'17-05-04	321,115.59	150,486.00	170,629.59	53.14	จากระบบ	'1/1	0.00	1.00	3.61	3	-	3	1	-	5	3
'17-03-01	355,589.86	194,132.00	161,457.86	45.41	จากระบบ	'1/1	0.00	3.00	7.88	9	-	8	6	-	9	9

SCAN หากต้องการดู

รายละเอียดงาน



หมายเหตุ: กรณีทุกตัว DM คาดว่าใช้งานได้หมด จะใช้น้ำเข้า DMA จริงจากอุปกรณ์เครื่องวัดภาคสนาม
กรณีคาดว่ามิบบาง DM ใช้งานไม่ได้ จะใช้น้ำเข้า DMA จากข้อมูลคาดการณ์จากสาขาเดือนก่อนหน้า

***ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน กทส.ฝจส. ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย ภาค 2 เดือน กรกฎาคม 2564

พื้นที่	ข้อมูลปริมาณน้ำเข้า น้ำขาย น้ำสูญเสีย เดือนมิถุนายน 2564 สำหรับใช้ ในการวางแผนกิจกรรม				ข้อมูลสถานะ RTU/DMA ล่าสุด		ข้อมูลสรุปสถานะงาน ALC เดือน กรกฎาคม 2564									
	ปริมาณน้ำเข้า	ปริมาณน้ำขาย	ปริมาณน้ำสูญเสีย	%น้ำ สูญเสีย เดือนนี้	สัดส่วน ข้อมูลจาก ระบบ	DMA พร้อม ใช้	Step Test	งานเดิน สำรวจ	ระยะ ทางเดิน	จุดรั่วที่พบ	ปิดงาน ภาคสนาม สปน. - ท่อ จ่าย	ปิดงาน ภาคสนาม สปน. - ท่อ บริการ	ปิดงาน สมบูรณ์ สปน.	ปิดงาน ภาคสนาม รับแจ้ง. - ท่อจ่าย	ปิดงาน ภาคสนาม รับแจ้ง. - ท่อบริการ	ปิดงาน สมบูรณ์ รับ แจ้ง.
กปน.	166,405,224.85	116,645,857.00	49,759,367.85	29.90	'396/992	'486/992	41.00	1,799.00	8,905	8,573	100	5,788	4,362	346	7,823	6,002
รวก.(กอ)	104,781,850.87	75,185,993.00	29,595,857.87	28.25	'250/604	'317/604	30.00	1,035.00	6,249.02	4,420	60	3,284	2,354	210	3,591	2,812
ขวก.(ก2)	37,655,663.86	23,643,572.00	14,012,091.86	37.21	'91/227	'112/227	22.00	311.00	1,645.94	1,385	25	1,127	1,037	38	995	894

3 ลำดับแรกใน DMA Ranking ในแต่ละสาขา																
สสน.	8,666,282.99	5,580,088.00	3,086,194.99	35.61	'42/65	'47/65	-	44.00	168.90	189	5	118	97	10	418	224
'03-04-08	341,616.13	92,895.00	248,721.13	72.81	จากระบบ	'1/1	0.00	1.00	16.63	11	-	11	9	-	8	8
'03-02-03	272,114.34	89,218.00	182,896.34	67.21	จากระบบ	'1/1	0.00	1.00	1.50	5	-	4	4	-	3	2
'03-05-05	224,155.34	98,503.00	125,652.34	56.06	จากระบบ	'1/1	0.00	1.00	-	3	-	-	-	-	6	5

สสท.	6,519,773.01	4,382,346.00	2,137,427.01	32.78	'22/48	'25/48	-	82.00	240.00	131	4	114	96	4	191	171
'05-05-14	251,120.70	78,850.00	172,270.70	68.60	จากระบบ	'2/2	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'05-02-05	204,253.98	117,480.00	86,773.98	42.48	จากระบบ	'1/1	0.00	1.00	5.00	1	-	1	1	-	5	5
'05-01-01	198,634.63	116,302.00	82,332.63	41.45	จากระบบ	'2/2	0.00	1.00	4.00	3	-	2	2	-	4	3

สสม.	9,808,619.61	5,616,633.00	4,191,986.61	42.74	'21/51	'22/51	11.00	47.00	279.02	273	2	255	234	7	215	194
'06-03-08	422,422.36	70,276.00	352,146.36	83.36	จากระบบ	'2/2	0.00	-	-	-	-	-	-	-	5	5
'06-04-04	487,133.58	180,384.00	306,749.58	62.97	จากระบบ	'3/3	0.00	2.00	27.95	17	-	15	15	-	5	5
'06-03-06	203,584.78	73,663.00	129,921.78	63.82	จากระบบ	'2/2	1.00	2.00	14.23	16	-	14	14	-	7	6

สสส.	10,603,243.76	7,579,667.00	3,023,576.76	28.52	'23/69	'28/69	-	61.00	241.50	233.00	2.00	114.00	116.00	13.00	239.00	249.00
'12-04-05	483,341.58	232,670.00	250,671.58	51.86	จากระบบ	'2/2	0.00	6.00	27.57	9.00	-	6.00	6.00	1.00	12.00	13.00
'12-03-01	287,012.46	155,807.00	131,205.46	45.71	จากระบบ	'2/2	1.00	1.00	8.00	2.00	-	1.00	1.00	-	4.00	4.00
'12-05-08	263,870.25	135,573.00	128,297.25	48.62	จากระบบ	'2/2	0.00	1.00	10.00	9.00	-	9.00	9.00	1.00	11.00	12.00

SCAN หากต้องการดู

รายละเอียดงาน



หมายเหตุ: กรณีทุกตัว DM คาดว่าใช้งานได้หมด จะใช้น้ำเข้า DMA จริงจากอุปกรณ์เครื่องวัดภาคสนาม
กรณีคาดว่ามิบบาง DM ใช้งานไม่ได้ จะใช้น้ำเข้า DMA จากข้อมูลคาดการณ์จากสาขาเดือนก่อนหน้า

ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย ภาค 3 เดือน กรกฎาคม 2564

พื้นที่	ข้อมูลปริมาณน้ำเข้า น้ำขาย น้ำสูญเสีย เดือนมิถุนายน 2564 สำหรับใช้ ในการวางแผนกิจกรรม				ข้อมูลสถานะ RTU/DMA ล่าสุด		ข้อมูลสรุปสถานะงาน ALC เดือน กรกฎาคม 2564									
	ปริมาณน้ำเข้า	ปริมาณน้ำขาย	ปริมาณน้ำสูญเสีย	%น้ำ สูญเสีย เดือนนี้	สัดส่วน ข้อมูลจาก ระบบ	DMA พร้อม ใช้	Step Test	งานเดิน สำรวจ	ระยะ ทางเดิน	จุดรั่วที่พบ	ปิดงาน ภาคสนาม สปน. - ท่อ จ่าย	ปิดงาน ภาคสนาม สปน. - ท่อ บริการ	ปิดงาน สมบูรณ์ สปน.	ปิดงาน ภาคสนาม รับแจ้ง. - ท่อจ่าย	ปิดงาน ภาคสนาม รับแจ้ง. - ท่อบริการ	ปิดงาน สมบูรณ์ รับ แจ้ง.
กปน.	166,405,224.85	116,645,857.00	49,759,367.85	29.90	'396/992	'486/992	41.00	1,799.00	8,905	8,573	100	5,788	4,362	346	7,823	6,002
รวก.(กอ)	104,781,850.87	75,185,993.00	29,595,857.87	28.25	'250/604	'317/604	30.00	1,035.00	6,249.02	4,420	60	3,284	2,354	210	3,591	2,812
ชวก.(ก3)	30,069,474.74	24,907,270.00	5,162,204.74	17.17	'103/186	'134/186	6.00	176.00	2,076.34	1,282	16	830	615	103	1,273	1,110

3 ลำดับแรกใน DMA Ranking ในแต่ละสาขา																
สสภ.	10,804,132.94	6,538,736.00	4,265,396.94	39.48	'37/63	'40/63	10.00	152.00	418.37	792	6	543	536	30	674	657
'15-09-01	234,273.08	127,120.00	107,153.08	45.74	จากระบบ	'2/2	0.00	3.00	145.78	42	-	41	39	1	19	16
'15-07-04	223,886.14	124,268.00	99,618.14	44.50	จากระบบ	'1/1	0.00	2.00	-	7	-	-	-	2	18	14
'15-03-01	165,334.44	67,692.00	97,642.44	59.06	จากระบบ	'1/1	0.00	-	-	-	-	-	-	-	9	7

สสภ.	9,720,104.42	6,753,528.00	2,966,576.42	30.52	'19/64	'27/64	6.00	97.00	436.07	459	9	357	356	18	300	281
'16-04-05	234,892.96	126,677.00	108,215.96	46.07	จากระบบ	'1/1	0.00	4.00	12.36	12	-	8	4	1	13	14
'16-07-01	284,095.46	176,462.00	107,633.46	37.89	จากระบบ	'2/2	0.00	-	-	-	-	-	-	-	24	24
'16-05-01	147,231.83	72,898.00	74,333.83	50.49	จากระบบ	'1/1	0.00	1.00	1.00	1	-	1	1	1	8	8

สสพ.	11,181,446.90	8,033,867.00	3,147,579.90	28.15	'8/53	'12/53	-	67.00	430.10	435	5	362	288	28	295	301
'53-05-09	162,683.34	68,065.00	94,618.34	58.16	จากระบบ	'3/3	0.00	-	-	-	-	-	-	1	8	3
'53-05-01	265,977.56	191,091.00	74,886.56	28.16	จากระบบ	'2/2	0.00	-	-	-	-	1	1	1	4	3
'53-01-03	140,705.72	79,207.00	61,498.72	43.71	จากระบบ	'1/1	0.00	5.00	71.48	48	-	47	-	-	6	3

สสว.	8,967,245.79	5,944,144.00	3,023,101.79	33.71	'15/57	'19/57	1.00	154.00	959.66	1,222.00	7.00	1,033.00	731.00	14.00	407.00	248.00
'55-04-05	192,163.84	72,887.00	119,276.84	62.07	จากระบบ	'1/1	0.00	4.00	44.00	45.00	-	12.00	1.00	-	3.00	3.00
'13-06-05	333,076.83	223,591.00	109,485.83	32.87	จากระบบ	'1/1	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'55-03-02	188,805.47	113,288.00	75,517.47	40.00	จากระบบ	'1/1	0.00	2.00	21.00	21.00	-	8.00	-	-	3.00	2.00

SCAN หากต้องการดู

รายละเอียดงาน



หมายเหตุ: กรณีทุกตัว DM คาดว่าใช้งานได้หมด จะใช้น้ำเข้า DMA จริงจากอุปกรณ์เครื่องวัดภาคสนาม
กรณีคาดว่ามิบบาง DM ใช้งานไม่ได้ จะใช้น้ำเข้า DMA จากข้อมูลคาดการณ์จากสาขาเดือนก่อนหน้า

ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย ภาค 4 เดือน กรกฎาคม 2564

พื้นที่	ข้อมูลปริมาณน้ำเข้า น้ำขาย น้ำสูญเสีย เดือนมิถุนายน 2564 สำหรับใช้ ในการวางแผนกิจกรรม				ข้อมูลสถานะ RTU/DMA ล่าสุด		ข้อมูลสรุปสถานะงาน ALC เดือน กรกฎาคม 2564									
	ปริมาณน้ำเข้า	ปริมาณน้ำขาย	ปริมาณน้ำสูญเสีย	%น้ำ สูญเสีย เดือนนี้	สัดส่วน ข้อมูลจาก ระบบ	DMA พร้อม ใช้	Step Test	งานเดิน สำรวจ	ระยะ ทางเดิน	จุดรั่วที่พบ	ปิดงาน ภาคสนาม สปน. - ท่อ จ่าย	ปิดงาน ภาคสนาม สปน. - ท่อ บริการ	ปิดงาน สมบูรณ์ สปน.	ปิดงาน ภาคสนาม รับแจ้ง. - ท่อจ่าย	ปิดงาน ภาคสนาม รับแจ้ง. - ท่อบริการ	ปิดงาน สมบูรณ์ รับ แจ้ง.
กปน.	166,405,224.85	116,645,857.00	49,759,367.85	29.90	'396/992	'486/992	41.00	1,799.00	8,905	8,573	100	5,788	4,362	346	7,823	6,002
รวก.(กต)	60,562,965.93	39,800,086.00	20,762,879.93	34.28	'146/377	'169/377	11.00	1,035.00	6,249	4,420	40	2,504	2,008	136	4,232	3,190
ขวก.(ก4)	39,216,652.83	24,991,674.00	14,224,978.83	36.27	'80/229	'89/229	11.00	576.00	2,330.99	3,616	17	2,127	1,715	78	2,293	1,968

3 ลำดับแรกใน DMA Ranking ในแต่ละสาขา																
สสข.	7,496,895.31	5,066,755.00	2,430,140.31	32.42	'40/54	'47/54	1.00	46.00	1,163.91	504	3	273	227	21	450	425
'01-01-02	462,621.75	85,835.00	376,786.75	81.45	จากระบบ	'2/2	0.00	1.00	3.00	1	-	2	1	-	8	8
'01-06-05	324,744.97	185,470.00	139,274.97	42.89	จากระบบ	'4/4	0.00	6.00	7.00	9	-	-	-	1	13	13
'01-01-05	221,530.03	94,997.00	126,533.03	57.12	จากระบบ	'1/1	0.00	4.00	6.00	8	-	6	4	-	7	5

สสข.	6,277,709.11	4,802,576.00	1,475,133.11	23.50	'28/43	'33/43	-	29.00	115.74	52	3	48	44	25	397	405
'02-08-02	390,834.41	228,102.00	162,732.41	41.64	จากระบบ	'2/2	0.00	7.00	17.88	12	-	1	1	-	10	8
'02-13-01	234,867.42	97,207.00	137,660.42	58.61	จากระบบ	'2/2	0.00	-	-	-	-	-	-	-	9	8
'02-04-03	294,630.23	157,738.00	136,892.23	46.46	จากระบบ	'1/1	0.00	4.00	41.63	43	1	24	25	-	23	15

สสป.	15,272,021.61	11,021,617.00	4,250,404.61	27.83	'25/69	'31/69	2.00	420.00	1,855.14	1,085	11	846	298	28	530	258
'11-06-09	558,185.05	322,990.00	235,195.05	42.14	จากระบบ	'3/3	1.00	12.00	49.00	63	-	58	58	-	25	21
'11-10-14	278,535.61	101,599.00	176,936.61	63.52	จากระบบ	'2/2	0.00	1.00	-	2	-	-	-	1	9	7
'11-03-05	234,778.43	73,710.00	161,068.43	68.60	จากระบบ	'1/1	1.00	1.00	5.00	8	-	-	-	1	10	11

สสมบ.	6,325,002.87	6,626,984.00	- 301,981.13	- 4.77	'21/47	'33/47	3.00	47.00	389.69	346.00	5.00	270.00	148.00	30.00	215.00	132.00
'14-07-05	364,435.88	103,329.00	261,106.88	71.65	จากระบบ	'1/1	0.00	1.00	15.10	15.00	-	15.00	15.00	-	-	-
'14-17-06	212,078.67	57,227.00	154,851.67	73.02	จากระบบ	'1/1	0.00	1.00	15.00	15.00	-	15.00	15.00	-	-	-
'14-05-07	279,963.75	144,687.00	135,276.75	48.32	จากระบบ	'1/1	0.00	12.00	19.86	98.00	1.00	92.00	54.00	-	23.00	14.00

SCAN หากต้องการดู

รายละเอียดงาน



หมายเหตุ: กรณีทุกตัว DM คาดว่าใช้งานได้หมด จะใช้น้ำเข้า DMA จริงจากอุปกรณ์เครื่องวัดภาคสนาม
กรณีคาดว่ามิบบาง DM ใช้งานไม่ได้ จะใช้น้ำเข้า DMA จากข้อมูลคาดการณ์จากสาขาเดือนก่อนหน้า

ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย ภาค 5 เดือน กรกฎาคม 2564

พื้นที่	ข้อมูลปริมาณน้ำเข้า น้ำขาย น้ำสูญเสีย เดือนมิถุนายน 2564 สำหรับใช้ ในการวางแผนกิจกรรม				ข้อมูลสถานะ RTU/DMA ล่าสุด		ข้อมูลสรุปสถานะงาน ALC เดือน กรกฎาคม 2564									
	ปริมาณน้ำเข้า	ปริมาณน้ำขาย	ปริมาณน้ำสูญเสีย	%น้ำ สูญเสีย เดือนนี้	สัดส่วน ข้อมูลจาก ระบบ	DMA พร้อม ใช้	Step Test	งานเดิน สำรวจ	ระยะ ทางเดิน	จุดรั่วที่พบ	ปิดงาน ภาคสนาม สปน. - ท่อ จ่าย	ปิดงาน ภาคสนาม สปน. - ท่อ บริการ	ปิดงาน สมบูรณ์ สปน.	ปิดงาน ภาคสนาม รับแจ้ง. - ท่อจ่าย	ปิดงาน ภาคสนาม รับแจ้ง. - ท่อบริการ	ปิดงาน สมบูรณ์ รับ แจ้ง.
กปน.	166,405,224.85	116,645,857.00	49,759,367.85	29.90	'396/992	'486/992	41.00	1,799.00	8,905	8,573	100	5,788	4,362	346	7,823	6,002
รวก.(กต)	60,562,965.93	39,800,086.00	20,762,879.93	34.28	'146/377	'169/377	11.00	1,035.00	6,249	4,420	40	2,504	2,008	136	4,232	3,190
ชวก.(ก5)	21,346,313.10	14,808,412.00	6,537,901.10	30.63	'66/148	'80/148	-	188.00	323.91	537	23	323	293	48	1,611	1,222

3 ลำดับแรกใน DMA Ranking ในแต่ละสาขา																
สสบท.	5,473,519.89	4,313,381.00	1,160,138.89	21.20	'5/41	'9/41	-	44.00	31.01	70	5	41	23	17	466	281
'04-05-04	210,550.51	77,792.00	132,758.51	63.05	จากระบบ	'1/1	0.00	-	-	-	-	1	-	-	4	2
'04-08-05	252,802.06	130,665.00	122,137.06	48.31	จากระบบ	'1/1	0.00	1.00	0.19	1	-	6	6	-	7	5
'04-03-05	153,137.08	46,158.00	106,979.08	69.86	จากระบบ	'1/1	0.00	1.00	2.64	5	-	-	-	-	4	1

สสสภ.	9,969,867.45	8,410,955.00	1,558,912.45	15.64	'14/42	'21/42	2.00	54.00	407.00	380	5	239	196	27	211	148
'54-08-04	79,090.88	10,454.00	68,636.88	86.78	จากระบบ	'1/1	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'54-08-02	127,618.58	80,316.00	47,302.58	37.07	จากระบบ	'1/1	0.00	3.00	8.00	16	-	13	10	1	14	12
'54-07-04	56,470.35	26,762.00	29,708.35	52.61	จากระบบ	'1/1	0.00	-	-	-	-	-	-	-	8	6

สสมส.	7,206,510.22	4,914,943.00	2,291,567.22	31.80	'19/42	'24/42	-	100.00	124.00	278	13	164	173	21	727	717
'56-07-02	478,305.64	299,006.00	179,299.64	37.49	จากระบบ	'1/1	0.00	8.00	4.00	26	-	5	5	1	38	36
'56-04-02	227,227.66	58,743.00	168,484.66	74.15	จากระบบ	'1/1	0.00	3.00	6.00	4	-	-	-	-	12	12
'56-07-01	271,781.28	113,361.00	158,420.28	58.29	จากระบบ	'1/1	0.00	4.00	6.00	16	1	4	5	-	52	51

SCAN หากต้องการดู
รายละเอียดงาน



แผน-ผลงานจัดทำแบบและจ้าง (สาขาและ Agenda base) ปีงบประมาณ 2564

สาขา	แผน (1200 กม.)	เบิกจ้างแล้ว				ลงนามแล้ว			
		ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน	ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน
สสส.	55	42.128	12.924	55.052	100.09%	42.128	12.924	55.052	100.09%
สสพ.	67	36.548	36.481	73.029	109.00%	36.548	29.307	65.855	98.29%
สสป.	91	18.385	73.612	91.997	101.10%	18.385	65.884	84.269	92.60%
ขวก.(ก1)	213	97.061	123.017	220.078	103.32%	97.061	108.115	205.176	96.33%
สสญ.	66	18.264	25.913	44.177	66.93%	18.264	8.272	26.536	40.21%
สสพ.	22	7.620	15.206	22.826	103.75%	7.620	15.206	22.826	103.75%
สสม.	25	13.113	16.005	29.118	116.47%	8.261	10.605	18.866	75.46%
สสส.	49	26.801	18.365	45.166	92.18%	9.586	17.572	27.158	55.42%
ขวก.(ก2)	162	65.798	75.489	141.287	87.21%	43.731	51.655	95.386	58.88%
สสช.	68	30.785	39.787	70.572	103.78%	30.785	33.175	63.960	94.06%
สสช.	51	26.715	25.681	52.396	102.74%	26.715	17.232	43.947	86.17%
สสมบ.	40	17.878	34.915	52.793	131.98%	17.878	25.861	43.739	109.35%
สสสภ.	59	0.000	62.793	62.793	106.43%	0.000	50.129	50.129	84.96%
ขวก.(ก3)	218	75.378	163.176	238.554	109.43%	75.378	126.397	201.775	92.56%
รวก.(กอ)	593	238.237	361.682	599.919	101.17%	216.170	286.167	502.337	84.71%
สสป.	73	0.000	82.758	82.758	113.37%	0.000	82.758	82.758	113.37%
สสด.	62	0.000	62.042	62.042	100.07%	0.000	62.042	62.042	100.07%
สสภ.	80	12.347	75.002	87.349	109.19%	12.347	75.002	87.349	109.19%
สสว.	70	0.000	70.069	70.069	100.10%	0.000	63.046	63.046	90.07%
ขวก.(ก4)	285	12.347	289.871	302.218	106.04%	12.347	282.848	295.195	103.58%
สสน.	57	31.473	35.905	67.378	118.21%	31.473	32.862	64.335	112.87%
สสบท.	43	31.452	50.581	82.033	190.77%	31.452	17.503	48.955	113.85%
สสมส.	57	0.000	67.114	67.114	117.74%	0.000	45.728	45.728	80.22%
ขวก.(ก5)	157	62.925	153.600	216.525	137.91%	62.925	96.093	159.018	101.29%
รวก.(กต)	442	75.272	443.471	518.743	117.36%	75.272	378.941	454.213	102.76%
Agenda base	165	0.000	134.278	134.278	81.38%	0.000	103.103	103.103	62.49%
กปน.	1,200	313.509	939.431	1252.940	104.41%	291.442	768.211	1059.653	88.30%

หมายเหตุ : ข้อมูลเบิกจ้าง-ลงนาม จาก Google sheet ณ 21 ก.ค. 64

ผลงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564

สาขา	คาดการณ์ ผลส่งมอบงาน	งานค้าง ก่อนปีงบฯ 64	ผลการลงนาม ปีงบฯ 64	ผลงานปรับปรุงท่อ						
				คาดการณ์ ถึงสิ้น ก.ค.64	รายเดือน ก.ค.64			สะสม (ต.ค.63-ก.ค.64)		
					แผนงาน	ผลงาน ณ 22 ก.ค.64	ผลต่าง +/-	แผนงาน	ผลงาน	ผลต่าง +/-
สสส.	55.400	35.000	55.052	0.000	2.000	0.000	(2.000)	37.000	33.751	(3.249)
สสพ.	72.000	31.000	65.855	2.827	12.000	2.827	(9.173)	50.000	70.045	20.045
สสป.	91.000	38.000	84.269	4.027	12.000	0.000	(12.000)	76.500	49.209	(27.291)
ขวก.(ก1)	218.400	104.000	205.176	6.854	26.000	2.827	(23.173)	163.500	153.005	(10.495)
สสญ.	45.100	30.500	26.536	5.360	3.500	5.360	1.860	35.500	22.128	(13.372)
สสท.	22.000	10.296	22.826	1.855	1.600	1.855	0.255	15.462	16.540	1.078
สสม.	12.400	2.000	18.866	0.000	0.000	0.000	0.000	12.000	5.083	(6.917)
สสล.	22.200	8.833	27.158	2.463	2.700	0.000	(2.700)	18.200	8.921	(9.279)
ขวก.(ก2)	101.700	51.629	95.386	9.678	7.800	7.215	(0.585)	81.162	52.672	(28.490)
สสช.	60.000	29.000	63.960	0.000	0.000	0.000	0.000	39.000	32.962	(6.038)
สสข.	45.000	21.000	43.947	0.000	5.000	0.000	(5.000)	34.000	25.171	(8.829)
สสมบ.	40.100	26.000	43.739	0.000	0.000	0.000	0.000	34.275	31.343	(2.932)
สสสภ.	59.800	18.895	50.129	2.000	12.000	0.000	(12.000)	35.000	28.513	(6.487)
ขวก.(ก3)	204.900	94.895	201.775	2.000	17.000	0.000	(17.000)	142.275	117.989	(24.286)
รวก.(กอ)	525.000	250.524	502.337	18.532	50.800	10.042	(40.758)	386.937	323.665	(63.272)
สสบ.	80.000	9.200	82.758	0.000	10.000	0.000	(10.000)	62.000	56.551	(5.449)
สสต.	62.000	22.000	62.042	8.059	6.000	8.059	2.059	34.000	37.019	3.019
สสภ.	90.000	21.000	87.349	10.000	11.000	9.438	(1.562)	67.000	90.265	23.265
สสว.	70.000	11.505	63.046	4.257	12.359	4.257	(8.102)	43.515	46.116	2.601
ขวก.(ก4)	302.000	63.705	295.195	22.316	39.359	21.754	(17.605)	206.515	229.951	23.436
สสน.	57.000	21.000	64.335	2.000	6.000	0.788	(5.212)	33.000	41.027	8.027
สสบท.	50.000	23.000	48.955	3.873	6.000	3.873	(2.127)	37.000	36.569	(0.431)
สสมส.	57.000	18.600	45.728	0.478	8.505	0.427	(8.078)	32.505	42.222	9.717
ขวก.(ก5)	164.000	62.600	159.018	6.351	20.505	5.088	(15.417)	102.505	119.818	17.313
รวก.(กต)	466.000	126.305	454.213	28.667	59.864	26.842	(33.022)	309.020	349.769	40.749
Agenda base	120.000	51.000	103.103	10.000	13.000	9.862	(3.138)	94.000	81.057	(12.943)
กปน.	1111.000	427.829	1059.653	57.199	123.664	46.746	(76.918)	789.957	754.491	(35.466)

หมายเหตุ : 1. งานค้างก่อนปีงบฯ 64 หมายถึง งานค้างที่สาขาคาดว่าจะส่งมอบงานภายในปีงบฯ 64

2. ผลการลงนามปีงบฯ 64 จาก Google sheet ณ วันที่ 21 ก.ค. 64 และคาดการณ์ผลงานปรับปรุงท่อ จาก Google sheet ณ วันที่ 22 ก.ค. 64 (9.00 น.)

3. ผลงานปรับปรุงท่อที่มีผลงานปรับปรุงท่อที่มีผลลดน้ำสูญเสียรวมอยู่สะสม 10.110 กิโลเมตร

แผนงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง)

สาขา	กิโลเมตรจัดสรร ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง)		
	สาขา	Agenda base	รวม
สสส.	63	7	70
สสพ.	69	16	85
สสป.	90	60	150
พื้นที่บริการ 1	222	83	305
สสญ.	66	4	70
สสท.	26	5	31
สสม.	26	4	30
สสล.	58	0	58
พื้นที่บริการ 2	176	13	189
สสช.	55	0	55
สสข.	53	0	53
สสมบ.	40	0	40
สสสภ.	55	0	55
พื้นที่บริการ 3	203	0	203
รวม.(กอ)	601	96	697
สสบ.	91	28	119
สสด.	70	7	77
สสภ.	80	9	89
สสว.	72	0	72
พื้นที่บริการ 4	313	44	357
สสน.	58	0	58
สสบท.	33	0	33
สสมส.	55	0	55
พื้นที่บริการ 5	146	0	146
รวม.(กต)	459	44	503
Agenda Base		140	140
กปน.	1,060	140	1,200

หมายเหตุ : ปรับปรุงตามแนวนโยบายลดน้ำสูญเสียในสาขาที่มีปริมาณน้ำรั่วสูง ณ 18 พ.ค.64

คาดการณ์ผลการส่งมอบงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียปีงบประมาณ 2564


หน่วย : กิโลเมตร

สาขา/ Agenda Base	คาดการณ์ผลการส่งมอบงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียปีงบประมาณ 2564												รวม
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ก.ค.	ก.ค.*	ส.ค.*	ก.ย.*	
สสส.	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	6.000	6.000	2.000	6.400	12.000	55.400
สสพ.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.000	12.000	12.000	10.000	72.000
สสป.	3.000	5.000	7.000	8.000	4.500	5.000	10.000	9.000	13.000	12.000	9.500	5.000	91.000
ขวก.(ก1)	11.000	12.000	14.000	15.000	11.500	12.000	18.000	19.000	25.000	26.000	27.900	27.000	218.400
สสญ.	1.000	1.500	3.500	2.000	3.000	6.500	3.000	5.500	6.000	3.500	4.500	5.100	45.100
สสท.	1.901	-	1.150	0.944	0.896	0.633	2.358	2.902	3.078	1.600	2.800	3.738	22.000
สสม.	0.500	1.000	-	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	0.400	12.400
สสล.	-	3.800	-	1.200	-	2.700	3.100	2.700	2.000	2.700	2.000	2.000	22.200
ขวก.(ก2)	3.401	6.300	4.650	5.144	5.396	11.833	10.458	13.102	13.078	7.800	9.300	11.238	101.700
สสข.	-	5.000	5.000	7.000	4.000	6.000	5.000	3.000	4.000	-	8.000	13.000	60.000
สสช.	-	4.000	7.000	3.000	4.000	3.000	3.000	2.000	3.000	5.000	1.000	10.000	45.000
สสมบ.	3.251	2.557	3.948	4.010	3.009	4.500	4.000	5.000	4.000	-	3.000	2.825	40.100
สสสภ.	3.000	1.600	0.800	1.400	1.600	1.700	2.300	3.000	7.600	12.000	12.000	12.800	59.800
ขวก.(ก3)	6.251	13.157	16.748	15.410	12.609	15.200	14.300	13.000	18.600	17.000	24.000	38.625	204.900
รวก.(กอ)	20.652	31.457	35.398	35.554	29.505	39.033	42.758	45.102	56.678	50.800	61.200	76.863	525.000
สสบ.	5.000	5.000	3.000	4.000	5.000	7.000	5.000	9.000	9.000	10.000	10.000	8.000	80.000
สสด.	1.000	6.855	1.990	5.455	1.500	1.500	1.500	2.200	6.000	6.000	13.000	15.000	62.000
สสภ.	5.000	0.500	5.000	5.000	5.000	6.500	8.000	8.000	13.000	11.000	11.000	12.000	90.000
สสว.	-	0.473	2.125	0.600	0.954	2.962	4.862	7.488	11.692	12.359	13.220	13.265	70.000
ขวก.(ก4)	11.000	12.828	12.115	15.055	12.454	17.962	19.362	26.688	39.692	39.359	47.220	48.265	302.000
สสน.	1.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	6.000	6.000	18.000	57.000
สสบท.	4.000	6.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	5.000	6.000	6.000	7.000	50.000
สสมส.	-	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.100	4.200	5.700	8.505	8.500	15.995	57.000
ขวก.(ก5)	5.500	9.500	6.000	7.500	8.500	8.500	8.600	13.200	14.700	20.505	20.500	40.995	164.000
รวก.(กต)	16.500	22.328	18.115	22.555	20.954	26.462	27.962	39.888	54.392	59.864	67.720	89.260	466.000
Agenda base	5.000	7.000	7.000	8.000	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	120.000
กปน.	42.152	60.785	60.513	66.109	60.459	75.495	80.720	96.990	123.070	123.664	141.920	179.123	1,111.000

หมายเหตุ : ผลการคาดการณ์ส่งมอบงานเป็นรายเดือน (ต.ค.64-มิ.ย.64) หน่วยเป็นกิโลเมตร/เดือน จาก Google sheet โดย สกส. สำนักงานประปาสาขา/Agenda base (แก้ไข ณ 22 ก.พ. 64)

* อัปเดตคาดการณ์ผลส่งมอบงานเดือน ก.ค., ส.ค. และ ก.ย.64 ณ 20 ก.ค.64

สถานะสัญญาจ้างบริหารจัดการข้อมูลและ CPM

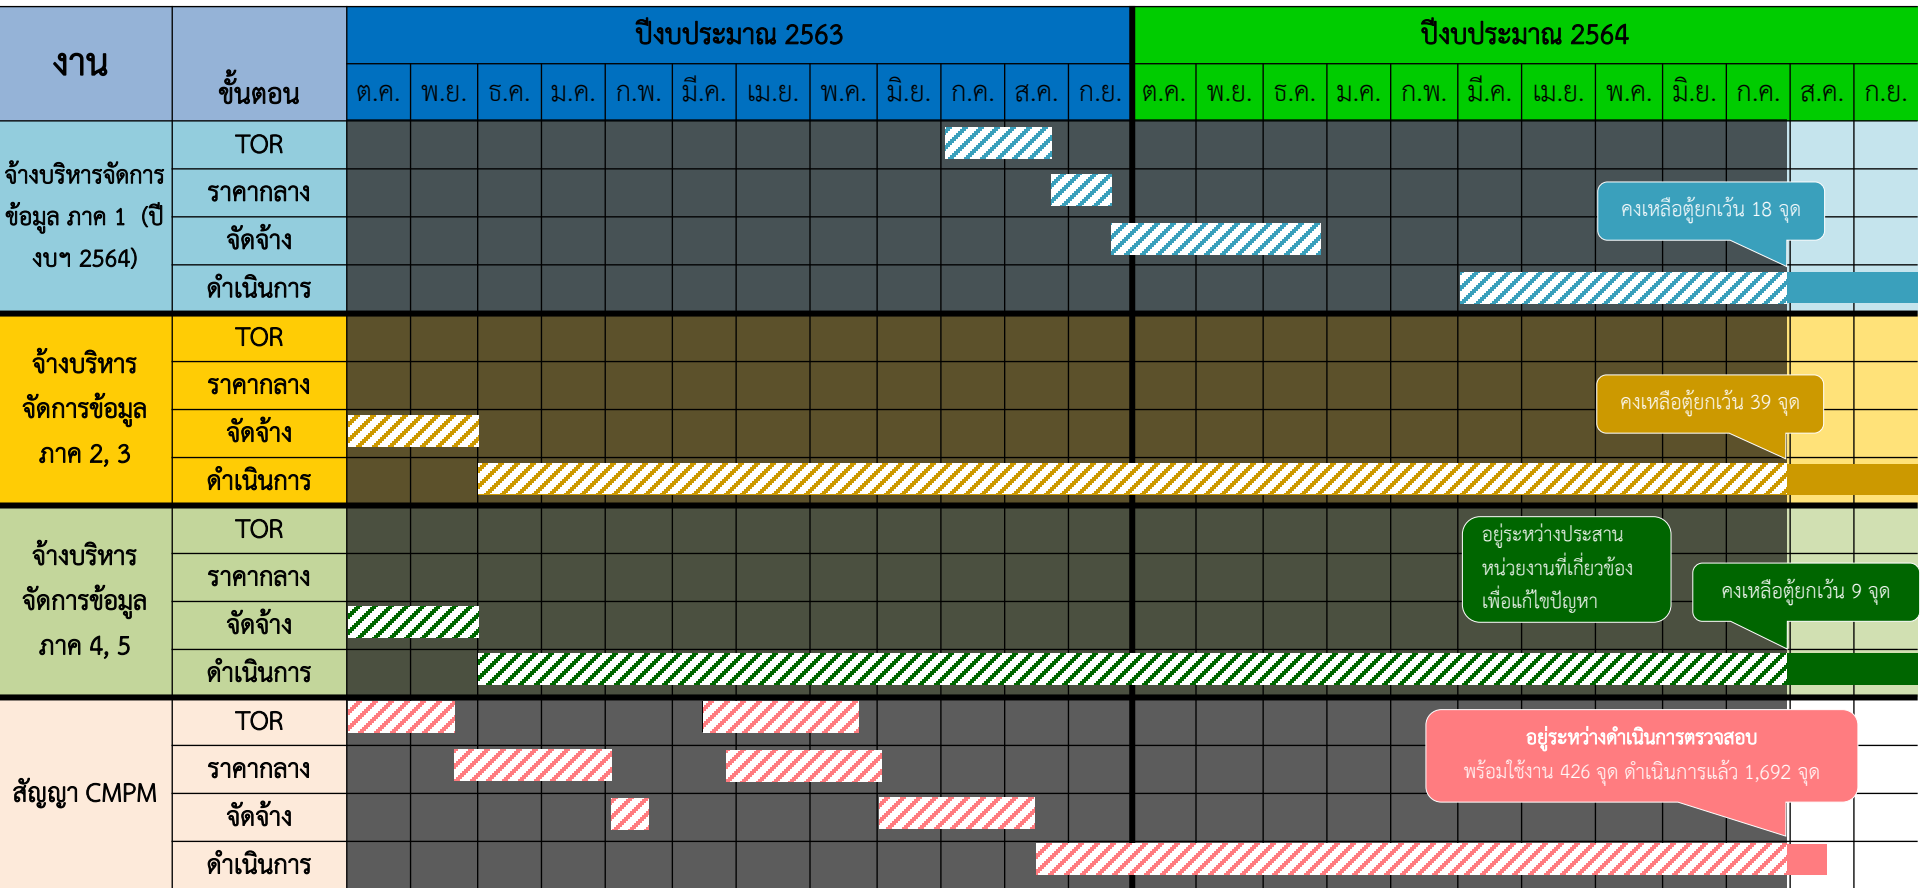

ผลงานปีงบ 2564

การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย (DMA) (สำนักงานประปาสาขา และ ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฝจส.))

ปีงบประมาณ 2564

สอบเทียบ/ ปรับปรุง RTU DMA

เป้าหมาย			ติดตั้งมาตร DMA / บำรุงรักษาและปรับปรุงในจุดที่สงสัย																				
รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2563												2564								
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งานปรับปรุงประสิทธิภาพ (ติดตั้งใหม่) ปีงบฯ 2564	27 จุด	20 ล้านบาท									A			B	C	D		E	F				
													A		B	C	D	E	F		ลงนามสัญญา 19 มี.ค. 64		
งานจ้างปรับปรุงทดแทนฯ ปีงบฯ 2564	400 จุด	80 ล้านบาท									A				B		C/D		E	F			
												A				B		C	D	E			
งานปรับปรุงประสิทธิภาพ (ติดตั้งใหม่) ปีงบฯ 2563	8 จุด	5 ล้านบาท	F																				
			D			E	F												งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ 19 ก.พ. 64				
งานจ้างปรับปรุงทดแทนฯ ปีงบฯ 2563	120 จุด	40 ล้านบาท (1 ปี)	F																				
			D			E	F												สิ้นสุดสัญญาฯ 28 พ.ค. 64				
งานจ้างปรับปรุงทดแทนฯ ปีงบฯ 2563	เพิ่มเติม 200 จุด	60 ล้านบาท					A		B/C		D	E	F										
							A		B/C		D	E	F										แจ้งเริ่มงานวันที่ 6 พ.ย. 63

หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฝจส.) ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค. 2564

หมายเหตุ

A

อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคาากลาง)

B

ยื่นเอกสารประกวดราคา

C

ตรวจเอกสาร

D

ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)

E

ลงนามสัญญา

F

ดำเนินงานตามสัญญา

แผนการดำเนินงาน

เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน

ล่าช้ากว่าแผน

รายงานสรุปผลการตรวจสอบมาตรฐานแม่เหล็กไฟฟ้า (สัญญา CPM)

สาขา	DM	% ดำเนินการ ตรวจสอบ แล้ว	พร้อมใช้งาน	มาตรฐาน วาระแต่ยัง ใช้งานได้	Sensor ชำรุด	Transmitter ชำรุด
พระโขนง	134	92.54	37	54	23	10
สมุทรปราการ	135	95.56	31	68	11	19
สุขุมวิท	135	100.00	41	80	2	12
ชวก.(ก1)	404	96.04	109	202	36	41
ทุ่งมหาเมฆ	91	100.00	11	50	1	29
พญาไท	91	96.70	11	22	5	50
แมนศรี	118	98.31	9	67	4	36
ลาดพร้าว	104	99.04	6	67	0	30
ชวก.(ก2)	404	98.51	37	206	10	145
บางเขน	66	100.00	41	22	1	2
ประชาชื่น	65	100.00	48	11	0	6
มีนบุรี	80	100.00	28	33	2	17
สุวรรณภูมิ	96	94.79	32	43	6	10
ชวก.(ก3)	307	98.37	149	109	9	35
รวก.(กอ)	1115	97.58	295	517	55	221
ตากสิน	116	100.00	9	89	14	4
บางกอกน้อย	97	100.00	25	56	11	5
ภาษีเจริญ	114	100.00	26	77	7	4
สุขสวัสดิ์	90	98.89	13	61	13	2
ชวก.(ก4)	417	99.76	73	283	45	15
นนทบุรี	70	100.00	28	35	4	3
บางบัวทอง	71	94.37	17	33	15	2
มหาสวัสดิ์	51	100.00	13	32	6	0
ชวก.(ก5)	192	97.92	58	100	25	5
รวก.(กต)	609	99.18	131	383	70	20
กปน.	1724	98.14	426	900	125	241

ยี่ห้อ	DM	% ดำเนินการ ตรวจสอบ แล้ว	พร้อมใช้ งาน	มาตรฐาน วาระแต่ยัง ใช้งานได้	Sensor ชำรุด	transmitter ชำรุด
ABB	720	98.06	115	481	90	20
Endress+Hauser	17	100.00	0	17	0	0
HYDROMETER	16	100.00	0	16	0	0
ISOIL	295	96.95	144	97	34	11
KROHNE	25	100.00	9	14	0	2
SIEMENS	288	97.22	156	102	0	22
YOKOGAWA	355	99.72	1	167	1	185
ไม่ทราบยี่ห้อ	8	1.00	1	6	0	1
ผลรวม	1724	98.14	426	900	125	241

หมายเหตุ : *ข้อมูลจากระบบ RTU Management วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น.

งานปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย

สัญญาเลขที่ ฝจส.ชล.1/2563 (จำนวน 8 จุด)

แผนการดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	ปีงบฯ 2563			ปีงบฯ 2564				
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ./มี.ค./เม.ย./ พ.ค./มิ.ย./กค.
1	ติดตั้งมิเตอร์/ตู้ RTU/เชื่อมโยงไฟฟ้า/ เชื่อมโยงระบบ SCADA และ WLMA/คินผิว								
2	เก็บรายละเอียดงานสัญญา และอื่นๆ							8 มค.64 (สิ้นสุด สัญญา)	

งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ววันที่ 24 ก.พ. 64 จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,265,031.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ปัจจุบันแก้ไขเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามที่ กตช. แจ้งให้แนบเพิ่มเติมเอกสารการใช้เรือไทย จากผู้ขาย (ผู้ขายแจ้งว่าได้รับเอกสารหลักฐานใบเสร็จค่าปรับจากกรมเจ้าท่าแล้ว 20 ก.ค.64 กำลังจัดส่งให้ กตช.)

รายละเอียดสัญญาฯ

ผู้ขาย

: บริษัท อาซาฮี-ไทย อีลล่อ

วันลงนามสัญญา

: 18 มีนาคม 2563

วันเริ่มงาน

: 14 พฤษภาคม 2563

ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ

: 240 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับหนังสือแจ้งจากการประปานครหลวงให้ส่งมอบพัสดุ

สิ้นสุดการส่งมอบ

: วันที่ 8 มกราคม 2564

วงเงินสัญญา

: 4,785,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ระยะเวลารับประกันความชำรุดฯ : 730 วัน นับถัดจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

งานติดตั้งเครื่องวัด DMA ใหม่ สัญญาเลขที่ ชล.30/2564

ในปีงบประมาณ 2564 (จำนวน 27 จุด)

แผนการดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	ปีงบ 63			ปีงบ 64											ปีงบ 65			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	ได้รับงบประมาณ/ประกาศแผนฯ /ขออนุมัติเบิกซื้อเบิกจ้าง																		
2	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งบประมาณ (20,000,000.- บาท) (กจขฝจพ 1564/2563 ลว. 16 กรกฎาคม 2563) ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง (จัดทำ TOR, ราคากลาง, ประกวดราคา)																		
3	ประกาศผลฯ																		
4	ลงนามสัญญาฯ/แจ้งเริ่มงาน																		
5	ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่/เริ่มดำเนินงาน																		
6	ตัดบรรจบ																		
7	ขอไฟฟ้า/คินผิว/เชื่อมโยงสัญญาณ/ทดสอบระบบ																		
8	ส่งมอบงาน																		
9	สิ้นสุดสัญญา/เก็บรายละเอียดงาน																		

ลงนามสัญญาวันที่ 19 มี.ค.64 (กจข.ฝจพ. แจ้งเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา (แก้ไขรายละเอียดวันแจ้งเริ่มงาน-สิ้นสุด) /ปัจจุบันบันทึกแนบท้ายสัญญาแล้วเสร็จ กจข. แจ้งเรื่องกลับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว /คาดว่าแจ้งเริ่มงานภายใน

ลงนามสัญญาวันที่ 19 มี.ค.64 (กจข.ฝจพ. แจ้งเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา (แก้ไขรายละเอียดวันแจ้งเริ่มงาน-สิ้นสุด) /ปัจจุบันบันทึกแนบท้ายสัญญาแล้วเสร็จ กจข. แจ้งเรื่องกลับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว /คาดว่าแจ้งเริ่มงานภายใน ก.ค.64)

สำรวจพื้นที่ ทำ Shop drawing ก่อนเข้าดำเนินการ (สำรวจพื้นที่ล่วงหน้าแล้ว 20 จุด)

หมายเหตุ จำนวนจุดในสัญญา 27 จุด (เป็นจุดงานในพื้นที่ กต. 6 จุด แบ่งเป็น สสท. 1 จุด สสบท. 2 จุด และ สสมส. 3 จุด) ระยะเวลาการดำเนินงาน 480 วัน

ความก้าวหน้างาน ผู้ขายบริษัท ABB จำกัด (ปัจจุบันลงนามบันทึกแนบท้ายเปลี่ยนแปลงสัญญาแล้ว) ขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนแจ้งเริ่มงาน (กำลังดำเนินการสำรวจพื้นที่ ทำ Shop drawing ก่อนเข้าดำเนินการ)

การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย (DMA) (สำนักงานประปาสาขา และ ผจส.)

ปีงบประมาณ 2564

สอบเทียบ/ปรับปรุง RTU DMA

เป้าหมาย			ปรับปรุงมาตรฐาน DMA / บำรุงรักษาและปรับปรุงในจุดที่สงสัย																								
รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2563												2564												
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
งานจ้างปรับปรุง ทดแทนฯ ปีงบฯ 2564	400 จุด	80 ล้านบาท										A			B		C/D		E		F						
													A			B		C		D		E		คาดว่าจะลงนามสัญญา ก.ค. 64			
งานจ้างปรับปรุง ทดแทนฯ ปีงบฯ 2563	120 จุด	40 ล้านบาท (1 ปี)	F												สิ้นสุดสัญญาฯ												
			D				E		F												28 พ.ค. 64						
งานจ้างปรับปรุง ทดแทนฯ ปีงบฯ 2563	เพิ่มเติม 200 จุด	60 ล้านบาท					A		B/C		D		E		F												สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 พ.ย. 64
							A		B/C		D		E		F												

คาดว่าจะลงนาม
สัญญา ก.ค. 64

สิ้นสุดสัญญา
28 พ.ค. 64

สิ้นสุดสัญญาวันที่
6 พ.ย. 64

หมายเหตุ

- A อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคาากลาง)
- B ยื่นเอกสารประกวดราคา
- C ตรวจเอกสาร

- D ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)
- E ลงนามสัญญา
- F ดำเนินงานตามสัญญา

- แผนการดำเนินงาน
- เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน
- ล่าช้ากว่าแผน

*** ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน กวท.ผจส. ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 2564

งานจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย (PBC) (สำนักงานประปาสาขา และ ฝจส.)

ปีงบประมาณ 2564

แผนงานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่ (PBC) (ปรับปรุงแผน ตุลาคม 2563)

ลำดับที่	กิจกรรม	2563					2564								
		ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	กลุ่ม 1 : 2 สัญญา ประกอบด้วย สสป. และ สสภ.														
	ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดทำสัญญาฯ และลงนาม														
	ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)														
2	กลุ่ม 2 : 11 สัญญา ประกอบด้วย สสส. สสป. สสญ. สสท. สสม. สสข. สสภ. สสบ. สสต. สสว. และ สสมส.														
	ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดทำสัญญาฯ และลงนาม														
	ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)														

อยู่ระหว่างการรอลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนามสัญญา ก.ค. 64

ขั้นตอนประกาศเชิญชวนประกอบด้วย 10 สัญญา และอยู่ระหว่างร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง จำนวน 1 สัญญา สาขาพระโขนง

อยู่ระหว่างการรอ
ลงนามสัญญา
คาดว่าจะลงนาม
สัญญา ก.ค. 64

ขั้นตอนประกาศเชิญชวนประกอบด้วย 10
สัญญา และอยู่ระหว่างร่างขอบเขตงาน (TOR)
และราคากลาง จำนวน 1 สัญญา สาขาพระ
โขนง

แผนการดำเนินงาน เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน ล่าช้ากว่าแผน

*** ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน กวท.ฝจส. ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 2564

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (สำนักงานประปาสาขา และ ฝจส.)

ปีงบประมาณ 2564

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

เป้าหมาย		จ้างสำรวจหาท่อรั่วด้วยดาวเทียม และบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยี Sensors																
รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปี 2563						ปี 2564									
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
สำรวจหาท่อรั่วด้วยดาวเทียม	15,000 กม.	9.64 ล้านบาท	A	B	C/D	E	F									งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ 1 ก.ค. 64		
			A	B	C/D	E	F											
งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยี Sensors	3 DMA (ประมาณการ)	15 ล้านบาท				A						B/C	D	E	F			
						A												

งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ 1 ก.ค. 64

หมายเหตุ

A

อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคาากลาง)

B

ยื่นเอกสารประกวดราคา

C

ตรวจเอกสาร

D

ดำเนินการขออนุมัติจ้าง

E

ลงนามสัญญา

F

ดำเนินงานตามสัญญา

แผนการดำเนินงาน

เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน

ล่าช้ากว่าแผน

*** ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน กวท.ฝจส. ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 2564

งานซื้อเครื่องมือสำหรับงานลดน้ำสูญเสียเพิ่มเติม (สำนักงานประปาสาขาและ ผจส.)

ปีงบประมาณ 2564

งานซื้อเครื่องมือสำหรับงานลดน้ำสูญเสีย

เป้าหมาย		ซื้อเครื่องมือสำหรับงานลดน้ำสูญเสีย														
รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2563					2564								
			ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งานซื้อเครื่องมือสำหรับงานลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564	299 เครื่อง	21.38 ล้านบาท			A								B	D	E/F	
					A											รอการได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ผังป.
งานซื้อเครื่องมือสำหรับงานลดน้ำสูญเสีย จำนวน 10 รายการ เลขที่ ผจส.ชล.2/2562	356 เครื่อง	15.73 ล้านบาท	F					ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาของสัญญาฯ และส่งมอบเครื่องมือฯ ให้สาขาได้ ภายใน ธ.ค.63								
			E	F												

รอการได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ผจป.

หมายเหตุ

- A อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคาากลาง)
- B ยื่นเอกสารประกวดราคา
- C ตรวจเอกสาร

- D ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)
- E ลงนามสัญญา
- F ดำเนินงานตามสัญญา

- แผนการดำเนินงาน
- เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน
- ล่าช้ากว่าแผน

ผลการปฏิบัติงานหน่วย ATTACK TEAM เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564

1) ผลการดำเนินงานกิจกรรมลดน้ำสูญเสียแรงดัน ปลายปีงบประมาณ 2564 สะสม : พื้นที่ สสว.

ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. – 20 ก.ค. 64 โดยทีมงาน **ATTACK TEAM** ผจส.

ลำดับที่	DMA	ผลการเดินสำรวจหาท่อรั่วสะสม				ผลซ่อมจากสาขาสะสม					MNF (ลบ.ม./ชม.) (WLMA)			
		จ่าย	บริการ	แคลมป์	อื่นๆ	จ่าย	บริการ	แคลมป์	อื่นๆ		ค่าติดตั้ง	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	Δ ผลต่าง จากค่าตั้ง ต้น
									ไม่พบ	ยกเลิก				
1	14-05-05	9	69	7	0	2	76	3	1	3	178	155	144	34
2	14-05-06	10	95	12	0	3	110	2	0	2	207	176	172	35
3	14-10-04	5	60	5	0	2	63	2	1	2	110	110	66	44
4	14-10-06	6	47	8	0	2	57	0	1	1	162	99	96	66
5	14-05-03	0	72	6	0	0	72	3	0	3	145	145	129	16
6	14-05-07	6	78	10	0	0	72	1	1	2	231	231	200	31
7	14-06-05	1	36	3	0	0	36	1	1	2	72	72	62	10
รวมทั้งหมด		37	457	51	0	9	486	12	5	15	1105	540	869	236

หมายเหตุ: จำนวนผลการเดินสำรวจหาท่อรั่วสะสม รวบรวมโดย ผจส.

: จำนวนผลซ่อมท่อจากสาขาสะสม รวบรวมโดย สสว. จากข้อมูลสถานะ "ภาคสนามเสร็จสิ้น" ในระบบ WLMA

: ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

ผลการปฏิบัติงานหน่วย ATTACK TEAM เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564

2) ผลการดำเนินงานกิจกรรมลดน้ำสูญเสียแรงดัน ปลายปีงบประมาณ 2564 สะสม : พื้นที่ สสบ.

ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. – 20 ก.ค. 64 โดยทีมงาน ผจส. ,สสบ. และ ทีมสนับสนุนจากสาขาพื้นที่บริการภาค 5

ลำดับ ที่	ทีมสาขา	DMA	ผลการเดินสำรวจหาท่อรั่วสะสม			ผลซ่อมท่อจากสาขาสะสม				MNF (ลบ.ม./ชม.) (WLMA)			
			จ่าย	บริการ	อื่นๆ	จ่าย	บริการ	อื่นๆ		ค่าตั้งต้น	มิ.ย.-64	ก.ค-64	Δ ผลต่าง ค่าตั้งต้น
								ไม่พบจุดรั่ว	ยกเลิกงาน				
1	สสน.	01-05-01	4	211	0	0	142	3	12	229	232	218	11
2		01-05-02	3	55	0	0	43	0	1	รอวัด UFM	รอวัด UFM	รอวัด UFM	รอวัด UFM
3		01-05-03	0	45	0	0	18	0	0	180	174	165	15
4		01-05-04	0	51	1	0	46	1	5	192	171	181	11
5		01-07-04 (ขวา)	2	51	0	0	39	0	1	95	95	96	-1
6	สสนส.	01-06-01	11	144	0	0	138	2	1	130	120	101	29
7		01-06-03	9	46	1	1	44	8	3	151	122	104	47
8		01-06-05 (ขวา)	2	19	2	1	9	0	0	142	100	106	36
9		01-08-02	3	48	0	0	51	0	0	รอวัด UFM	รอวัด UFM	รอวัด UFM	รอวัด UFM
10	สสบท.	01-06-05 (ซ้าย)	3	11	0	0	9	0	2	69	67	58	11
11		01-06-02	26	228	0	0	251	0	1	รอวัด UFM	รอวัด UFM	รอวัด UFM	รอวัด UFM
12		01-06-04	5	68	0	1	64	4	4	143	126	128	15
13		01-08-03	3	41	0	0	44	0	0	รอวัด UFM	รอวัด UFM	รอวัด UFM	รอวัด UFM
รวม			71	1,018	4	3	898	18	30	1,331	1,207	1,157	174

หมายเหตุ : จำนวนผลการเดินสำรวจหาท่อรั่วสะสม รวบรวมโดย ผจส.

: จำนวนผลซ่อมท่อจากสาขาสะสม รวบรวมโดย สสบ. จากข้อมูลสถานะ "ภาคสนามเสร็จสิ้น" ในระบบ WLMA

ตั้งแต่วันที่ 01-07-2564 ถึง 31-07-2564

ขอบคุณครับ
