



วาระที่ 4.1.1

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 12/2566
15 ธันวาคม 2566



หัวข้อเรื่อง



01




ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำเดือน พ.ย.66
และสะสม ต.ค.66 – พ.ย.66

02

การเบิกจ่ายแบบ Front Load
(วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท และ
ความก้าวหน้าการทำสัญญา)

03


งบค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่ว
และงานซ่อมท่อ PBC



01

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำเดือน ธันวาคม 2566

แผน - ผลเบิกจ่าย พ.ย.66 และสะสม ต.ค.66 - พ.ย.66

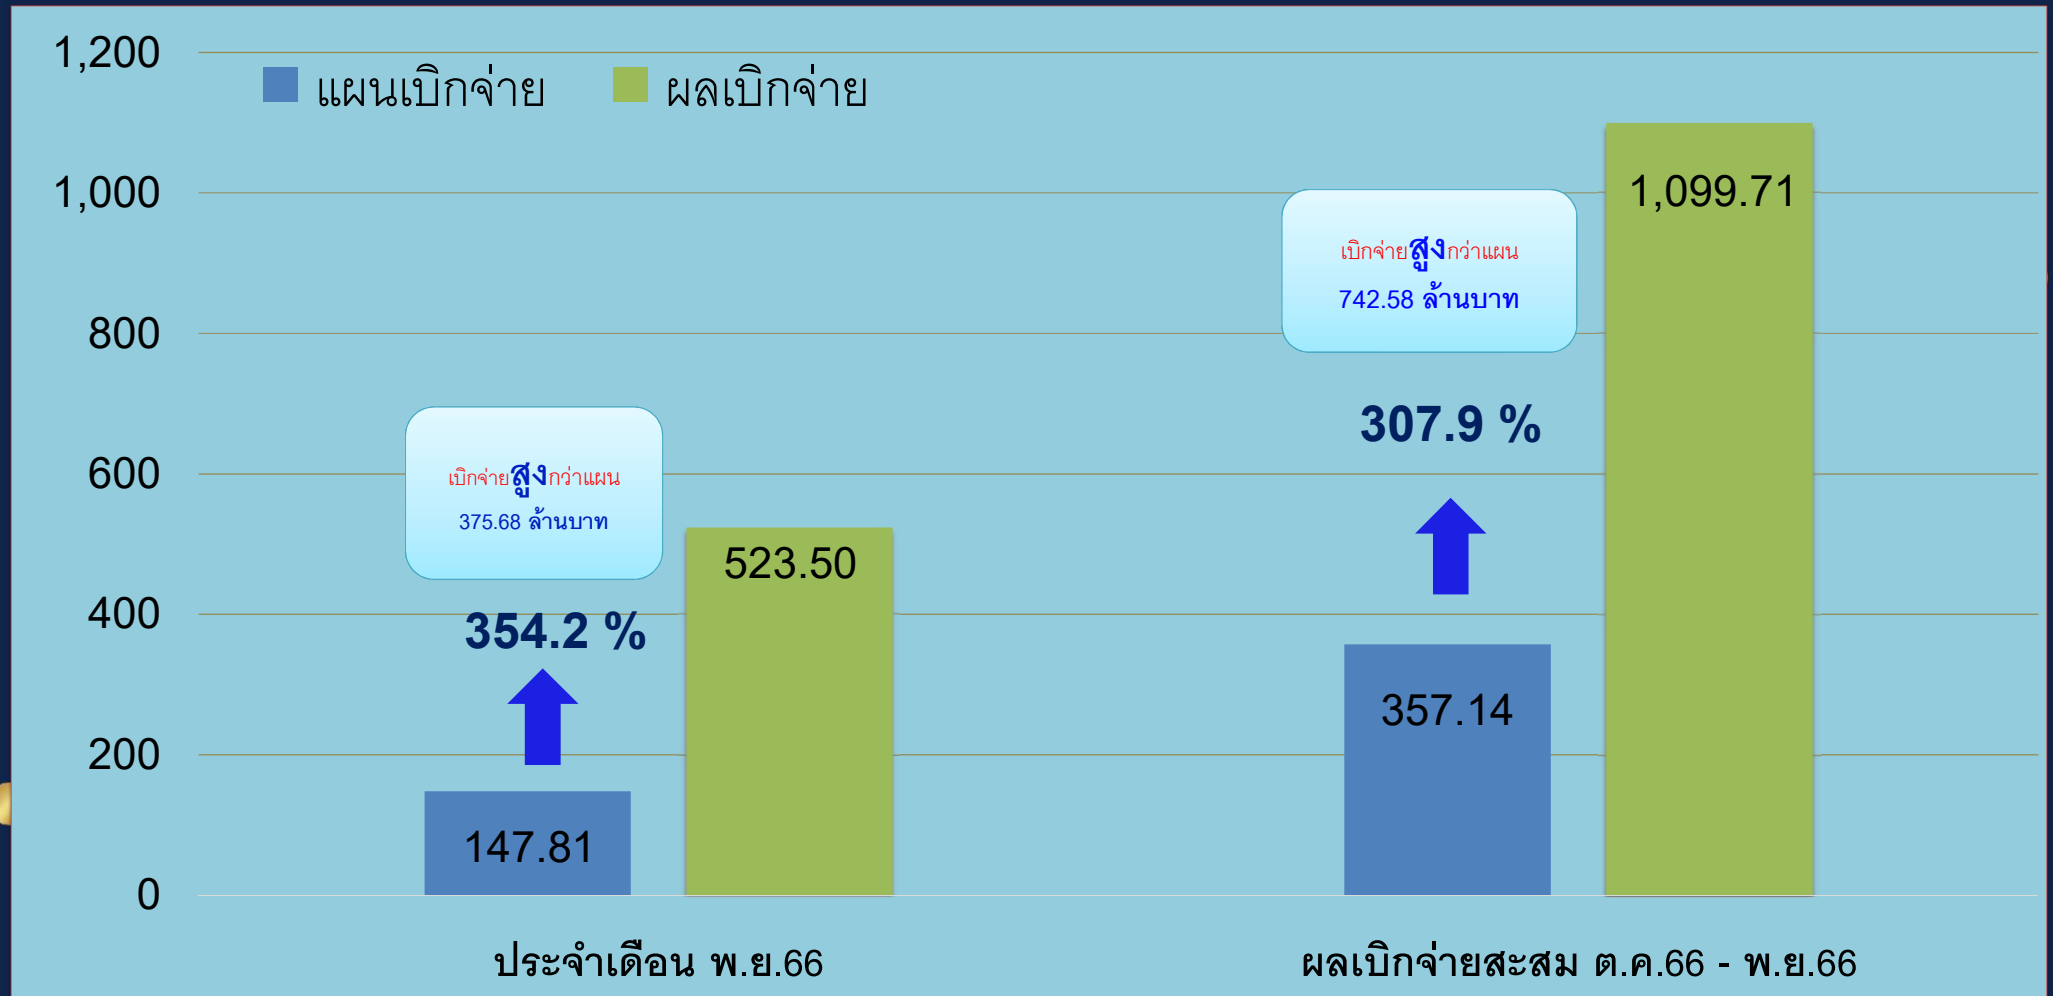

● แผน - ผลเบิกจ่าย พ.ย.66 และสะสม ต.ค.66 - พ.ย.66

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน พ.ย.66				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.66 — พ.ย.66			
	แผน พ.ย.66	ผล พ.ย.66	ผลต่าง	%	แผนสะสม	ผลสะสม	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	12.62	50.71	38.09	401.7%	26.57	79.69	53.12	300.0%
ลดน้ำสูญเสีย	76.26	328.15	251.89	430.3%	204.59	696.44	491.86	340.4%
มาตรวัดน้ำ	11.56	24.86	13.30	215.1%	15.30	36.53	21.23	238.7%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	2.98	4.20	1.21	140.7%	4.28	7.00	2.72	163.5%
ขยายเขตชุมชนเมือง	3.78	9.22	5.44	244.0%	4.95	22.24	17.29	449.6%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	1.07	2.26	1.19	212.0%	6.66	11.32	4.66	169.9%
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.00	5.04	5.04	-	0.75	5.53	4.78	736.0%
งานรับจ้างงาน	20.29	68.92	48.64	339.8%	42.79	167.27	124.47	390.9%
งานติดตั้งประปาใหม่	14.60	19.70	5.11	135.0%	28.03	45.16	17.14	161.1%
งานทดแทนระบบเฝ้าระวัง DMA	4.66	2.60	(2.06)	55.8%	23.22	15.77	(7.45)	67.9%
งานก่อสร้างอาคาร สสب.		7.85	7.85	-	0.00	12.76	12.76	-
รวมทั้งสิ้น	147.81	523.50	375.68	354.2%	357.14	1,099.71	742.58	307.9%

แผน - ผลเบิกจ่าย พ.ย.66 และสะสม ต.ค.66 - พ.ย.66

*****แผนเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567*****

อยู่ระหว่างคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนให้ความเห็นชอบ
หากได้รับความเห็นชอบแล้ว จะแจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบและ
บันทึกข้อมูลในระบบ CMS ต่อไป



การได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2567

0	ขอจัดสรรงบประมาณวงเงินดำเนินการเพิ่มเติม																
	งบปรับปรุงกำลังน้ำ			งบขยายเขตรับจ้างงาน			งบขยายเขตติดตั้งประปาใหม่			งบขยายเขต MOU			งบขยายเขตจำหน่ายน้ำ			รวมของบเพิ่มเติม	
สาขา	ค่าแรง	ค่าวัสดุอุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าวัสดุอุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าวัสดุอุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าวัสดุอุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าวัสดุอุปกรณ์	รวม	วงเงินดำเนินการ	แผนเบิกจ่ายส่วนเพิ่ม
สสพ	10,000,000.00		10,000,000.00										150,000.00	126,000.00	276,000.00	10,276,000.00	7,150,000.00
สสป	3,000,000.00		3,000,000.00				2,000,000.00	-	2,000,000.00	11,000,000.00	4,000,000.00	15,000,000.00				20,000,000.00	6,000,000.00
สสม				3,050,000.00	2,954,000.00	6,004,000.00										6,004,000.00	6,004,000.00
สสช				1,988,742.58	4,411,422.00	6,400,164.58	500,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00							8,150,164.58	5,211,422.00
สสข					10,000,000.00	10,000,000.00										10,000,000.00	5,000,000.00
สสมบ	7,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	10,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00							21,000,000.00	14,250,000.00
สสสภ				15,000,000.00	15,000,000.00	30,000,000.00				7,800,000.00	6,200,000.00	14,000,000.00				44,000,000.00	21,200,000.00
รวม.(กบ)	20,000,000.00	3,000,000.00	23,000,000.00	23,038,742.58	39,365,422.00	62,404,164.58	2,500,000.00	2,250,000.00	4,750,000.00	18,800,000.00	10,200,000.00	29,000,000.00	150,000.00	126,000.00	276,000.00	119,430,164.58	64,815,422.00
สสบ																	
สสค		9,000,000.00	9,000,000.00													9,000,000.00	9,000,000.00
สสภ				5,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00										8,000,000.00	3,000,000.00
สสว				21,000,000.00	20,000,000.00	41,000,000.00										41,000,000.00	20,000,000.00
รวม.(ก5)																	
สสน	25,000,000.00	2,200,000.00	27,200,000.00										420,000.00	145,000.00	565,000.00	27,765,000.00	2,465,000.00
สสบท		10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	35,000,000.00										45,000,000.00	24,350,000.00
สสมส	-	8,095,000.00	8,095,000.00	25,256,221.00	20,875,000.00	46,131,221.00	1,500,000.00	3,700,000.00	5,200,000.00							59,426,221.00	32,670,000.00
ฟ้จส																340,299,065.42	-
รวม.(กค)	25,000,000.00	29,295,000.00	54,295,000.00	71,256,221.00	58,875,000.00	130,131,221.00	1,500,000.00	3,700,000.00	5,200,000.00	-	-	-	420,000.00	145,000.00	565,000.00	530,490,286.42	91,485,000.00
กบ)+(กค)	45,000,000.00	32,295,000.00	77,295,000.00	94,294,963.58	98,240,422.00	192,535,385.58	4,000,000.00	5,950,000.00	9,950,000.00	18,800,000.00	10,200,000.00	29,000,000.00	570,000.00	271,000.00	841,000.00	649,920,451.00	156,300,422.00

คาดว่าได้รับจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 2 – 3 หากหน่วยงานได้ต้องการใช้งบประมาณเร่งด่วน
ขอให้โอนจากสาขาภาคเดียวกัน สายงานเดียวกันก่อน เมื่อได้รับจัดสรรงบเพิ่มเติมแล้ว จึงโอนงบประมาณคืน



การได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2567 - งบปรับปรุงกำลังน้ำ

งบปรับปรุงกำลังน้ำคลองเหลือ								
12-ธ.ค.-66								
ค่าแรง				ค่าตอบแทน				
สาขา	งบที่ได้รับจัดสรร	กัณวเงินสัญญา	%	วงเงินคงเหลือ	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกใช้จริง	%	วงเงินคงเหลือ
สสส	20,000,000.00	18,047,973.83	90.2%	1,952,026.17	24,000,000.00	-1,107,284.17	-4.6%	25,107,284.17
สสพ	15,000,000.00	10,726,285.05	71.5%	4,273,714.95	20,000,000.00	4,130,990.96	20.7%	15,869,009.04
สสป	16,000,000.00	11,475,979.44	71.7%	4,524,020.56	22,000,000.00	-120,706.50	-0.5%	22,120,706.50
สสท	6,000,000.00	934,500.00	15.6%	5,065,500.00	5,000,000.00	-405,640.22	-8.1%	5,405,640.22
สสม	6,000,000.00	3,000,000.00	50.0%	3,000,000.00	4,400,000.00	74,181.56	1.7%	4,325,818.44
สสญ	14,000,000.00	9,662,204.68	69.0%	4,337,795.32	7,500,000.00	-299,954.61	-4.0%	7,799,954.61
สสล	27,840,000.00	7,508,669.16	27.0%	20,331,330.84	11,360,000.00	3,147,557.42	27.7%	8,212,442.58
สสข	7,000,000.00	2,336,444.86	33.4%	4,663,555.14	13,000,000.00	430,935.47	3.3%	12,569,064.53
สสช	15,000,000.00	10,868,224.30	72.5%	4,131,775.70	12,000,000.00	4,590,812.94	38.3%	7,409,187.06
สสมบ	12,500,000.00	1,137,470.09	9.1%	11,362,529.91	17,500,000.00	1,027,439.37	5.9%	16,472,560.63
สสสภ	22,000,000.00	11,184,337.38	50.8%	10,815,662.62	22,000,000.00	6,162,306.62	28.0%	15,837,693.38
สสบ	15,000,000.00	7,887,394.39	52.6%	7,112,605.61	15,000,000.00	1,750,556.78	11.7%	13,249,443.22
สสค	19,700,000.00	15,000,000.00	76.1%	4,700,000.00	16,500,000.00	9,161,646.23	55.5%	7,338,353.77
สสภ	20,000,000.00	11,475,979.44	57.4%	4,524,020.56	20,000,000.00	533,554.41	2.7%	19,466,445.59
สสว	25,000,000.00	5,064,505.60	20.3%	19,935,494.40	20,000,000.00	5,372,633.19	26.9%	14,627,366.81
สสน	18,000,000.00	8,496,559.82	47.2%	9,503,440.18	20,000,000.00	2,681,435.36	13.4%	17,318,564.64
สสบท	22,000,000.00	3,028,308.41	13.8%	18,971,691.59	16,500,000.00	5,345,097.01	32.4%	11,154,902.99
สสมส	15,000,000.00	5,924,991.58	39.5%	9,075,008.42	17,000,000.00	3,293,250.98	19.4%	13,706,749.02
	296,040,000.00	143,759,828.03		148,280,171.97	283,760,000.00	45,768,812.80		237,991,187.20

คาดว่าได้รับจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 2 – 3 หากหน่วยงานได้ต้องการใช้งบประมาณเร่งด่วน

ขอให้โอนจากสาขาภาคเดียวกัน สายงานเดียวกันก่อน เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว จึงโอนงบประมาณคืน

การได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2567 — งบขยายเขตรับจ้างงาน

งบขยายเขต - รับจ้างงาน คงเหลือ								
12-ธ.ค.-66								
	ค่าแรง				ค่าตอบแทน			
สาขา	งบที่ได้รับจัดสรร	กัณวเงินสัญญา	%	วงเงินคงเหลือ	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกใช้จริง	%	วงเงินคงเหลือ
สสส	15,000,000.00	5,619,450.47	37.5%	9,380,549.53	20,000,000.00	1,278,210.18	6.4%	18,721,789.82
สสพ	20,000,000.00	2,103,645.78	10.5%	13,814,675.70	25,000,000.00	3,943,265.20	15.8%	21,056,734.80
สสป	32,000,000.00	32,000,000.00	100.0%	30,687,111.21	48,000,000.00	9,329,864.62	19.4%	38,670,135.38
สสท	1,500,000.00	457,871.03	30.5%	1,042,128.97	2,000,000.00	-165,843.44	-8.3%	2,165,843.44
สสม	3,950,000.00	1,600,000.00	40.5%	2,350,000.00	2,600,000.00	1,856,625.38	71.4%	743,374.62
สสน	2,500,000.00	272,000.00	10.9%	2,194,900.00	2,900,000.00	659,369.60	22.7%	2,240,630.40
สสล	5,300,000.00	1,488,833.65	28.1%	3,811,166.35	6,300,000.00	4,360,583.49	69.2%	1,939,416.51
สสช	7,000,000.00	2,696,225.23	38.5%	4,303,774.77	7,000,000.00	3,134,292.48	44.8%	3,865,707.52
สสข	24,000,000.00	859,950.47	3.6%	23,140,049.53	15,000,000.00	10,822,515.76	72.2%	4,177,484.24
สสบ	15,700,000.00	7,750,022.44	49.4%	7,949,977.56	21,300,000.00	12,685,350.63	59.6%	8,614,649.37
สสภ	34,800,000.00	9,606,610.32	27.6%	25,193,389.68	55,200,000.00	13,838,497.12	25.1%	41,361,502.88
สสบ	14,000,000.00	3,552,849.54	25.4%	10,447,150.46	14,000,000.00	2,494,498.18	17.8%	11,505,501.82
สสค	11,000,000.00	0.00	0.0%	11,000,000.00	13,000,000.00	462,847.51	3.6%	12,537,152.49
สสภ	15,000,000.00	8,298,054.21	55.3%	6,701,945.79	20,000,000.00	4,115,465.97	20.6%	15,884,534.03
สสว	25,000,000.00	11,185,324.30	44.7%	13,814,675.70	50,000,000.00	6,824,614.90	13.6%	43,175,385.10
สสน	8,000,000.00	3,644,859.81	45.6%	4,355,140.19	3,500,000.00	907,532.94	25.9%	2,592,467.06
สสบท	30,000,000.00	5,846,857.01	19.5%	24,153,142.99	39,000,000.00	14,051,549.93	36.0%	24,948,450.07
สสมส	20,000,000.00	17,390,701.89	87.0%	2,609,298.11	32,000,000.00	25,435,410.81	79.5%	6,564,589.19
	284,750,000.00	114,373,256.15		196,949,076.54	376,800,000.00	116,034,651.26		260,765,348.74

คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 2 – 3
หากหน่วยงานได้ต้องการใช้งบประมาณเร่งด่วน

ขอให้โอนจากสาขาภาคเดียวกัน
สายงานเดียวกันก่อน เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว
จึงโอนงบประมาณคืน

02

การเบิกจ่ายแบบ Front Load (วงเงินไม่เกิน
1 แสนบาท และความก้าวหน้าการทำสัญญา)

การเบิกจ่ายแบบ **Front Load** (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท และความก้าวหน้าการทำสัญญา)

วงเงินดำเนินการ	แนวทาง
ต่ำกว่า 100,000 บาท	ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายภายในเดือนตุลาคม 2566
100,000-500,000 บาท	ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2566)
เกินกว่า 500,000 บาท	ลงนามสัญญาภายในไตรมาสที่ 2 และวางแผนเบิกจ่ายตามงวดงาน



การเบิกจ่ายแบบ **Front Load** (วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท และความก้าวหน้าการทำสัญญา)

Front – Load ไม่เกิน 1 แสน

รวก.(กบ) คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
6 รายการ วงเงิน 221,600.00 บาท

รวก.(กต) คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
6 รายการ วงเงิน 237,430.00 บาท

ความก้าวหน้าสาขาที่ยังไม่ทำสัญญา **รวก.(กบ)**

ไม่เกิน 5 ล้านบาท ยังไม่ทำสัญญา
13 รายการ
ได้แก่ สสม. สสล. สสมบ.

เกิน 5 ล้านบาท ยังไม่ได้ทำสัญญา
10 รายการ ได้แก่ สสพ. สสป.
สสท. สสม. สสล. ฝตส.

ความก้าวหน้าสาขาที่ยังไม่ทำสัญญา **รวก.(กต)**

ไม่เกิน 5 ล้านบาท ยังไม่ทำสัญญา
9 รายการ ได้แก่ สสด. สสบท.
สสมส. ฝมน. ฝคจ. ฝสน.

เกิน 5 ล้านบาท ยังไม่ได้ทำสัญญา
26 รายการ ได้แก่ สสด. สสบท.
ฝจส. ฝคจ. ฝสน.

WARNING

ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย และ เร่งรัดการลงนามสัญญา

การเบิกจ่ายแบบ Front Load วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

รายงานบริการ (ด้านตะวันออก)											
รายการที่มีวงเงินดำเนินการต่ำกว่า 100,000 บาท											
ลำดับ	หน่วย งาน	WBS	รายการ	วงเงิน	เลขที่ PR/PO	วันที่ใน PR/PO	วงเงินที่กัน PO	วันที่ GR	ความคืบหน้า/แนวทางแก้ไข ตุลาคม	ความคืบหน้า/แนวทาง แก้ไข พฤศจิกายน	ความคืบหน้า/แนวทางแก้ไข ธันวาคม
4	สสน.	C-67.1.05.01.0261	ชุดโต๊ะสนาม	30,000.00	1100064269				คาดว่าจะ เดือน พ.ย.66	คาดว่าจะ เดือน พ.ย.66	
7	สสนบ.	C-67.1.05.01.0257	ชั้นวางกล่องเอกสาร3ชั้นขนาด1.50เมตรX1.50เมตร	9,000.00	3300061352	18.10.2023			อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ	คาดว่าจะเบิกจ่าย พ.ย.66	
8	สสนบ.	C-67.1.05.01.0258	ชั้นวางของ3ชั้น	3,600.00	3300061570	4.10.2023			อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ	คาดว่าจะเบิกจ่าย พ.ย.66	
9	สสนบ.	C-67.1.05.02.0035	ไมโครโฟนประชุมแบบประธาน	20,000.00	3300061313	6.12.2023	20,000.00		ไมโครโฟนประชุมแบบประธาน รื้อดำเนินการซื้อรวม ไมโครโฟน ผู้เข้าร่วมและชุดควบคุมจ่ายไฟ ซึ่งจะดำเนินการ 5.ค.66 วงเงินดำเนินการรวม 440,000 บาท		คาดการณ์เบิกจ่าย 5.ค.66
10	สสนบ.	C-67.1.05.05.0027	ถังเก็บน้ำประปาขนาด2,000ลิตร	84,000.00	3300061817				อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดงบประมาณและจุด ติดตั้ง จากติดตั้งคาดฟ้า ติดตั้งชั้น 1		
13	สสท.	C-67.2.02.03.0472	เครื่องอ่านบาร์โค้ด	75,000.00	3300061391	2.10.2023		24.10.2023			

รายงานบริการ (ด้านตะวันตก)										
รายการที่มีวงเงินดำเนินการต่ำกว่า 100,000 บาท										
ลำดับ	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	เลขที่ PR/PO	วันที่ใน PR/PO	วงเงินที่กัน PO	วันที่ GR	ความคืบหน้า/แนวทางแก้ไข พฤศจิกายน	
67	สสค. แผนจ่าย ม.ย.67	C-67.1.05.01.0374	โต๊ะบาร์สำหรับบริการลูกค้า	5,800.00					จะทำเรื่องขออนุมัติเบิกซื้อในเดือน เม.ย.67 และเบิกจ่ายภายในเดือน ม.ย.67 เนื่องจากขอปรับแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับ	
68	สสค. แผนจ่าย ม.ย.67	C-67.1.05.01.0375	โต๊ะบาร์ขนาดใหญ่(สั่งทำ)	39,000.00					ระยะเวลาแล้วเสร็จของอาคารที่มีการก่อสร้างและปรับปรุงใหม่	
69	สสค. แผนจ่าย ม.ย.67	C-67.1.05.01.0119	เก้าอี้สตูลบาร์ไม้สำหรับบริการลูกค้า	49,000.00					จะทำเรื่องขออนุมัติเบิกซื้อในเดือน เม.ย.67 และเบิกจ่ายภายในเดือน ม.ย.67 เนื่องจากขอปรับแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับ	
70	สสค. แผนจ่าย ม.ย.67	C-67.1.05.01.0120	เก้าอี้สำนักงาน	73,630.00					ระยะเวลาแล้วเสร็จของอาคารที่มีการก่อสร้างและปรับปรุงใหม่	
71	ฝมน. แผนจ่าย 5.ค.66	C-67.1.03.01.0026	เครื่องวัดอัตราการไหลขนาด1นิ้ว	30,000.00	3300061992	25.10.2023	28,000.00	5.ค. 66	จะทำเรื่องขออนุมัติเบิกซื้อในเดือน เม.ย.67 และเบิกจ่ายภายในเดือน ม.ย.67 เนื่องจากขอปรับแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับ	
72	ฝมน. แผนจ่าย 5.ค.66	C-67.1.03.01.0027	เครื่องวัดอัตราการไหลขนาด2นิ้ว	40,000.00	3300061988	25.10.2023	35,500.00	5.ค. 66	จัดทำสัญญาซื้อ(PO)แล้ว รอรับพัสดุลงนามรับใบ PO คาดว่าลงนามได้ภายใน 30 พ.ย. 66	
									จัดทำสัญญาซื้อ(PO)แล้ว รอรับพัสดุลงนามรับใบ PO คาดว่าลงนามได้ภายใน 30 พ.ย. 66	

ความก้าวหน้าการลงนามสัญญาภายในไตรมาสที่ 1 – รวก.(กอ)

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	WBS	ประเภท WBS	สัญญา	รายการ	แผนทำสัญญา		เลขที่ PR/PO	วันที่ใน PR/PO	วงเงินที่กัน PO
2	สสมบ.	C-67.1.02.02.0004	ประจำปี		งานติดตั้งโครงหลังคาจุดบริการเครื่องดื่มอาร์โอ	ต.ค. 66	100,000.00	1100063664	9.10.2023	
3	สสมบ.	C-67.1.05.02.0028	ประจำปี		งานระบบเสียงลำโพงห้องประชุม สสมบ. พร้อมติดตั้ง	ยกลึก	106,700.00			
4	สสมบ.	C-67.1.05.02.0029	ประจำปี		ชุดควบคุมและจ่ายไฟ(ชุดประชุม)แบบบันทึกเสียงได้	พ.ย. 66	120,000.00			
7	สสส.	C-67.1.05.02.0041	ประจำปี		ระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง สสส.	ม.ค. 67	160,000.00			
8	สสส.	C-67.1.02.02.0012	ประจำปี		งานปรับปรุงรางระบายน้ำ สำนักงานประปาสาขาตลาดพร้าว	ต.ค. 66	231,500.00			
10	สสช.	C-67.1.02.02.0007	ประจำปี		งานปรับปรุงป้ายสำนักงานประปาสาขาบางเขน	ต.ค. 66	251,500.00			
11	สสป.	C-67.1.02.02.0016	ประจำปี		งานปรับปรุงห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	พ.ย. 66	279,800.00			
12	สสมบ.	C-67.1.05.02.0036	ประจำปี		ไมโครโฟนประชุมแบบผู้เข้าร่วม	พ.ย. 66	300,000.00			
13	สสมบ.	C-67.1.02.02.0022	ประจำปี		งานปรับปรุงห้องส่วนซ่อมบำรุงระบบโยธา กองบำรุงรักษา สสมบ.	พ.ย. 66	301,200.00			
14	สสช.	C-67.1.02.02.0015	ประจำปี		งานปรับปรุงหลังคา อาคาร 2	ต.ค. 66	355,300.00			
16	สสม.	C-67.1.02.02.0002	ประจำปี		งานจ้างปรับปรุงประตูหนีไฟ	ต.ค. 66	400,000.00	1100064229	03.11.2023	400,000.00
17	สสช.	C-67.1.02.02.0014	ประจำปี		งานปรับปรุงหลังคา อาคาร 1	ต.ค. 66	410,100.00			
19	สสมบ.	C-67.1.02.01.0001	ประจำปี		งานก่อสร้างห้องน้ำ อาคาร 2 ชั้น 1 สสมบ.	พ.ย. 66	460,000.00			
20	สสช.	C-67.1.02.02.0020	ประจำปี		งานปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 1	ต.ค. 66	465,500.00			
22	สสม.	C-67.1.02.02.0024	ประจำปี		งานปรับปรุงอาคารลูกค้าสัมพันธ์สำนักงานประปา (สาขาแม่จันทร์)	พ.ย. 66	647,500.00	1100063835	16.10.2023	647,500.00
24	สสม.	C-67.1.02.02.0003	ประจำปี		งานจ้างปรับปรุงหลังคาจอดรถ สสม.	พ.ย. 66	1,100,000.00	1100064221	02.11.2023	1,100,000.00
25	สสมบ.	C-67.1.05.01.0453	ประจำปี		ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง (สสมบ.)	ก.พ. 67	1,569,100.00			
26	สสพ.	C-67.1.02.02.0008	ประจำปี		งานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 สำนักงานประปาสาขาพระโขนง	พ.ย. 66	1,787,400.00	1100063700	10.10.2023	
27	สสป.	C-66.1.04.01.0006	ผูกพันดำเนินการ	ชล.16/2566	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกทุกน้ำ	ต.ค. 66	2,336,500.00			

ความก้าวหน้าการลงนามสัญญาภายในไตรมาสที่ 2 – รวก.(กอ)

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	WBS	ประเภท WBS	สัญญา	รายการ	แผนทำสัญญา	เลขที่ PR/PO	วันที่ใน PR/PO	วงเงินที่กัน PO
28	สสพ.	C-67.1.02.02.0009	ประจำปี		งานปรับปรุงพื้นที่บริการ บริเวณชั้น 1 สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท – พระโขนง	ธ.ค. 66	2,520,700.00	1100063705	10.10.2023
30	สสส.	C-67.1.02.02.0010	ประจำปี		งานปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร 1 ชั้น 2,3 สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว	ม.ค. 67	3,769,000.00		
31	สสมบ.	C-66.1.02.02.0019	ผูกพันดำเนินการ		ปรับปรุงหลังคาอาคารชั้นลาดฟ้า สสมบ.	เม.ย. 67	4,500,000.00		
32	สสมบ.	C-66.1.02.03.0002	ผูกพันดำเนินการ		ปรับปรุงถนน ลานจอดรถ	เม.ย. 67	4,900,000.00		
33	สสท.	C-67.1.02.02.0001	ประจำปี		โครงสร้างและระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์		5,700,000.00		
34	ฝตส.	C-66.2.02.10.0001	ผูกพันดำเนินการ		โครงการปรับปรุงระบบCallCenter	เม.ย. 67	33,298,015.00		
ยกเลิกรายการลงทุน									
รวม							71,908,315.00		
รวม							136,989,030.00		
รวมทั้งสิ้น							137,636,530.00		

ความก้าวหน้าการลงนามสัญญาภายในไตรมาสที่ 1 – รวก.(กต)

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	ประเภท WBS	รายการ	แผนทำสัญญา		เลขที่ PR/PO	วันที่ใน PR/PO
					เดือน	วงเงิน		
1	สสค.	C-67.1.05.01.0376	ประจำปี	โต๊ะประชุม	พ.ค. 67	100,020.00		
3	ฝคจ.	C-67.1.05.06.0011	ประจำปี	เครื่องสูบน้ำดูดโคลน ขนาด 3 นิ้ว	ต.ค. 66	110,000.00		
9	สสบท.	C-67.1.02.02.0018	ประจำปี	งานปรับปรุงห้องน้ำผู้จัดการสาขา	ต.ค. 66	176,800.00		
11	ฝคจ.	C-67.1.03.01.0022	ประจำปี	เครื่องมือวัดแก๊สแบบพกพา	ต.ค. 66	220,000.00		
13	สสค.	C-67.1.05.04.0012	ประจำปี	โทรทัศน์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 75 นิ้ว สมาร์ททีวี (สามารถคัดลอกการแสดงผลหน้าจอจากมือถือไปยังโทรทัศน์ได้แบบไร้สาย)	เม.ย. 67	252,600.00		
14	ฝสน.	C-67.1.03.03.0030	ประจำปี	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายใน Pump Floor ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำลาดพร้าวและสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำลาดกระบัง	ต.ค. 66	340,000.00		
15	สสบท.	C-67.1.02.02.0019	ประจำปี	งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 ชั้น 2	ต.ค. 66	348,000.00		
18	สสมส.	C-67.1.02.02.0013	ประจำปี	งานปรับปรุงโรงอาหาร สำนักงานประชาสัมพันธ์มหาสวัสดิ์	ม.ค. 67	496,800.00		
19	ฝสน.	C-67.1.03.03.0008	ประจำปี	จ้าง Overhaul Supply Fan หมายเลข 1-5 ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำคลองเตย และ หมายเลข 1-5 ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำเพชรเกษม	มี.ค. 67	800,000.00	1100064414	02/10/2566
20	ฝสน.	C-67.1.03.03.0004	ประจำปี	งานซื้อพร้อมติดตั้ง Control Desk และอุปกรณ์ สว.สำโรง	ธ.ค. 66	1,000,000.00	1100064413	02/10/2566
22	สสค.	C-67.1.04.01.0009	ประจำปี	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ พร้อมต่อตู้เครื่องมือ 83-122-4 SPE.		1,500,000.00		
23	สสบท.	C-67.1.02.02.0021	ประจำปี	งานปรับปรุงห้องประชุมสาขางบวทอง	ธ.ค. 66	1,760,000.00		
24	ฝสน.	C-67.1.03.03.0006	ประจำปี	จ้าง Overhaul Crane ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำลาดพร้าว และ สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำคลองเตย	ก.พ. 67	2,000,000.00	1100064408	02/10/2566
26	สสบท.	C-66.1.02.02.0008	ผูกพันดำเนินการ	งานปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถสำหรับลูกค้า	ม.ค. 67	2,280,000.00		
27	ฝสน.	C-67.1.03.03.0020	ประจำปี	ซื้อพร้อมติดตั้ง Radio Tower แบบ Self support พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำคลองเตย	ธ.ค. 66	2,500,000.00	1100064415	02/10/2566
29	ฝสน.	C-66.1.02.02.0012	ผูกพันดำเนินการ	จ้างปรับปรุงห้อง Switchgear ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำลุมพินี และสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ	ต.ค. 66	3,000,000.00	1100058218	04/10/2565
30	ฝสน.	C-65.1.04.01.0012	ผูกพันดำเนินการ	รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า	ก.ย. 66	3,300,000.00		

ความก้าวหน้าการลงนามสัญญาภายในไตรมาสที่ 2 — รวก.(กต)

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	ประเภท WBS	รายการ	แผนทำสัญญา		เลขที่ PR/PO	วันที่ใน PR/PO
					เดือน	วงเงิน		
31	ฝสน.	C-67.1.03.03.0017	ประจำปี	ซื้อพร้อมติดตั้ง Electric Actuator พร้อมเกียร์ทด และสายไฟ Power Control and Signal สำหรับ Submerge Discharge Valve No.1,2,3,4 ที่สถานีสูบน้ำลาดพร้าว	ก.พ. 67	3,500,000.00	1100064416	02/10/2566
33	ฝคจ.	C-66.1.04.01.0008	ผูกพันดำเนินการ	รถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน พร้อมติดตั้งเครนแขนยึด	ธ.ค. 66	5,000,000.00		
34	ฝสน.	C-67.1.03.01.0035	ประจำปี	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง อาคารศูนย์ควบคุมระบบส่งและสูบน้ำ โรงงานผลิตน้ำสามเสน 2	เม.ย. 67	5,500,000.00		
35	ฝสน.	C-66.1.06.02.0029	ผูกพันดำเนินการ	งานซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer) ขนาด 7.5 MVA และสวิตช์เกียร์แรงดัน 115 kV ชนิด Hybrid Compact Switchgear พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สจ.มันบุรี	ส.ค. 66	5,685,633.33		
37	ฝสน.	C-67.1.03.03.0002	ประจำปี	งานจ้าง Overhaul เครื่องปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ Allen-Bradley รุ่น PowerFlex7000 หมายเลข 4 ที่สถานีสูบน้ำลาดพร้าว และหมายเลข 5 ที่สถานีสูบน้ำลำโรง	ธ.ค. 66	6,000,000.00	1100064418	02/10/2566
42	ฝจส.	C-66.1.06.02.0057	ผูกพันดำเนินการ	งานซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ดำเนินการโครงการพื้นที่ทดลองระบบบริหารจัดการแรงดันน้ำอัจฉริยะ (Smart Pressure Management)		9,345,000.00		
44	ฝจส.	C-67.1.05.06.0015	ประจำปี	งานซื้อเครื่องมือสำหรับงานลดน้ำสูญเสีย	ก.พ. 67	10,000,000.00		
45	ฝจส.	C-67.1.05.06.0016	ประจำปี	งานติดตั้งเครื่องวัด DMA ใหม่	มี.ย. 67	10,000,000.00		
46	ฝคจ.	C-64.1.03.02.0012	ผูกพันดำเนินการ	รถ excavator ล้อยางเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 170 แรงม้า	พ.ย. 66	12,000,000.00		
47	ฝสน.	C-67.1.03.03.0003	ประจำปี	งานจ้าง Overhaul เครื่องปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ ABB รุ่น ACS1000 หมายเลข 1 ที่สถานีสูบน้ำคูมพินี หมายเลข 4 ที่สถานีสูบน้ำเพชรเกษมและหมายเลข 2,3,5 ที่สถานีสูบน้ำบางพลี	ธ.ค. 66	13,500,000.00	1100064419	02/10/2566
48	ฝสน.	C-67.1.03.03.0005	ประจำปี	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ สำหรับอุปกรณ์ Power Electronics ที่สถานีสูบน้ำลาดกระบังและสถานีสูบน้ำท่าพระ	ม.ค. 67	15,000,000.00		
49	ฝคจ.	C-67.1.03.03.0027	ประจำปี	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลชนิดใช้คลื่นอัลตราโซนิก แบบติดตั้งรัดติดกับท่อและฝังกลบถาวร	ธ.ค. 66	16,000,000.00		
51	ฝคจ.	C-67.1.03.03.0028	ประจำปี	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลและเครื่องวัดแรงดันในระบบท่อประธาน	มี.ค. 67	22,000,000.00		
52	ฝสน.	C-66.1.03.03.0031	ผูกพันดำเนินการ	ซื้อพร้อมติดตั้งคลอรีนปายสายที่สถานีสูบน้ำคลองเตย ท่าพระ ราชบุรีบรณะ และเพชรเกษม พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	ก.พ. 67	24,000,000.00		

ความก้าวหน้าการลงนามสัญญาภายในไตรมาสที่ 2 — รวก.(กต)

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	ประเภท WBS	รายการ	แผนทำสัญญา		เลขที่ PR/PO	วันที่ใน PR/PO
					เดือน	วงเงิน		
53	ฝคจ.	C-67.1.03.03.0001	ประจำปี	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมประตูน้ำระยะไกล (Remote Control Valve)	มี.ค. 67	25,000,000.00		
54	สสب.	C-63.2.24.02.0001	ผูกพันดำเนินการ	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย	ม.ค.67	37,547,663.84		
55	ฝจส.	C-67.1.05.06.0017	ประจำปี	งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำระบบเผาระวังน้ำสูญเสียที่ชำรุด	ก.พ. 67	60,000,000.00		
56	ฝสน.	C-66.2.42.01.0001	ผูกพันดำเนินการ	งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำพหลโยธินพร้อมงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ก.ย. 67	780,000,000.00		
57	ฝมบ. แผนจ่าย ม.ค.67	C-66.1.06.02.0051		งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำ		348,250.00		
						948,547,663.84		

03

งบค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่ว
และงานซ่อมท่อ PBC

งบค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่ว และ งานซ่อมท่อ PBC

1.

งานซ่อมท่อ PBC 5
สาขา สิ้นสุดสัญญา
ได้แก่ สสป. สสบ.
สสต. สสภ. และ สสว.

2.

สาขาต้องการวงเงิน
รองรับงานซ่อมท่อ
พื้นที่ PBC สำหรับที่
อยู่ระหว่างจัดทำ
สัญญา หรือ ขอ
VO แบนท้ายสัญญา
เพิ่มเติม

3.

สาขาที่ไม่มีสัญญา
PBC ทำให้กระทบ
ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ
(ปกติ) และต้องการ
งบประมาณเพิ่มเติม

4.

หาแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณ
แตกรั่วเพิ่มเติม



งบค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่ว และ งานซ่อมท่อ PBC

รายละเอียดการดำเนินงานซ่อมท่อ (ปกติ) (งบทำการ ประจำปีงบประมาณ 2567)

รายละเอียดผลการดำเนินงานใช้งบประมาณงานซ่อมท่อ (ปกติ) (งบทำการ) ประจำปีงบประมาณ 2567																
ลำดับที่	สาขา	งบประมาณที่ได้รับ ปี 2567 (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (ต.ค.66 - พ.ย.66) (บาท)	งบประมาณคงเหลือ ณ เดือน ธ.ค. 66 (บาท)	คาดการณ์งบประมาณที่ใช้ (บาท)										รวมงบประมาณใช้จริง (บาท)	ของงบประมาณเพิ่มเติม (บาท)
					ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67		
1	สสป	34,900,000.00	5,477,886.72	29,422,113.28	4,110,000.00	4,120,000.00	4,150,000.00	4,150,000.00	4,150,000.00	3,350,000.00	3,350,000.00	3,350,000.00	3,350,000.00	3,350,000.00	42,907,886.72	8,007,886.72
2	สสบ	27,425,800.00	2,652,342.51	24,773,457.49	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	3,580,000.00	3,580,000.00	3,623,637.87	3,698,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	5,700,000.00	36,833,980.38	9,408,180.38
3	สสภ	16,045,300.00	14,112,149.52	1,933,150.48	13,000,000.00			10,000,000.00			10,000,000.00				47,112,149.52	31,066,849.52
4	สสด	22,867,000.00	9,883,570.01	12,983,429.99	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	29,883,570.01	7,016,570.01
5	สสว	23,138,300.00	3,536,335.36	19,601,964.64	2,809,000.00	2,809,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	4,050,000.00	4,100,000.00	4,050,000.00	36,604,335.36	13,466,035.36
รวม		124,376,400.00	35,662,284.12	88,714,115.88	24,719,000.00	11,729,000.00	12,000,000.00	22,780,000.00	12,780,000.00	12,023,637.87	22,098,000.00	12,200,000.00	12,250,000.00	15,100,000.00	193,341,921.99	68,965,521.99
																ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค.66
หมายเหตุ : สด. แจ้งว่า อนาคต สาขาภาษีเจริญ จะขอโอนงบนี้ เป็นจำนวน 2,000,000 บาท เพราะฉะนั้นจะเหลือเงิน ณ เดือน ธ.ค.66 แต่ 10,983,429.99 บาท																

หมายเหตุ : สสค. แจ้งว่า อนาคต สาขาภาษีเจริญ จะขอโอนงบนี้ เป็นจำนวน 2,000,000 บาท เพราะฉะนั้นจะเหลือเงิน ณ เดือน ธ.ค.66 แค่ 10,983,429.99 บาท

ที่มา : กวท.ฟอส.



Thank You

