



วาระที่ 4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 3/2567

20 มีนาคม 2567



Table of Contents.



01.

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำเดือน ก.พ.67
และสะสม ต.ค.66 - ก.พ.67



02.

การเบิกจ่ายแบบ Front Load



03.

มติคณะเร่ร็ดเบิกจ่ายงบลงทุน



04.

การจัดสรรงบค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ
(ปกติ) และ ค่าท่ออุปกรณ์เพิ่มเติม

01

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำเดือน ก.พ.67
และสะสม ต.ค.66 – ก.พ.67

แผน - ผลเบิกจ่าย ก.พ.67 และสะสม ต.ค.66 - ก.พ.67



แผน – ผลเบิกจ่าย ก.พ.67 และสะสม ต.ค.66 – ก.พ.67

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ก.พ.67				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.66 – ก.พ.67			
	แผน ก.พ.67	ผล ก.พ.67	ผลต่าง	%	แผนสะสม	ผลสะสม	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	28.12	49.20	21.08	175.0 %	99.43	226.41	126.98	227.7 %
ลดน้ำสูญเสีย	241.95	283.41	41.46	117.1 %	809.99	1,559.89	749.91	192.6 %
มาตรวัดน้ำ	24.01	51.47	27.46	214.4 %	94.94	148.89	53.94	156.8 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.37	3.78	(0.58)	86.6 %	14.87	18.04	3.18	121.4 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	4.20	4.60	0.40	109.4 %	19.97	59.15	39.18	296.2 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	12.96	9.84	(3.12)	75.9 %	47.47	31.91	(15.56)	67.2 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	10.99	10.99	-	2.51	32.15	29.64	1,282.3 %
งานรับจ้างงาน	51.13	78.90	27.77	154.3 %	178.72	357.07	178.35	199.8 %
งานติดตั้งประปาใหม่	16.76	23.34	6.58	139.2 %	81.68	106.43	24.75	130.3 %
งานทดแทนระบบเฝ้าระวัง DMA	3.87	7.54	3.65	194.0 %	46.03	31.71	(14.32)	68.9 %
งานก่อสร้างอาคาร สสب.	10.90	-	10.90	-	10.90	26.95	16.05	247.3%
รวมทั้งสิ้น	398.30	523.09	124.79	131.3 %	1,406.51	2,598.60	1,192.09	184.8%

02

การเบี่ยงถ่ายแบบ **Front Load**

สายงานบริการ (ด้านตะวันออก)

รายการที่มีวงเงินดำเนินการไม่เกิน 100,000 บาท

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567)

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	ทำสัญญา		เบิกจ่าย		ประเภท
					แผนทำสัญญา	ทำสัญญา	แผนจ่าย	จ่ายจริง	
1	สสมบ.	C-67.1.05.05.0027	ถังเก็บน้ำประปาขนาด2,000ลิตร	84,000.00	ต.ค.-66		ต.ค.-66		ประจำปี
2	สสมบ.	C-67.1.02.02.0004	งานติดตั้งโครงหลังคาจุดบริการเครื่องดื่มอาร์โอ	100,000.00	ต.ค.-66	พ.ย.-66	ต.ค.-66		ประจำปี
รวม				184,000.00	-		-		

รายการที่มีวงเงินดำเนินการอยู่ระหว่าง 100,001 - 500,000 บาท

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567)

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	ทำสัญญา		เบิกจ่าย		ประเภท
					แผนทำสัญญา	ทำสัญญา	แผนจ่าย	จ่ายจริง	
16	สสข.	C-67.1.02.02.0007	งานปรับปรุงป้ายสำนักงานประปาสาขาบางเขน	251,500.00	ต.ค.-66	ก.พ.-67	ธ.ค.-66		ประจำปี
17	สสป.	C-67.1.02.02.0016	งานปรับปรุงห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	279,800.00	พ.ย.-66		ธ.ค.-66		ประจำปี
18	สสมบ.	C-67.1.02.02.0022	งานปรับปรุงห้องส่วนซ่อมบำรุงระบบโยธากองบำรุงรักษาสมบ.	301,200.00	พ.ย.-66		ธ.ค.-66		ประจำปี
19	สสข.	C-67.1.02.02.0015	งานปรับปรุงหลังคาอาคาร2	355,300.00	ต.ค.-66	ม.ค.-67	ธ.ค.-66		ประจำปี
20	สสม.	C-67.1.02.02.0002	งานจ้างปรับปรุงประตูดึงไฟ	400,000.00	ต.ค.-66	มี.ค.-67	ธ.ค.-66		ประจำปี
21	สสข.	C-67.1.02.02.0014	งานปรับปรุงหลังคาอาคาร1	410,100.00	ต.ค.-66	ม.ค.-67	ธ.ค.-66		ประจำปี
22	สสมบ.	C-67.1.02.01.0001	งานก่อสร้างห้องน้ำอาคาร2ชั้น1สสมบ.	460,000.00	พ.ย.-66		ธ.ค.-66		ประจำปี
23	สสข.	C-67.1.02.02.0020	งานปรับปรุงห้องประชุมอาคาร1	465,500.00	ต.ค.-66	ก.พ.-67	ธ.ค.-66		ประจำปี
24	สสพ.	C-67.1.02.02.0017	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิงชั้น1สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท-พระโขนง	467,300.00	ต.ค.-66	ต.ค.-66	ธ.ค.-66		ประจำปี
25	สสส.	C-67.1.05.02.0041	ระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งสสส.	160,000.00	ม.ค.-67		ก.ย.-67		ประจำปี
รวม				3,550,700.00					

สายงานบริการ (ด้านตะวันตก)

รายการที่มีวงเงินดำเนินการไม่เกิน 100,000 บาท

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567)

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	ทำสัญญา		เบิกจ่าย		ประเภท
					แผนทำสัญญา	ทำสัญญา	แผนจ่าย	จ่ายจริง	
1	สสต.	C-67.1.05.01.0374	โต๊ะบาร์สำหรับบริการลูกค้า	5,800.00	ม.ย.-67		ม.ย.-67		ประจำปี
3	สสต.	C-67.1.05.01.0375	โต๊ะบาร์ขนาดใหญ่(สั่งทำ)	39,000.00	ม.ย.-67		ม.ย.-67		ประจำปี
5	สสต.	C-67.1.05.01.0119	เก้าอี้สตูลบาร์ไม่สำหรับบริการลูกค้า	49,000.00	ม.ย.-67		ม.ย.-67		ประจำปี
6	สสต.	C-67.1.05.01.0120	เก้าอี้สำนักงาน	73,630.00	พ.ค.-67		ม.ย.-67		ประจำปี
รวม				167,430.00					

รายการที่มีวงเงินดำเนินการอยู่ระหว่าง 100,001 - 500,000 บาท

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567)

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	ทำสัญญา		เบิกจ่าย		ประเภท
					แผนทำสัญญา	ทำสัญญา	แผนจ่าย	จ่ายจริง	
14	สสต.	C-67.1.05.01.0376	โต๊ะประชุม	100,020.00	พ.ค.-67		ม.ย.-67		ประจำปี
15	สสท.	C-67.1.02.02.0018	งานปรับปรุงห้องน้ำผู้จัดการสาขา	176,800.00	ต.ค.-66	ม.ค.-67	ธ.ค.-66		ประจำปี
16	สสต.	C-67.1.05.04.0012	โทรทัศน์ขนาดไม่ต่ำกว่า75นิ้วสมาร์ทีวี(สามารถตัดลอกการแสดงผลหน้าจอจากมือถือไปยังโทรทัศน์ได้แบบไร้สาย)	252,600.00	เม.ย.-67	ก.พ.-67	ม.ย.-67		ประจำปี
17	สสท.	C-67.1.02.02.0019	งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร1ชั้น2	348,000.00	ต.ค.-66		ธ.ค.-66		ประจำปี
18	ฝมน.	C-67.1.03.01.0064	อุปกรณ์HARTFieldCommunicator	400,000.00	ต.ค.-66	ต.ค.-66	เม.ย.-67		ประจำปี
19	สสน.	C-67.1.05.02.0030	ชุดไมล์และเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง	457,800.00	พ.ย.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66		ประจำปี
20	สสมส.	C-67.1.02.02.0013	งานปรับปรุงโรงอาหารสำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์	496,800.00	ม.ค.-67	ม.ค.-67	มี.ค.-67		ประจำปี
รวม				2,232,020.00					

03

มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

3.1 ผวก. สอบถามความก้าวหน้าครุภัณฑ์ ดั่งนี้



1. งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประจำ สาขางอกน้อย

- คงเหลือวงเงินดำเนินการเพิ่มค่างาน
- ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเพิ่ม
ค่างาน ระบบ LAN และ ระบบ อื่นๆ คาดว่า
จะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายเดือน มิ.ย.67



2. การติดตั้งประปาหัวแดง

- งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประปาหัวแดง) กทม. ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทำงาน โดย
ให้ กปน. เป็นผู้เบิกจ่ายทั้งหมดไปก่อน แล้วจึงเรียกเก็บจาก กทม. ในภายหลัง

ประธาน มีข้อสังเกตงานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประปาหัวแดง) กทม. ว่าอยู่ในแผนป้องกัน
อัคคีภัย ถ้าเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยให้ กปน. เบิกจ่ายทั้งหมดก่อน จะเป็นการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ใน MOU

นางสาวภัทรศรีย จันทรุ่งสง่า (นักบัญชี 7 รว.กอ) ชี้แจงว่า จากการประชุมร่วมกับ
กทม. ได้รับแจ้งว่าจะมีการโอนไปให้กรมบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้เบิกจ่าย ซึ่งทางกรมบรรเทาสาธารณภัยจะ
ทำหนังสือถึง กปน. โดยมีเงื่อนไขให้ กปน. เป็นผู้เบิกจ่ายทั้งหมดไปก่อน และกรมบรรเทาสาธารณภัยจะเบิกจ่ายให้
กปน. ในปีงบประมาณ 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอหนังสือจากกรมบรรเทาสาธารณภัย

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณปี 2568 ซึ่ง
กรมบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานที่ขอรับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน โดยหากมีการขอจัดสรร
งบประมาณสำหรับการดำเนินงานดังกล่าว จะต้องต้องมีข้อมูลปรากฏอยู่ในคำขอตั้งงบประมาณ ดังนั้น ในเบื้องต้น
จึงสามารถตรวจสอบการขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2568 สำหรับงานดังกล่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาได้

ประธาน ขอให้ดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การดำเนินงานต่อไป


3.1 ผวก. สอบถามความก้าวหน้าครุภัณฑ์ ดังนี้

3. งานติดตั้ง Radio Tower แบบ Self support พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่สถานีสูบน้ำคลองเตยของ ฝสน.

ประธาน สอบถามความคืบหน้าของรายการซื้อพร้อมติดตั้ง Radio Tower แบบ Self support พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่สถานีสูบน้ำคลองเตย ฝสน. ที่รายงานว่าเดือนมกราคม 2567 ยังไม่ลงนามในสัญญาแต่มีการแจ้งเริ่มงานแล้วอยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงานร้อยละ 20 และเดือนกุมภาพันธ์ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงานร้อยละ 10

นายสุชาติ สิริสรณ์บัญชา (หน.สสจ.1 ฝสน.) ชี้แจงรายการซื้อพร้อมติดตั้ง Radio Tower แบบ Self support พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่สถานีสูบน้ำคลองเตยว่า มีการลงนามในสัญญาเดือนธันวาคม 2566 แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถเริ่มงานได้เนื่องจากมีการแก้แบบ Radio Tower ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ


จากการตรวจสอบพบว่า รายการ **งานติดตั้ง Radio Tower แบบ Self support** ลงนามสัญญาแล้ว แต่ไม่ได้บันทึก **PO** ในระบบ **SAP** ปัจจุบันดำเนินการแก้ไขแล้ว

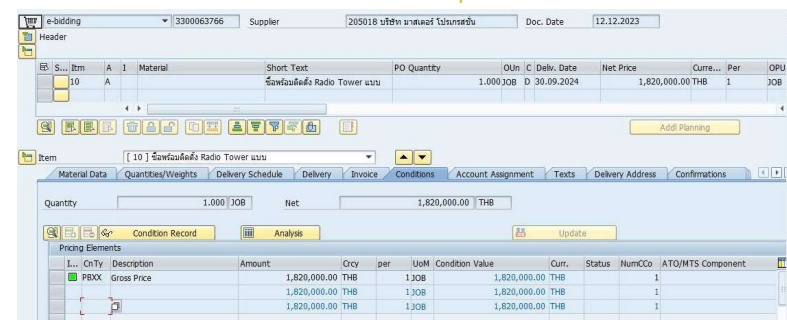

The screenshot shows a SAP PO entry for 'Radio Tower' with a quantity of 1,000 and a net price of 1,820,000.00 THB. The 'Pricing Elements' table is visible below.

L.	On/Off	Description	Amount	Qty	per	UoM	Condition Value	Curr.	Status	NumCo	ATO/MTS Component
1		Gross Price	1,820,000.00 THB	1		1 JOB	1,820,000.00 THB			1	
2			1,820,000.00 THB	1		1 JOB	1,820,000.00 THB			1	
3			1,820,000.00 THB	1		1 JOB	1,820,000.00 THB			1	

นอกจากนี้ งานจ้าง **Switchgear** ของ สถานีสูบน้ำลุมพินี และราษฎร์บูรณะ ลงนามสัญญาแล้ว แต่ไม่ได้บันทึก **PO** ในระบบ **SAP** เช่นกัน ปัจจุบันดำเนินการแก้ไขแล้ว

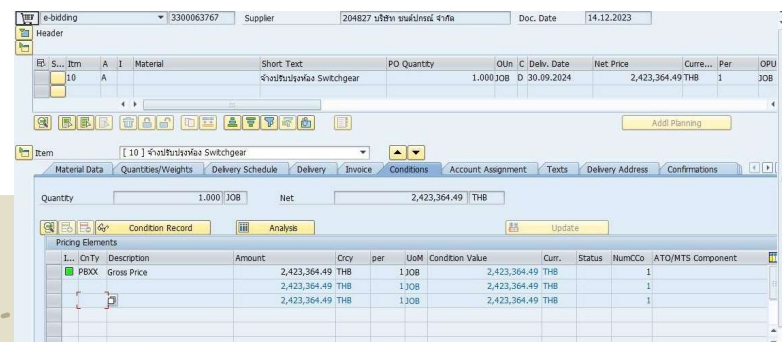

The screenshot shows a SAP PO entry for 'Switchgear' with a quantity of 1,000 and a net price of 2,423,364.49 THB. The 'Pricing Elements' table is visible below.

L.	On/Off	Description	Amount	Qty	per	UoM	Condition Value	Curr.	Status	NumCo	ATO/MTS Component
1		Gross Price	2,423,364.49 THB	1		1 JOB	2,423,364.49 THB			1	
2			2,423,364.49 THB	1		1 JOB	2,423,364.49 THB			1	
3			2,423,364.49 THB	1		1 JOB	2,423,364.49 THB			1	



ขอให้ตรวจสอบการลงนามสัญญา
กับการบันทึก PO ในระบบ SAP ให้ถูกต้องตรงกันด้วย

3.1 ผวก. สอบถามความก้าวหน้าครุภัณฑ์ ดังนี้

4. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำ พหลโยธินพร้อมงานอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ของ ฝสน.

- อยู่ระหว่างประชุมกำหนดแนวทางเบิกจ่าย
- เลขาคณะทำงาน ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

ประธาน สอบถามแผนการดำเนินงานรายการงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำพหลโยธินพร้อมงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการ ชี้แจงว่า จากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งว่า งานดังกล่าว
อาจจะชะลอออกไปดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2572 โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีงบลงทุนที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอ
ดังนั้น จึงอาจจะยกเลิกรายการลงทุนไปก่อน และเมื่อมีความพร้อมสามารถตั้งงบลงทุนอีกครั้ง



3.1 ผวก. สอบถามความก้าวหน้าครุภัณฑ์ ดังนี้

5. ความคืบหน้า การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ของ ฝจพ.

ประธาน สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร

ผู้แทนสายงานบริหาร ชี้แจงว่าเนื่องจากรายการลงทุนดังกล่าวติดประเด็นเรื่องราคากลาง เพราะราคากลางค่อนข้างต่ำ โดยหากครั้งนี้ประกาศราคากลางแล้ว และยังไม่สามารถจัดซื้อได้ก็จะมีการมอบอำนาจให้หน่วยงานไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง

นางสาวชนัสลา พัฒน์เชียร (นักบริหารงาน 7 รองผู้ว่าการ (บริหาร)) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายการรถจักรยานยนต์ ที่นำรายการตั้งแต่ปี 2565-2567 มาจัดซื้อรวมกัน โดยการกำหนดราคากลางจะต้องใช้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนทุก 6 เดือน โดยล่าสุดมีการปรับราคา ในเดือนมกราคม 2567 ทั้งนี้ ทาง รวท.(บ) ได้หารือกับ ฝจพ. ในการเร่งรัดการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ และในกรณีที่ทาง ฝจพ. ไม่สามารถจัดซื้อได้ จะปรับเปลี่ยนวิธีให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง

3.2 การเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบความถูกต้องระหว่าง **SAP** กับการลงนามสัญญา

เลขานุการ รายงานการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้ากว่าแผนที่ว่า สาเหตุหลักประการหนึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาได้ ดังนั้นจึงควรเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้โดยเร็ว นอกจากนี้ ฝงป. ขอความร่วมมือผู้แทนสายงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนระหว่าง SAP กับการลงนามในสัญญา เช่น บางรายการลงทุน หน่วยงานมีการรายงานว่าได้ลงนามสัญญาแล้ว แต่จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบ SAP ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล PO หรือกรณีที่มีการจัดทำ PO ในระบบ SAP แล้วแต่ไม่มีการบันทึก (Hold PO) ฝงป. จะไม่สามารถติดตามข้อมูลการทำสัญญาของรายการลงทุนดังกล่าวได้

04

การจัดสรรงบประมาณซ่อมท่อ
(ปกติ) และ ค่าท่ออุปกรณ์เพิ่มเติม



ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ
94,276,581.85 บาท

ค่าสำรวจหาท่อรั่ว
9,192,319.00 บาท

ค่าท่ออุปกรณ์
57,547,297.87 บาท

รวมทั้งสิ้น

161,016,198.72 บาท

ฝจส. มีงบค่าจ้างเหมาสำรวจ
และซ่อมท่อ (ปกติ)
คงเหลือ 19.00 ล้านบาท

ซ่อมท่อ + สร

งบประมาณที่ต้องการเพิ่มเติม งานจ้างเหมาซ่อมท่อ และ งานสำรวจหาท่อรั่ว

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 2567

สาขา	วงเงินงบประมาณคงเหลือ (เฉพาะงบปกติ) 14 มี.ค.67			คาดการณ์เปิดสัญญา มี.ค.67 - ก.ย.67			ต้องการงบประมาณเพิ่มเติม		
	ซ่อมท่อ	สร.	รวม	ซ่อมท่อ	สร.	รวม	ซ่อมท่อ	สร.	รวม
สสส	441,968.22	1,119,689.00	1,561,657.22	6,600,000.00	ไม่มีข้อมูล	6,600,000.00	5,039,000.00	ไม่มีข้อมูล	5,039,000.00
สสพ	468,982.25	163,247.00	632,229.25	9,345,794.39	ไม่มีข้อมูล	9,345,794.39	-	ไม่มีข้อมูล	-
สสป	1,825,758.88	622,766.07	2,448,524.95	9,300,000.00	1,700,000.00	11,000,000.00	9,300,000.00	1,700,000.00	11,000,000.00
สสท	289,887.85	198,844.00	488,731.85	2,000,000.00	ไม่มีข้อมูล	2,000,000.00	2,000,000.00	ไม่มีข้อมูล	2,000,000.00
สสม	949,605.29	73,832.00	1,023,437.29	2,598,598.13	-	2,598,598.13	1,575,160.84		1,575,160.84
สสญ	733,275.88	57,378.00	790,653.88	-	ไม่มีข้อมูล	-	-	ไม่มีข้อมูล	-
สสล	2,956,196.38	68,149.00	3,024,345.38	ไม่มีรายละเอียด	ไม่มีข้อมูล	-	-	ไม่มีข้อมูล	-
สสช	-	34,588.00	34,588.00	ไม่มีข้อมูล		-	ไม่มีข้อมูล		-
สสข	2,070,820.56	38,377.00	2,109,197.56	5,000,000.00	ไม่มีข้อมูล	5,000,000.00	2,900,000.00	ไม่มีข้อมูล	2,900,000.00
สสมบ	23.36	56,728.03	56,751.39	-	ไม่มีข้อมูล	-	-	ไม่มีข้อมูล	-
สสสก	1,626,646.26	47,013.00	1,673,659.26	ไม่มีรายละเอียด	ไม่มีข้อมูล	-	4,000,000.00	ไม่มีข้อมูล	4,000,000.00
สสบ	6,760,266.35	183,490.00	6,943,756.35	18,737,857.74	ไม่มีข้อมูล	18,737,857.74	11,977,591.39	ไม่มีข้อมูล	11,977,591.39
สสด	4,052,046.73	34,187.00	4,086,233.73	13,000,000.00	2,000,000.00	15,000,000.00	8,947,953.27	2,000,000.00	10,947,953.27
สสก*	1,565,977.94	- 571,040.00	994,937.94	31,308,411.21	2,000,000.00	33,308,411.21	26,471,405.24	2,571,040.00	29,042,445.24
สสว	4,793,509.51	187,557.00	4,981,066.51	18,691,400.00	2,090,000.00	20,781,400.00	13,897,890.49	1,902,443.00	15,800,333.49
สสน	1,518,085.98	116,164.00	1,634,249.98	2,910,000.00	1,135,000.00	4,045,000.00	1,391,914.02	1,018,836.00	2,410,750.02
สสบท	3,374,333.40	284,046.00	3,658,379.40	10,150,000.00	ไม่เปิดสัญญาเพิ่ม	10,150,000.00	6,775,666.60	-	6,775,666.60
สสมส	3,594,177.57	1,154,209.00	4,748,386.57	3,748,386.57	1,000,000.00	4,748,386.57	-	-	-
ฝจส	-	19,000,001.08	19,000,001.08						
ฝคจ	11,773.50		11,773.50						
รวม	37,021,562.41	22,869,225.18	59,902,561.09	133,390,448.04	9,925,000.00	143,315,448.04	94,276,581.85	9,192,319.00	103,468,900.85

ข้อมูล

๑

รายละเอียด			ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ				เลขหนังสืออ้างอิง	
			เดือน	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาดำเนินการ	วงเงินที่เปิดสัญญา		วงเงินที่ขอเพิ่ม (หลังหักงบคงเหลือแล้ว)
1	สสบ.	โซน 1,2,3,4,9 อยู่ขั้นตอนประกาศประกวดราคา	มี.ค. 67	สป01 04 67	9 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	8,097,000.00	1,336,733.65	สวปกอบสสบ 134/2567
2	สสบ.	โซน 5,6,7 และ 8 อยู่ขั้นตอนจัดทำราคากลาง	มี.ค. 67	สป01 05 67	25 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	8,097,000.00	8,097,000.00	
3	สสค.		มี.ค. 67	สป02 03 67	เม.ย.67 - ก.ย.67	9,350,000.00	5,297,953.27	
4	สสภ.	โซน 03,06,08,10 กั้นวงเงิน Po เรียบร้อยแล้ว	มี.ค. 67	สป11 08 67	1 มี.ค.67 - 31 มี.ค.67	2,336,448.60	-	สวปกอบสภ90/2567
5	สสภ.	โซน 05,07 กั้นวงเงิน Pr เรียบร้อยแล้ว	มี.ค. 67	สป11 09 67	16 มี.ค.67 - 31 มี.ค.67	934,579.44	-	
6	สสภ.	โซน 03,06,08,10	มี.ค. 67	สป11 10 67	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	7,943,925.23	6,377,947.29	
7	สสภ.	โซน 05,07	มี.ค. 67	สป11 11 67	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	6,074,766.36	6,074,766.36	
8	สสว.		มี.ค. 67	สป14 03 67	1 พ.ค.67 ถึง 20 ก.ค.67	9,345,700.00	4,552,190.49	
ความต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ เดือน มี.ค.67						52,179,419.63	31,736,591.06	-
1	สสบ.	เปิดรองรับพื้นที่ PBC ที่ยังไม่มีสัญญา โซน 1 , 2 และ 9 จ้างวิธีเฉพาะเจาะจง	เม.ย. 67	สป01 06 67	1 พ.ค. - 30 ก.ค.67	2,543,857.74	2,543,857.74	สวปกอบสสบ 134/2567
2	สสค.		เม.ย. 67	สป02 04 67	มิ.ย.67 - ก.ย.67	3,650,000.00	3,650,000.00	สวปสค37/2567
3	สสภ.	โซน 03,06,08,10	เม.ย. 67	สป11 12 67	1 มิ.ย.67 - 30 ก.ย.67	7,943,925.23	7,943,925.23	สวปกอบสภ90/2567
4	สสภ.	โซน 05,07	เม.ย. 67	สป11 13 67	1 มิ.ย.67 - 30 ก.ย.67	6,074,766.36	6,074,766.36	
5	สสส.		เม.ย. 67	สป07 02 67	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	6,600,000.00	5,039,000.00	สวปกอบสสส 23/2567
6	สสพ.	กั้นวงเงิน PR แล้ว	เม.ย. 67	สป13 02 67	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	9,345,794.39	-	สวปกอบสพ 31/2567
7	สสป.	02 07 ยกเว้น 06	เม.ย. 67	สป17 03 67	1 มิ.ย.67 - 30 ก.ย.67	9,300,000.00	9,300,000.00	
ความต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ เดือน เม.ย.67						45,458,343.72	34,551,549.33	
1	สสว.		พ.ค. 67	สป14 04 67	21 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	9,345,700.00	9,345,700.00	-
2	สสน.		พ.ค. 67	สป04 03 67	20 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	2,910,000.00	1,391,914.02	สสน169/2567
3	สสบท.	E - Bidding	พ.ค. 67	สป54 04 67	16 พ.ค. 67 30 ก.ย.67	10,000,000.00	6,775,666.60	สวปกอบสสบท18/2567
4	สสบท.	สัญญาโยธาซ่อมผิว ทพ.	พ.ค. 67	สัญญาโยธาซ่อมผิว ทพ.	พ.ค. 67	150,000.00	-	สวปกอบสสบท18/2567
5	สสข.		พ.ค. 67	สป16 02 67	15 มิ.ย.67 - 30 ก.ย.67	5,000,000.00	2,900,000.00	
ความต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ เดือน พ.ค.67						27,405,700.00	20,413,280.62	-
1	สสนส.		มิ.ย. 67	สป56 03 67	สิ้นสุด 30 ก.ย.66	3,748,386.57	-	สวปกอบสสนส54/2567
2	สสท.		มิ.ย. 67	สป05 02 67	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	2,000,000.00	2,000,000.00	สวปสท7/2567
			มิ.ย. 67					
ความต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ เดือน มิ.ย.67						5,748,386.57	2,000,000.00	-
1	สสน.		ก.ค. 67	สป06 04 67	15 มิ.ย.67 - 30 ก.ย.67	2,598,598.13	1,575,160.84	สวปกอบสสน46/2567
2	สสภ.	ไม่มีรายละเอียด	ก.ค. 67			-	4,000,000.00	
ความต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ เดือน ก.ค.67						2,598,598.13	5,575,160.84	-
ต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ รวมทั้งสิ้น						133,390,448.05	94,276,581.85	-

สร

สาขาพิจารณาการณเปิดสัญญาและขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

งานสำรวจหาท่อรั่ว

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.2567

ลำดับที่	สาขา	รายละเอียด	ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ				
			เดือน	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาดำเนินการ	วงเงินที่เปิดสัญญา	วงเงินที่ขอเพิ่ม
1	สสภ.	โซน 03,05 และ 07	มี.ค.-67	สร 11-03-67	เม.ย.67 - มิ.ย.67	500,000.00	500,000.00
2	สสภ.	โซน 06,08 และ 10	มี.ค.-67	สร.11-04-67	เม.ย.67 - มิ.ย.67	500,000.00	500,000.00
3	สสภ.	กลบวงเงินติดลบ				-	571,040.00
4	สสว.		มี.ค.-67	สร.14-05-67	20 เม.ย.67 - 15 ก.ย.67	1,470,000.00	1,470,000.00
6	สสนส.		มี.ค.-67	สร.56-02-67	25พ.ค.67 - 15 ก.ย.67	1,000,000.00	-
7	สสต.		มี.ค.-67	ไม่มีรายละเอียด			2,000,000.00
							-
ความต้องการงบประมาณงานสำรวจหาท่อรั่ว เดือน มี.ค.66						3,470,000.00	5,041,040.00
1	สสป.	โซน 02,03,04,05,06,07,11	พ.ค.-67	สร.17-04-67	พ.ค.67 - ก.ย.67	934,579.44	940,000.00
2	สสป.	โซน 01 ,08 ,09 ,10	พ.ค.-67	สร.17-05-67	พ.ค.67 - ก.ย.67	747,663.55	760,000.00
ความต้องการงบประมาณงานสำรวจหาท่อรั่ว เดือน พ.ค.66						1,682,242.99	1,700,000.00
1	สสภ.	โซน 03,05 และ 07	มิ.ย.-67	สร 11-05-67	ก.ค.67 - ก.ย.67	500,000.00	500,000.00
2	สสภ.	โซน 06,08 และ 10	มิ.ย.-67	สร.11-06-67	ก.ค.67 - ก.ย.67	500,000.00	500,000.00
3	สสว.		มิ.ย.-67	สร.14-06-67	1 ก.ค.67 - 15 ก.ย.67	620,000.00	432,443.00
4	สสน.		มิ.ย.-67	สร.14-06-67	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	1,135,000.00	1,018,836.00
ความต้องการงบประมาณงานสำรวจหาท่อรั่ว เดือน มิ.ย.66						2,755,000.00	2,451,279.00
ต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ รวมทั้งสิ้น						7,907,242.99	9,192,319.00

ค่าท่ออุปกรณ์

งบประมาณที่ต้องการเพิ่มเติม ค่าท่ออุปกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.2566

สาขา	วงเงินงบประมาณคงเหลือ 14 มี.ค.67	ค่าท่ออุปกรณ์ใช้จริง	ค่าท่อเฉลี่ยต่อเดือน	คาดการณ์ใช้งบประมาณ มี.ค.66 - ก.ย.66	ต้องการงบประมาณเพิ่มเติม	งบประมาณไม่เพียงพอในเดือน
สสส	1,903,735.82	5,394,264.18	980,775.31	7,294,758.97	4,900,000.00	พ.ค.-67
สสป	6,762,881.52	4,951,118.48	900,203.36	6,762,881.52	-	ก.ย.-67
สสป	12,681,472.45	9,865,527.55	1,793,732.28	-	3,418,503.00	ส.ค.-67
สสท	1,660,741.11	2,098,258.89	381,501.62	-	ยังไม่ได้รับข้อมูล	
สสม	1,159,433.08	3,986,566.92	724,830.35	4,972,604.34	3,916,018.31	เม.ย.-67
สสญ	5,535,572.70	7,483,427.30	1,360,623.15	8,910,000.00	3,373,692.30	ก.ค.-67
สสล	5,120,840.83	6,252,159.17	1,136,756.21	5,600,000.00	668,881.71	ส.ค.-67
สสช	2,691,012.89	5,683,987.11	1,033,452.20	-	ยังไม่ได้รับข้อมูล	
สสข	2,866,465.15	4,025,356.85	731,883.06	5,403,477.94	2,500,000.00	มิ.ย.-67
สสมบ	6,833,826.58	6,079,173.42	1,105,304.26	8,508,750.64	1,700,000.00	ส.ค.-67
สสสภ	3,751,211.66	7,252,788.34	1,318,688.79	8,251,211.66	4,500,000.00	มิ.ย.-67
สสบ	4,187,732.22	9,407,267.78	1,710,412.32	11,214,000.00	7,161,621.61	พ.ค.-67
สสด	15,938,037.24	9,746,962.76	1,772,175.05	-	ยังไม่ได้รับข้อมูล	
สสภ	3,994,543.04	9,543,456.96	1,735,173.99	15,398,065.32	11,403,830.28	เม.ย.-67
สสว	6,319,529.63	11,070,470.37	2,012,812.79	15,600,000.00	9,280,470.37	พ.ค.-67
สสน	3,732,657.83	3,469,542.17	630,825.85	4,856,938.12	1,124,280.29	ส.ค.-67
สสบท	4,917,302.58	7,638,697.42	1,388,854.08	8,612,223.76	3,700,000.00	มิ.ย.-67
สสมส	10,662,520.40	8,474,479.60	1,540,814.47	10,662,328.71	-	ก.ย.-67
รวม	100,719,516.73	122,423,505.27	22,258,819.14	122,047,240.98	57,647,297.87	ก.ย.-67

ควรพิจารณากำหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณค่าท่ออุปกรณ์ให้กับสาขา โดยเฉพาะ สสส. สสม. สสบ. สสภ. สสว.

A festive banner with colorful flags (red, yellow, green) and stars is positioned at the top of the slide. The background is a light beige color with decorative elements including stars, clouds, and dashed lines.

Thank you!

Do you have any questions?



วาระที่ 4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 3/2567

20 มีนาคม 2567



Table of Contents.



01.

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำเดือน ก.พ.67
และสะสม ต.ค.66 - ก.พ.67



02.

การเบิกจ่ายแบบ Front Load



03.

มติคณะเร่ร็ดเบิกจ่ายงบลงทุน



04.

การจัดสรรงบค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ
(ปกติ) และ ค่าท่ออุปกรณ์เพิ่มเติม

01

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำเดือน ก.พ.67
และสะสม ต.ค.66 – ก.พ.67

แผน - ผลเบิกจ่าย ก.พ.67 และสะสม ต.ค.66 - ก.พ.67



แผน – ผลเบิกจ่าย ก.พ.67 และสะสม ต.ค.66 – ก.พ.67

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ก.พ.67				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.66 – ก.พ.67			
	แผน ก.พ.67	ผล ก.พ.67	ผลต่าง	%	แผนสะสม	ผลสะสม	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	28.12	49.20	21.08	175.0 %	99.43	226.41	126.98	227.7 %
ลดน้ำสูญเสีย	241.95	283.41	41.46	117.1 %	809.99	1,559.89	749.91	192.6 %
มาตรวัดน้ำ	24.01	51.47	27.46	214.4 %	94.94	148.89	53.94	156.8 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.37	3.78	(0.58)	86.6 %	14.87	18.04	3.18	121.4 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	4.20	4.60	0.40	109.4 %	19.97	59.15	39.18	296.2 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	12.96	9.84	(3.12)	75.9 %	47.47	31.91	(15.56)	67.2 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	10.99	10.99	-	2.51	32.15	29.64	1,282.3 %
งานรับจ้างงาน	51.13	78.90	27.77	154.3 %	178.72	357.07	178.35	199.8 %
งานติดตั้งประปาใหม่	16.76	23.34	6.58	139.2 %	81.68	106.43	24.75	130.3 %
งานทดแทนระบบเฝ้าระวัง DMA	3.87	7.54	3.65	194.0 %	46.03	31.71	(14.32)	68.9 %
งานก่อสร้างอาคาร สสب.	10.90	-	10.90	-	10.90	26.95	16.05	247.3%
รวมทั้งสิ้น	398.30	523.09	124.79	131.3 %	1,406.51	2,598.60	1,192.09	184.8%

02

การเบิกจ่ายแบบ **Front Load**

สายงานบริการ (ด้านตะวันออก)

รายการที่มีวงเงินดำเนินการไม่เกิน 100,000 บาท

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567)

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	ทำสัญญา		เบิกจ่าย		ประเภท
					แผนทำสัญญา	ทำสัญญา	แผนจ่าย	จ่ายจริง	
1	สสมบ.	C-67.1.05.05.0027	ถังเก็บน้ำประปาขนาด2,000ลิตร	84,000.00	ต.ค.-66		ต.ค.-66		ประจำปี
2	สสมบ.	C-67.1.02.02.0004	งานติดตั้งโครงหลังคาจุดบริการเครื่องดื่มอาร์โอ	100,000.00	ต.ค.-66	พ.ย.-66	ต.ค.-66		ประจำปี
รวม				184,000.00	-		-		

รายการที่มีวงเงินดำเนินการอยู่ระหว่าง 100,001 - 500,000 บาท

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567)

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	ทำสัญญา		เบิกจ่าย		ประเภท
					แผนทำสัญญา	ทำสัญญา	แผนจ่าย	จ่ายจริง	
16	สสข.	C-67.1.02.02.0007	งานปรับปรุงป้ายสำนักงานประปาสาขาบางเขน	251,500.00	ต.ค.-66	ก.พ.-67	ธ.ค.-66		ประจำปี
17	สสป.	C-67.1.02.02.0016	งานปรับปรุงห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	279,800.00	พ.ย.-66		ธ.ค.-66		ประจำปี
18	สสมบ.	C-67.1.02.02.0022	งานปรับปรุงห้องส่วนซ่อมบำรุงระบบโยธากองบำรุงรักษาสมบ.	301,200.00	พ.ย.-66		ธ.ค.-66		ประจำปี
19	สสข.	C-67.1.02.02.0015	งานปรับปรุงหลังคาอาคาร2	355,300.00	ต.ค.-66	ม.ค.-67	ธ.ค.-66		ประจำปี
20	สสม.	C-67.1.02.02.0002	งานจ้างปรับปรุงประตูดึงไฟ	400,000.00	ต.ค.-66	มี.ค.-67	ธ.ค.-66		ประจำปี
21	สสข.	C-67.1.02.02.0014	งานปรับปรุงหลังคาอาคาร1	410,100.00	ต.ค.-66	ม.ค.-67	ธ.ค.-66		ประจำปี
22	สสมบ.	C-67.1.02.01.0001	งานก่อสร้างห้องน้ำอาคาร2ชั้น1สสมบ.	460,000.00	พ.ย.-66		ธ.ค.-66		ประจำปี
23	สสข.	C-67.1.02.02.0020	งานปรับปรุงห้องประชุมอาคาร1	465,500.00	ต.ค.-66	ก.พ.-67	ธ.ค.-66		ประจำปี
24	สสพ.	C-67.1.02.02.0017	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิงชั้น1สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท-พระโขนง	467,300.00	ต.ค.-66	ต.ค.-66	ธ.ค.-66		ประจำปี
25	สสล.	C-67.1.05.02.0041	ระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งสสล.	160,000.00	ม.ค.-67		ก.ย.-67		ประจำปี
รวม				3,550,700.00					

สายงานบริการ (ด้านตะวันตก)

รายการที่มีวงเงินดำเนินการไม่เกิน 100,000 บาท

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567)

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	ทำสัญญา		เบิกจ่าย		ประเภท
					แผนทำสัญญา	ทำสัญญา	แผนจ่าย	จ่ายจริง	
1	สสต.	C-67.1.05.01.0374	โต๊ะบาร์สำหรับบริการลูกค้า	5,800.00	ม.ย.-67		ม.ย.-67		ประจำปี
3	สสต.	C-67.1.05.01.0375	โต๊ะบาร์ขนาดใหญ่(สั่งทำ)	39,000.00	ม.ย.-67		ม.ย.-67		ประจำปี
5	สสต.	C-67.1.05.01.0119	เก้าอี้สตูลบาร์ไม่สำหรับบริการลูกค้า	49,000.00	ม.ย.-67		ม.ย.-67		ประจำปี
6	สสต.	C-67.1.05.01.0120	เก้าอี้สำนักงาน	73,630.00	พ.ค.-67		ม.ย.-67		ประจำปี
รวม				167,430.00					

รายการที่มีวงเงินดำเนินการอยู่ระหว่าง 100,001 - 500,000 บาท

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567)

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	ทำสัญญา		เบิกจ่าย		ประเภท
					แผนทำสัญญา	ทำสัญญา	แผนจ่าย	จ่ายจริง	
14	สสต.	C-67.1.05.01.0376	โต๊ะประชุม	100,020.00	พ.ค.-67		ม.ย.-67		ประจำปี
15	สสท.	C-67.1.02.02.0018	งานปรับปรุงห้องน้ำผู้จัดการสาขา	176,800.00	ต.ค.-66	ม.ค.-67	ธ.ค.-66		ประจำปี
16	สสต.	C-67.1.05.04.0012	โทรทัศน์ขนาดไม่ต่ำกว่า75นิ้วสมาร์ทีวี(สามารถคัดลอกการแสดงผลหน้าจอจากมือถือไปยังโทรทัศน์ได้แบบไร้สาย)	252,600.00	เม.ย.-67	ก.พ.-67	ม.ย.-67		ประจำปี
17	สสท.	C-67.1.02.02.0019	งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร1ชั้น2	348,000.00	ต.ค.-66		ธ.ค.-66		ประจำปี
18	ฝมน.	C-67.1.03.01.0064	อุปกรณ์HARTFieldCommunicator	400,000.00	ต.ค.-66	ต.ค.-66	เม.ย.-67		ประจำปี
19	สสน.	C-67.1.05.02.0030	ชุดไมล์และเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง	457,800.00	พ.ย.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66		ประจำปี
20	สสมส.	C-67.1.02.02.0013	งานปรับปรุงโรงอาหารสำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์	496,800.00	ม.ค.-67	ม.ค.-67	มี.ค.-67		ประจำปี
รวม				2,232,020.00					

03

มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

3.1 ผวก. สอบถามความก้าวหน้าครุภัณฑ์ ดั่งนี้



1. งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประจำ สาขางอกน้อย

- คงเหลือวงเงินดำเนินการเพิ่มค่างาน
- ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเพิ่ม
ค่างาน ระบบ LAN และ ระบบ อื่นๆ คาดว่า
จะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายเดือน มิ.ย.67



2. การติดตั้งประปาหัวแดง

- งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประปาหัวแดง) กทม. ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทำงาน โดย
ให้ กปน. เป็นผู้เบิกจ่ายทั้งหมดไปก่อน แล้วจึงเรียกเก็บจาก กทม. ในภายหลัง

ประธาน มีข้อสังเกตงานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประปาหัวแดง) กทม. ว่าอยู่ในแผนป้องกัน
อัคคีภัย ถ้าเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยให้ กปน. เบิกจ่ายทั้งหมดก่อน จะเป็นการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ใน MOU

นางสาวภัทรศรีย จันทรุ่งสง่า (นักบัญชี 7 รว.กอ)) ชี้แจงว่า จากการประชุมร่วมกับ
กทม. ได้รับแจ้งว่าจะมีการโอนไปให้กรมบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้เบิกจ่าย ซึ่งทางกรมบรรเทาสาธารณภัยจะ
ทำหนังสือถึง กปน. โดยมีเงื่อนไขให้ กปน. เป็นผู้เบิกจ่ายทั้งหมดไปก่อน และกรมบรรเทาสาธารณภัยจะเบิกจ่ายให้
กปน. ในปีงบประมาณ 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอหนังสือจากกรมบรรเทาสาธารณภัย

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณปี 2568 ซึ่ง
กรมบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานที่ขอรับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน โดยหากมีการขอจัดสรร
งบประมาณสำหรับการดำเนินงานดังกล่าว จะต้องต้องมีข้อมูลปรากฏอยู่ในคำขอตั้งงบประมาณ ดังนั้น ในเบื้องต้น
จึงสามารถตรวจสอบการขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2568 สำหรับงานดังกล่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาได้

ประธาน ขอให้ดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การดำเนินงานต่อไป


3.1 ผวก. สอบถามความก้าวหน้าครุภัณฑ์ ดังนี้

3. งานติดตั้ง Radio Tower แบบ Self support พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่สถานีสูบน้ำคลองเตยของ ฝสน.

ประธาน สอบถามความคืบหน้าของรายการซื้อพร้อมติดตั้ง Radio Tower แบบ Self support พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่สถานีสูบน้ำคลองเตย ฝสน. ที่รายงานว่าเดือนมกราคม 2567 ยังไม่ลงนามในสัญญาแต่มีการแจ้งเริ่มงานแล้วอยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงานร้อยละ 20 และเดือนกุมภาพันธ์ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงานร้อยละ 10

นายสุชาติ สิริสรณ์บัญชา (หน.สสจ.1 ฝสน.) ชี้แจงรายการซื้อพร้อมติดตั้ง Radio Tower แบบ Self support พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่สถานีสูบน้ำคลองเตยว่า มีการลงนามในสัญญาเดือนธันวาคม 2566 แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถเริ่มงานได้เนื่องจากมีการแก้แบบ Radio Tower ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ


จากการตรวจสอบพบว่า รายการ **งานติดตั้ง Radio Tower แบบ Self support** ลงนามสัญญาแล้ว แต่ไม่ได้บันทึก **PO** ในระบบ **SAP** ปัจจุบันดำเนินการแก้ไขแล้ว

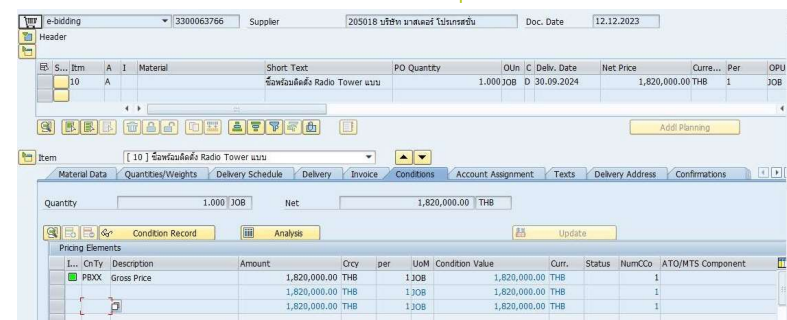

The screenshot shows a SAP PO entry for 'Radio Tower' with a quantity of 1,000 and a net price of 1,820,000 THB. The 'Pricing Elements' table is visible below.

L.	On/Off	Description	Amount	Qty	per	UoM	Condition Value	Curr.	Status	NumCo	ATO/MTS Component
1		Gross Price	1,820,000.00 THB	1		JOB	1,820,000.00 THB			1	
2		Gross Price	1,820,000.00 THB	1		JOB	1,820,000.00 THB			1	
3		Gross Price	1,820,000.00 THB	1		JOB	1,820,000.00 THB			1	

นอกจากนี้ งานจ้าง **Switchgear** ของ สถานีสูบน้ำลุมพินี และราษฎร์บูรณะ ลงนามสัญญาแล้ว แต่ไม่ได้บันทึก **PO** ในระบบ **SAP** เช่นกัน ปัจจุบันดำเนินการแก้ไขแล้ว

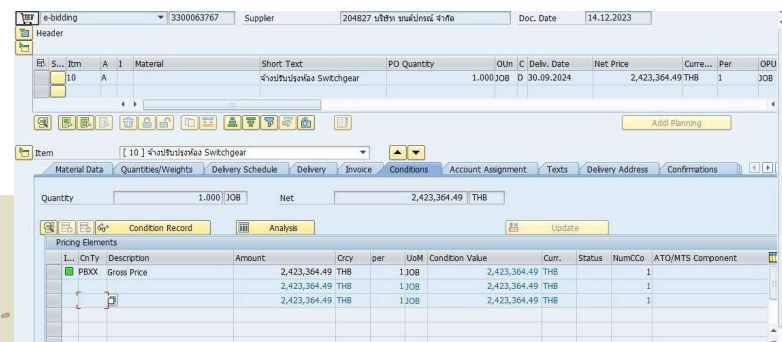

The screenshot shows a SAP PO entry for 'Switchgear' with a quantity of 1,000 and a net price of 2,423,364.49 THB. The 'Pricing Elements' table is visible below.

L.	On/Off	Description	Amount	Qty	per	UoM	Condition Value	Curr.	Status	NumCo	ATO/MTS Component
1		Gross Price	2,423,364.49 THB	1		JOB	2,423,364.49 THB			1	
2		Gross Price	2,423,364.49 THB	1		JOB	2,423,364.49 THB			1	
3		Gross Price	2,423,364.49 THB	1		JOB	2,423,364.49 THB			1	



ขอให้ตรวจสอบการลงนามสัญญา
กับการบันทึก PO ในระบบ SAP ให้ถูกต้องตรงกันด้วย

3.1 ผวก. สอบถามความก้าวหน้าครุภัณฑ์ ดังนี้

4. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำ พหลโยธินพร้อมงานอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ของ ฝสน.

- อยู่ระหว่างประชุมกำหนดแนวทางเบิกจ่าย
- เลขาคณะทำงาน ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

ประธาน สอบถามแผนการดำเนินงานรายการงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำพหลโยธินพร้อมงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการ ชี้แจงว่า จากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งว่า งานดังกล่าว
อาจจะชะลอออกไปดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2572 โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีงบลงทุนที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอ
ดังนั้น จึงอาจจะยกเลิกรายการลงทุนไปก่อน และเมื่อมีความพร้อมสามารถตั้งงบลงทุนอีกครั้ง



3.1 ผวก. สอบถามความก้าวหน้าครุภัณฑ์ ดังนี้

5. ความคืบหน้า การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ของ ฝจพ.

ประธาน สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร

ผู้แทนสายงานบริหาร ชี้แจงว่าเนื่องจากรายการลงทุนดังกล่าวติดประเด็นเรื่องราคากลาง เพราะราคากลางค่อนข้างต่ำ โดยหากครั้งนี้ประกาศราคากลางแล้ว และยังไม่สามารถจัดซื้อได้ก็จะมีการมอบอำนาจให้หน่วยงานไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง

นางสาวชนัสลา พัฒน์เชียร (นักบริหารงาน 7 รองผู้ว่าการ (บริหาร)) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายการรถจักรยานยนต์ ที่นำรายการตั้งแต่ปี 2565-2567 มาจัดซื้อรวมกัน โดยการกำหนดราคากลางจะต้องใช้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนทุก 6 เดือน โดยล่าสุดมีการปรับราคา ในเดือนมกราคม 2567 ทั้งนี้ ทาง รวท.(บ) ได้หารือกับ ฝจพ. ในการเร่งรัดการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ และในกรณีที่ทาง ฝจพ. ไม่สามารถจัดซื้อได้ จะปรับเปลี่ยนวิธีให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง

3.2 การเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบความถูกต้องระหว่าง SAP กับการลงนามสัญญา

เลขานุการ รายงานการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้ากว่าแผนที่ว่า สาเหตุหลักประการหนึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาได้ ดังนั้นจึงควรเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้โดยเร็ว นอกจากนี้ ฝงป. ขอความร่วมมือผู้แทนสายงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนระหว่าง SAP กับการลงนามในสัญญา เช่น บางรายการลงทุน หน่วยงานมีการรายงานว่าได้ลงนามสัญญาแล้ว แต่จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบ SAP ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล PO หรือกรณีที่มีการจัดทำ PO ในระบบ SAP แล้วแต่ไม่มีการบันทึก (Hold PO) ฝงป. จะไม่สามารถติดตามข้อมูลการทำสัญญาของรายการลงทุนดังกล่าวได้

04

การจัดสรรงบประมาณซ่อมท่อ
(ปกติ) และ ค่าท่ออุปกรณ์เพิ่มเติม



ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ
94,276,581.85 บาท

ค่าสำรวจหาท่อรั่ว
9,192,319.00 บาท

ค่าท่ออุปกรณ์
57,547,297.87 บาท

รวมทั้งสิ้น

161,016,198.72 บาท

ฝจส. มีงบค่าจ้างเหมาสำรวจ
และซ่อมท่อ (ปกติ)
คงเหลือ 19.00 ล้านบาท

ซ่อมท่อ + สร

งบประมาณที่ต้องการเพิ่มเติม งานจ้างเหมาซ่อมท่อ และ งานสำรวจหาท่อรั่ว

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 2567

สาขา	วงเงินงบประมาณคงเหลือ (เฉพาะงบปกติ) 14 มี.ค.67			คาดการณ์เปิดสัญญา มี.ค.67 - ก.ย.67			ต้องการงบประมาณเพิ่มเติม		
	ซ่อมท่อ	สร.	รวม	ซ่อมท่อ	สร.	รวม	ซ่อมท่อ	สร.	รวม
สสส	441,968.22	1,119,689.00	1,561,657.22	6,600,000.00	ไม่มีข้อมูล	6,600,000.00	5,039,000.00	ไม่มีข้อมูล	5,039,000.00
สสพ	468,982.25	163,247.00	632,229.25	9,345,794.39	ไม่มีข้อมูล	9,345,794.39	-	ไม่มีข้อมูล	-
สสป	1,825,758.88	622,766.07	2,448,524.95	9,300,000.00	1,700,000.00	11,000,000.00	9,300,000.00	1,700,000.00	11,000,000.00
สสท	289,887.85	198,844.00	488,731.85	2,000,000.00	ไม่มีข้อมูล	2,000,000.00	2,000,000.00	ไม่มีข้อมูล	2,000,000.00
สสม	949,605.29	73,832.00	1,023,437.29	2,598,598.13	-	2,598,598.13	1,575,160.84		1,575,160.84
สสญ	733,275.88	57,378.00	790,653.88	-	ไม่มีข้อมูล	-	-	ไม่มีข้อมูล	-
สสล	2,956,196.38	68,149.00	3,024,345.38	ไม่มีรายละเอียด	ไม่มีข้อมูล	-	-	ไม่มีข้อมูล	-
สสช	-	34,588.00	34,588.00	ไม่มีข้อมูล		-	ไม่มีข้อมูล		-
สสข	2,070,820.56	38,377.00	2,109,197.56	5,000,000.00	ไม่มีข้อมูล	5,000,000.00	2,900,000.00	ไม่มีข้อมูล	2,900,000.00
สสมบ	23.36	56,728.03	56,751.39	-	ไม่มีข้อมูล	-	-	ไม่มีข้อมูล	-
สสสก	1,626,646.26	47,013.00	1,673,659.26	ไม่มีรายละเอียด	ไม่มีข้อมูล	-	4,000,000.00	ไม่มีข้อมูล	4,000,000.00
สสบ	6,760,266.35	183,490.00	6,943,756.35	18,737,857.74	ไม่มีข้อมูล	18,737,857.74	11,977,591.39	ไม่มีข้อมูล	11,977,591.39
สสด	4,052,046.73	34,187.00	4,086,233.73	13,000,000.00	2,000,000.00	15,000,000.00	8,947,953.27	2,000,000.00	10,947,953.27
สสก*	1,565,977.94	- 571,040.00	994,937.94	31,308,411.21	2,000,000.00	33,308,411.21	26,471,405.24	2,571,040.00	29,042,445.24
สสว	4,793,509.51	187,557.00	4,981,066.51	18,691,400.00	2,090,000.00	20,781,400.00	13,897,890.49	1,902,443.00	15,800,333.49
สสน	1,518,085.98	116,164.00	1,634,249.98	2,910,000.00	1,135,000.00	4,045,000.00	1,391,914.02	1,018,836.00	2,410,750.02
สสบท	3,374,333.40	284,046.00	3,658,379.40	10,150,000.00	ไม่เปิดสัญญาเพิ่ม	10,150,000.00	6,775,666.60	-	6,775,666.60
สสมส	3,594,177.57	1,154,209.00	4,748,386.57	3,748,386.57	1,000,000.00	4,748,386.57	-	-	-
ฝจส	-	19,000,001.08	19,000,001.08						
ฝคจ	11,773.50		11,773.50						
รวม	37,021,562.41	22,869,225.18	59,902,561.09	133,390,448.04	9,925,000.00	143,315,448.04	94,276,581.85	9,192,319.00	103,468,900.85

ข้อมูล

๑

รายละเอียด			ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ				เลขหนังสืออ้างอิง	
			เดือน	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาดำเนินการ	วงเงินที่เปิดสัญญา		วงเงินที่ขอเพิ่ม (หลังหักงบคงเหลือแล้ว)
1	สสท.	โซน 1,2,3,4,9 อยู่ขั้นตอนประกาศประกวดราคา	มี.ค. 67	สป01 04 67	9 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	8,097,000.00	1,336,733.65	สวปกอบสสท 134/2567
2	สสท.	โซน 5,6,7 และ 8 อยู่ขั้นตอนจัดทำราคากลาง	มี.ค. 67	สป01 05 67	25 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	8,097,000.00	8,097,000.00	
3	สสท.		มี.ค. 67	สป02 03 67	เม.ย.67 - ก.ย.67	9,350,000.00	5,297,953.27	
4	สสท.	โซน 03,06,08,10 กั้นวงเงิน Po เรียบร้อยแล้ว	มี.ค. 67	สป11 08 67	1 มี.ค.67 - 31 มี.ค.67	2,336,448.60	-	สวปกอบสสท90/2567
5	สสท.	โซน 05,07 กั้นวงเงิน Pr เรียบร้อยแล้ว	มี.ค. 67	สป11 09 67	16 มี.ค.67 - 31 มี.ค.67	934,579.44	-	
6	สสท.	โซน 03,06,08,10	มี.ค. 67	สป11 10 67	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	7,943,925.23	6,377,947.29	
7	สสท.	โซน 05,07	มี.ค. 67	สป11 11 67	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	6,074,766.36	6,074,766.36	
8	สสท.		มี.ค. 67	สป14 03 67	1 พ.ค.67 ถึง 20 ก.ค.67	9,345,700.00	4,552,190.49	
ความต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ เดือน มี.ค.67						52,179,419.63	31,736,591.06	-
1	สสท.	เปิดรองรับพื้นที่ PBC ที่ยังไม่มีสัญญา โซน 1 , 2 และ 9 จ้างวิธีเฉพาะเจาะจง	เม.ย. 67	สป01 06 67	1 พ.ค. - 30 ก.ค.67	2,543,857.74	2,543,857.74	สวปกอบสสท 134/2567
2	สสท.		เม.ย. 67	สป02 04 67	มิ.ย.67 - ก.ย.67	3,650,000.00	3,650,000.00	สวปสสท37/2567
3	สสท.	โซน 03,06,08,10	เม.ย. 67	สป11 12 67	1 มิ.ย.67 - 30 ก.ย.67	7,943,925.23	7,943,925.23	สวปกอบสสท90/2567
4	สสท.	โซน 05,07	เม.ย. 67	สป11 13 67	1 มิ.ย.67 - 30 ก.ย.67	6,074,766.36	6,074,766.36	
5	สสท.		เม.ย. 67	สป07 02 67	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	6,600,000.00	5,039,000.00	สวปกอบสสท 23/2567
6	สสท.	กั้นวงเงิน PR แล้ว	เม.ย. 67	สป13 02 67	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	9,345,794.39	-	สวปกอบสสท 31/2567
7	สสท.	02 07 ยกเว้น 06	เม.ย. 67	สป17 03 67	1 มิ.ย.67 - 30 ก.ย.67	9,300,000.00	9,300,000.00	
ความต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ เดือน เม.ย.67						45,458,343.72	34,551,549.33	
1	สสท.		พ.ค. 67	สป14 04 67	21 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	9,345,700.00	9,345,700.00	-
2	สสท.		พ.ค. 67	สป04 03 67	20 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	2,910,000.00	1,391,914.02	สสน169/2567
3	สสท.	E - Bidding	พ.ค. 67	สป54 04 67	16 พ.ค. 67 30 ก.ย.67	10,000,000.00	6,775,666.60	สวปกอบสสท18/2567
4	สสท.	สัญญาโยธาซ่อมผิว พท.	พ.ค. 67	สัญญาโยธาซ่อมผิว พท.	พ.ค. 67	150,000.00	-	สวปกอบสสท18/2567
5	สสท.		พ.ค. 67	สป16 02 67	15 มิ.ย.67 - 30 ก.ย.67	5,000,000.00	2,900,000.00	
ความต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ เดือน พ.ค.67						27,405,700.00	20,413,280.62	-
1	สสท.		มิ.ย. 67	สป56 03 67	สิ้นสุด 30 ก.ย.66	3,748,386.57	-	สวปกอบสสท54/2567
2	สสท.		มิ.ย. 67	สป05 02 67	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	2,000,000.00	2,000,000.00	สวปสสท7/2567
			มิ.ย. 67					
ความต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ เดือน มิ.ย.67						5,748,386.57	2,000,000.00	-
1	สสท.		ก.ค. 67	สป06 04 67	15 มิ.ย.67 - 30 ก.ย.67	2,598,598.13	1,575,160.84	สวปกอบสสท46/2567
2	สสท.	ไม่มีรายละเอียด	ก.ค. 67			-	4,000,000.00	
ความต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ เดือน ก.ค.67						2,598,598.13	5,575,160.84	-
ต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ รวมทั้งสิ้น						133,390,448.05	94,276,581.85	-

สร

สาขาพิจารณาการณเปิดสัญญาและขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

งานสำรวจหาท่อรั่ว

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.2567

ลำดับที่	สาขา	รายละเอียด	ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ				
			เดือน	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาดำเนินการ	วงเงินที่เปิดสัญญา	วงเงินที่ขอเพิ่ม
1	สสภ.	โซน 03,05 และ 07	มี.ค.-67	สร 11-03-67	เม.ย.67 - มิ.ย.67	500,000.00	500,000.00
2	สสภ.	โซน 06,08 และ 10	มี.ค.-67	สร.11-04-67	เม.ย.67 - มิ.ย.67	500,000.00	500,000.00
3	สสภ.	กลบวงเงินติดลบ				-	571,040.00
4	สสว.		มี.ค.-67	สร.14-05-67	20 เม.ย.67 - 15 ก.ย.67	1,470,000.00	1,470,000.00
6	สสนส.		มี.ค.-67	สร.56-02-67	25พ.ค.67 - 15 ก.ย.67	1,000,000.00	-
7	สสต.		มี.ค.-67	ไม่มีรายละเอียด			2,000,000.00
							-
ความต้องการงบประมาณงานสำรวจหาท่อรั่ว เดือน มี.ค.66						3,470,000.00	5,041,040.00
1	สสป.	โซน 02,03,04,05,06,07,11	พ.ค.-67	สร.17-04-67	พ.ค.67 - ก.ย.67	934,579.44	940,000.00
2	สสป.	โซน 01 ,08 ,09 ,10	พ.ค.-67	สร.17-05-67	พ.ค.67 - ก.ย.67	747,663.55	760,000.00
ความต้องการงบประมาณงานสำรวจหาท่อรั่ว เดือน พ.ค.66						1,682,242.99	1,700,000.00
1	สสภ.	โซน 03,05 และ 07	มิ.ย.-67	สร 11-05-67	ก.ค.67 - ก.ย.67	500,000.00	500,000.00
2	สสภ.	โซน 06,08 และ 10	มิ.ย.-67	สร.11-06-67	ก.ค.67 - ก.ย.67	500,000.00	500,000.00
3	สสว.		มิ.ย.-67	สร.14-06-67	1 ก.ค.67 - 15 ก.ย.67	620,000.00	432,443.00
4	สสน.		มิ.ย.-67	สร.14-06-67	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	1,135,000.00	1,018,836.00
ความต้องการงบประมาณงานสำรวจหาท่อรั่ว เดือน มิ.ย.66						2,755,000.00	2,451,279.00
ต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ รวมทั้งสิ้น						7,907,242.99	9,192,319.00

ค่าท่ออุปกรณ์

งบประมาณที่ต้องการเพิ่มเติม ค่าท่ออุปกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.2566

สาขา	วงเงินงบประมาณคงเหลือ 14 มี.ค.67	ค่าท่ออุปกรณ์ใช้จริง	ค่าท่อเฉลี่ยต่อเดือน	คาดการณ์ใช้งบประมาณ มี.ค.66 - ก.ย.66	ต้องการงบประมาณเพิ่มเติม	งบประมาณไม่เพียงพอในเดือน
สสส	1,903,735.82	5,394,264.18	980,775.31	7,294,758.97	4,900,000.00	พ.ค.-67
สสป	6,762,881.52	4,951,118.48	900,203.36	6,762,881.52	-	ก.ย.-67
สสพ	12,681,472.45	9,865,527.55	1,793,732.28	-	3,418,503.00	ส.ค.-67
สสท	1,660,741.11	2,098,258.89	381,501.62	-	ยังไม่ได้รับข้อมูล	
สสม	1,159,433.08	3,986,566.92	724,830.35	4,972,604.34	3,916,018.31	เม.ย.-67
สสญ	5,535,572.70	7,483,427.30	1,360,623.15	8,910,000.00	3,373,692.30	ก.ค.-67
สสล	5,120,840.83	6,252,159.17	1,136,756.21	5,600,000.00	668,881.71	ส.ค.-67
สสช	2,691,012.89	5,683,987.11	1,033,452.20	-	ยังไม่ได้รับข้อมูล	
สสข	2,866,465.15	4,025,356.85	731,883.06	5,403,477.94	2,500,000.00	มิ.ย.-67
สสมบ	6,833,826.58	6,079,173.42	1,105,304.26	8,508,750.64	1,700,000.00	ส.ค.-67
สสสภ	3,751,211.66	7,252,788.34	1,318,688.79	8,251,211.66	4,500,000.00	มิ.ย.-67
สสบ	4,187,732.22	9,407,267.78	1,710,412.32	11,214,000.00	7,161,621.61	พ.ค.-67
สสด	15,938,037.24	9,746,962.76	1,772,175.05	-	ยังไม่ได้รับข้อมูล	
สสภ	3,994,543.04	9,543,456.96	1,735,173.99	15,398,065.32	11,403,830.28	เม.ย.-67
สสว	6,319,529.63	11,070,470.37	2,012,812.79	15,600,000.00	9,280,470.37	พ.ค.-67
สสน	3,732,657.83	3,469,542.17	630,825.85	4,856,938.12	1,124,280.29	ส.ค.-67
สสบท	4,917,302.58	7,638,697.42	1,388,854.08	8,612,223.76	3,700,000.00	มิ.ย.-67
สสมส	10,662,520.40	8,474,479.60	1,540,814.47	10,662,328.71	-	ก.ย.-67
รวม	100,719,516.73	122,423,505.27	22,258,819.14	122,047,240.98	57,647,297.87	ก.ย.-67

ควรพิจารณากำหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณค่าท่ออุปกรณ์ให้กับสาขา โดยเฉพาะ สสส. สสม. สสบ. สสภ. สสว.



Thank you!

Do you have any questions?
