



## วาระที่ 4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 4/2567

18 เมษายน 2567



# Agenda Style

01

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ประจำเดือน มี.ค.67  
และสะสม ต.ค.66 – มี.ค.67

02


มติคณะเร่งรัด  
เบิกจ่ายงบประมาณ

03

คาดการณ์เบิกจ่าย  
งบประมาณ

04

การบริหารงบประมาณ  
และงบลงทุน





1. ผลการเบิกจ่ายบลงทุนประจำเดือน มี.ค.67  
และสะสม ต.ค.66 – มี.ค.67


# แผน – ผลเบิกจ่าย มี.ค.67 และสะสม ต.ค.66 – มี.ค.67

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน มี.ค.67				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.66 – มี.ค.67			
	แผน มี.ค.67	ผล มี.ค.67	ผลต่าง	%	แผนสะสม	ผลสะสม	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	48.44	49.55	1.11	102.3%	147.87	275.96	128.09	186.6%
ลดน้ำสูญเสีย	330.38	321.93	(8.45)	97.4%	1,140.37	1,878.10	737.74	164.7%
มาตรวัดน้ำ	20.68	27.96	7.29	135.2%	115.62	149.62	34.00	129.4%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.24	3.91	(0.33)	92.2%	19.11	21.95	2.85	114.9%
ขยายเขตชุมชนเมือง	2.47	2.96	0.49	120.0%	22.44	62.12	39.68	276.8%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	7.24	14.51	7.27	200.4%	54.72	90.55	35.84	165.5%
งานรื้อย้ายท่อประปา	10.36	7.57	(2.78)	73.1%	12.86	40.53	27.67	315.1%
งานรับจ้างงาน	60.98	67.23	6.25	110.2%	239.70	424.29	184.59	177.0%
งานติดตั้งประปาใหม่	24.48	24.33	(0.16)	99.3%	106.16	130.75	24.59	123.2%
งานทดแทนระบบเฝ้าระวัง DMA	6.76	10.37	3.60	153.3%	52.80	42.08	(10.72)	79.7%
งานก่อสร้างอาคาร สสب.	-	0.00	0.00	-	10.90	26.95	16.05	247.2%
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>516.03</b>	<b>522.75</b>	<b>6.72</b>	<b>101.3%</b>	<b>1,922.54</b>	<b>3,142.91</b>	<b>1,220.37</b>	<b>163.5%</b>

## แผน - ผลเบิกจ่าย มี.ค.67 และสะสม ต.ค.66 - มี.ค.67

■ แผนเบิกจ่าย

■ ผลเบิกจ่าย

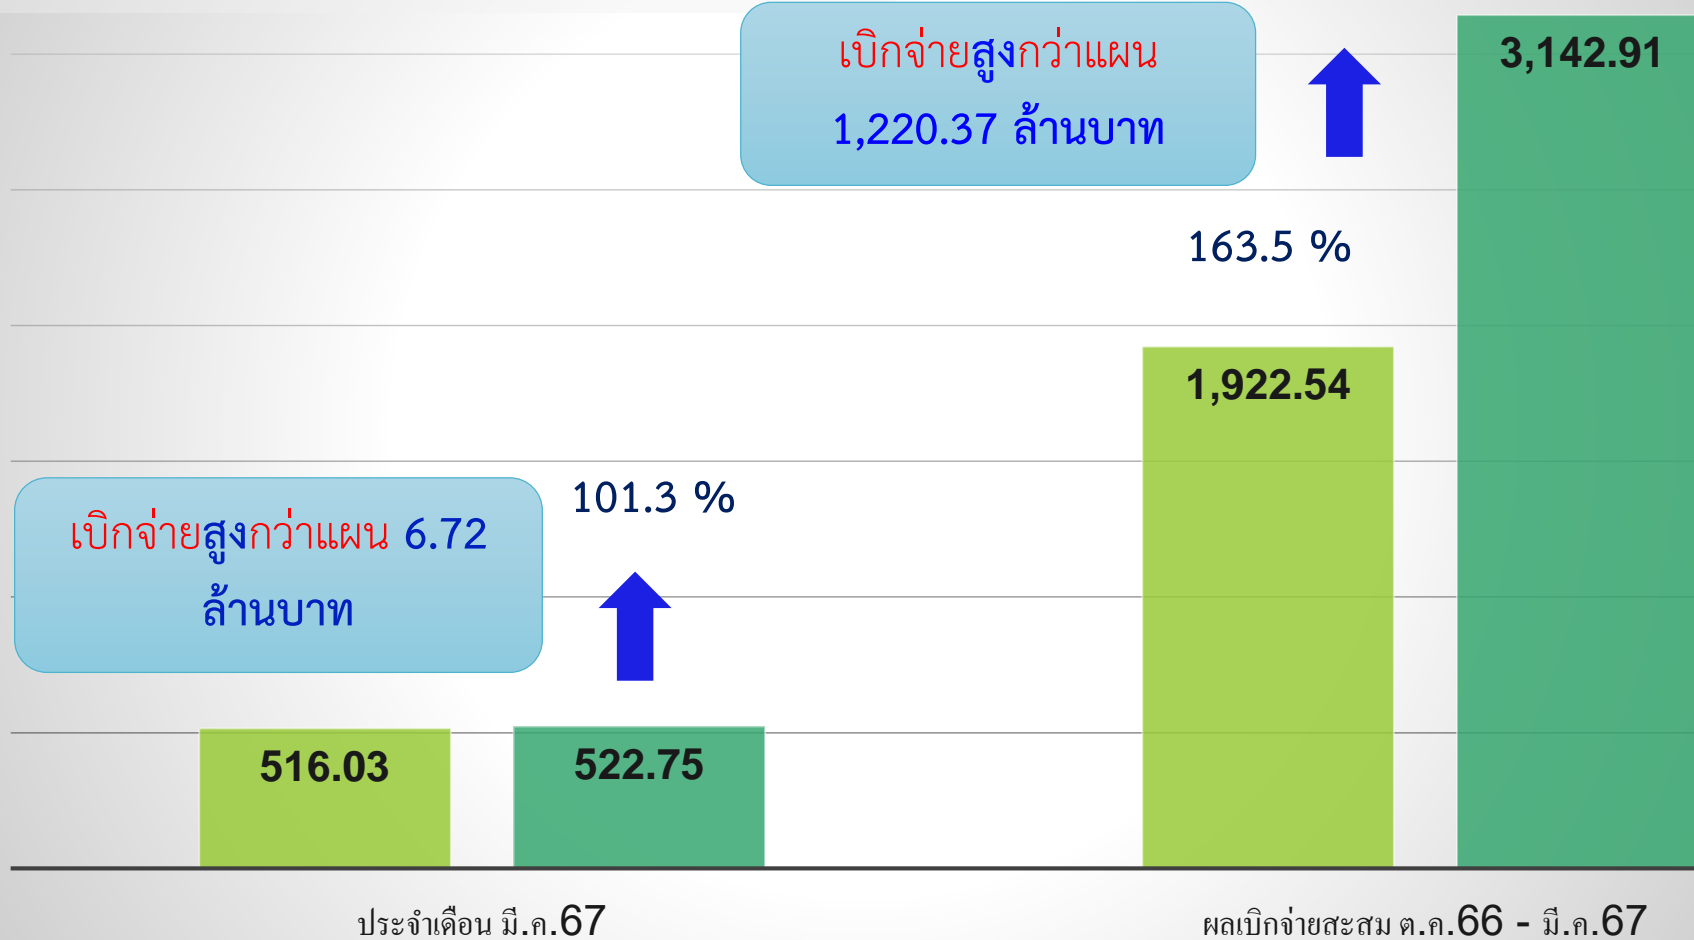



## 2. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

ยืนยันมติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย  
งบลงทุนประจำปี ครั้งที่ 3/2567

คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน  
ทุกรายการในระบบ CMS  
ภายในวันที่ 10 เม.ย.67



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี (ฝ่ายงบประมาณ)

ที่ ผังป 141 /2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567

เรื่อง ยืนยันมติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ครั้งที่ 3/2567

- |                                                            |                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| เรียน <input type="checkbox"/> ผู้ว่าการ                   | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (บริหาร)             |
| <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (การเงิน)            | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม)           |
| <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ)            | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)        |
| <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล)   |
| <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)  | <input type="checkbox"/> ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) |

ตาม มติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ประธานได้สั่งการให้หน่วยงานคาดการณ์ผลเบิกจ่ายงบลงทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลแสดงแนวโน้มการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2567 และกำหนดแนวทางการแก้ไขได้ทันที่หากคาดว่าจะผลเบิกจ่ายจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายงบประมาณ ขอความร่วมมือคณะทำงานฯ และผู้แทนทุกสายงาน กำชับหน่วยงานภายใต้สังกัดดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ CMS เป็นประจำทุกเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทุกรายการ ทั้งในส่วนของการลงนามสัญญา (M6) และการเบิกจ่ายงบลงทุน (M8) พร้อมบันทึกประเด็นปัญหาและความคืบหน้าในการดำเนินงานให้ครบถ้วน
2. ในกรณีที่หน่วยงานมีการยกเลิกรายการลงทุนที่มีแผนเบิกจ่ายในปี 2567 หรือกรณีที่คาดการณ์ผลเบิกจ่ายแล้วจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ขอให้พิจารณาและระบุรายการลงทุนที่จะสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อชดเชยรายการที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โดยหน่วยงานสามารถบันทึกข้อมูลคาดการณ์ผลเบิกจ่ายงบลงทุนในระบบ CMS สำหรับเดือนเมษายน ได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานและคาดการณ์ในระบบ CMS ที่แนบ ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ส่วนควบคุมงบลงทุน กองบริหารงบลงทุน ฝ่ายงบประมาณ โทรศัพท์ 1357 1387 และ 1952

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

สโรบล แสงระวี

(นางสาวขวัญ เชาวนะกิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ



### 3. การคัดค้านเบื้องต้น

ประเภท งบประมาณ	คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 6 เดือน + คาดการณ์ 6 เดือน					
	แผนเบิกจ่ายทั้งปี	ผลเบิกจ่ายถึง มี.ค.67	คาดการณ์ 6 เดือน	จริง + คาดการณ์	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	503.46	275.96	271.89	547.85	44.39	108.82%
ลดน้ำสูญเสีย	3,225.69	1,878.10	1,451.13	3,329.23	103.55	103.21%
มาตรวัดน้ำ	239.46	149.62	117.48	267.11	27.65	111.55%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	51.73	21.95	25.17	47.12	(4.61)	91.10%
ขยายเขตชุมชนเมือง	73.71	62.12	53.09	115.21	41.50	156.31%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	323.83	90.55	224.94	315.50	(8.33)	97.43%
งานรื้อย้ายท่อประปา	48.81	40.53	34.38	74.92	26.11	153.50%
ปรับปรุงระบบ DMA	122.73	42.08	47.89	89.97	(32.76)	73.31%
งานรับจ้างงาน	677.36	424.29	379.55	803.84	126.48	118.67%
งานติดตั้งประปาใหม่	240.55	130.75	110.68	241.43	0.89	100.37%
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	53.97	26.95	14.98	41.92	(12.05)	77.68%
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,561.28</b>	<b>3,142.91</b>	<b>2,731.18</b>	<b>5,874.10</b>	<b>312.82</b>	<b>105.62%</b>

## คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 6 เดือน + คาดการณ์ 6 เดือน

หน่วยงาน	แผนจ่าย ปี 2567	เบิกจริง 6 เดือน	คาดการณ์ 6 เดือน	จริง+ คาดการณ์	%
สสส	218.11	91.43	124.07	215.50	98.8%
สสพ	285.47	155.31	209.59	364.90	127.8%
สสป	355.88	240.57	112.37	352.94	99.2%
สสท	110.19	53.35	40.63	93.99	85.3%
สสม	110.90	48.58	59.14	107.73	97.1%
สสญ	210.91	169.86	86.01	255.87	121.3%
สสล	253.51	143.22	110.09	253.31	99.9%
ฟตส	0.06	0.06	0.00	0.06	99.6%
สสช	172.83	77.80	93.59	171.39	99.2%
สสข	180.40	113.67	73.56	187.23	103.8%
สสมบ	321.08	160.44	173.14	333.58	103.9%
สสสภ	355.18	169.06	153.44	322.50	90.8%
<b>รวม.(กบ)</b>	<b>2,574.54</b>	<b>1,423.36</b>	<b>1,235.62</b>	<b>2,658.99</b>	<b>103.3%</b>

หน่วยงาน	แผนจ่าย ปี 2567	เบิกจริง 6 เดือน	คาดการณ์ 6 เดือน	จริง+ คาดการณ์	%
สสบ	341.23	204.67	159.80	364.47	106.8%
สสต	298.78	119.48	182.99	302.47	101.2%
สสภ	377.44	206.75	203.10	409.85	108.6%
สสว	363.04	248.02	125.33	373.35	102.8%
สสน	200.88	132.06	68.58	200.63	99.9%
สสบท	311.14	223.46	133.23	356.69	114.6%
สสมส	377.43	222.07	166.08	388.15	102.8%
ฟจส	477.74	302.31	279.03	581.34	121.7%
ฝมน	28.73	28.15	0.40	28.55	99.4%
ฝคจ	87.04	24.55	65.79	90.34	103.8%
ฝสน	58.58	5.99	49.01	55.00	93.9%
<b>รวม.(กต)</b>	<b>2,922.02</b>	<b>1,717.51</b>	<b>1,433.33</b>	<b>3,150.84</b>	<b>107.8%</b>
<b>บริการ</b>	<b>5,496.56</b>	<b>3,140.87</b>	<b>2,668.96</b>	<b>5,809.83</b>	<b>105.7%</b>



## 4.การบริหารงบประมาณและงบลงทุน

ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการบริหารงบทำการ  
และงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567  
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๙ รวก.(กอ)

ที่ ผชช.กบ.๙-๖๒/๑๙ / ๒๕๖๗ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการบริหารงบทำการและงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ☐ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขา ☐ ผอ.ฝงส.

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารสายงานบริการด้านตะวันออกและบริการด้านตะวันตก ครั้งที่ ๓/๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ รวก.(กอ) มอบหมาย ผชช.กบ.ระดับ ๙ (นายกิตติพัฒน์ อุทัยมพร) เป็นผู้ประสานงานกับ ฝงป. ในการขอจัดสรรงบทำการและงบลงทุนเพิ่มเติม นั้น

จากการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้แทนสายงานบริการ ได้แก่ ประธานกลุ่ม ผจ. , ประธานกลุ่ม กอบ., ผอ.ฝงส. และ ฝ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อหาแนวทางการบริหารงบทำการและงบลงทุน ให้เพียงพอ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ ที่ประชุมมีมติให้สายงานบริการบริหารงบลงทุนภายในหน่วยงาน และบริหารงบทำการ ซึ่งเบื้องต้น ฝงป. จัดสรรวงเงินงบประมาณ ๖๑ ล้านบาท ให้กับสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเปิดสัญญา และเบิกจ่ายค่าท่ออุปกรณ์

เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างคล่องตัว และทันต่อการดำเนินการ จึงขอให้เชิญสาขาเข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมปิยราชบุรี พร้อมจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดการใช้งาน ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อและค่าท่ออุปกรณ์ (งบทำการ) , งานขยายเขต - รับจ้างงาน และงานปรับปรุงกำลังน้ำ (งบลงทุน) ค่าการณเปิดสัญญา และเบิกท่อพร้อมส่งไฟล์ excel ให้ กบ.ฝส.บ. รวบรวมและนำเสนอในการประชุมต่อไป ตามวันและเวลา ดังนี้

สายงาน	วัน เวลา และสถานที่
สาขาสังกัด รวก.(กต)	วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมปิยราชบุรี เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สาขาสังกัด รวก.(กอ)	วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมปิยราชบุรี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว  
ต่อไป

(นายกิตติพัฒน์ อุทัยมพร)  
ผชช.กบ.น. ระดับ ๙ รวก.(กอ)

ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 98,443,811.71 บาท

ค่าท่ออุปกรณ์ 62,079,509.66 บาท

ค่าสำรวจหาท่อรั่ว 18,176,211.01 บาท

มติที่ประชุมหารือการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่ว สำรวจหาท่อรั่ว และ  
ค่าท่ออุปกรณ์ และงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

ฟงป

61 ล้านบาท

ค่าซ่อมท่อ

ค่าท่ออุปกรณ์

ฟจส

แผน PBC ใหม่

80 ล้านบาท

รอ ฝนย. นำเข้า Steering

สัญญาซ่อมท่อ เดือน  
มิ.ย.67

PBC

13 สาขา เดิม

38 ล้านบาท

เร่งรัดการปิดสัญญา  
วงเงินคงเหลือนำมาใช้

# แนวทางการบริหารงบประมาณและงบลงทุน

## งบทำการ

01

- งบทำการ ฝปบ. จะจัดสรรวงเงินงบประมาณงบทำการเพิ่มเติม จำนวน 61 ล้านบาท ให้กับสายงาน เพื่อบริหารเงินงบประมาณตามความจำเป็นเร่งด่วน
- **ค่าท่ออุปกรณ์** จัดสรรให้กับสาขาที่ค่าท่ออุปกรณ์คงเหลือ ไม่เพียงพอ ให้เบิกถึง มิ.ย.67 โดยที่ประชุมพิจารณาจากค่าท่อเฉลี่ยต่อเดือน ไม่ได้จัดสรรตามความต้องการที่สาขาแจ้ง
- **ค่าจ้างเหมาสำรวจหาท่อรั่ว** ฝสส. จัดสรรให้กับสาขาครั้งที่ 2 ทั้งนี้ สาขาต้องจัดทำบันทึกยืนยัน ให้ ฝสส. โอนงบประมาณ
- **ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่ว** จัดสรรให้กับสาขาที่ต้องเปิดสัญญาเดือน เม.ย.67 – พ.ค.67 โดยโอนงบประมาณเมื่อสาขาอยู่ในขั้นตอน ลงนามสัญญา (PO) ขอให้แนบรายละเอียดวงเงินที่ลงนามใน PO มาพร้อมด้วย ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจะพิจารณาการ เบิกจ่ายค่าแรงค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่วประกอบด้วย
- งบประมาณที่จัดสรรให้ใช้รองรับงานค่าจ้างเหมาซ่อมท่อเท่านั้น (ห้ามนำไปใช้ในส่วนอื่น)

## งบลงทุน

02

- งบลงทุน ให้บริหารงบลงทุนภายในหน่วยงาน โดยสายงานบริการจะ ได้รับงบลงทุนที่ขอเพิ่มเติมในปีงบฯ 2567 ประมาณเดือน พฤษภาคม 2567
- หากหน่วยงานที่ได้ของบเพิ่มเติมกลางปี 2567 ไว้ ขอให้ประสานงาน กับสาขาในภาคเดียวกัน และภายในสายงานบริการก่อน ก่อนขอจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติม จาก ฝปบ. ต่อไป



## อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม บันทึกข้อความ

รวท.(กอ)
รับที่ 2072 เวลา 16.01
วันที่ 10 เม.ย. 2567

หน่วยงาน ..... ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๙ รวท.(กอ)

ที่ ผชชกปน๙-๖๒/ ๑๙ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าท่ออุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ สำรวจหาท่อรั่ว และงบลงทุน ปีงบฯ ๒๕๖๗



## บันทึกข้อความ

รวม(ณ)
รับ 1072- 1601
รับ 10 เม.ย. 2567

หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญการปราบปรามหลวง ระดับ ๙ รว.ก(ก)

ที่ ผช.กปน.๙-๖๒/ ๑๔ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าท่ออุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อสำรวจหาท่อรั่ว และงบลงทุน บึงบา ๒๕๖๗

เรียน รว.ก(ก)

จากการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้แทนสายงานบริการ ได้แก่ ประธานกลุ่ม ผจ. , ประธานกลุ่ม กอบ. , ผอ.ผจส. , ประธานกลุ่ม สวป. และ ฝ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๗ เพื่อหาแนวทางบริหารงบทำการและงบลงทุน ให้เพียงพอจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- งบลงทุน ให้บริหารงบลงทุนภายในหน่วยงาน โดยสายงานบริการจะได้รับงบลงทุนที่ขอเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ช่วงประมาณเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

- งบทำการ ผจป. จะจัดสรรวงเงินงบประมาณงบทำการเพิ่มเติม จำนวน ๖๑ ล้านบาท ให้กับสายงานบริการ เพื่อบริหารเงินงบประมาณตามความจำเป็นเร่งด่วน ที่ประชุมจึงกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณงบทำการ ดังนี้

๑. ค่าท่ออุปกรณ์ จัดสรรให้กับสาขาที่ค่าท่ออุปกรณ์คงเหลือไม่เพียงพอที่จะให้เบิกถึง มิ.ย.๖๗ โดยที่ประชุมพิจารณาจากค่าท่อเฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งไม่ได้จัดสรรตามความต้องการที่สาขาแจ้งมา และโอนค่าท่ออุปกรณ์ของสาขาที่งบประมาณคงเหลือ (คาดการณ์เพียงพอถึง ก.ย. ๖๗) ให้กับสาขาที่มีงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอ ทั้งนี้หากกรณีงบประมาณไม่เพียงพอใช้งาน ขอให้สาขาจัดทำบันทึกเสนอขอจัดสรรงบประมาณล่วงหน้า ๒ เดือน ตามลำดับชั้น และส่งให้ กป.ง.ผส.บ. รว.บ.รวม (เอกสารแนบ ๑)

๒. ค่าจ้างเหมาสำรวจหาท่อรั่ว ผจส. จัดสรรให้กับสาขาครั้งที่ ๒ ตามบันทึก ผจส ๑๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๗ วงเงิน ๒๐ ล้านบาท (เอกสารแนบ ๒) ซึ่งสาขาคงจัดทำบันทึกยืนยันให้ ผจส. เพื่อใช้ประกอบการโอนงบประมาณ กรณีสาขาไม่ได้ของงบประมาณเพิ่มเติมในครั้งนี้ หรือได้รับไม่เพียงพอ ขอให้สาขาจัดทำบันทึกขอจัดสรรเพิ่มเติมเพื่อให้ ผจส. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

### ๓. ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่ว

๓.๑ ขอให้สาขาทบทวนวงเงินในการเปิดสัญญาจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่ว ให้สอดคล้องกับสัญญา PBC และ ค่าจ้างเหมาสำรวจหาท่อรั่ว เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน และงานค้างซ่อมในระบบ

๓.๒ ผจส. ประสานงานกับ ผนช. เพื่อปรับลดวงเงินสัญญา PBC ประมาณ ๗๕-๘๐ ล้านบาท เนื่องจากแผนการลงนามสัญญา PBC ใหม่ล่าช้า โดยโอนให้กับ ๕ สาขา ที่สัญญา PBC เดิม สิ้นสุดระยะเวลาสัญญา ได้แก่ สสป. สสภ. สสค. สสภ. และ สสว. เพื่อนำวงเงินงบประมาณดังกล่าวใช้ในการเปิดสัญญาจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่วและค่าท่ออุปกรณ์ในพื้นที่ PBC

๓.๓ กรณีที่ต้องการ/ .....

-๒-

๓.๓ กรณีที่ต้องการวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม ขอให้จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบตามลำดับชั้น ส่งให้ กป.ง.ผส.บ. รว.บ.รวม นำเรียน รว.ก(ก) และ รว.ก(กต) โดยจะพิจารณาโอนงบประมาณเมื่อสาขาอยู่ในขั้นตอนลงนามสัญญา (PO) เท่านั้น (ขอให้แนบรายละเอียดวงเงินที่ลงนามใน PO มาพร้อมด้วย) ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจะพิจารณาการเบิกจ่ายค่าแรงค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่วประกอบด้วย

๓.๔ ขอให้สาขาเร่งรัดการเบิกจ่ายสัญญาจ้างเหมาซ่อมท่อ (ปกติ) และ สัญญา PBC เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา โดยด่วน เพื่อให้วงเงินคงเหลือ ใช้ในการบริหารค่าจ้างเหมาซ่อมท่อและค่าท่ออุปกรณ์ต่อไป

๓.๕ งบประมาณที่จัดสรรเพิ่มเติมให้สาขารองรับงานค่าจ้างเหมาซ่อมท่อนั้น (ห้ามโอนนำไปใช้ในส่วนอื่น)

๔. กรณีวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่ว หรือ ค่าท่ออุปกรณ์ไม่เพียงพอและไม่สามารถรองรับงานจนถึง ๓๐ ก.ย.๖๗ ขอให้สาขาจัดทำข้อมูลเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมส่งให้ กป.ง.ผส.บ. อีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบแนวทางการบริหารงบประมาณ และถือปฏิบัติต่อไป

(นายกิตติพัฒน์ อุทัยมพร)

ผช.กปน. ระดับ ๙ รว.ก(ก)

- ทราบ

เรียน ขว.ก(ก๑) - ขว.ก(ก๕) , ขว.ก(ก)

เพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบ  
แนวทางการบริหารงบประมาณ และถือปฏิบัติต่อไป

(นายสุเทพ เอื้อปกรณ์)

รว.ก(ก)

สำเนาเรียน : รว.ก(กต) , ผอ.กป.ง.ผส.บ.



THANK YOU

