




ผลการดำเนินงาน

ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ

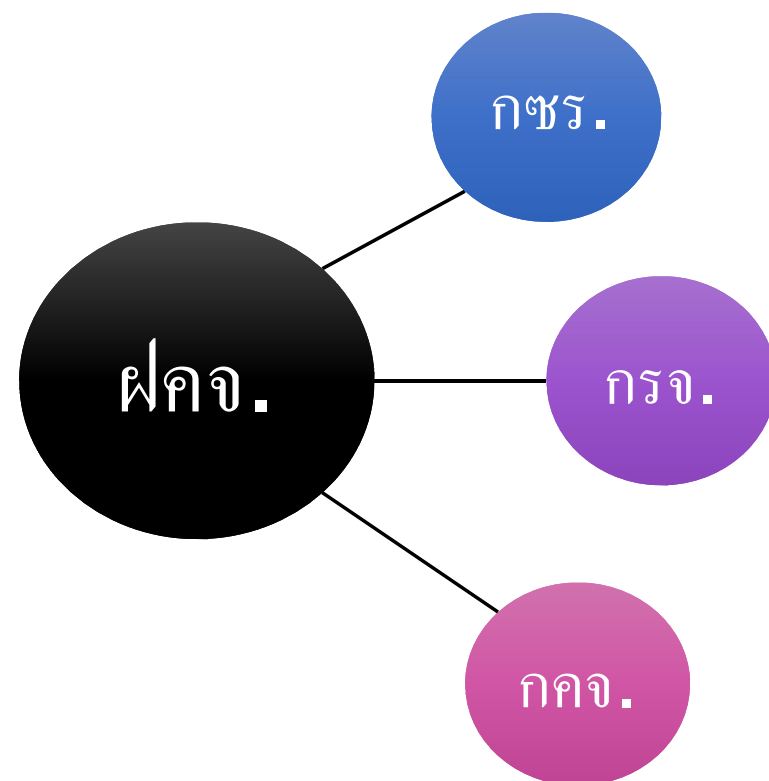

1. งานสำรวจหาท่อรั่วในท่อประธาน (ALC)

แผนที่แสดงโครงข่ายท่อประธาน
ด้วยหลักการสมดุลน้ำ (Water Balance)



แผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6

ALC-MAIN PIPE LENGTH INSPECTION 2567 (KM.)




ปริมาณน้ำสูญเสียสะสมในระบบท่อประธานที่ลดลงได้ประจำปีงบประมาณ 2567 (ลูกบาศก์เมตร)



รหัส - ชื่อโครงการ	แผนงาน	ปี 67		ปี 68		ปี 69		ปี 70	
SO1-T3-P1 โครงการปรับปรุงท่อประปา	แผนงานที่ 1 : งานสำรวจท่อประธานแตกรั่ว	540	20	540	20	540	20	540	20

ผลดำเนินการซ่อมท่อประธานประจำปีงบประมาณ 2567

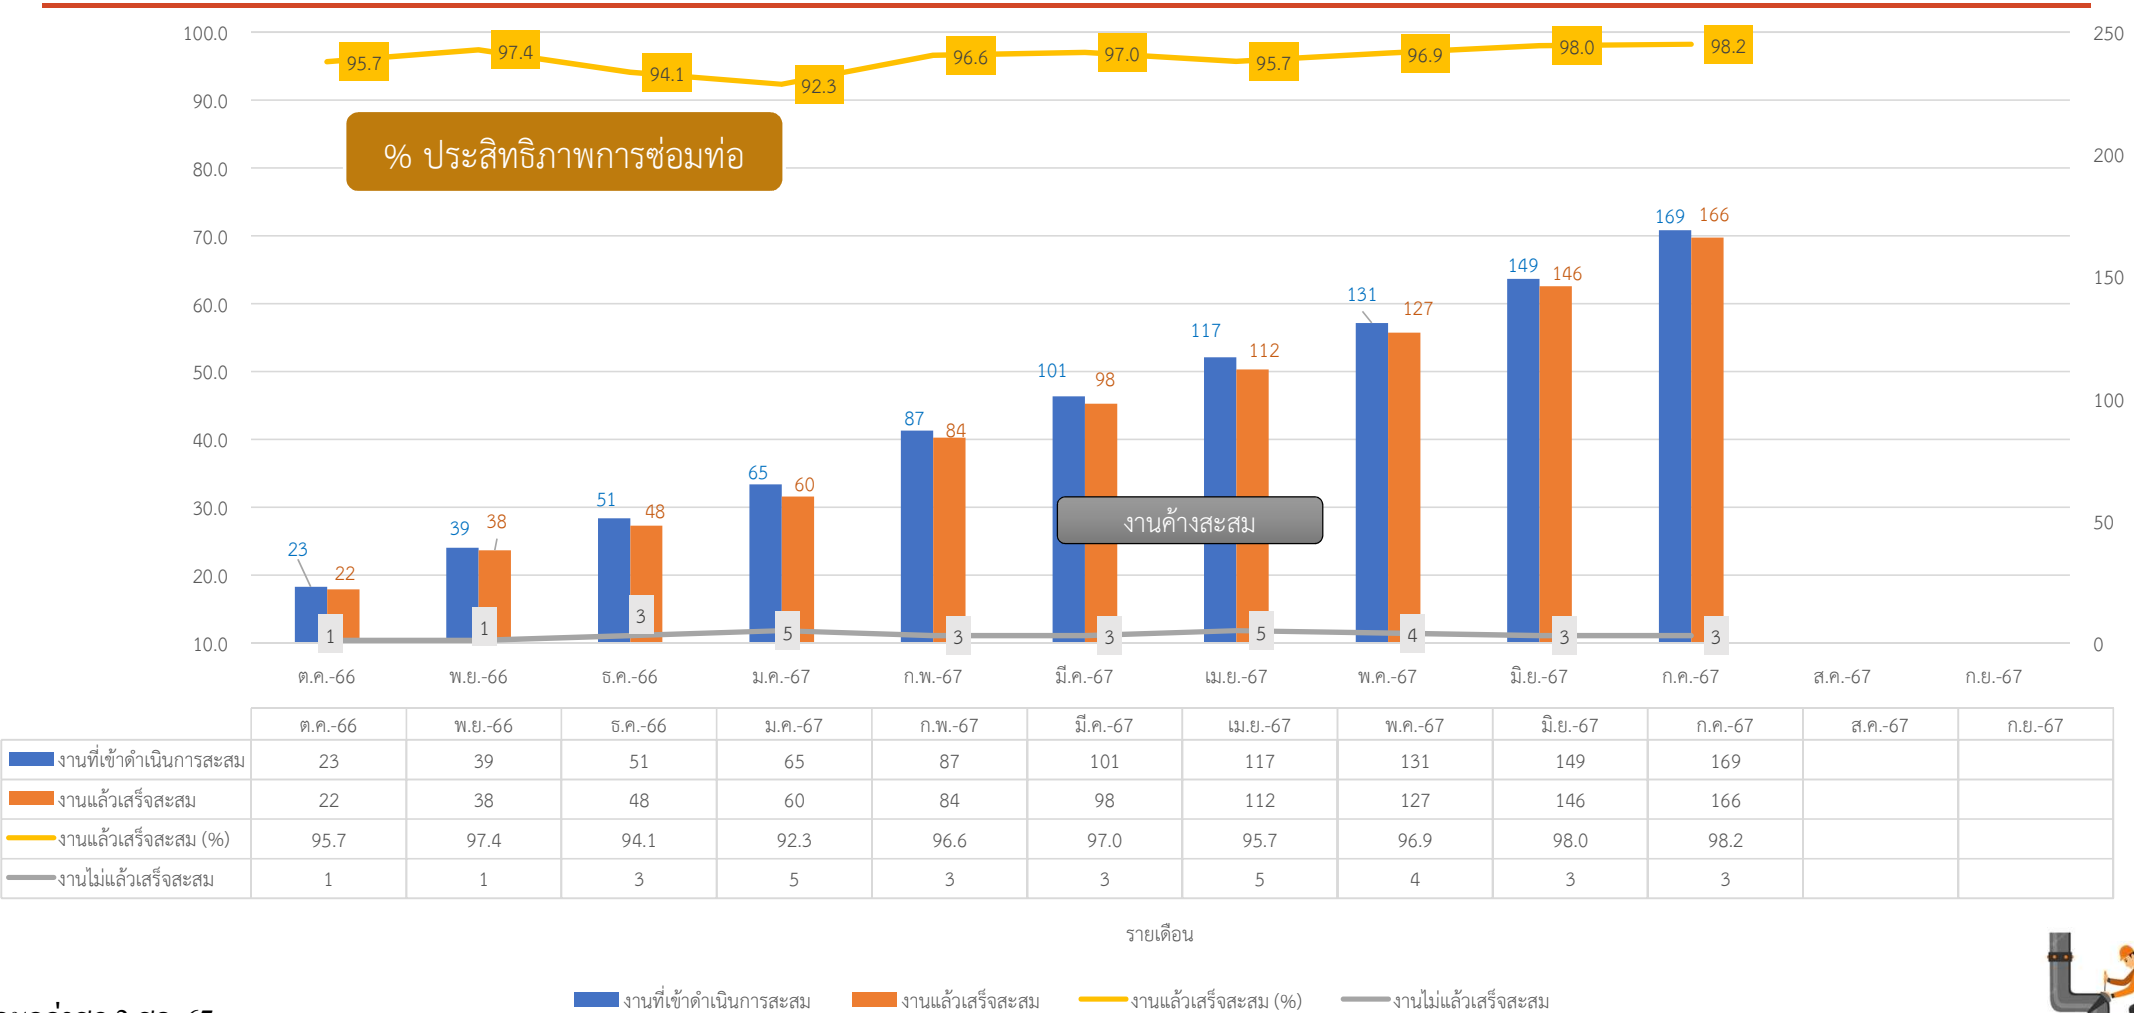

ข้อมูลล่าสุด 2 สค. 67

ปัญหาและอุปสรรคงานซ่อมท่อประธารานที่ ไม่แล้วเสร็จ

(งานที่ค้างข้อมูล ณ 1 ส.ค. 2567)





การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

เลขงาน	พิกัดจุดงาน	พื้นที่ สาขา	วันที่เริ่มเข้า ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
Job 122.3/67	ท่อส่งน้ำ 13,400 มม. แยก เกษตร ถนน ประเสริฐมนูกิจ	สสญ	7/5/67	- ดำสำรวจพบจุดรั่วท่อผุกร่อน ซ่อมโดยเชื่อมแผ่นปะ (ยังพบการผุกร่อน เพิ่มเติม) - นักประดาน้ำเชื่อมแผ่นเหล็กปะเพิ่มเติม 21/6/67 ยังพบการรั่ว - กำหนดเข้าสำรวจ พร้อมซ่อมอีกครั้ง 3/8/67
Job 148/67	ท่อ 3400 คลองบางขวด ถนนประเสริฐ มนูกิจ	สสล	22/6/67	- ประดาน้ำเข้าเชื่อมรอยแตกแนวเชื่อม ได้ 50 % - กำหนดดำน้ำเชื่อมอีก 1 ครั้ง 3/8/2567
Job 149/67	ยกเลิกท่อ 700ST ข้ามคลองเปรมประชากร ช่วงถนนงามวงศ์วานและงานที่เกี่ยวข้อง	สสข	25-26/6/67	- กצר.เข้าเตรียมงานตัดยกเลิกท่อข้ามคลอง ที่สนน. กทม ส่งหนังสือมา - กำหนด การตัดท่อ/รื้อย้ายท่อ รอ กค.ฝบค. กำหนดอีกครั้ง



กสร.ฝคจ.

ผลการดำเนินงานบริหารแรงดันน้ำ 162 จุด ปีงบประมาณ 67

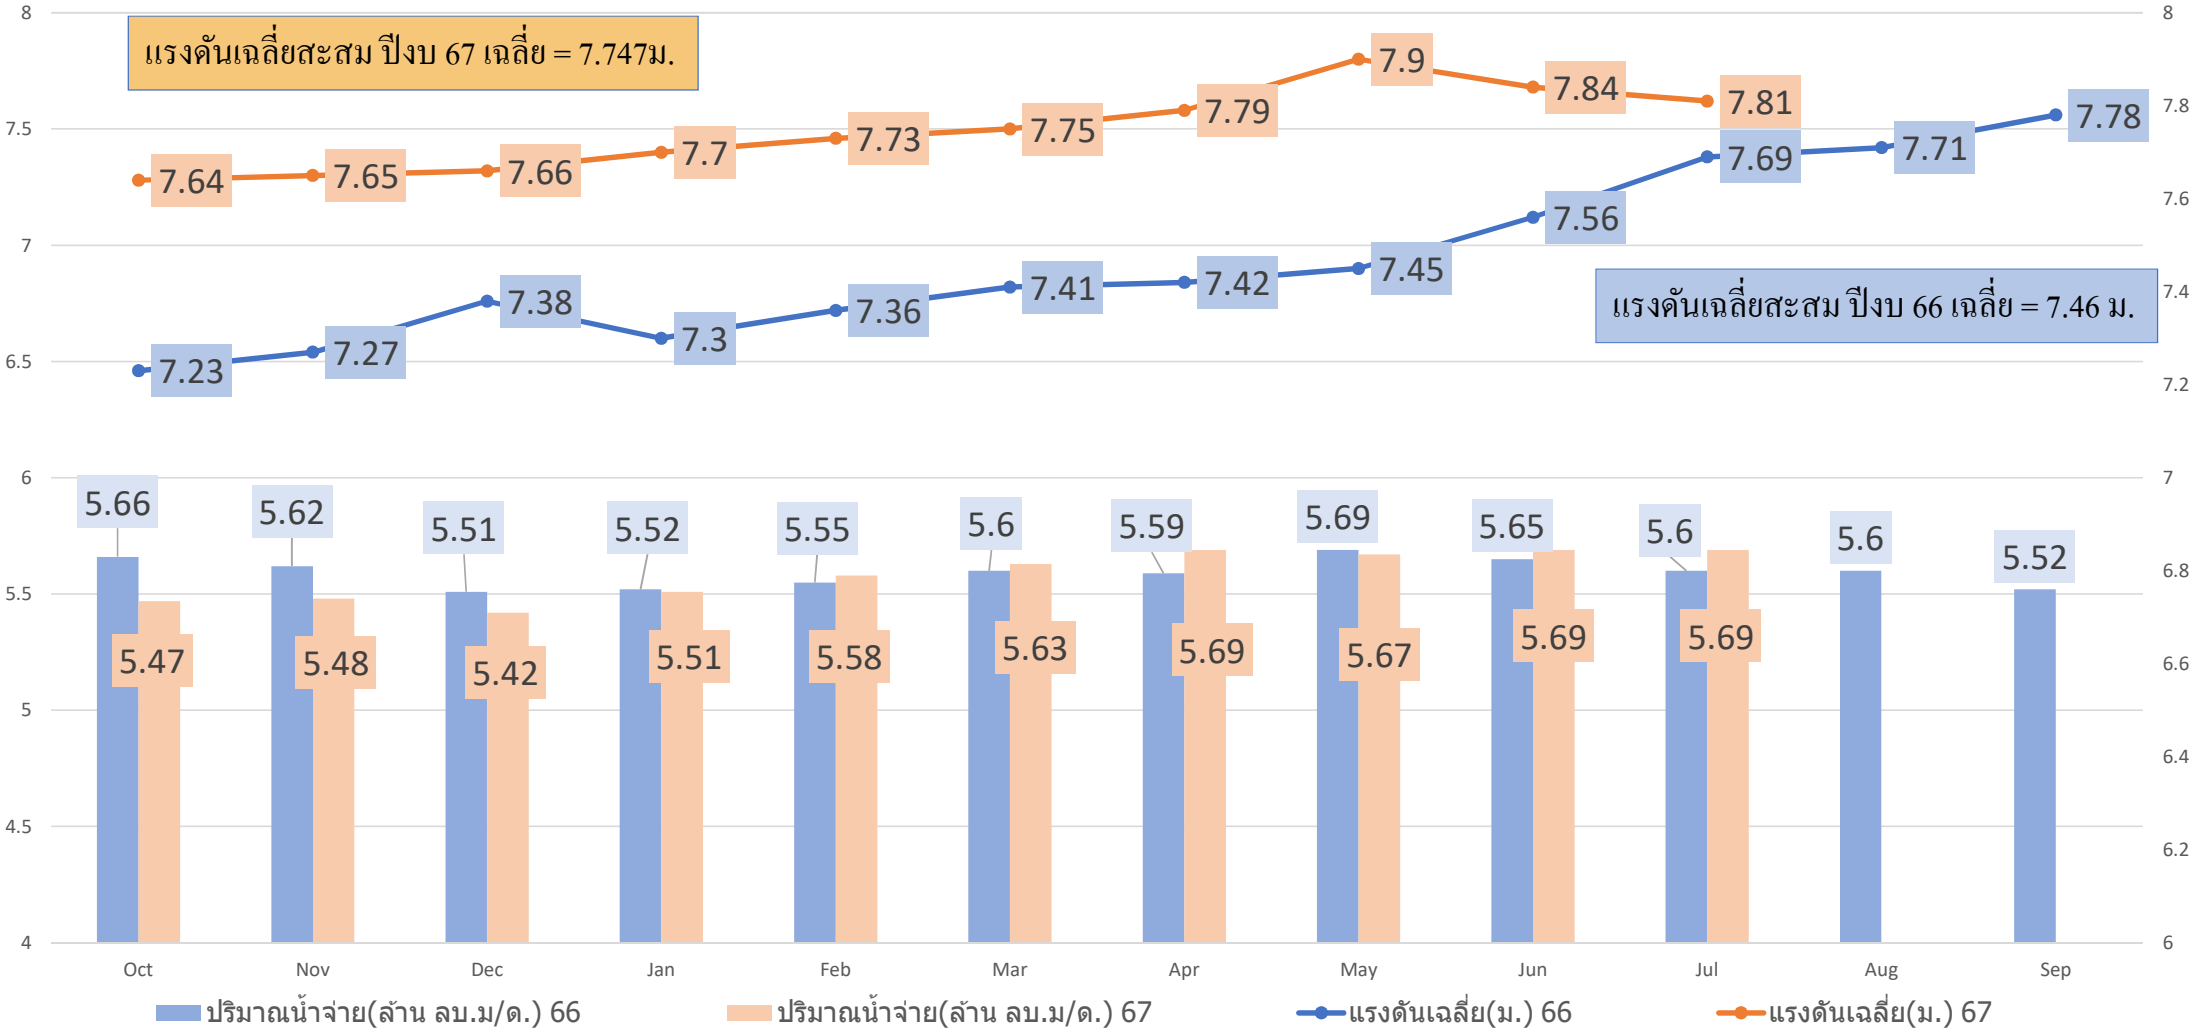


ข้อมูลล่าสุด 2 สค. 67



ผลการดำเนินงาน

ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ



1. งานสำรวจหาท่อรั่วในท่อประธาน (ALC)



การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

แผนที่แสดงโครงข่ายท่อประธาน
ด้วยหลักการสมดุลน้ำ (Water Balance)




แผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6

ALC-MAIN PIPE LENGTH INSPECTION 2567 (KM.)




ปริมาณน้ำสูญเสียสะสมในระบบท่อประธานที่ลดลงได้ประจำปีงบประมาณ 2567 (ลูกบาศก์เมตร)

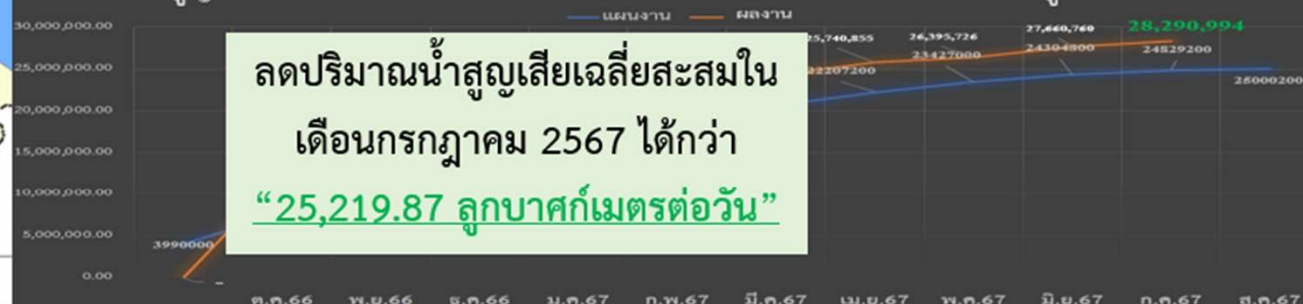

รหัส - ชื่อโครงการ	แผนงาน	ปี 67		ปี 68		ปี 69		ปี 70	
SO1-T3-P1 โครงการปรับปรุงท่อประปา	แผนงานที่ 1 : งานสำรวจท่อประธานแตกรั่ว	540	20	540	20	540	20	540	20

ผลดำเนินการซ่อมท่อประธานประจำปีงบประมาณ 2567

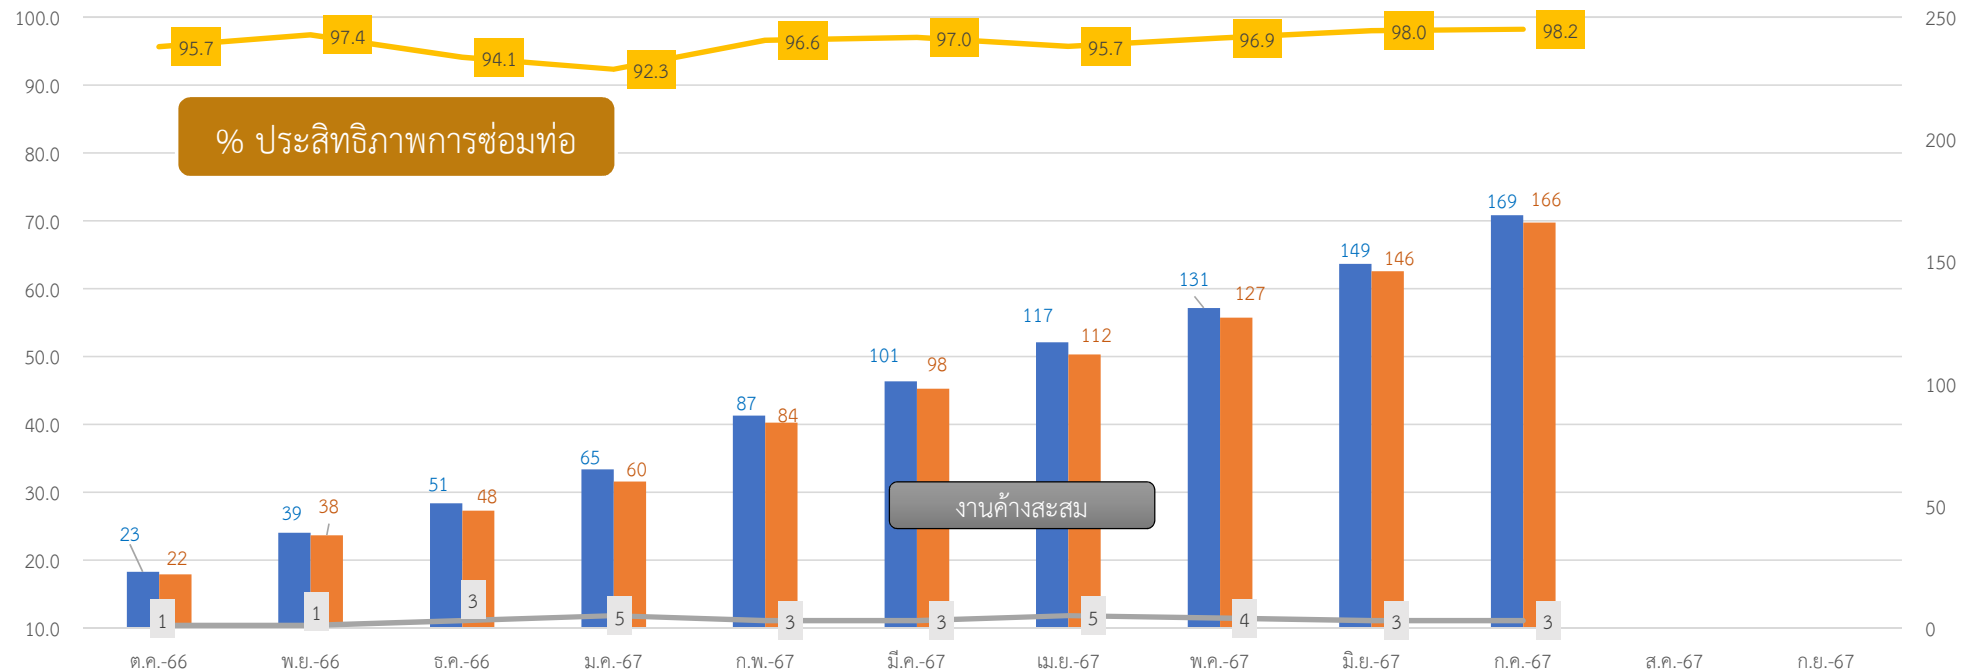

	ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67
งานที่เข้าดำเนินการสะสม	23	39	51	65	87	101	117	131	149	169		
งานแล้วเสร็จสะสม	22	38	48	60	84	98	112	127	146	166		
งานแล้วเสร็จสะสม (%)	95.7	97.4	94.1	92.3	96.6	97.0	95.7	96.9	98.0	98.2		
งานไม่แล้วเสร็จสะสม	1	1	3	5	3	3	5	4	3	3		

รายเดือน

งานที่เข้าดำเนินการสะสม งานแล้วเสร็จสะสม งานแล้วเสร็จสะสม (%) งานไม่แล้วเสร็จสะสม



ปัญหาและอุปสรรคงานซ่อมท่อประธารานที่ไม่แล้วเสร็จ

(งานที่ค้างข้อมูล ณ 1 ส.ค. 2567)





การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

เลขงาน	พิกัดจุดงาน	พื้นที่สาขา	วันที่เริ่มเข้าดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
Job 122.3/67	ท่อส่งน้ำ 13,400 มม. แยก เกษตร ถนนประเสริฐมนูกิจ	สสญ	7/5/67	- ดำสำรวจพบจุดรั่วท่อผุกร่อน ซ่อมโดยเชื่อมแผ่นปะ (ยังพบการผุกร่อนเพิ่มเติม) - นักประดาน้ำเชื่อมแผ่นเหล็กปะเพิ่มเติม 21/6/67 ยังพบการรั่ว - กำหนดเข้าสำรวจ พร้อมซ่อมอีกครั้ง 3/8/67
Job 148/67	ท่อ 3400 คลองบางขวด ถนนประเสริฐมนูกิจ	สสล	22/6/67	- ประดาน้ำเข้าเชื่อมรอยแตกแนวเชื่อม ได้ 50 % - กำหนดดำน้ำเชื่อมอีก 1 ครั้ง 3/8/2567
Job 149/67	ยกเลิกท่อ 700ST ข้ามคลองเปรมประชากร ช่วงถนนงามวงศ์วานและงานที่เกี่ยวข้อง	สสข	25-26/6/67	- กצר.เข้าเตรียมงานตัดยกเลิกท่อข้ามคลอง ที่สนน. กทม ส่งหนังสือมา - กำหนด การตัดท่อ/รื้อย้ายท่อ รอ กค.ฝบค. กำหนดอีกครั้ง



กสร.ฝคจ.

ผลการดำเนินงานบริหารแรงดันน้ำ 162 จุด ปีงบประมาณ 67

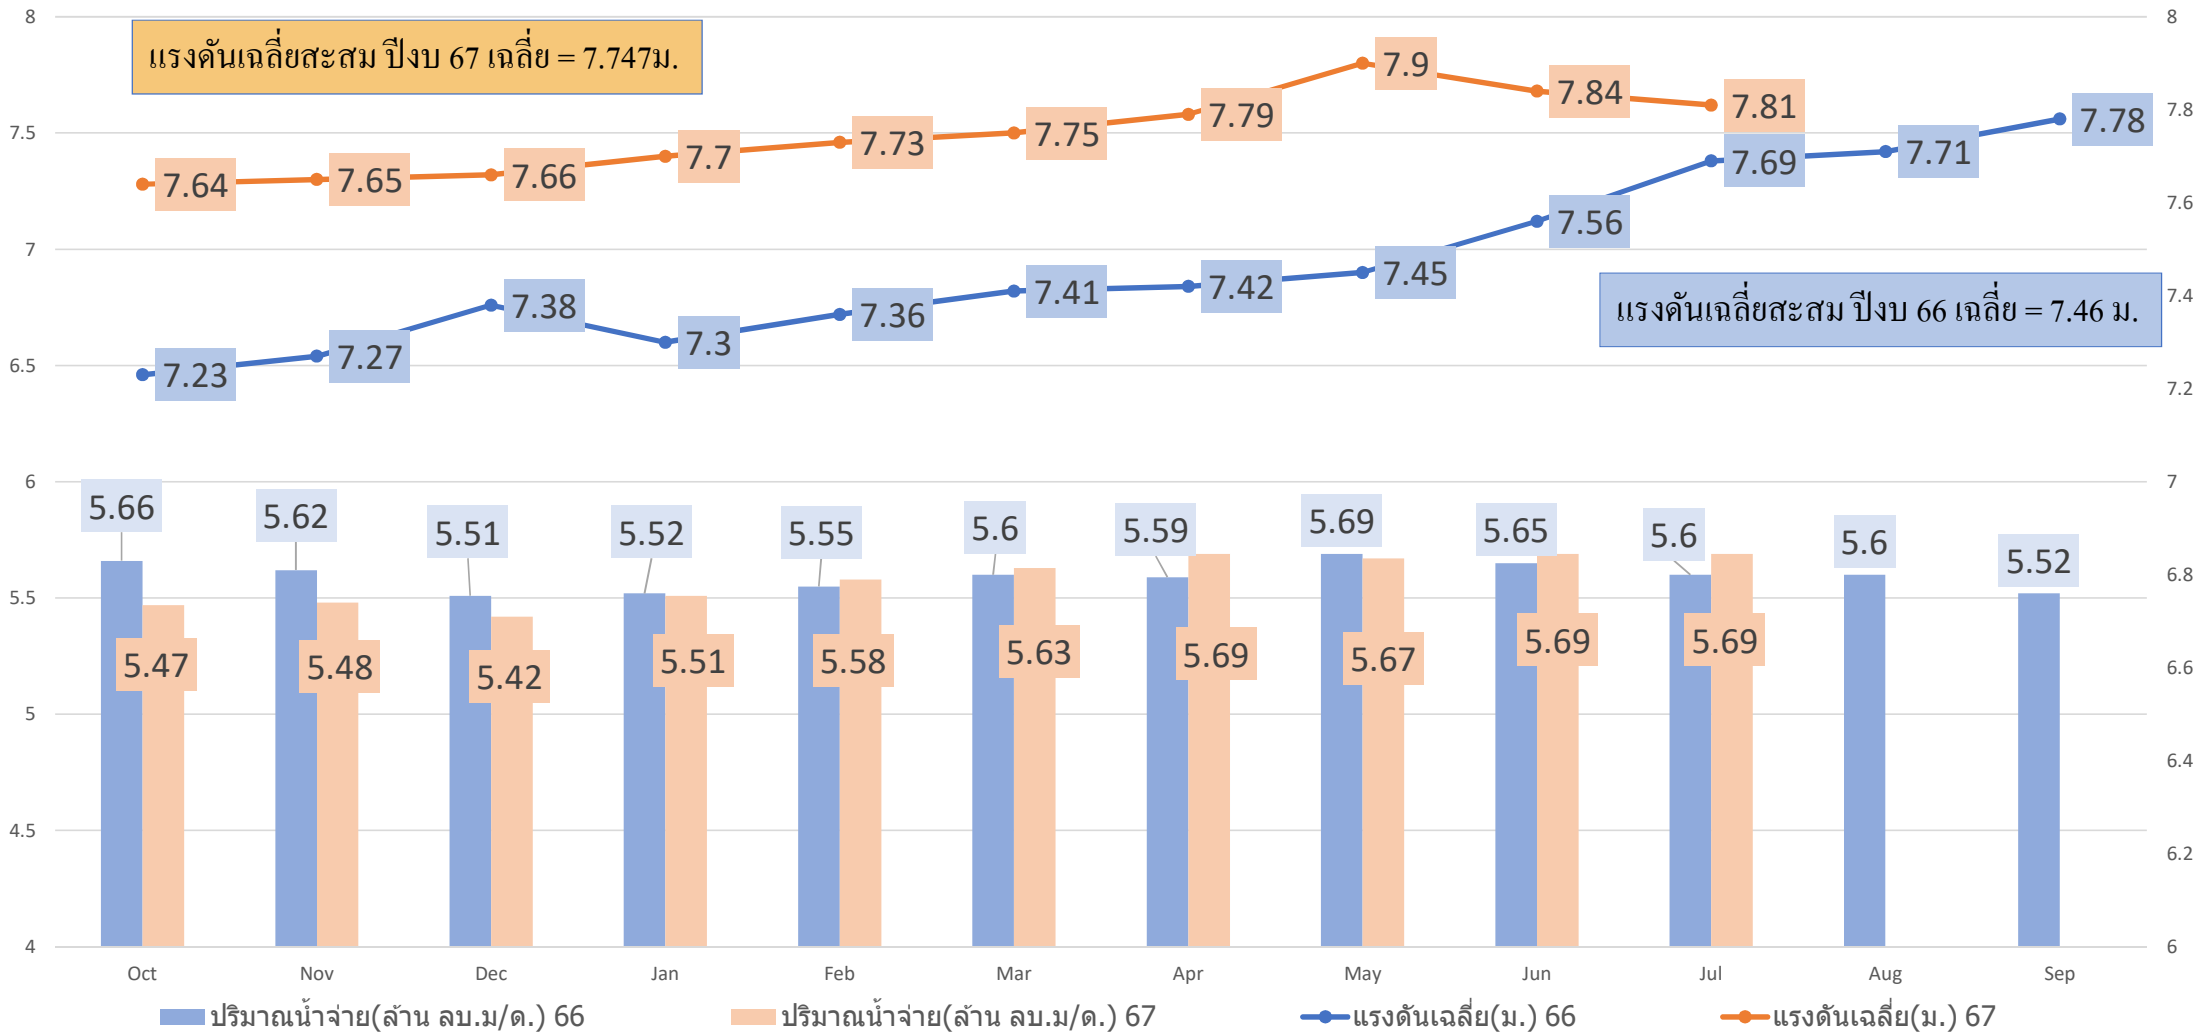

ข้อมูลล่าสุด 2 สค. 67
