


พิจารณากรอบการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำปี งบประมาณ 2563
ของสายงานบริการ

วันที่ 4 มิถุนายน 2563
เวลา 13:30 น. – 16:30 น.
ณ ห้องประชุม ปิยราชภัฏ

มติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย งบลงทุนประจำปี ครั้งที่ 5/2563



จากการคาดการณ์ จ่ายจริง 7 เดือน และ คาดการณ์ 4 เดือน พบว่า
เกินแผนกรอบจ่ายรวม อาจจะต้องขออนุมัติขยายกรอบจ่าย จาก สศช.
โดยส่งข้อมูลผ่าน คณะกรรมการ กปน. ภายใน มิ.ย.63

ขอให้หน่วยงานพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 โดย
รายการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ให้ระบุขั้นตอนตาม
Milestone (M) และรายงานความก้าวหน้า ซึ่ง ผงป. จะอัปโหลดไฟล์
Excel ที่หน้าเว็บ ผงป.

หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบลงทุนเร่งด่วน เร่งรัดการติดตามและเบิกจ่าย
งบลงทุน

ขอให้เขียนประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขให้ชัดเจน

คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

แผนงาน / สายงาน	แผนจ่ายปี 2563 (1)	สะสม ต.ค.62 - เม.ย.63			พ.ค.63 - ก.ย.63		รวม (4) = (2) + (3)	%	ผลต่าง ณ เม.ย.63 (4) - (1)
		แผนจ่าย	จ่ายจริง (2)	%	คาดการณ์ (3)				
รวมงบลงทุนปกติ	4,975,800,000.00	2,657,880,478.97	3,519,423,118.89	132.4	1,617,614,276.14		5,137,037,395.03	103.2	161,237,395.03
สายงานผู้ว่าการ	8,094,977.97	5,372,977.97	8,487,939.46	158.0	1,848,500.00		10,336,439.46	127.7	2,241,461.49
สายงานบริหาร	309,107,617.48	32,079,729.21	109,778,678.47	342.2	17,466,864.34		127,245,542.81	41.2	(181,862,074.67)
สายงานการเงิน	-	-	-	-	-		-	-	-
สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง	420,919,798.59	215,676,592.90	416,244,804.33	193.0	20,854,385.89		437,099,190.22	103.8	16,179,391.63
สายงานผลิตและส่งน้ำ	673,165,445.72	339,034,860.48	365,088,609.61	107.7	217,869,192.43		582,957,802.04	86.6	(90,207,643.68)
สายงานแผนและพัฒนา	-	-	-	-	-		-	-	-
สายงานบริการ	3,380,866,180.46	2,004,476,978.16	2,551,954,245.72	127.3	1,299,972,571.41		3,851,926,817.13	113.9	471,060,636.67
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	126,735,811.78	30,681,906.25	48,725,877.30	158.8	50,556,392.78		99,282,270.08	78.3	(27,453,541.70)
รวมงานจัดซื้อรวม	56,910,168.00	30,557,434.00	19,142,964.00	62.6	9,046,369.29		28,189,333.29	49.5	(28,720,834.71)
- งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ผยส.	13,072,107.00	7,455,107.00	8,692,647.00	116.6	4,286,400.00		12,979,047.00	99.3	(93,060.00)
- งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ผจท.	43,838,061.00	23,102,327.00	10,450,317.00	45.2	4,759,969.29		15,210,286.29	34.7	(28,627,774.71)
รวมงานโครงการในความรับผิดชอบของสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง	584,200,000.00	253,360,000.00	238,428,099.33	94.1	260,551,900.67		498,980,000.00	85.4	(85,220,000.00)
โครงการฯ 7	70,100,000.00	30,060,000.00	54,901,284.24	182.6	15,198,715.76		70,100,000.00	100.0	-
โครงการฯ 8	60,900,000.00	16,000,000.00	9,511,446.98	59.4	34,298,553.02		43,810,000.00	71.9	(17,090,000.00)
โครงการฯ 9	453,200,000.00	207,300,000.00	174,015,368.11	83.9	211,054,631.89		385,070,000.00	85.0	(68,130,000.00)
รวมทั้งสิ้น	5,560,000,000.00	2,911,240,478.97	3,757,851,218.22	129.1	1,878,166,176.81		5,636,017,395.03	101.4	76,017,395.03

สายงาน	แผนจ่าย	จ่ายจริง	คาดการณ์	จริง+คาด	สูง/ต่ำกว่าแผน
สายบริการ (ล้านบาท)	3,380.87	2,551.95	1,299.97	3,851.93	471.06
กปน. (ล้านบาท)	5,560.00	3,757.85	1,978.17	5,736.02	176.02

การคาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณของสายงานบริการ จากระบบ CMS

แผนงาน	แผนเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	เบิกจ่ายจริงสะสม ต.ค.๖๒ - พ.ค.๖๓	คาดการณ์เบิกจ่าย มิ.ย.๖๓ - ก.ย.๖๓	จริง + คาดการณ์	เบิกจ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน
ปรับปรุงกำลังน้ำ	437,270,789.23	327,768,063.37	139,595,179.57	467,363,242.94	30,092,453.71
ลดน้ำสูญเสีย	1,864,909,936.66	1,593,123,765.25	518,835,102.70	2,111,958,867.95	247,048,931.29
มาตรวัดน้ำ	164,672,246.84	192,517,771.51	58,278,038.82	250,795,810.33	86,123,563.49
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	40,095,067.52	33,146,837.42	17,712,833.33	50,859,670.75	10,764,603.23
ขยายเขตชุมชนเมือง	53,381,129.16	52,377,271.05	35,978,855.63	88,356,126.68	34,974,997.52
รื้อย้าย	8,651,024.00	8,372,183.91	1,350,000.00	9,722,183.91	1,071,159.91
ขยายเขต-รับจ้างงาน	502,682,917.10	448,581,450.97	100,594,747.89	549,176,198.86	46,493,281.76
ขยายเขต-ติดตั้งประปาใหม่	216,639,453.89	166,417,248.11	66,928,219.21	233,345,467.32	16,706,013.43
งบบุคลากรสิ่งก่อสร้าง	51,816,394.39	22,752,862.67	32,057,531.00	54,840,393.67	2,993,999.28
งบลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	741,814.90	881,249.66	-	881,249.66	139,434.76
งานปรับปรุงระบบ DMA	40,005,406.77	29,419,366.77	900,000.00	30,319,366.77	(9,686,040.00)
รวมทั้งสิ้น	3,380,866,180.46	2,875,358,070.69	972,230,508.15	3,847,588,578.84	466,722,398.38

ล้านบาท	3,380.87	2,875.36	972.23	3,847.59	466.72
---------	----------	----------	--------	----------	--------

รายการกระทบยอดจากระบบ CMS กับ File ผู้บริหารหน่วยงานเห็นชอบ

แผนงาน	แผนเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563	เบิกจ่ายจริง สะสม ต.ค.62 - พ.ค.63	คาดการณ์เบิกจ่าย มิ.ย.63 - ก.ย.63	จริง + คาดการณ์	เบิกจ่ายสูง/ต่ำกว่า แผน
ปรับปรุงกำลังน้ำ	437,270,789.23	327,768,063.37	139,595,179.57	467,363,242.94	30,092,453.71
ลดน้ำสูญเสีย	1,864,909,936.66	1,593,123,765.25	549,715,102.70	2,142,838,867.95	277,928,931.29
มาตรวัดน้ำ	164,672,246.84	192,517,771.51	59,978,038.82	252,495,810.33	87,823,563.49
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	40,095,067.52	33,146,837.42	17,712,833.33	50,859,670.75	10,764,603.23
ขยายเขตชุมชนเมือง	53,381,129.16	52,377,271.05	35,978,855.63	88,356,126.68	34,974,997.52
เรือย้าย	8,651,024.00	8,372,183.91	1,350,000.00	9,722,183.91	1,071,159.91
ขยายเขต-รับจ้างงาน	502,682,917.10	448,581,450.97	100,594,747.89	549,176,198.86	46,493,281.76
ขยายเขต-ติดตั้งประปาใหม่	216,639,453.89	166,417,248.11	69,094,091.21	235,511,339.32	18,871,885.43
งบบุคลากรสิ่งก่อสร้าง	51,816,394.39	22,752,862.67	32,998,433.19	55,751,295.86	3,934,901.47
งบลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	741,814.90	881,249.66	-	881,249.66	139,434.76
งานปรับปรุงระบบ DMA	40,005,406.77	29,419,366.77	900,000.00	30,319,366.77	(9,686,040.00)
รวมทั้งสิ้น	3,380,866,180.46	2,875,358,070.69	1,007,917,282.34	3,883,275,353.03	502,409,172.57

	แผนจ่าย	เบิกจ่ายจริง	คาดการณ์	ขอปรับปรุง	จริง+คาด	สูง/ต่ำกว่าแผน
ล้านบาท	3,380.87	2,875.36	972.23	35.69	3,883.28	502.41

รายละเอียดการขอปรับปรุงคาดการณ์เบิกจ่าย

งบลดน้ำสูญเสีย

1. Agenda ขอปรับปรุงเพิ่มยอดจากระบบ CMS จากเดิม 33,000,000.00 บาท เป็น 66,880,000.00 บาท
2. สสป. คาดการณ์เดือน ก.ย.63 เห็นชอบ 5.2 ล้านบาท แต่บันทึกในระบบ 8.2 ล้านบาท จึงขอปรับลด 3.0 ล้านบาท
3. สสม. เห็นชอบ ยอดเดือน ก.ค.63 และ ก.ย.63 ไม่ตรงกับระบบ CMS แต่ยอดคาดการณ์โดยรวมไม่เปลี่ยนแปลง
4. สสน. เห็นชอบ ยอดเดือน ก.ค.63 และ ส.ค.63 ไม่ตรงกับระบบ CMS แต่ยอดคาดการณ์โดยรวมไม่เปลี่ยนแปลง

งบมาตรวัดน้ำ

สสสภ.ไม่ได้คาดการณ์ในระบบ CMS 1.7 ล้านบาท

งบติดตั้งใหม่

1. สสพ. เห็นชอบ 4 ล้านบาท แต่บันทึกในระบบ 4.1 ล้านบาท
2. สสสภ.เห็นชอบ 8,590,032.00 บาท แต่บันทึกในระบบ 6,724,160.00 บาท
3. สสส. เห็นชอบ 0.9 ล้านบาท แต่บันทึกในระบบ 0.5 ล้านบาท

งบครุภัณฑ์ ฯ

1. สสม. เห็นชอบคาดการณ์ ก.ค. 63 = 1,086,967.62 บาท แต่บันทึกในระบบ 2,499,976 บาท ปรับลดลง 1,413,008.38 บาท เนื่องจากมีการเบิกจ่ายงวดแรกไปแล้ว
2. สสส.ไม่ได้คาด CCTV ในระบบ CMS แต่ใส่คาดการณ์เบิกจ่ายที่ให้ความเห็นชอบ ในเดือน มิ.ย.63 ทั้งนี้รายการดังกล่าวการเบิกจ่ายแล้วในเดือน พ.ค.63 จึงไม่ต้องคาดการณ์รายการดังกล่าวแล้ว
3. สสส. ขอยกเลิกคาดการณ์เบิกจ่าย มิ.ย.63 - งานปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ วงเงิน 463,500 บาท จึงยกเลิกการคาดการณ์ดังกล่าว
5. สสว. คาดการณ์งบสำรองเร่งด่วน เพิ่มเติม - งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ให้บริการลูกค้า วงเงิน 457,060.00 บาท
6. สสมบ. คาดการณ์งบสำรองเร่งด่วน 3 รายการ เพิ่มเติม - จำนวน 480,557.57 บาท
7. สสสภ. ไม่ได้คาดงบสำรองเร่งด่วนจาก ผวก. ในระบบ CMS แต่เห็นชอบ 1,879,793.00 บาท ซึ่งไม่ทราบรายละเอียด

การพิจารณารายการขอปรับปรุงคาดการณ์เบิกจ่าย

เพิ่ม

มาตรวัดน้ำ - สสสภ.เพิ่ม 1.7 ล้านบาท

ติดตั้งประปาใหม่

- สสสภ. เห็นชอบ 8.59 ล้านบาท

เพิ่ม 1.866 ล้านบาท

- สสส. เห็นชอบ 0.9 ล้านบาท

เพิ่ม 0.4 ล้านบาท

ครุภัณฑ์

- สสว. (เร่งด่วน) 0.457 ล้านบาท

- สสมบ. (เร่งด่วน) 0.480 ล้านบาท

- สสสภ. (เร่งด่วน) 1.879 ล้านบาท

ลด

งบน้ำสูญเสีย - Agenda จาก 33 ล้าน

ลดเหลือ 20 ล้านบาท

- สสป. เห็นชอบ 5.2 ล้านบาท

ปรับลด 3.0 ล้านบาท

ติดตั้งประปาใหม่

- สสพ. เห็นชอบ 4 ล้านบาท

ลด 0.1 ล้านบาท

ครุภัณฑ์ - สสม. เบิกจ่ายแล้ว 1.413 ล้านบาท

- สสต. งานปรับปรุงลานจอดรถ

0.463 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว

- ผจส. (เร่งด่วน) 20 ล้าน

เหตุผลที่เบิกจ่ายและคาดการณ์สูงกว่าแผนงาน

ค่างเบิกจ่ายจากงบประมาณ
ปี 2562

- เบิกจ่ายสะสม ต.ค. - พ.ย. 2562 = 733.53 ล้านบาท
- เทียบช่วงเดียวกันปีงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้น = 380.98 ล้านบาท

งบประมาณเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ 2563

- ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 310.14 ล้านบาท
- แผนเบิกจ่ายปรับเพิ่ม 44.87 ล้านบาท (งบขยายเขต- รับจ้างงาน)

แผนงานและการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

- จากสถิติการเบิกจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน = 311.80 ล้านบาท (หักที่เบิกเพิ่มขึ้นช่วง ต.ค.-พ.ย.62 หาร 8 เดือน)
- คาดการณ์ 4 เดือนเฉลี่ยต่อเดือน = 243.06 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในสถิติ

อื่นๆ

- ปรับแผนงานการเบิกจ่ายและแนวทางปฏิบัติ
- ต้นทุนค่ามาตรฐานสูงกว่าเดิมเช่น มาตรฐาน 1 ½ นิ้ว , มาตรฐานไฟฟ้า
- เพิ่มแผนงานการลดขนาดมาตรฐาน


การของบงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี

ประเภทงบประมาณ	แผนเบิกจ่าย	ของบเพิ่มเติม	แผนเบิกจ่ายที่เพิ่มเติม
งบขยายเขต - รับจ้างงาน	457,812,311.86	174,260,000.00	44,870,605.24
งบปรับปรุงกำลังน้ำ	437,270,789.23	52,350,643.47	-
งบติดตั้งประปาใหม่	216,639,453.89	12,750,000.00	-
งบขยายเขตจำหน่ายน้ำ	40,095,067.52	2,200,000.00	-
งบขยายเขตให้เต็มพื้นที่ทั่ว ชุมชนเมือง	53,381,129.16	31,750,000.00	-
มาตรวัดน้ำครบวาระ	164,672,246.84	36,830,000.00	
รวมทั้งสิ้น	1,369,870,998.50	310,140,643.47	44,870,605.24

การเบิกจ่ายที่สูงขึ้นจากปีงบประมาณก่อน

ประเภทงบประมาณ	ต.ค. – พ.ย. 2561	ต.ค. – พ.ย. 2562	สูง / กว่าปีก่อน
ปรับปรุงกำลังน้ำ	57.17	71.76	14.59
ลดน้ำสูญเสีย	108.45	384.91	276.46
มาตรวัดน้ำ	38.97	30.74	-8.23
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	8.67	12.09	3.42
ขยายเขตชุมชนเมือง	17.38	3.80	-13.58
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	6.64	8.58	1.94
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.17	0.36	0.19
งานรับจ้างงาน	89.05	143.06	54.01
งานติดตั้งประปาใหม่	27.49	47.92	20.43
DMA + ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	(1.44)	30.30	31.74
รวมทั้งสิ้น	352.55	733.53	380.98

การพิจารณากรอบการเบิกจ่ายงบลงทุนของ กปน.

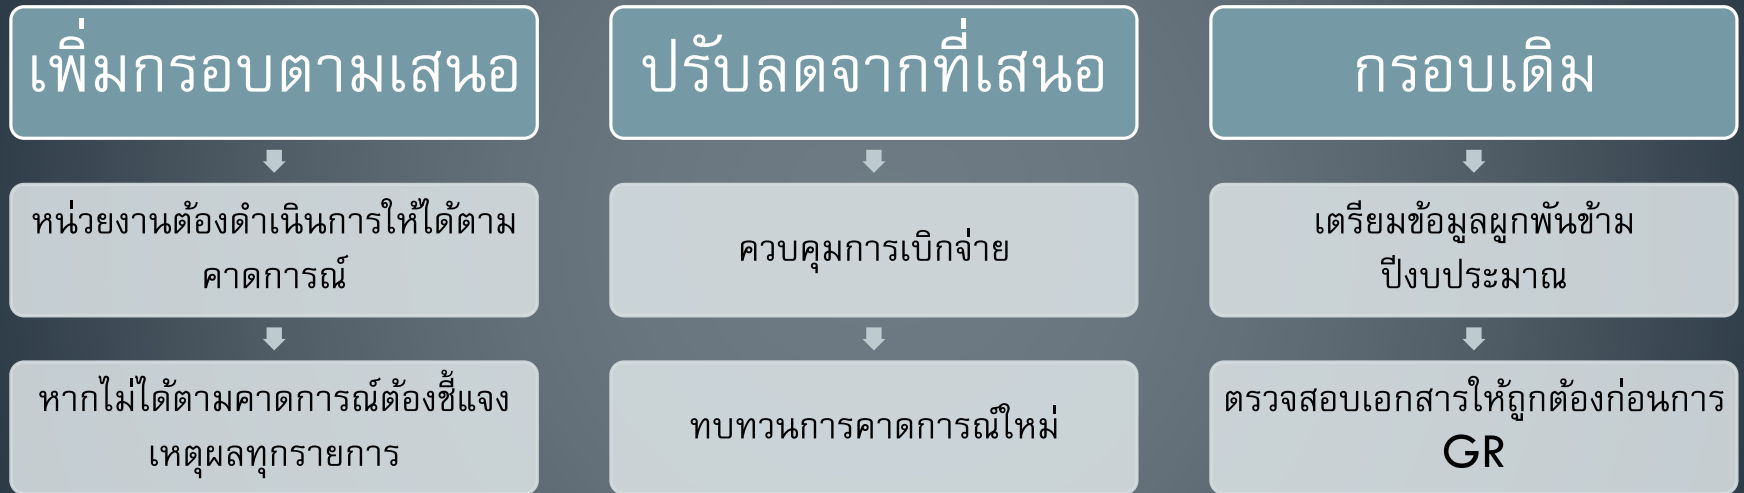

รายงานสถานะปัจจุบันของแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

กปง.ฝสบ.ได้มีบันทึกนำเรียนรองผู้ว่าการบริการด้านตะวันตกและรองผู้ว่าการบริการด้านตะวันออก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดย ส่วนที่มีประเด็น ฝจพ.ให้หน่วยงานดำเนินการเอง ได้ระบุสถานะ ผู้บริหารหารือร่วมกัน ทั้งนี้ ฝงป.แจ้งว่าหน่วยงานไม่ต้องจัดทำ WF (ฝจพ.ดำเนินการทำ WF ให้) มีดังนี้

- 1.เก้าอี้นั่งทำงานและโต๊ะทำงานแบบต่าง ๆ
- 2.เครื่องปรับอากาศขนาดต่าง ๆ
- 3.ตู้เหล็กแบบต่าง ๆ
- 4.โต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์

สำหรับรถบรรทุกน้ำและรถจักรยานยนต์ไม่ได้ระบุ

การติดตามสถานะงบประมาณเร่งด่วน(ผวก.)

สสน.	สายส่งน้ำดับเพลิงและหัวฉีดสำหรับรถบรรทุกน้ำ	10,500.00	ยังไม่ทัน PR
สสน.	สายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ	7,714.00	ยังไม่ทัน PR
สสว.	งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ให้บริการลูกค้า บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1	457,060.00	คาดการณ์เบิกจ่าย มิ.ย.
สสต.	งานก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ ด้านหน้าและ ด้านหลังอาคารสำนักงาน	462,800.00	คาดการณ์เบิกจ่าย ก.ค.
สสต.	งานก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ	420,700.00	คาดการณ์เบิกจ่าย ก.ค.
สสมบ.	ประตูเลื่อนอัตโนมัติบานเดียว	60,500.00	คาดการณ์เบิกจ่าย มิ.ย.
สสมบ.	โครงหลังคาเหล็กมุงด้วยไวนิล (สำหรับทางลาดผู้ พิการ)	114,800.00	คาดการณ์เบิกจ่าย ก.ค.
สสมบ.	งานปรับปรุงทางเท้าพร้อมปูกระเบื้องทางเข้า สำนักงาน	308,000.00	คาดการณ์เบิกจ่าย มิ.ย.


สสช.	งานปรับปรุงทางลาดผู้พิการ	116,852.00	คาดการณ์เบิกจ่าย มิ.ย.
สสช.	งานปรับปรุงที่จอดรถคนพิการ	72,000.00	ทัน PR แล้ว
สสน.	งานปรับปรุงบันไดหนีไฟ	140,335.00	คาดการณ์เบิกจ่าย ก.ค.
สสสภ.	งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ จุดจอดรถรองรับน้ำ	54,000.00	ทัน PR แล้ว
สสสภ.	งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อม อุปกรณ์และค่าติดตั้ง	1,744,100.00	
ผจส.	เครื่องมืออุปกรณ์ในการดำเนินการลดน้ำสูญเสีย 10 รายการ	20,000,000.00	อยู่ในระหว่างพิจารณา ประกาศประกวดราคา

รายงานประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไข


จากการหารือเบื้องต้นกับประธานกลุ่ม สวป.กธบ ได้แนวทางการปฏิบัติดังนี้




ประเด็นงบลงทุน-ปรับปรุงกำลังน้ำบางสาขาไม่เพียงพอ



ประเด็นงบทำการไม่เพียงพอ

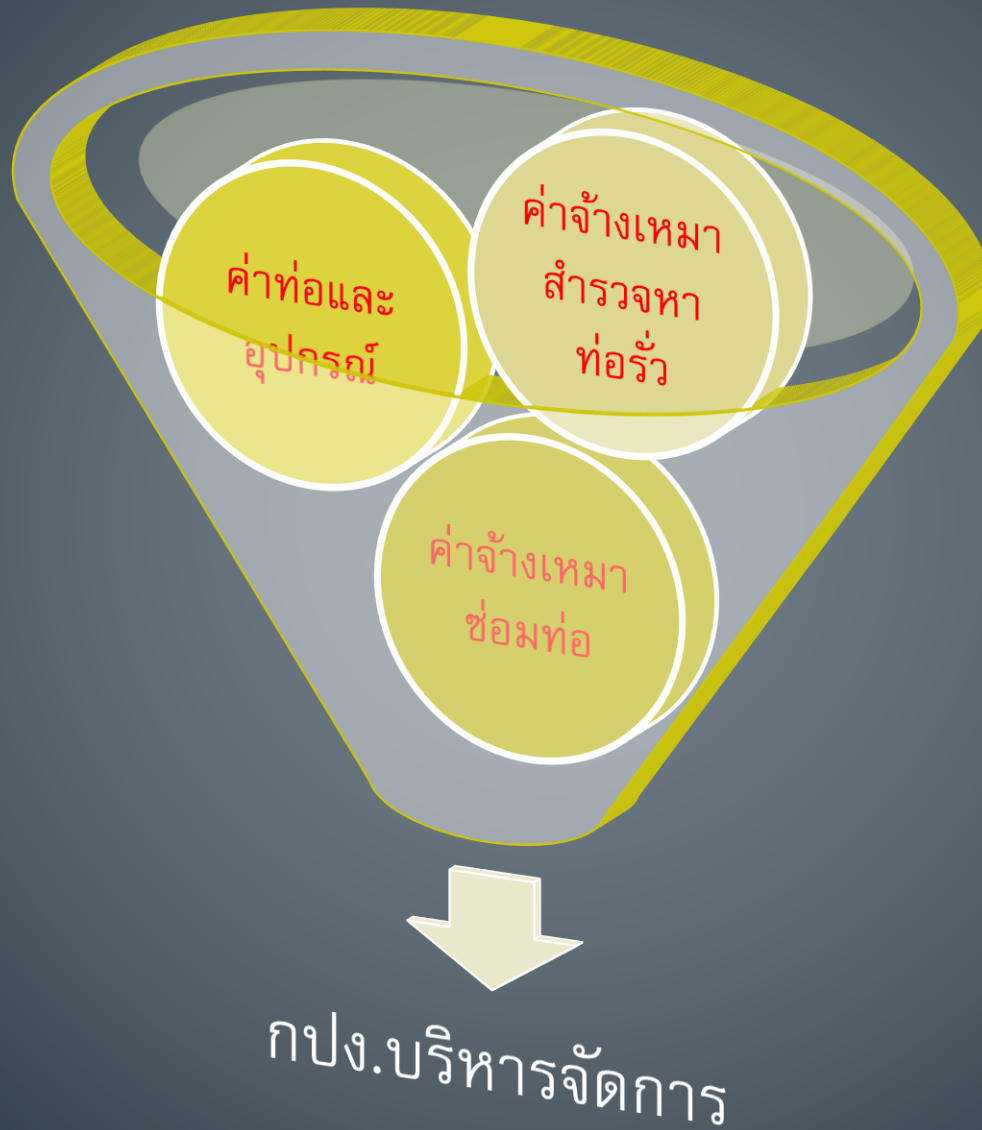

ค่าจ้างเหมาสำรวจหาท่อรั่ว



กรุงเทพมหานคร
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน.....กองวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีน้ำสูญเสีย ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

ที่..... กว. ผส. 44 /2563..... วันที่..... 15..... พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณจ้างสำรวจหาท่อรั่วในระบบท่อจ่ายน้ำปึงนประมาณ 2563.เพิ่มเติม และ.....
.....ให้แก่สาขา.....

หน่วยงาน	ผู้รับโอนงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)
สสช.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	2,700,000
สสช.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	500,000
สสช.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	425,000
สสสภ.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	1,000,000
สสภ.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	1,400,000
สสน.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	750,000
สสบท.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	1,100,000
สสมส.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	300,000
รวม		8,175,000

หน่วยงาน	ผู้รับโอนงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)
สสภ.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	2,698,700
สสส.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	500,000
สสว.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	600,000
รวม		3,798,700

หน่วยงาน	ผู้รับโอนงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)
สสส.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	450,000
สสญ.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	984,450
สสม.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	500,000
สสล.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	300,000
รวม		2,234,450

ข้อเสนอเพื่อพิจารณาสำหรับค่าจ้างเหมาสำรวจหาท่อรั่ว

1. กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากกว่า 5 แสนบาท และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี **E-Bidding** ขอให้พิจารณาระยะเวลาดำเนินการด้วย เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 ต้องขออนุมัติสัญญา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จาก ผวก. ด้วย

2. สำหรับสาขาที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงานสำรวจหาท่อรั่วสัญญาเดิม ขอให้เร่งรัดดำเนินการด้วย หากเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณจะ
ไปกินเงินงบประมาณ 2564

แนวทางการบริหารจัดการงบทำการ – ค่าท่อและอุปกรณ์ , ค่าจ้างเหมาสำรวจหาท่อรั่ว และค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ

