




การประปานครหลวง

METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

ผลการดำเนินงานด้านลดน้ำสูญเสีย
ประจำเดือนธันวาคม 2563

คาดการณ์ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสม ธันวาคม 2563 (กปน.)

(%)

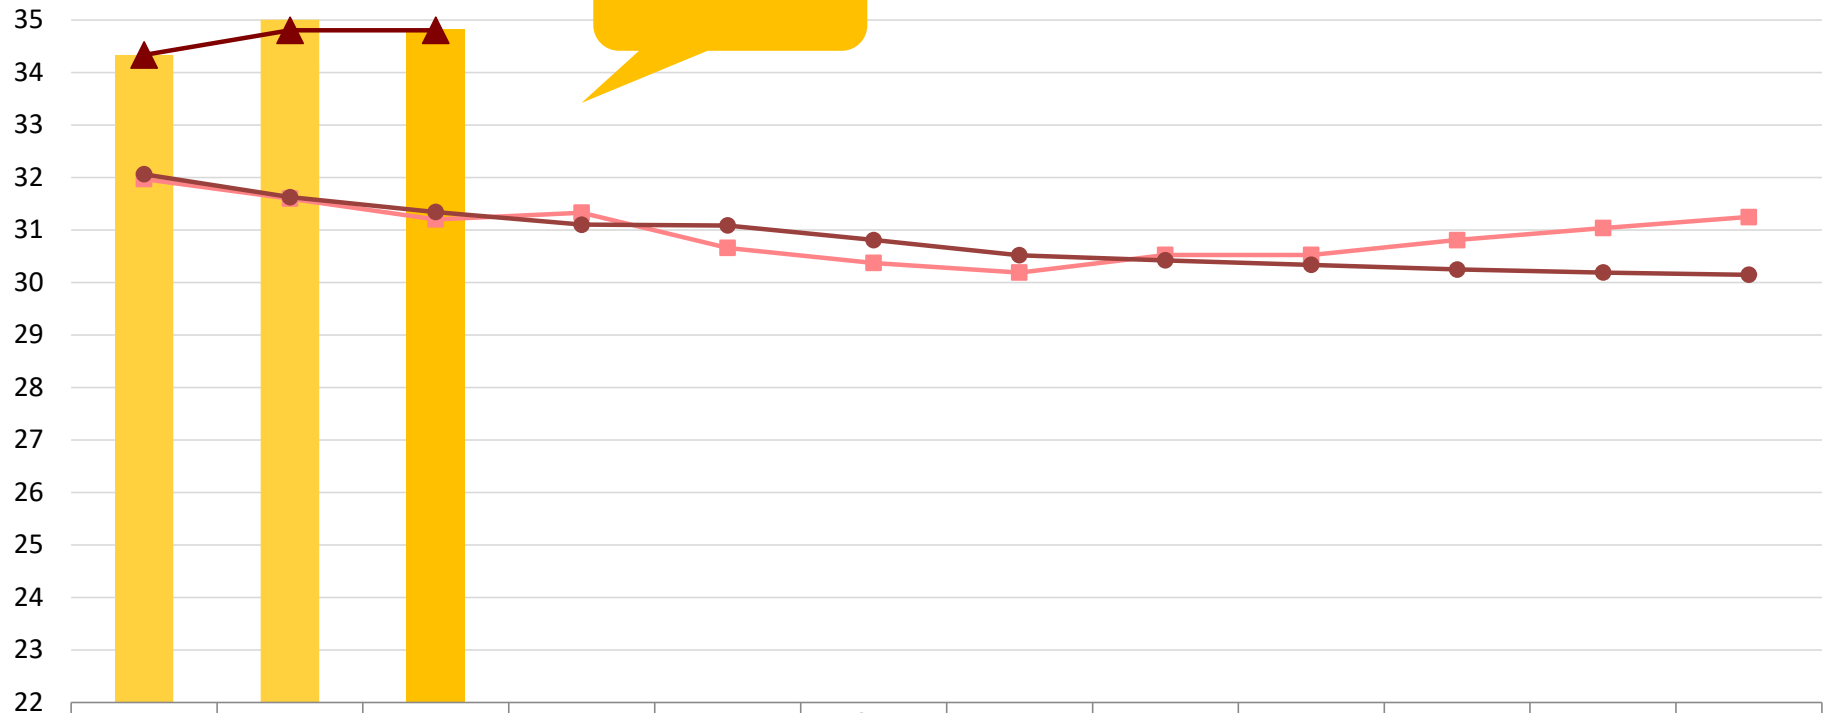

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายเดือน ปี 64	34.34	35.29	34.82									
สะสม ปี 2563	31.97	31.60	31.20	31.33	30.66	30.37	30.19	30.53	30.53	30.81	31.04	31.25
สะสม ปี 2564	34.34	34.81	34.81									
เป้าสะสม ปี 64	32.07	31.63	31.34	31.10	31.09	30.81	30.52	30.42	30.34	30.25	30.19	30.15

ตัวชี้วัด	E	D	C	B	A
อัตราน้ำสูญเสีย(ร้อยละ)	32.35	31.80	31.25	30.70	30.15

(1) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 63

คาคการณ์ผลงานอัตราน้ำสูญเสียเดือนธันวาคม 2563

สาขา	ปริมาณน้ำเข้า (ลบ.ม./วัน)		ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม./วัน)		เป้าหมายน้ำ จำหน่าย ร.ค. (ลบ.ม./วัน)	% น้ำจำหน่าย เทียบเป้าหมาย ร.ค. (%)	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)		เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)	
	พ.ย.	ธ.ค. (1)	พ.ย.	ธ.ค. (1)			พ.ย.	ธ.ค. (1)	พ.ย.	ธ.ค. (1)
สสส.	395,729.00	391,732.00	260,397.54	268,637.17	272,129.03	- 1.28	135,331.46	123,094.83	34.20	31.42
สสพ.	415,550.00	414,351.00	290,904.04	275,868.94	273,064.52	1.03	124,645.96	138,482.06	30.00	33.42
สสป.	575,284.00	586,319.00	371,205.48	361,763.71	387,516.13	- 6.65	204,078.52	224,555.29	35.47	38.30
สสญ.	412,633.00	389,302.00	248,506.21	251,648.96	251,129.03	0.21	164,126.79	137,653.04	39.78	35.36
สสท.	238,118.00	234,676.00	150,824.62	152,492.42	157,129.03	- 2.95	87,293.38	82,183.58	36.66	35.02
สสม.	317,977.00	317,356.00	201,452.82	206,340.45	212,193.55	- 2.76	116,524.18	111,015.55	36.65	34.98
สสล.	311,570.00	312,484.00	218,368.25	223,608.00	231,290.32	- 3.32	93,201.75	88,876.00	29.91	28.44
สสช.	268,347.00	265,774.00	173,795.21	171,099.19	179,419.35	- 4.64	94,551.79	94,674.81	35.23	35.62
สสข.	202,998.00	207,723.00	148,279.09	148,450.97	145,387.10	2.11	54,718.91	59,272.03	26.96	28.53
สสมบ.	238,326.00	238,572.00	206,013.38	210,709.68	204,645.16	2.96	32,312.62	27,862.32	13.56	11.68
สสสภ.	347,746.00	349,473.00	257,671.12	249,388.52	260,129.03	- 4.13	90,074.88	100,084.48	25.90	28.64
สสบ.	353,746.00	360,869.00	183,166.76	188,759.06	189,032.26	- 0.14	170,579.24	172,109.94	48.22	47.69
สสด.	339,238.00	338,192.00	213,881.60	220,516.13	225,290.32	- 2.12	125,356.40	117,675.87	36.95	34.80
สสภ.	339,454.00	331,472.00	198,391.59	200,433.32	207,354.84	- 3.34	141,062.41	131,038.68	41.56	39.53
สสว.	361,909.00	358,606.00	188,791.23	189,548.68	195,161.29	- 2.88	173,117.77	169,057.32	47.83	47.14
สสน.	279,463.00	284,517.00	182,669.54	184,838.71	186,064.52	- 0.66	96,793.46	99,678.29	34.64	35.03
สสบท.	207,667.00	200,848.00	144,784.38	146,991.16	141,774.19	3.68	62,882.62	53,856.84	30.28	26.81
สสมส.	256,720.00	262,728.00	154,556.14	158,741.57	154,193.55	2.95	102,163.86	103,986.43	39.80	39.58
กปน.	5,862,475.00	5,844,994.00	3,793,659.00	3,809,836.64	3,872,903.23	- 1.63	2,068,816.00	2,035,157.36	35.29	34.82

กลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูงมาก (>110,000 ลบ.ม./วัน) จำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไข

(1) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 63

กลุ่มเป้าหมายรอง

กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูง (55,000 - 110,000 ลบ.ม./วัน) จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขรองลงมา

กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพ

กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพ

คาดการณ์ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสมเดือนธันวาคม 2563 (เทียบเป้าหมายรายเดือน)

สาขา	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)			เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)			ผลงานสะสม (%)	เป้าหมายเดือน ธ.ค. 63	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค. (1)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค. (1)		เป้าหมายสะสม (%)	เปรียบเทียบ
สสส.	126,443.95	135,331.46	123,094.83	32.48	34.20	31.42	32.69	28.03	✗
สสพ.	118,236.16	124,645.96	138,482.06	29.14	30.00	33.42	30.87	29.02	✗
สสป.	206,329.24	204,078.52	224,555.29	35.57	35.47	38.30	36.47	31.32	✗
ชวก.(ก1)	451,009.36	464,055.94	486,132.18	32.80	33.47	34.91	33.73	29.73	✗
สสญ.	157,033.35	164,126.79	137,653.04	38.30	39.78	35.36	37.84	39.42	✓
สสท.	83,685.27	87,293.38	82,183.58	35.61	36.66	35.02	35.76	29.97	✗
สสม.	97,556.29	116,524.18	111,015.55	32.07	36.65	34.98	34.58	35.34	✓
สสล.	93,410.95	93,201.75	88,876.00	30.10	29.91	28.44	29.48	21.90	✗
ชวก.(ก2)	431,685.87	461,146.10	419,728.16	34.27	36.02	33.48	34.58	32.61	✗
สสช.	98,292.00	94,551.79	94,674.81	36.37	35.23	35.62	35.75	33.16	✗
สสข.	55,520.49	54,718.91	59,272.03	28.00	26.96	28.53	27.84	25.99	✗
สสมบ.	30,606.67	32,312.62	27,862.32	13.03	13.56	11.68	12.74	12.68	✗
สสสภ.	80,388.40	90,074.88	100,084.48	24.28	25.90	28.64	26.31	20.55	✗
ชวก.(ก3)	264,807.57	271,658.21	281,893.65	25.59	25.69	26.56	25.95	23.07	✗

กลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูงมาก (>110,000 ลบ.ม./วัน) จำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไข

(1) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 63

กลุ่มเป้าหมายรอง

กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูง (55,000 - 110,000 ลบ.ม./วัน) จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขรองลงมา

กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพ

กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพ

คาดการณ์ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสมเดือนธันวาคม 2563 (เทียบเป้าหมายรายเดือน)

สาขา	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)			เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)			ผลงานสะสม (%)	เป้าหมายเดือน ธ.ค. 63	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค. (1)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค. (1)		เป้าหมายสะสม (%)	เปรียบเทียบ
สสب.	156,832.09	170,579.24	172,109.94	45.96	48.22	47.69	47.30	41.26	✗
สสต.	129,443.82	125,356.40	117,675.87	37.57	36.95	34.80	36.44	31.26	✗
สสภ.	137,975.91	141,062.41	131,038.68	40.94	41.56	39.53	40.67	39.23	✗
สสว.	153,363.80	173,117.77	169,057.32	44.71	47.83	47.14	46.58	38.55	✗
ชวภ.(ก4)	577,615.62	610,115.81	589,881.81	42.29	43.76	42.46	42.83	37.56	✗
สสน.	94,321.83	96,793.46	99,678.29	33.98	34.64	35.03	34.55	33.28	✗
สสบท.	62,390.98	62,882.62	53,856.84	29.97	30.28	26.81	29.03	26.61	✗
สสมส.	99,202.21	102,163.86	103,986.43	39.88	39.80	39.58	39.75	36.79	✗
ชวภ.(ก5)	255,915.02	261,839.94	257,521.56	34.84	35.20	34.42	34.82	32.67	✗
กปน.	1,981,033.43	2,068,816.00	2,035,157.36	34.34	35.29	34.82	34.81	31.34	✗

กลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูงมาก (>110,000 ลบ.ม./วัน) จำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไข

(1) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 63

กลุ่มเป้าหมายรอง

กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูง (55,000 - 110,000 ลบ.ม./วัน) จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขรองลงมา

กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพ

กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย เดือน ธันวาคม 2563

ระดับข้อมูล	ปริมาณน้ำสูญเสีย	จำนวนงาน Step Test	จำนวนงานสร.	ระยะทางที่เดิน	จำนวนจุดรั่วที่พบ	จำนวนงานซ่อมที่เปิด-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อจ่าย-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อบริการ-สปน.	งานซ่อม ท่อจ่าย-สปน.	งานซ่อม ท่อบริการ-สปน.	ไม่พบจุดรั่ว-สปน.	อื่นๆ-สปน.	ยกเลิกงาน-สปน.
กปน.	56,900,579.73	32	903	4,021.18	3,773	4,003	74	2,688	49	1,930	36	113	76
รวก.(กอ)	34,363,298.02	23	569	2,849.03	2,122	2,334	46	1,655	29	1,317	17	98	41
รวก.(กต)	22,537,281.70	9	334	1,172.15	1,651	1,669	28	1,033	20	613	19	15	35

ระดับข้อมูล	ปริมาณน้ำสูญเสีย	จำนวนงานซ่อมที่เปิด-รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนามท่อจ่าย-รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนามท่อ บริการ-รับแจ้ง
กปน.	56,900,579.73	6,452	197	4,996
รวก.(กอ)	34,363,298.02	3,347	116	2,647
รวก.(กต)	22,537,281.70	3,105	81	2,349

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 14 ธ.ค.63 จากระบบ WLMA

SCAN หากต้องการดู
รายละเอียดงาน
เป็นรายวัน



ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย ภาค 1 เดือน ธันวาคม 2563

ระดับข้อมูล	ปริมาณน้ำสูญเสีย	จำนวนงาน Step Test	จำนวนงานสร.	ระยะทางที่เดิน	จำนวนจุดรั่วที่พบ	จำนวนงานซ่อมที่เปิด-สปน.	ปิดงานภาคสนามท่อจ่าย-สปน.	ปิดงานภาคสนามท่อบริการ-สปน.	งานซ่อมท่อจ่าย-สปน.	งานซ่อมท่อบริการ-สปน.	ไม่พบจุดรั่ว-สปน.	อื่นๆ-สปน.	ยกเลิกงาน-สปน.	จำนวนงานซ่อมที่เปิด-รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนามท่อจ่าย-รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนามท่อบริการ-รับแจ้ง
กปน.	56,900,579.73	32	903	4,021.18	3,773	4,003	74	2,688	49	1,930	36	113	76	6,452	197	4,996
รวก.(กอ)	34,363,298.02	23	569	2,849.03	2,122	2,334	46	1,655	29	1,317	17	98	41	3,347	116	2,647
ชวก.(ก1)	11,998,392.41	7	221	1,379.23	821	910	18	589	4	405	1	20	24	1,144	48	980

3 ลำดับแรกใน DMA Ranking ในแต่ละสาขา

สสส.	3,583,184.37	1	21	74.75	77	85		19		19				277	1	273
07-01-11	146,697.12													1		1
07-01-06	132,910.2		1	2.44	2	2		2		2				1		1
07-04-22	130,219.23		2	2.2	11	11								2		2
สสพ.	3,454,451.70	3	25	102.39	120	270	4	181	4	165	1	15	6	409	14	363
13-02-08	168,994.63													1		1
13-07-02	78,680.98													1		1
13-02-03	73,662.22													5		5
สสป.	4,960,756.33	3	175	1,202.09	624	555	14	389		221		5	18	458	33	344
17-06-02	281,841.88		4	3.76	11	10		1				1		4		4
17-04-05	139,657.91	1	5	21.27	15	7		2		2				16	2	14
17-01-05	135,256.13		1	0.38	1	1		1				1		3		3

ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย ภาค 2 เดือน ธันวาคม 2563

ระดับข้อมูล	ปริมาณน้ำสูญเสีย	จำนวนงาน Step Test	จำนวนงานสร.	ระยะทางที่เดิน	จำนวนจุดรั่วที่พบ	จำนวนงานซ่อมที่เปิด-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อจ่าย-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อบริการ-สปน.	งานซ่อม ท่อจ่าย-สปน.	งานซ่อม ท่อบริการ-สปน.	ไม่พบจุดรั่ว-สปน.	อื่นๆ-สปน.	ยกเลิกงาน-สปน.	จำนวนงานซ่อมที่เปิด-รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนาม ท่อจ่าย-รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนาม ท่อบริการ-รับแจ้ง
กปน.	56,900,579.73	32	903	4,021.18	3,773	4,003	74	2,688	49	1,930	36	113	76	6,452	197	4,996
รวก.(กอ)	34,363,298.02	23	569	2,849.03	2,122	2,334	46	1,655	29	1,317	17	98	41	3,347	116	2,647
ชวก.(ก2)	13,381,520.92	13	244	666.67	648	799	19	628	19	547	13	57	12	1050	25	832
3 ลำดับแรกใน DMA Ranking ในแต่ละสาขา																
สสญ.	4,488,588.5	5	43	162.17	200	378	3	282	3	226	5	40		316	5	258
03-06-11	147,723.72															
03-05-04	140,993.05	1	2	1.5	2	2	1	1	1	1				9		9
03-01-03	124,547.12		1	1.5	1	7		5		3	1	1		7	1	5
สสท.	1,980,033.123		106	194.6	127	107	4	86	4	66	6	14		168	2	124
05-02-01	105,814.01		1	0.1	3	1		1				1		1		1
05-02-05	91,953.01		8	10.4	9	7		5		3		2		3		2
05-01-04	41,749.58		3	11.4	3	3		3		1	1	1		1		1
สสม.	3,796,984.167	6	23	219.9	115	125	4	102	4	100		2	1	217	9	170
06-03-06	135,359.1															
06-03-03	106,822.41													8	1	7
06-02-05	77,542.6													1		1
สสล.	3,115,915.129	2	72	90	206	189	8	158	8	155	2	1	11	349	9	280
12-04-05	206,741.13		3	4.24	3	3	1	1	1	1				6		6
12-03-01	147,757.87													5		5
12-02-07	112,399.04													3		3

***ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน กทส.ฝจส. ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563

ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย ภาค 3 เดือน ธันวาคม 2563

ระดับข้อมูล	ปริมาณน้ำสูญเสีย	จำนวนงาน Step Test	จำนวนงานสร.	ระยะทางที่เดิน	จำนวนจุดรั่วที่พบ	จำนวนงานซ่อมที่เปิด-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อจ่าย-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อบริการ-สปน.	งานซ่อม ท่อจ่าย-สปน.	งานซ่อม ท่อบริการ-สปน.	ไม่พบจุดรั่ว-สปน.	อื่นๆ-สปน.	ยกเลิกงาน-สปน.	จำนวนงานซ่อมที่เปิด-รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนาม ท่อจ่าย-รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนาม ท่อบริการ-รับแจ้ง
กปน.	56,900,579.73	32	903	4,021.18	3,773	4,003	74	2,688	49	1,930	36	113	76	6,452	197	4,996
รวก.(กอ)	34,363,298.02	23	569	2,849.03	2,122	2,334	46	1,655	29	1,317	17	98	41	3,347	116	2,647
ชวก.(ก3)	8,983,384.697	3	104	803.13	653	625	9	438	6	365	3	21	5	1153	43	835
3 ลำดับแรกใน DMA Ranking ในแต่ละสาขา																
สสช.	3,114,975.445		20	327.23	255	274	2	218	2	188	1	17	4	457	8	256
15-07-04	145,827.54					15		15		14				6		4
15-07-03	144,729.02					41		40		33		6	1	4		3
15-09-01	124,556.84		1	10.58	4	4	1	1	1	1				11		8
สสช.	1,798,350.36	1	31	134.18	87	94	1	84	1	81				227	10	166
16-07-01	125,690.26	1	4	6.56	4	3		2		2				13		13
16-04-05	101,855.37													2		2
16-04-03	99,807.3															
สสมบ.	2,048,599.221		17	73.22	55	55	4	43	3	40				240	10	213
53-02-03	179,945.15															
53-01-02	81,060.01		3	13.41	18	16	1	15	1	13				4		4
53-05-02	71,502.61															
สสสภ.	2,021,459.672	2	36	268.5	256	202	2	93		56	2	4	1	229	15	200
55-07-01	208,656.78				1									4	1	3
55-03-02	82,035.11				1									1		1
55-02-02	16,032.6													2		2

***ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน กทส.ฝจส. ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563

ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย ภาค 4 เดือน ธันวาคม 2563

ระดับข้อมูล	ปริมาณน้ำสูญเสีย	จำนวนงาน Step Test	จำนวนงานสร.	ระยะทางที่เดิน	จำนวนจุดรั่วที่พบ	จำนวนงานซ่อมที่เปิด-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อจ่าย-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อบริการ-สปน.	งานซ่อม ท่อจ่าย-สปน.	งานซ่อม ท่อบริการ-สปน.	ไม่พบจุดรั่ว-สปน.	อื่นๆ-สปน.	ยกเลิกงาน-สปน.	จำนวนงานซ่อมที่เปิด-รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนาม ท่อจ่าย-รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนาม ท่อบริการ-รับแจ้ง
กปน.	56,900,579.73	32	903	4,021.18	3,773	4,003	74	2,688	49	1,930	36	113	76	6,452	197	4,996
รวก.(กต)	22,537,281.70	9	334	1,172.15	1,651	1,669	28	1,033	20	613	19	15	35	3,105	81	2,349
ชวก.(ก4)	15,150,966.00	8	211	834.78	1,103	1,107	16	581	9	342	8	5	12	2,019	40	1,435
3 ลำดับแรกใน DMA Ranking ในแต่ละสาขา																
สสบ.	3,956,813.76	6	53	137.2	275	323	2	125	2	9	1		3	329	2	327
01-03-01	97,252.76	1	6	22	24	18		13		2	1		1	6		6
01-09-08	91,617.46	1	2	5	23	36		24		1				7		7
01-01-05	90,376.93		1	4	5	5		4						3		3
สสด.	3,543,555.45		50	272.27	342	278	1	65	1	65			3	714	10	270
02-03-05	249,376.55															
02-08-02	210,393.54		3	5.58	3	2								23		6
02-13-03	154,567.48		2	5.42	20	20								10		7
สสภ.	4,541,627.18	1	61	195.4	303	323	6	276	6	266	7	5	6	529	19	434
11-03-10	215,381.73													5		5
11-08-07	177,266.00		1	0	1	1		1			1			5		3
11-08-02	131,348.35													8		8
สสว.	3,108,969.60	1	47	229.91	183	183	7	115		2				447	9	404
14-05-06	149,265.31															
14-05-01	143,446.62															
14-05-07	129,382.79															

***ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน กทส.ฝจส. ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563

ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย ภาค 5 เดือน ธันวาคม 2563

ระดับข้อมูล	ปริมาณน้ำ สูญเสีย	จำนวน งาน Step Test	จำนวนงาน สร.	ระยะทางที่ เดิน	จำนวนจุดรั่ว ที่พบ	จำนวนงานซ่อม ที่เปิด-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อจ่าย-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อบริการ-สปน.	งานซ่อม ท่อจ่าย-สปน.	งานซ่อม ท่อบริการ- สปน.	ไม่พบจุด รั่ว-สปน.	อื่นๆ- สปน.	ยกเลิกงาน- สปน.	จำนวนงานซ่อมที่ เปิด-รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนาม ท่อจ่าย-รับแจ้ง	ปิดงาน ภาคสนามท่อ บริการ-รับแจ้ง
กปน.	56,900,579.73	32	903	4,021.18	3,773	4,003	74	2,688	49	1,930	36	113	76	6,452	197	4,996
รวก.(กต)	22,537,281.70	9	334	1,172.15	1,651	1,669	28	1,033	20	613	19	15	35	3,105	81	2,349
ชวก.(ก5)	7,386,315.70	1	123	337.37	548	562	12	452	11	271	11	10	23	1,086	41	914

3 ลำดับแรกใน DMA Ranking ในแต่ละสาขา

สสน.	3,282,476.70		30	75.95	113	127	1	102		50	2	2	9	328	14	289
04-05-04	141,940.05															
04-08-05	135,055.35													7		7
04-03-05	119,837.35													2		2
สสบท.	1,463,751.36		32	88.22	193	193	2	168	2	55		1	6	289	13	254
54-09-04	54,286.7													3		3
54-08-08	51,974.52		1	0	1	2		2		2				1		1
54-04-01	18,050.53													2		2
สสมส.	2,640,087.62	1	61	173.2	242	242	9	182	9	166	9	7	8	469	14	371
56-04-02	200,893.92													3	1	2
56-02-01	190,307.26	1	4	9.2	17	21	1	17	1	14	2	1	2	5		5
56-04-01	138,174.39													14		14

DMA RANKING สำหรับวางแผนปฏิบัติงานลดน้ำสูญเสียเดือน มกราคม 2563

WLMA

หน้าหลัก เกี่ยวกับหน่วยงาน แบบฟอร์ม แผนงาน ผลการดำเนินงาน ลิงก์อื่น ๆ เข้าสู่ระบบ ติดต่อเรา

รายงานจัดอันดับ DMA ตามปริมาณน้ำสูญเสีย (DMA RANKING)

เลือกเดือนที่ต้องการติดตามผลการดำเนินงาน

เดือน มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 ตุลาคม 2563

สรุปสถานะงาน

กปน.

ข้อมูลปริมาณน้ำเข้า น้ำขาย น้ำสูญเสีย เดือนพฤศจิกายน 2563 สำหรับใช้ในการวางแผนกิจกรรม				ข้อมูลสถานะ RTU/DMA ล่าสุด		ข้อมูลสรุปสถานะงาน ALC เดือน ธันวาคม 2563										
พื้นที่	ปริมาณน้ำเข้า	ปริมาณน้ำขาย	ปริมาณน้ำสูญเสีย	% น้ำสูญเสีย เดือนนี้	สัดส่วน DMA ระบบ	ข้อมูลจาก DMA พร้อมใช้	งาน Step Test	ระยะทางสำรวจ	จุดตรวจพบ	จุดรั่วซึม - ท่อจ่าย	ปิดงานภาคสนาม - ท่อจ่าย	ปิดงานภาคสนาม - ท่อจ่าย	ปิดงานภาคสนาม - ท่อจ่าย	ปิดงานภาคสนาม - ท่อจ่าย	ปิดงานภาคสนาม - ท่อจ่าย	ปิดงานภาคสนาม - ท่อจ่าย
กปน.	166,236,000.48	112,676,808.00	53,559,192.48	32.22	320/997	381/997	83	1,840	9,058.92	7,722	147	5,448	4,707	427	8,191	6,786

รายงานบริการ

ข้อมูลปริมาณน้ำเข้า น้ำขาย น้ำสูญเสีย เดือนพฤศจิกายน 2563 สำหรับใช้ในการวางแผนกิจกรรม				ข้อมูลสถานะ RTU/DMA ล่าสุด		ข้อมูลสรุปสถานะงาน ALC เดือน ธันวาคม 2563										
พื้นที่	ปริมาณน้ำเข้า	ปริมาณน้ำขาย	ปริมาณน้ำสูญเสีย	% น้ำสูญเสีย เดือนนี้	สัดส่วน DMA ระบบ	ข้อมูลจาก DMA พร้อมใช้	งาน Step Test	ระยะทางสำรวจ	จุดตรวจพบ	จุดรั่วซึม - ท่อจ่าย	ปิดงานภาคสนาม - ท่อจ่าย	ปิดงานภาคสนาม - ท่อจ่าย	ปิดงานภาคสนาม - ท่อจ่าย	ปิดงานภาคสนาม - ท่อจ่าย	ปิดงานภาคสนาม - ท่อจ่าย	ปิดงานภาคสนาม - ท่อจ่าย
รวม(กย)	105,540,708.57	72,306,896.00	33,233,812.57	31.49	200/595	245/595	54	1,192	6,741.87	4,526	84	3,221	2,751	244	4,053	3,392
รวม(กต)	59,439,397.86	36,960,878.00	22,478,519.86	37.82	120/378	136/378	29	648	2,317.05	3,196	63	2,227	1,956	183	4,138	3,394
NULL	1,255,894.05	3,409,034.00	-2,153,139.95	-171.44	0/24	0/24	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0

สามารถดูข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์หลักของ ผจส.

เมนู DMA Ranking หรือ URL

http://172.16.194.225/rtu/dma_Ranking.php

สามารถเลือกเดือนเพื่อใช้วางแผนปฏิบัติงานเดือนถัดไปได้ตั้งแต่วันที่ 22 ของทุกเดือน โดยระบบจะแสดงข้อมูลปริมาณน้ำเข้า น้ำขาย น้ำสูญเสียจากโปรแกรม WB127 ในระบบ WLMA ของเดือนปัจจุบัน

กปน.

ข้อมูลปริมาณน้ำเข้า น้ำขาย น้ำสูญเสีย เดือนธันวาคม 2563 สำหรับใช้ในการวางแผนกิจกรรม				ข้อมูลสถานะ RTU/DMA ล่าสุด			ข้อมูลสรุปสถานะงาน ALC เดือน มกราคม 2564									
พื้นที่	ปริมาณน้ำเข้า	ปริมาณน้ำขาย	ปริมาณน้ำสูญเสีย	% น้ำสูญเสีย เดือนนี้	สัดส่วน DMA ระบบ	ข้อมูลจาก DMA พร้อมใช้	งาน Step Test	ระยะทางสำรวจ	จุดตรวจพบ	จุดปิดงานภาคสนาม - ท่อจ่าย	จุดปิดงานภาคสนาม - ท่อจ่าย	จุดปิดงานภาคสนาม - ท่อจ่าย	จุดปิดงานภาคสนาม - ท่อจ่าย	จุดปิดงานภาคสนาม - ท่อจ่าย	จุดปิดงานภาคสนาม - ท่อจ่าย	จุดปิดงานภาคสนาม - ท่อจ่าย
กปน.	163,702,820.45	111,281,036.00	52,421,784.45	32.02	317/996	381/996	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
รวม(กย)	103,778,678.04	71,267,508.00	32,511,170.04	31.33	200/595	245/595	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
รวม(กต)	58,668,248.37	36,640,851.00	22,027,397.37	37.55	117/378	136/378	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
NULL	1,255,894.05	3,372,677.00	-2,116,782.95	-168.55	0/23	0/23	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0

ผลรวมน้ำสูญเสียราย DMA (วัดจากน้ำเข้า DMA) ของเดือน ธันวาคม 2563

ตัวอย่างข้อมูลจริงจากการจัดอันดับ DMA เรียงตามปริมาณน้ำสูญเสีย (DMA Ranking) ของเดือน ธันวาคม 2563

พื้นที่	ข้อมูลปริมาณน้ำเข้า น้ำขาย น้ำสูญเสีย เดือนธันวาคม 2563 สำหรับใช้ในการวางแผนกิจกรรม				ข้อมูลสถานะ RTU/DMA ล่าสุด		ข้อมูลสรุปสถานะงาน ALC เดือน มกราคม 2564									
	ปริมาณน้ำเข้า	ปริมาณน้ำขาย	ปริมาณน้ำสูญเสีย	%น้ำสูญเสีย เดือนนี้	ที่มา ข้อมูล	DM พร้อม ใช้	Step Test	งาน เดินสำรวจ	ระยะทาง	จุดรั่ว ที่พบ	สนาม. - ท่อจ่าย	ปิดงาน ภาค สนาม. - ท่อ บริการ	ปิดงาน ภาค สนาม. - รับแจ้ง. - ท่อ	ปิดงาน ภาค สนาม. - รับแจ้ง. - ท่อ	ปิดงาน ภาค สนาม. - รับแจ้ง. - ท่อ	ปิดงาน ภาค สนาม. - รับแจ้ง. - ท่อ
07-01-11	377,685.39	236,132.00	141,553.39	37.48	จากระบบ	2/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-04-22	267,009.54	140,294.00	126,715.54	47.46	จากระบบ	2/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

สุขุมวิท

07-01-11	377,685.39	236,132.00	141,553.39	37.48	จากระบบ	2/2
07-04-22	267,009.54	140,294.00	126,715.54	47.46	จากระบบ	2/2
07-01-06	346,321.52	228,315.00	118,006.52	34.07	จากระบบ	3/3
07-07-04	217,338.48	102,163.00	115,175.48	52.99	จากระบบ	3/3

บางเขน

16-07-01	275,583.93	172,657.00	102,926.93	37.35	จากระบบ	2/2
16-04-05	216,646.24	115,469.00	101,177.24	46.70	จากระบบ	1/1
16-04-03	224,134.47	123,904.00	100,230.47	44.72	จากระบบ	2/2
16-05-03	244,127.89	168,885.00	75,242.89	30.82	จากระบบ	2/2

เรียงตามปริมาณน้ำสูญเสีย

สุขสวัสดิ์

14-05-06	331,569.72	168,947.00	162,622.72	49.05	จากระบบ	2/2
14-05-02	294,426.26	153,495.00	140,931.26	47.87	จากระบบ	1/1
14-05-07	261,738.35	137,287.00	124,451.35	47.55	จากระบบ	1/1
14-05-01	275,137.99	156,818.00	118,319.99	43.00	จากระบบ	1/1

บางกอกน้อย

01-03-01	159,390.68	65,734.00	93,656.68	58.76	จากระบบ	1/1
01-02-05	124,737.90	38,781.00	85,956.90	68.91	จากระบบ	1/1
01-01-05	176,268.17	91,237.00	85,031.17	48.24	จากระบบ	1/1
01-09-08	180,000.53	97,178.00	82,822.53	46.01	จากระบบ	1/1

แผน-ผลงานจัดทำแบบและจ้าง (สาขาและ Agenda base) ปีงบประมาณ 2564

สาขา	แผน (1200 กม.)	เบิกจ้างแล้ว				ลงนามแล้ว			
		ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน	ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน
สสส.	55	42.128	10.002	52.130	94.78%	0.000	0.000	0.000	0.00%
สสพ.	67	36.548	4.193	40.741	60.81%	0.000	0.000	0.000	0.00%
สสป.	91	18.385	29.090	47.475	52.17%	0.000	4.142	4.142	4.55%
ชวก.(ก1)	213	97.061	43.285	140.346	65.89%	0.000	4.142	4.142	1.94%
สสญ.	66	9.978	0.000	9.978	15.12%	0.000	0.000	0.000	0.00%
สสท.	22	7.620	12.186	19.806	90.03%	0.000	0.871	0.871	3.96%
สstm.	25	8.261	3.401	11.662	46.65%	0.000	0.224	0.224	0.90%
สสล.	49	9.586	12.540	22.126	45.16%	0.000	0.000	0.000	0.00%
ชวก.(ก2)	162	35.445	28.127	63.572	39.24%	0.000	1.095	1.095	0.68%
สสช.	68	30.785	5.913	36.698	53.97%	0.000	0.624	0.624	0.92%
สสช.	51	26.826	7.408	34.234	67.13%	0.000	4.953	4.953	9.71%
สstmบ.	40	14.413	25.843	40.256	100.64%	0.000	0.000	0.000	0.00%
สสสภ.	59	0.000	41.150	41.150	69.75%	0.000	0.000	0.000	0.00%
ชวก.(ก3)	218	72.024	80.314	152.338	69.88%	0.000	5.577	5.577	2.56%
รวก.(กอ)	593	204.530	151.726	356.256	60.08%	0.000	10.814	10.814	1.82%
สสบ.	73	0.000	69.257	69.257	94.87%	0.000	44.354	44.354	60.76%
สสต.	62	0.000	47.482	47.482	76.58%	0.000	0.000	0.000	0.00%
สสภ.	80	12.347	72.815	85.162	106.45%	0.000	72.815	72.815	91.02%
สสว.	70	0.000	68.411	68.411	97.73%	0.000	35.353	35.353	50.50%
ชวก.(ก4)	285	12.347	257.965	270.312	94.85%	0.000	152.522	152.522	53.52%
สสน.	57	31.473	20.573	52.046	91.31%	0.000	0.370	0.370	0.65%
สสบท.	43	31.452	14.885	46.337	107.76%	0.000	0.000	0.000	0.00%
สstmส.	57	0.000	45.495	45.495	79.82%	0.000	12.883	12.883	22.60%
ชวก.(ก5)	157	62.925	80.953	143.878	91.64%	0.000	13.253	13.253	8.44%
รวก.(กต)	442	75.272	338.918	414.190	93.71%	0.000	165.775	165.775	37.51%
Agenda base	165	0.000	88.732	88.732	53.78%	0.000	0.000	0.000	0.00%
กปน.	1,200	279.802	579.376	859.178	71.60%	0.000	176.589	176.589	14.72%

ผลงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 (รอบกลางเดือน)

สาขา	คาดการณ์ ผลส่งมอบงาน	งานค้าง ก่อนปีงบฯ 64	ผลการลงนาม ปีงบฯ 64	ผลงานปรับปรุงท่อ						
				คาดการณ์ ถึงสิ้น ธ.ค.63	รายเดือน ธ.ค.63			สะสม (ต.ค.63-ธ.ค.63)		
					แผนงาน	ผลงาน ณ 23 ธ.ค. 63	ผลต่าง +/-	แผนงาน	ผลงาน	ผลต่าง +/-
สสส.	55.000	35.000	0.000	0.000	3.000	0.000	(3.000)	10.000	13.218	3.218
สสพ.	67.000	31.000	0.000	0.000	4.000	0.000	(4.000)	12.000	22.058	10.058
สสป.	91.000	38.000	4.142	0.000	7.000	0.000	(7.000)	15.000	8.383	(6.617)
ขวก.(ก1)	213.000	104.000	4.142	0.000	14.000	0.000	(14.000)	37.000	43.659	6.659
สสญ.	52.000	30.500	0.000	2.635	3.500	0.000	(3.500)	6.000	2.700	(3.300)
สสท.	22.000	10.296	0.871	0.708	1.150	0.708	(0.442)	3.051	2.609	(0.442)
สสม.	18.000	2.000	0.224	0.701	0.000	0.000	0.000	1.500	0.406	(1.094)
สสล.	39.550	8.833	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.800	3.461	(0.339)
ขวก.(ก2)	131.550	51.629	1.095	4.044	4.650	0.708	(3.942)	14.351	9.176	(5.175)
สสช.	60.000	29.000	0.624	0.000	5.000	0.000	(5.000)	10.000	5.224	(4.776)
สสข.	45.000	21.000	4.953	2.423	7.000	2.423	(4.577)	11.000	2.423	(8.577)
สสมบ.	40.000	26.000	0.000	0.000	3.948	0.000	(3.948)	9.756	7.027	(2.729)
สสสภ.	59.000	18.895	0.000	1.390	0.800	0.000	(0.800)	5.400	5.789	0.389
ขวก.(ก3)	204.000	94.895	5.577	3.813	16.748	2.423	(14.325)	36.156	20.463	(15.693)
รวม.(กอ)	548.550	250.524	10.814	7.857	35.398	3.131	(32.267)	87.507	73.297	(14.210)
สสบ.	73.000	9.200	44.354	0.000	3.000	0.000	(3.000)	13.000	7.340	(5.660)
สสต.	62.000	22.000	0.000	1.957	1.990	1.957	(0.033)	9.850	8.033	(1.817)
สสภ.	80.000	21.000	72.815	5.000	5.000	3.860	(1.140)	10.500	12.046	1.546
สสว.	70.000	11.505	35.353	2.598	2.125	0.000	(2.125)	2.598	0.473	(2.125)
ขวก.(ก4)	285.000	63.705	152.522	9.555	12.115	5.817	(6.298)	35.948	27.892	(8.056)
สสน.	57.000	21.000	0.370	0.000	3.000	0.000	(3.000)	7.000	7.014	0.014
สสบท.	43.000	23.000	0.000	0.000	1.000	2.204	1.204	11.000	6.792	(4.208)
สสมส.	57.000	18.600	12.883	0.000	2.000	0.000	(2.000)	3.000	4.381	1.381
ขวก.(ก5)	157.000	62.600	13.253	0.000	6.000	2.204	(3.796)	21.000	18.187	(2.813)
รวม.(กต)	442.000	126.305	165.775	9.555	18.115	8.021	(10.094)	56.948	46.079	(10.869)
Agenda base	120.000	51.000	0.000	10.000	7.000	2.899	(4.101)	19.000	27.485	8.485
กปน.	1110.550	427.829	176.589	27.412	60.513	14.051	(46.462)	163.455	146.861	(16.594)

หมายเหตุ : 1. งานค้างก่อนปีงบฯ 64 หมายถึง งานค้างที่สาขาคาดว่าจะส่งมอบงานภายในปีงบฯ 64

2. ผลการลงนามปีงบฯ 64 และคาดการณ์ผลงานปรับปรุงท่อ ธ.ค.63 จาก Google sheet ณ วันที่ 23 ธ.ค.63

3. ผลงานปรับปรุงท่อที่มีผลงานปรับปรุงท่อที่มีผลลดน้ำสูญเสียรวมอยู่สะสม 2.765 กิโลเมตร

คาดการณ์ผลการส่งมอบงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียปีงบประมาณ 2564

หน่วย : กิโลเมตร

สาขา/ Agenda Base	ปริมาณงานตามแผน ปีงบฯ 64	คาดการณ์ผลการส่งมอบงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียปีงบประมาณ 2564												รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
สสส.	55	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	55.000
สสพ.	67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000	10.000	13.000	67.000
สสป.	91	3.000	5.000	7.000	8.000	4.500	5.000	10.000	9.000	13.000	12.000	9.500	5.000	91.000
ขวก.(ก1)	213	11.000	12.000	14.000	15.000	11.500	12.000	18.000	19.000	25.000	24.000	26.500	25.000	213.000
สสญ.	66	1.000	1.500	3.500	2.000	3.000	6.500	3.000	5.500	6.000	7.000	7.000	6.000	52.000
สสท.	22	1.901	-	1.150	0.944	0.896	0.633	2.358	2.902	3.078	2.858	2.784	2.496	22.000
สสม.	25	0.500	1.000	-	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	18.000
สสล.	49	-	3.800	-	1.200	-	2.700	3.100	2.700	2.000	5.400	4.500	14.150	39.550
ขวก.(ก2)	162	3.401	6.300	4.650	5.144	5.396	11.833	10.458	13.102	13.078	17.258	16.284	24.646	131.550
สสช.	68	-	5.000	5.000	7.000	4.000	6.000	5.000	3.000	4.000	6.000	5.000	10.000	60.000
สสข.	51	-	4.000	7.000	3.000	4.000	3.000	3.000	2.000	3.000	5.000	1.000	10.000	45.000
สสมบ.	40	3.251	2.557	3.948	4.010	3.009	4.500	4.000	5.000	4.000	3.000	2.725	-	40.000
สสสภ.	59	3.000	1.600	0.800	1.400	1.600	1.700	2.300	3.000	7.600	12.000	12.000	12.000	59.000
ขวก.(ก3)	218	6.251	13.157	16.748	15.410	12.609	15.200	14.300	13.000	18.600	26.000	20.725	32.000	204.000
รวก.(กอ)	593	20.652	31.457	35.398	35.554	29.505	39.033	42.758	45.102	56.678	67.258	63.509	81.646	548.550
สสบ.	73	5.000	5.000	3.000	4.000	5.000	7.000	5.000	9.000	9.000	9.000	7.000	5.000	73.000
สสด.	62	1.000	6.860	1.990	9.540	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	4.000	3.610	62.000
สสภ.	80	5.000	0.500	5.000	5.000	5.000	6.500	8.000	8.000	13.000	10.000	8.000	6.000	80.000
สสว.	70	-	0.473	2.125	0.600	0.954	2.962	4.862	7.488	11.692	12.359	13.220	13.265	70.000
ขวก.(ก4)	285	11.000	12.833	12.115	19.140	16.954	22.462	23.862	30.488	39.692	36.359	32.220	27.875	285.000
สสน.	57	1.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	6.000	6.000	18.000	57.000
สสบท.	43	4.000	6.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	4.000	3.000	43.000
สสมส.	57	-	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.100	4.200	5.700	8.505	8.500	15.995	57.000
ขวก.(ก5)	157	5.500	9.500	6.000	7.500	8.500	8.500	8.600	13.200	14.700	19.505	18.500	36.995	157.000
รวก.(กต)	442	16.500	22.333	18.115	26.640	25.454	30.962	32.462	43.688	54.392	55.864	50.720	64.870	442.000
Agenda base	165	5.000	7.000	7.000	8.000	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	120.000
กปน.	1200	42.152	60.790	60.513	70.194	64.959	79.995	85.220	100.790	123.070	136.122	127.229	159.516	1,110.550

หมายเหตุ : * ผลการคาดการณ์ส่งมอบงานเป็นรายเดือน หน่วยเป็นกิโลเมตร/เดือน จาก Google sheet โดย สกส. สำนักงานประปาสาขา ณ 29 ต.ค. 63

* สสน. มีงานปรับปรุงร่วมที่ดำเนินการโดยสายงานวิศวกรรม 7 กม.

* แถบสีเขียวแสดงปริมาณงานที่สาขามีเท่ากับปริมาณงานค้างก่อนปีงบฯ 64 (รวมผลการลงนาม) ณ วันที่ 23 ธ.ค.63

งานซื้อเครื่องมือสำหรับงานลดน้ำสูญเสียเพิ่มเติม (สำนักงานประปาสาขาและ ผจส.)

ปีงบประมาณ 2564

งานซื้อเครื่องมือสำหรับงานลดน้ำสูญเสีย

เป้าหมาย		ซื้อเครื่องมือสำหรับงานลดน้ำสูญเสีย															
รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2563					2564									
			ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งานซื้อเครื่องมือสำหรับงานลดน้ำสูญเสีย ปีงบฯ 2564	299 เครื่อง	21.38 ล้านบาท			A, B, C, D				E		F						
					A												
งานซื้อเครื่องมือสำหรับงานลดน้ำสูญเสีย จำนวน 10 รายการ เลขที่ ผจส.ชล.2/2562	356 เครื่อง	15.73 ล้านบาท	F					ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาของสัญญาฯ และส่งมอบเครื่องมือฯ ให้สาขาได้ ภายใน ธ.ค.63									
			E	F													
** มีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานซื้อเครื่องมือฯ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว																	

** มีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานซื้อเครื่องมือฯ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว และประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานซื้อเครื่องมือฯ ใหม่ ตาม พรบ.พัสดุฯ เพื่อให้เกิดการแข่งขันและให้ กปน. ได้ประโยชน์สูงสุด



- A อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคาากลาง)
- B ยื่นเอกสารประกวดราคา
- C ตรวจเอกสาร

- D ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)
- E ลงนามสัญญา
- F ดำเนินงานตามสัญญา

- แผนการดำเนินงาน
- เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน
- ล่าช้ากว่าแผน

***ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน กวท.ผจส. ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2563

ผลการปฏิบัติงานหน่วย ATTACK TEAM เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563

1) สนับสนุนงานโครงการเพิ่มแรงดันโรงสูบบางพลี เพื่อสำรวจหาจุดรั่ว : สสป.

ลำดับที่	DMA	ผลสำรวจ Attack Team				ผลซ่อมท่อ สาขา				MNF (cmh)		
		ท่อจ่าย	ท่อบริการ	แคลมป์	อื่นๆ	ท่อจ่าย	ท่อบริการ	แคลมป์	อื่นๆ	ติดตั้ง	ร.ค.-63	ลดลง
1	17-04-06	1	9	0	3	0	0	0	0	140 (UFM)	รอ ดำเนินการ	
2	17-05-04	18*	8	0	3	0	4	2	2	187 (UFM)	รอ ดำเนินการ	

หมายเหตุ : *จุดท่อจ่ายใน DMA 17-05-04 จำนวน 11 จุดจาก 18 จุด เป็นการแตกรั่วที่เกิดขึ้นบนท่อ By-pass ประสานสาขาแจ้ง สกส.สาขาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่เข้าดำเนินการ :

DMA 17-04-06 : ตรวจสอบพื้นที่โดยภาพรวม, ตรวจสอบระบบท่อใน DMA, ตรวจสอบแรงดันในทั่วพื้นที่จำนวน 21 จุด, ติดตั้ง Ultrasonic Flow Meter เพื่อวัดอัตราการไหลของน้ำติดตั้ง และเดินสำรวจหาท่อรั่ว (บางส่วน)

DMA 17-05-06 : ตรวจสอบพื้นที่โดยภาพรวม, ตรวจสอบระบบท่อใน DMA, กิจกรรม Step Test, ติดตั้ง Ultrasonic Flow Meter เพื่อวัดอัตราการไหลของน้ำติดตั้ง และเดินสำรวจหาท่อรั่ว (บางส่วน)

ปัญหาและอุปสรรค :

สภาพการจราจรที่หนาแน่นและส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุก, การก่อสร้างสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่กระทบแนวท่อ, ระบบท่อยังมีความคลุมเครือหลายพื้นที่ไม่เป็นไปตาม As-Built (จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมหน้างาน), ประตุน้ำจมนหลายจุด, ในหลายพื้นที่ท่อมีความลึกทำให้ยากต่อการสำรวจบำรุงรักษา และอาจมีผลกระทบต่อน้ำหนักที่เกิดบนตัวโครงสร้างท่อในอนาคตได้

ผลการปฏิบัติงานหน่วย ATTACK TEAM เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563

2) สนับสนุนงานโครงการ Booster Pump : สสบท.

ลำดับที่	DMA	ผลสำรวจ Attack Team				ผลซ่อมท่อ สาขา				MNF (cmh)		
		ท่อจ่าย	ท่อบริการ	แคลมป์	อื่นๆ	ท่อจ่าย	ท่อบริการ	แคลมป์	อื่นๆ	ตั้งต้น	ธ.ค.-63	ลดลง
1	54-01-06	0	5	0	1	0	3	0	0	184.70	138.92	45.78

กิจกรรมที่เข้าดำเนินการ :

- ตรวจสอบแรงดันโดยละเอียดทั่วพื้นที่ (ปรับเปลี่ยนตามการแผน Booster Pump)
- ตรวจสอบจุดข้ามคลองบริเวณต่างๆ ทั่วพื้นที่
- เดินสำรวจหาท่อรั่วเบื้องต้นในพื้นที่โซนบน
- เดินสำรวจท่อรั่วแบบละเอียดเพื่อบิบบพื้นที่บริเวณแยกทำอิฐร่วมกับสาขา

ปัญหาและอุปสรรค :

- มีการปรับเปลี่ยนอิทธิพลการจ่ายน้ำเพื่อลดข้อร้องเรียน ทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรม Isolate Test และ Step Test ตรวจสอบพฤติกรรมจริงของพื้นที่ได้ (อยู่ในระหว่างการประสานงานกับสาขาเพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดหลังระบบการจ่ายน้ำในพื้นที่เสถียร)
- ท่อในพื้นที่ที่มีความลึกมากทำให้ยากต่อการสำรวจหาท่อรั่วในพื้นที่แรงดันน้ำต่ำ

ขอบคุณครับ
