




ผลการดำเนินงาน

ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ

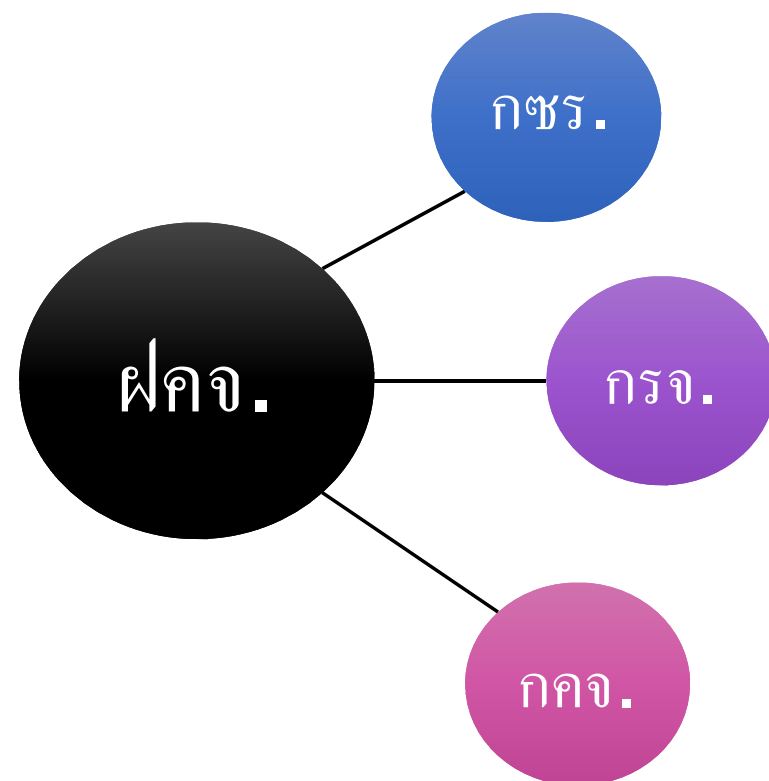

1. งานสำรวจหาท่อรั่วในท่อประธาน (ALC)



กรมประปา
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

แผนที่แสดงโครงข่ายท่อประธาน
ด้วยหลักการสมดุลน้ำ (Water Balance)



แผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6

ALC-MAIN PIPE LENGTH INSPECTION 2567 (KM.)




ปริมาณน้ำสูญเสียสะสมในระบบท่อประธานที่ลดลงได้ประจำปีงบประมาณ 2567 (ลูกบาศก์เมตร)



รหัส - ชื่อโครงการ	แผนงาน	ปี 67		ปี 68		ปี 69		ปี 70	
SO1-T3-P1 โครงการปรับปรุงท่อประปา	แผนงานที่ 1 : งานสำรวจท่อประธานแตกรั่ว	540	20	540	20	540	20	540	20

ผลดำเนินการซ่อมท่อประธานประจำปีงบประมาณ 2567

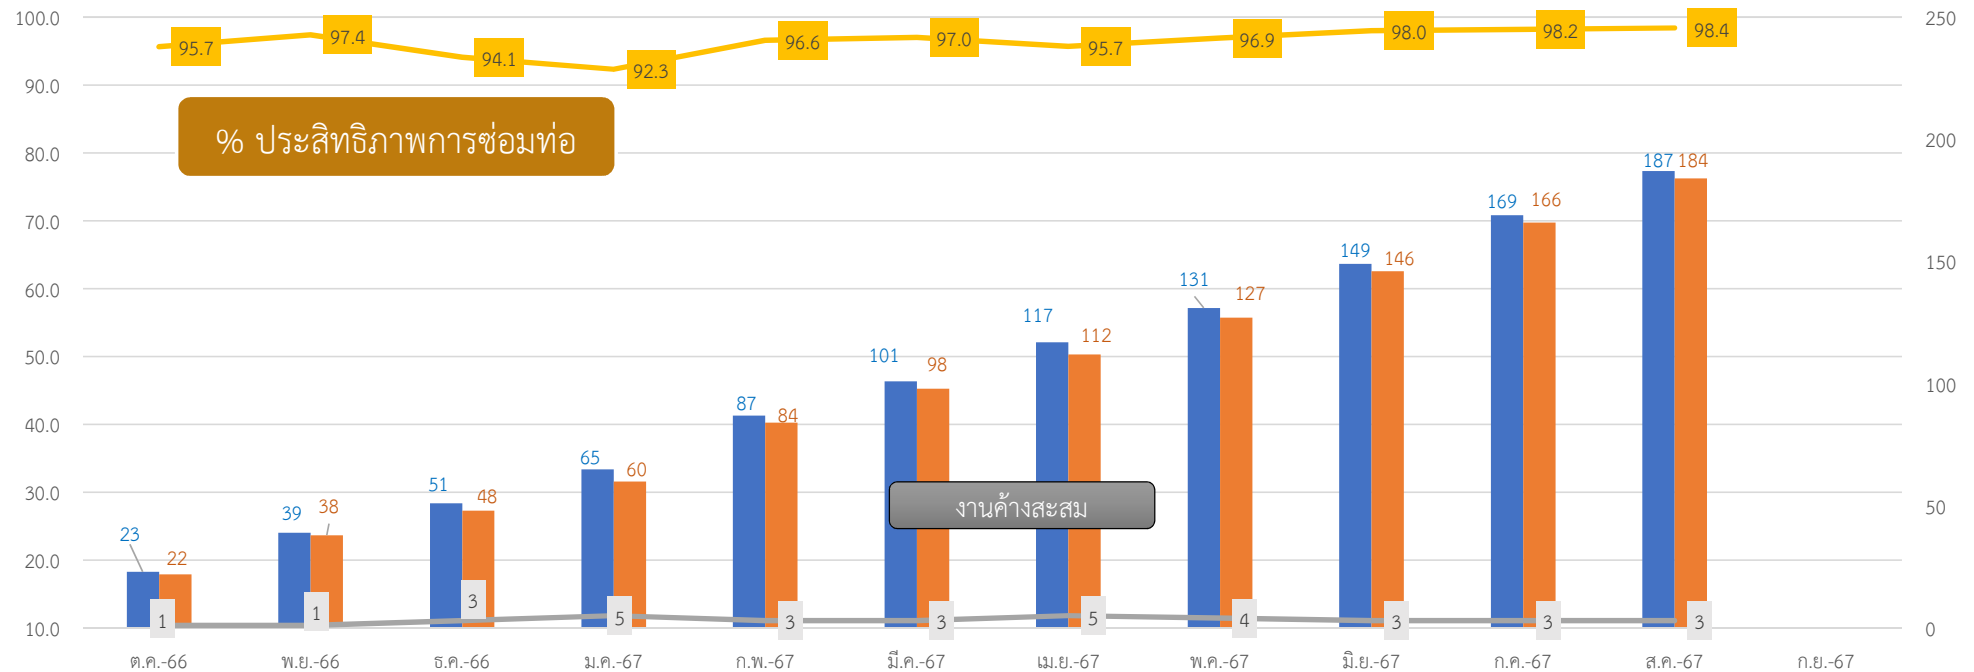

	ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67
งานที่เข้าดำเนินการสะสม	23	39	51	65	87	101	117	131	149	169	187	
งานแล้วเสร็จสะสม	22	38	48	60	84	98	112	127	146	166	184	
งานแล้วเสร็จสะสม (%)	95.7	97.4	94.1	92.3	96.6	97.0	95.7	96.9	98.0	98.2	98.4	
งานไม่แล้วเสร็จสะสม	1	1	3	5	3	3	5	4	3	3	3	

รายเดือน

งานที่เข้าดำเนินการสะสม งานแล้วเสร็จสะสม งานแล้วเสร็จสะสม (%) งานไม่แล้วเสร็จสะสม

ข้อมูลล่าสุด 2 สค. 67

ปัญหาและอุปสรรคงานซ่อมท่อประปาที่ไม่แล้วเสร็จ

(งานที่ค้างข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2567)





การประปาปทุมธานี
AN WATERWORKS AUTHORITY

เลขงาน	พิกัดจุดงาน	พื้นที่สาขา	วันที่เริ่มเข้าดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
Job 149/67	ยกเลิกท่อ700ST ข้ามคลองเปรมประชากร ช่วงถนนงามวงศ์วานและงานที่เกี่ยวข้อง	สสข	25-26/6/67	-กצר.เข้าเตรียมงานตัดยกเลิกท่อข้ามคลอง ที่สนน. กทม ส่งหนังสือมา -กำหนด การตัดท่อ/รื้อย้ายท่อ รอ กงค.ฟบค. กำหนดอีกครั้ง
Job 183/67	คอAV-150x Manifold 1800 ผุกร่อน สจ. ลาดพร้าว	สสส.	21/8/2567	-กצר. สร้างหลุมงาน/ตัดเปลี่ยน คอ AV+อุปกรณ์ พบว่า หน้างาน600 สเปคไม่ใช่ PN 10 ตาม สเปค กมว. จึงต้องสั่งหน้างาน600x150 ใหม่ -กำหนดการเข้าเปลี่ยน พร้อมงาน สัญญาฯ ติดตั้งท่อBy-Passของ ฟสน. ช่วง เดือน ต.ค. 2567
Job 186/67	ท่อ1200 คลองบางอ้าย ถนนกาญจนาฯ ตะวันตก	สสส.	26/8/2567	-กצר. เตรียมเข้า ขุดหา AV600x1200 ผังตรงข้ามกับจุดรั่ว เพื่อให้ให้นัก ประดาน้ำดำสำรวจ+ซ่อม -กำหนดเข้า ดำเนินการ 4 ก.ย. 2567



กצר.ผดจ.

ผลการดำเนินงานบริหารแรงดันน้ำ 162 จุด ปังบประมาณ 67

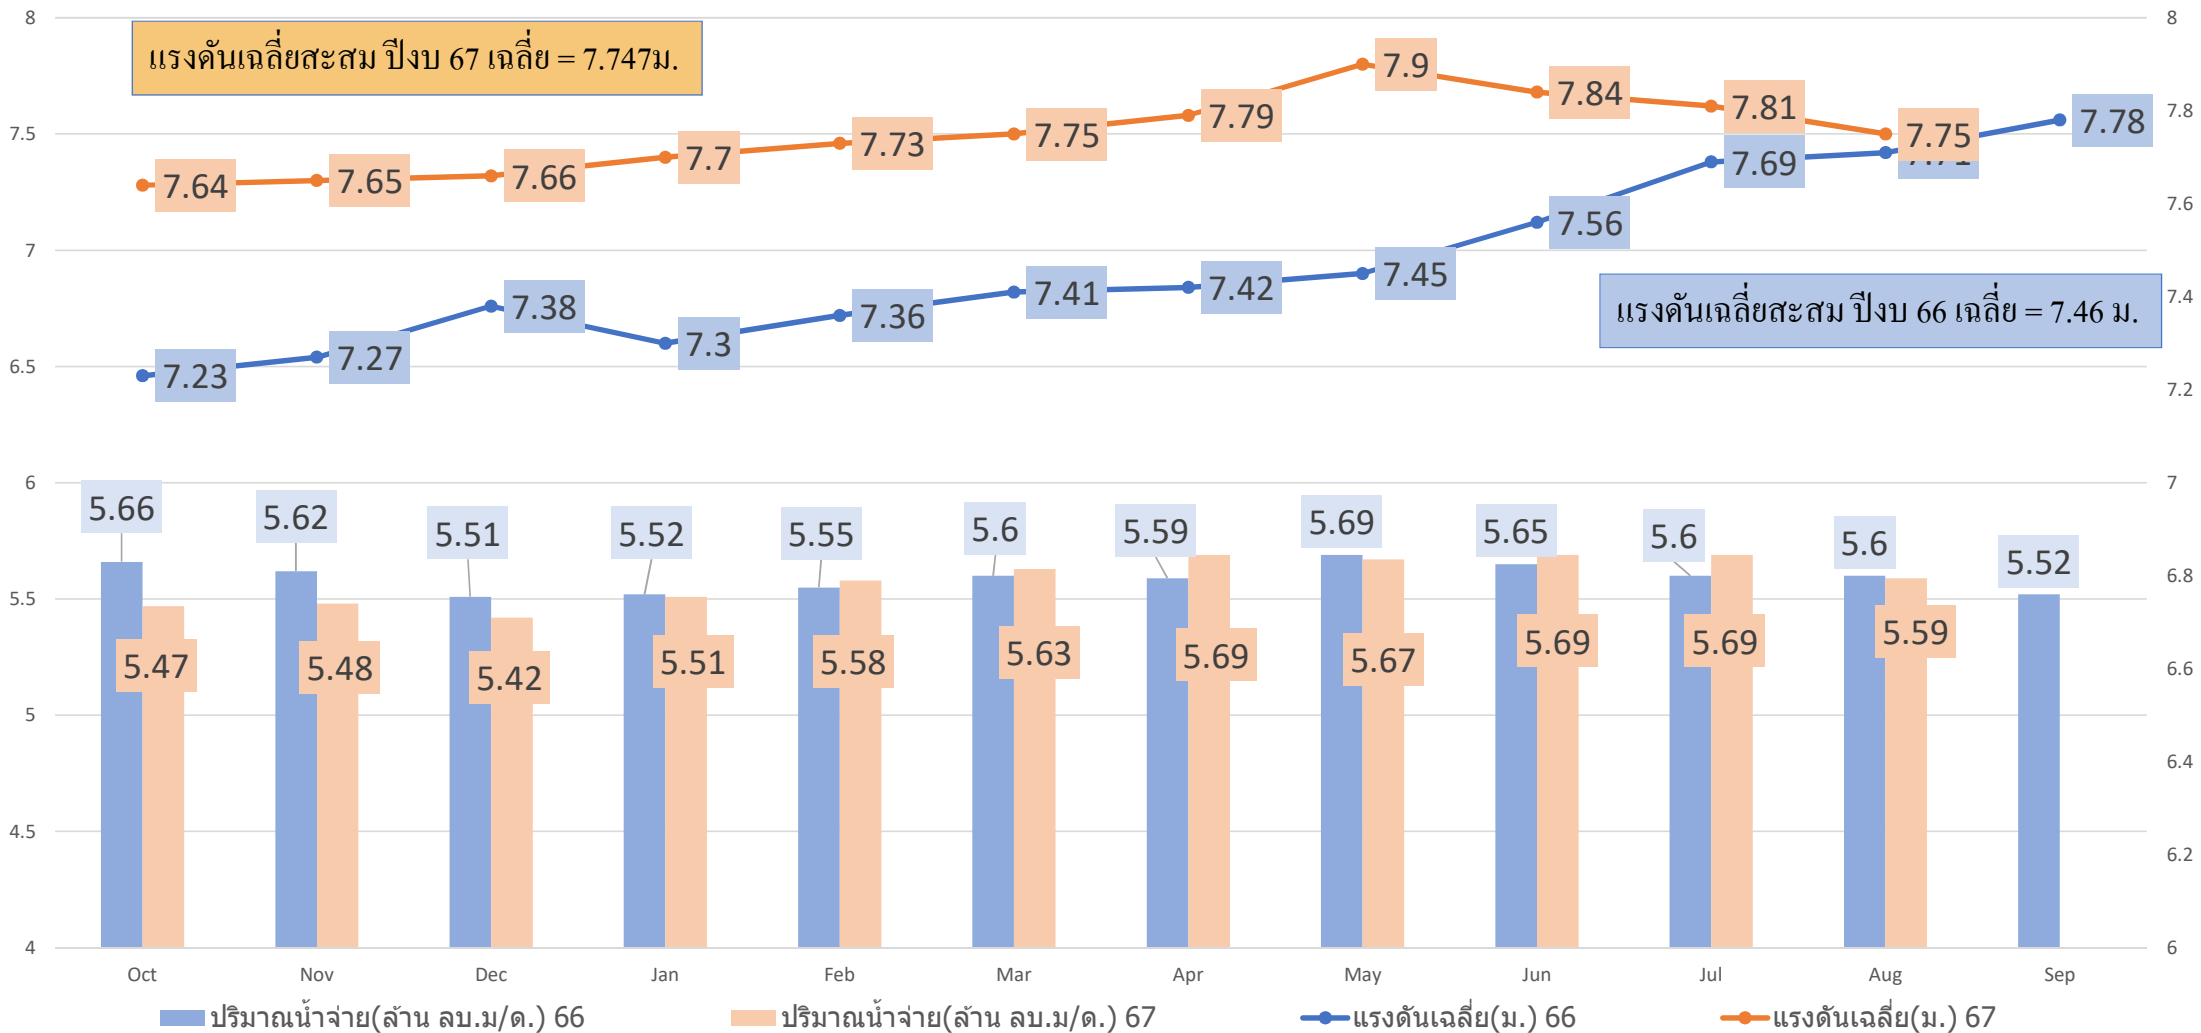

ข้อมูลล่าสุด 2 กย. 67
