




ผลการดำเนินงาน

ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ



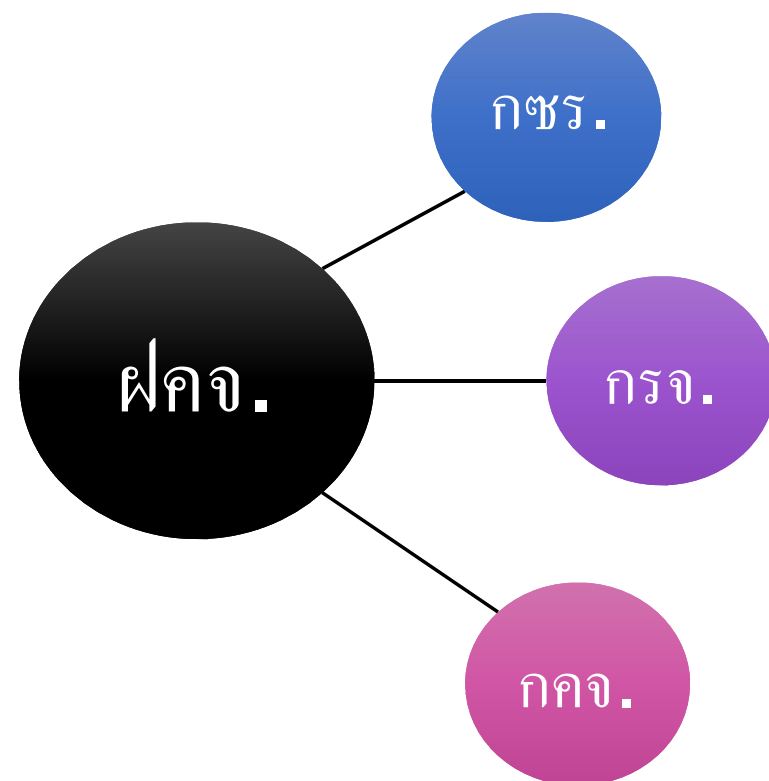

การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

1. งานสำรวจหาท่อรั่วในท่อประธาน (ALC)

แผนที่แสดงโครงข่ายท่อประธาน
ด้วยหลักการสมดุลน้ำ (Water Balance)



แผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6

ALC-MAIN PIPE LENGTH INSPECTION 2567 (KM.)



ปริมาณน้ำสูญเสียสะสมในระบบท่อประธานที่ลดลงได้ประจำปีงบประมาณ 2567 (ลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณน้ำสูญเสียสะสมในระบบท่อประธานที่ลดลงได้ประจำปีงบประมาณ 2567 (ลูกบาศก์เมตร)


ลดปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยสะสมใน
เดือนกันยายน 2567 ได้กว่า
“9,858.41 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน”



รหัส - ชื่อโครงการ	แผนงาน	ปี 67		ปี 68		ปี 69		ปี 70	
SO1-T3-P1 โครงการปรับปรุงท่อประปา	แผนงานที่ 1 : งานสำรวจท่อประธานแตกรั่ว	540	20	540	20	540	20	540	20

ข้อมูลล่าสุด 2 ต.ค. 67

ผลดำเนินการซ่อมท่อประธานประจำปีงบประมาณ 2567

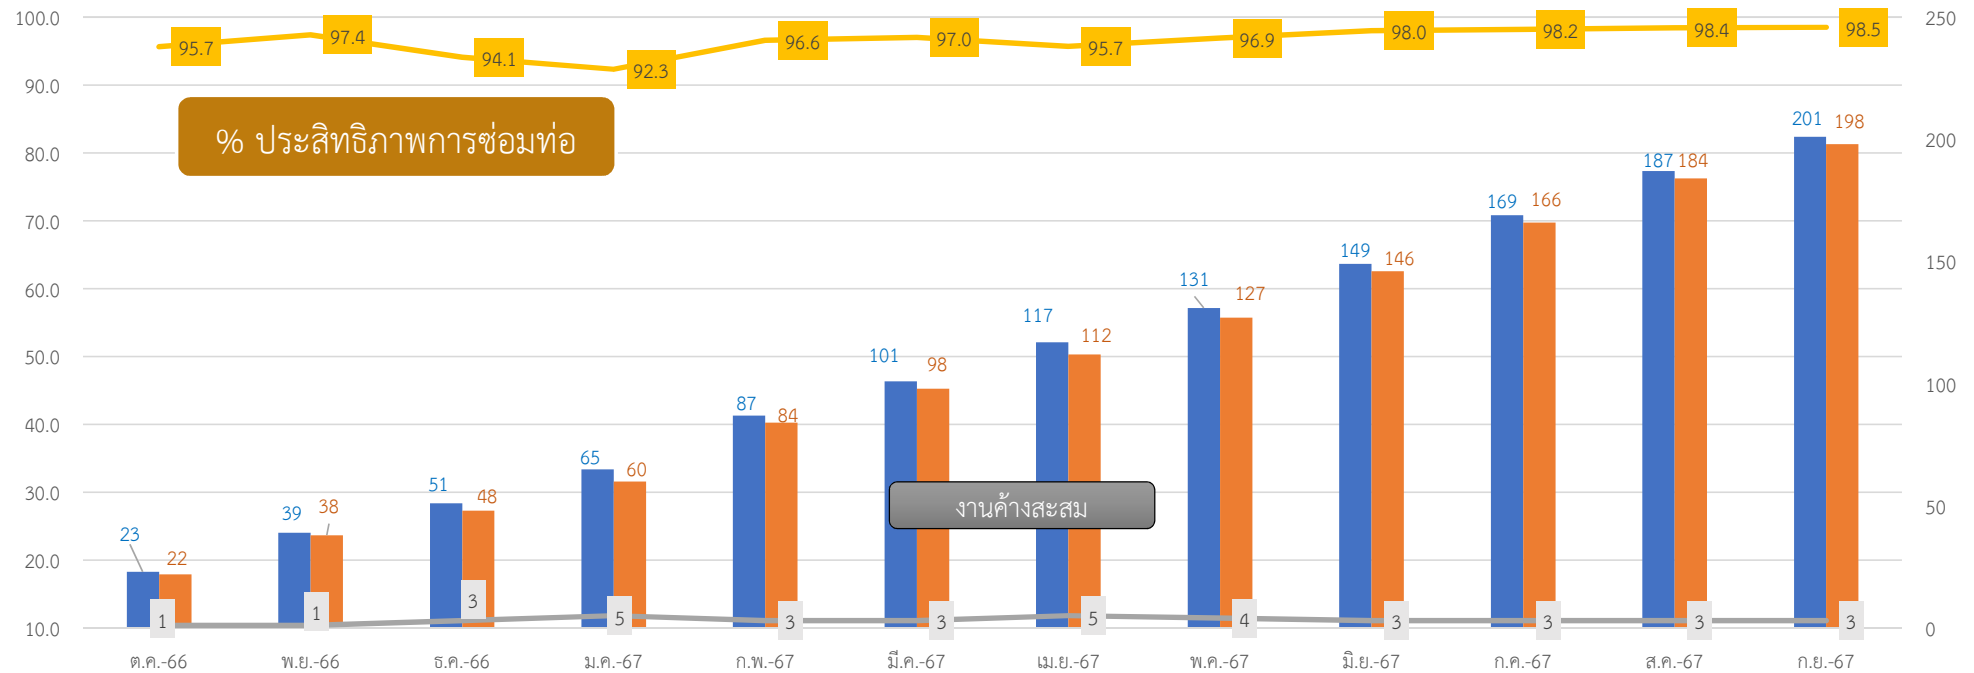

	ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67
งานที่เข้าดำเนินการสะสม	23	39	51	65	87	101	117	131	149	169	187	201
งานแล้วเสร็จสะสม	22	38	48	60	84	98	112	127	146	166	184	198
งานแล้วเสร็จสะสม (%)	95.7	97.4	94.1	92.3	96.6	97.0	95.7	96.9	98.0	98.2	98.4	98.5
งานไม่แล้วเสร็จสะสม	1	1	3	5	3	3	5	4	3	3	3	3

รายเดือน

งานที่เข้าดำเนินการสะสม งานแล้วเสร็จสะสม งานแล้วเสร็จสะสม (%) งานไม่แล้วเสร็จสะสม




แนวโน้ม คาดการณ์งานซ่อมท่อประธาน

(Linear Forecast)



การประปาเทศบาล
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

สรุปงานซ่อมท่อและแนวโน้มการคาดการณ์ ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2567

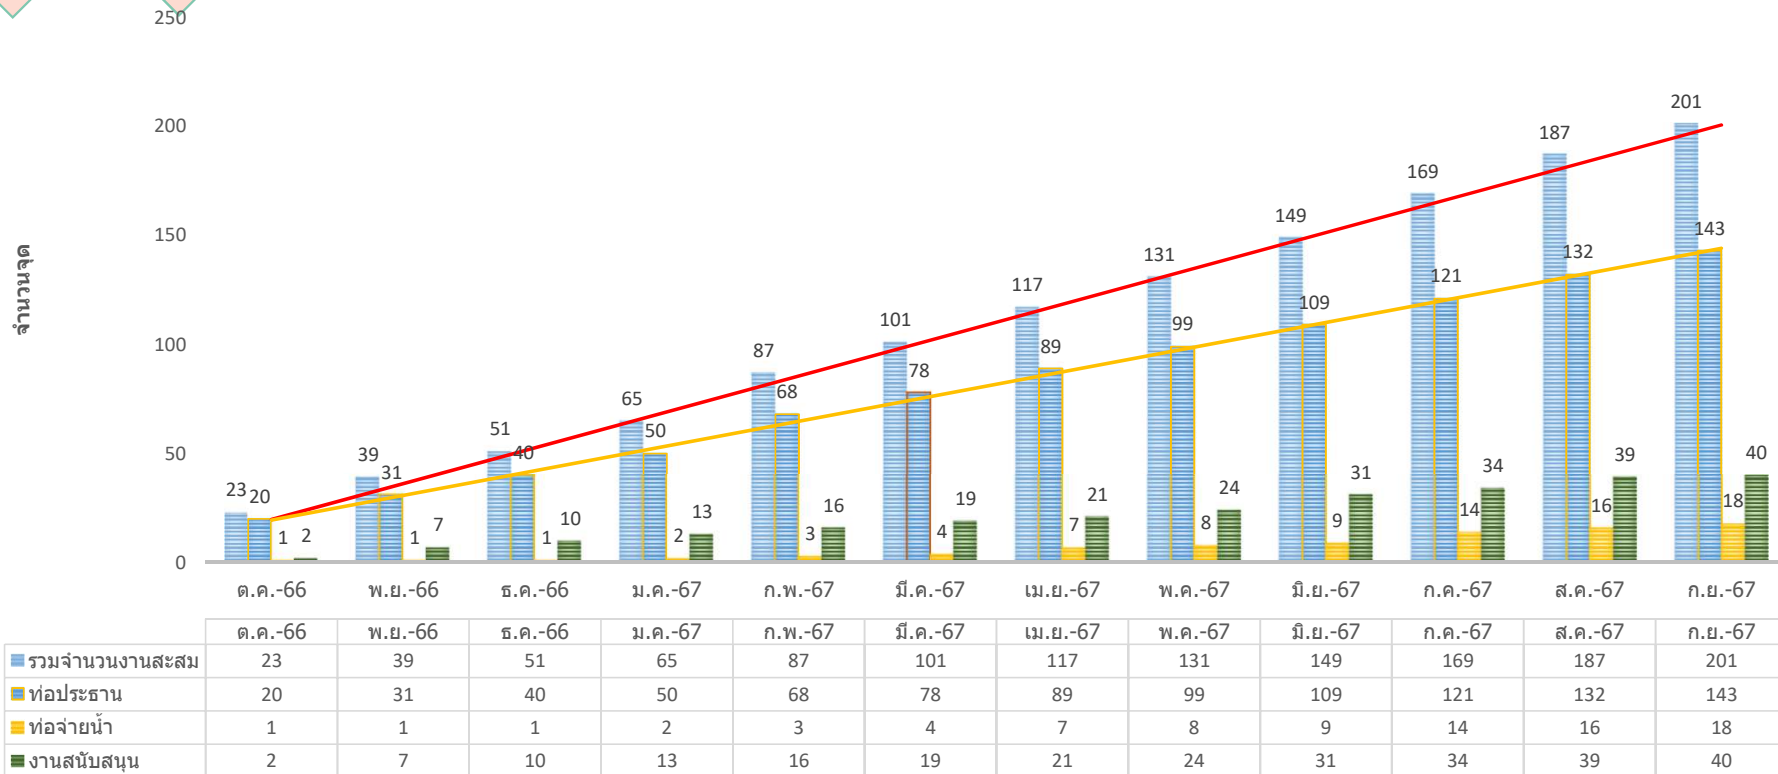

กช.ร.ผ.ค.



การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

ปัญหาและอุปสรรคงานซ่อมท่อประปาที่ไม่แล้วเสร็จ



เลขงาน	พิกัดจุดงาน	พื้นที่ สาขา	วันที่เริ่มเข้า ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
Job 149/67	ยกเลิกท่อ700ST ข้ามคลองเปรม ประชากร ช่วงถนนงามวงศ์วานและงาน ที่เกี่ยวข้อง	สสช.	25-26/6/67	-กצר.เข้าเตรียมงานตัดยกเลิกท่อข้ามคลอง ที่สนน. กทม ส่งหนังสือ มา -กำหนด การตัดท่อ/ร้อยย้ายท่อ รอ กค.ฟค. กำหนดอีกครั้ง
Job 186/67	ท่อ1200 คลองบางอ้าย ถนนกาญจนาฯ ตะวันตก	สสภ.	26/8/2567	-กצר. เข้า ขุดหา AV600x1200 ฟังตรงข้ามกับจุดรั่ว เพื่อให้ นัก ประดาน้ำดำสำรวจ+ซ่อม(4 ก.ย. 2567) พบจุดรั่วท่อTAP300 -ที่ประชุมร่วม ฝคจ/สาขา เสนอแผนติดตั้งTapใหม่จากท่อ AV600x1200 และจ้างนักประดาน้ำเชื่อมปิดจุดTapเดิม (10 ต.ค.67)
Job 202/67	ท่อ2000 ST คลองลาดพร้าว ถนน ประชาอุทิศ	สสส.	21/9/2567	- กצר ตัดยกเลิกท่อ AV-150 เดิมและย้ายจุดติดตั้ง AV-700x150 ใหม่ - รอกำหนดเข้าพร้อม งานหยุดสูบน้ำ สจ.ลาดพร้าว(งานติดตั้ง ท่อBy-Pass)



กצר.ฝคจ.

กצר.ฝคจ.

ผลการดำเนินงานบริหารแรงดันน้ำ 162 จุด ปีงบประมาณ 2567

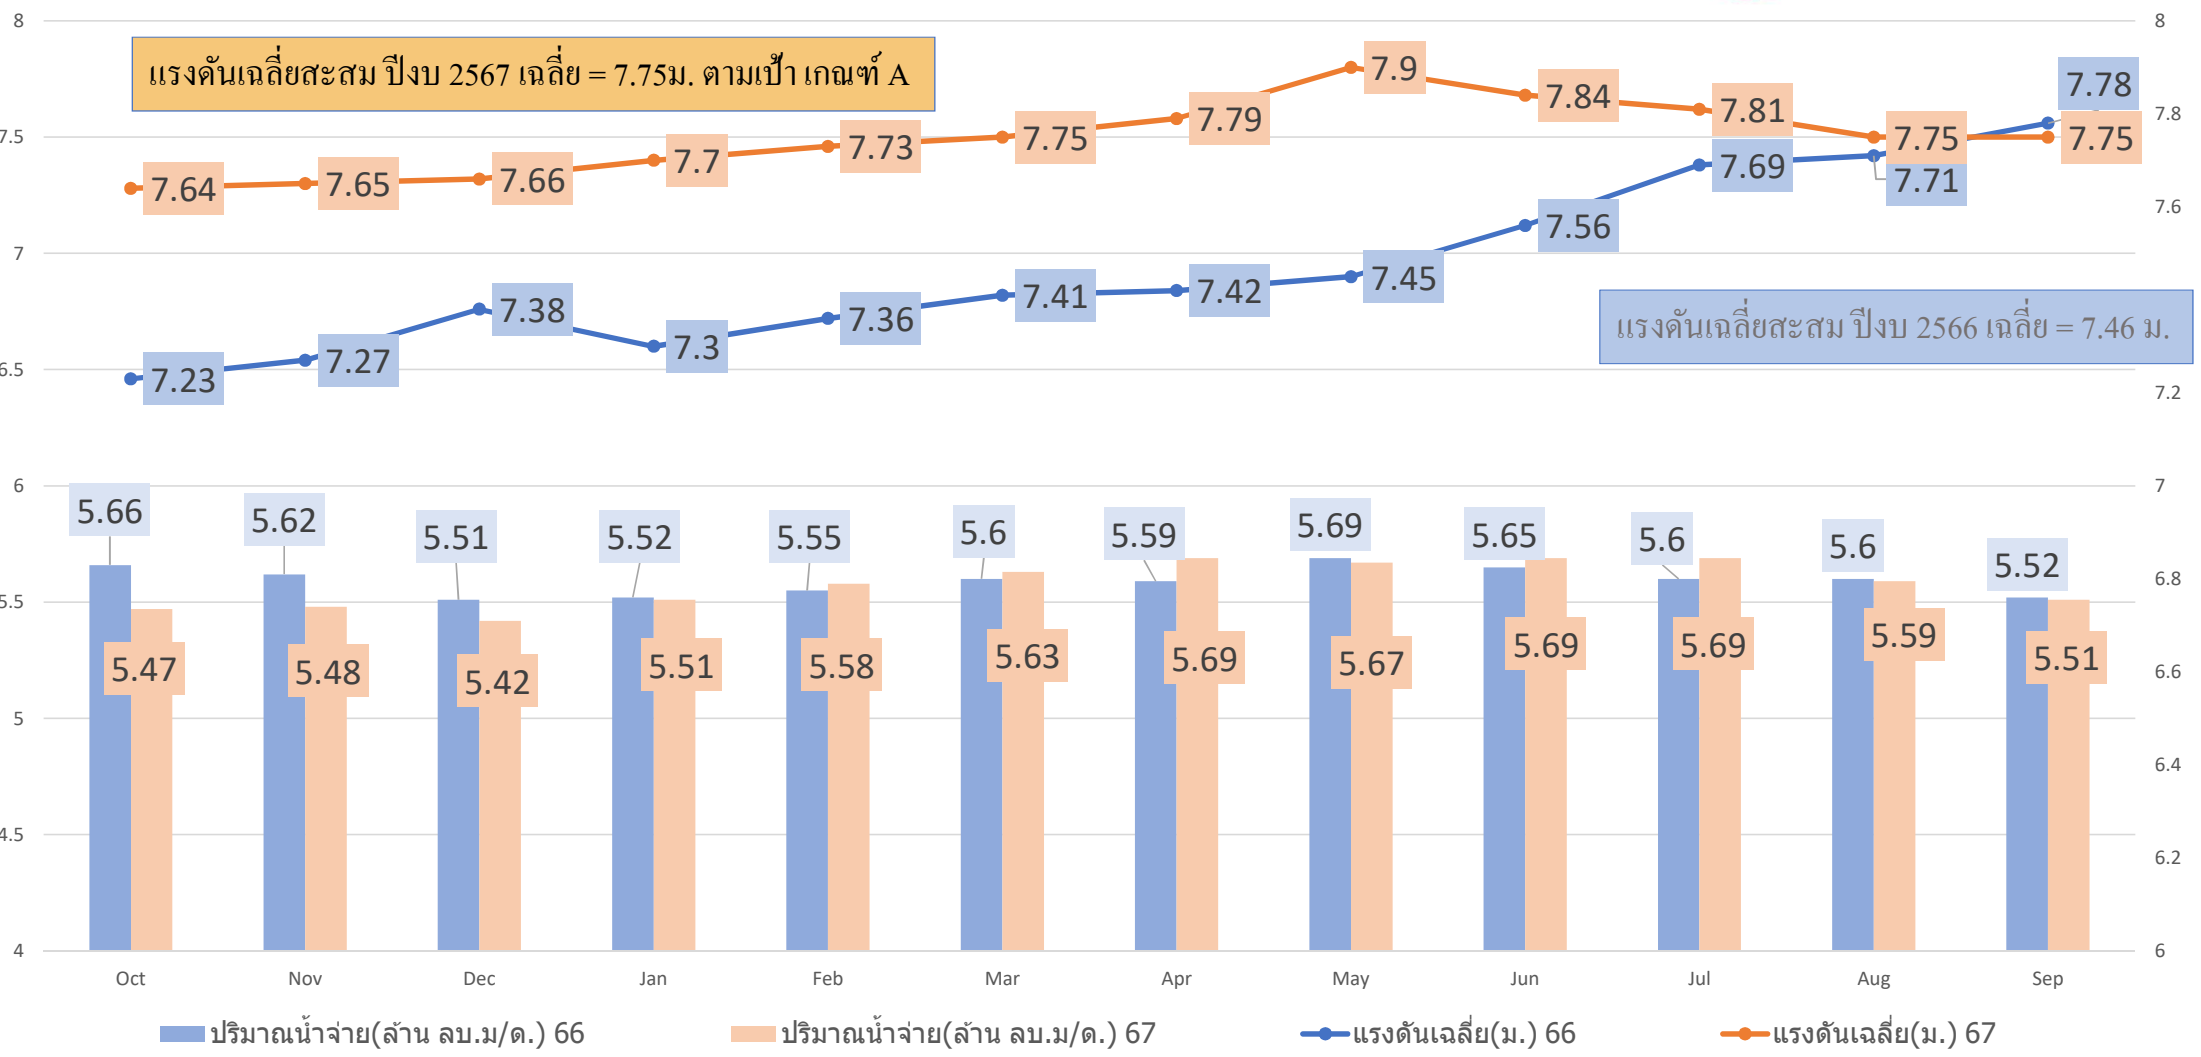

ข้อมูลล่าสุด 2 ต.ค. 67
